


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	PROYECTO 1900376	824.75 días	Jue 6/2/20	sáb 27/5/23	
2	MATANZA/ARROYO HONDO/ PAYA/ CARRETON	824.75 días	Jue 6/2/20	sáb 27/5/23	
3	LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN MATANZA	685.22 días	Jue 6/2/20	lun 14/11/22	
4	COLOCACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZA ESPECIALES Y REPARACIONES EXISTENTES (INLUYE 9,8 KM TUBERIAS DE 4" Y 3" ADICIONALES EN ADENDA)	385 días	Jue 6/2/20	lun 20/9/21	
5	ACOMETIDAS URBANAS (2,583 U)	536 días	vie 19/6/20	vie 8/7/22	
9	PRUEBA DE ACOMETIDAS	60 días	lun 3/5/21	lun 25/7/22	7FF+1.67 sem.
10	ASFALTO (75% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)	95 días	mié 12/5/21	lun 14/11/22	4;9
11	LINEA DE CONDUCCION, LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION EN ARROYO HONDO, LOS TUMBAO Y QUIJA QUIETA	605.06 días	sáb 15/2/20	Jue 4/8/22	
12	COLOCACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZA ESPECIALES Y REPARACIONES EXISTENTES (INLUYE 11,3 KM TUBERIAS DE 3" A 5/65 días)	sáb 15/2/20	Jue 9/6/22	4CC+0.83 sem.	
13	ACOMETIDAS URBANAS (3,415 U)	488.29 días	lun 24/8/20	Jue 7/7/22	
17	PRUEBA DE ACOMETIDAS	75 días	vie 30/4/21	Jue 21/7/22	15FF+10 días
18	ASFALTO (50% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)	75 días	vie 13/11/20	Jue 4/8/22	17FF+1.67 sem.
19	LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION DE PAYA	370 días	mar 27/7/21	mar 27/12/22	
20	COLOCACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZA ESPECIALES Y REPARACIONES EXISTENTES (INLUYE 5 KM TUBERIAS DE 3" Y 4" ADICIONALES EN ADENDA)	288 días	mar 27/7/21	vie 2/9/22	4
21	INSTALACION DE VALVULAS Y REGISTROS DE VALVULAS	85 días	Jue 5/5/22	Jue 1/9/22	20CC+0.83 mss
22	ACOMETIDAS URBANAS (453 U)	67 días	mar 7/9/21	Jue 9/12/21	
26	PRUEBA DE ACOMETIDAS	85 días	Jue 9/12/21	Jue 7/4/22	24
27	ASFALTO (85% LONGITUD DE TUBERIAS N/ TODAS LAS CALLES ESTAN ASFALTADAS)	188 días	Jue 7/4/22	mar 27/12/22	26
28	RED DE DISTRIBUCION EL CARRETON Y ZONAS ALEDAÑAS PLANTA DE TRATAMIENTO	248 días	mié 15/6/22	sáb 27/5/23	
29	COLOCACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS, PIEZA ESPECIALES Y REPARACIONES EXISTENTES	193 días	mié 31/8/22	sáb 27/5/23	21FF-3 días
30	INSTALACION DE VALVULAS Y REGISTROS DE VALVULAS	80 días	mié 14/9/22	mié 4/1/23	29CC+1.67 sem.
31	SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS Y CAJA DE ACOMETIDA POLIETILENO URBANA (450 U)	170 días	mié 15/6/22	mar 7/2/23	
35	PRUEBA DE ACOMETIDAS	75 días	mié 12/10/22	mar 24/1/23	32CC;34



Proyecto: Cronograma Lote I y Fecha: mar 21/6/22	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha Emite		Hilo de línea base	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas		Resumen de línea base	
	Hilo		Hilo inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica		Progreso	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hilo externo		Línea base		Progreso manual	

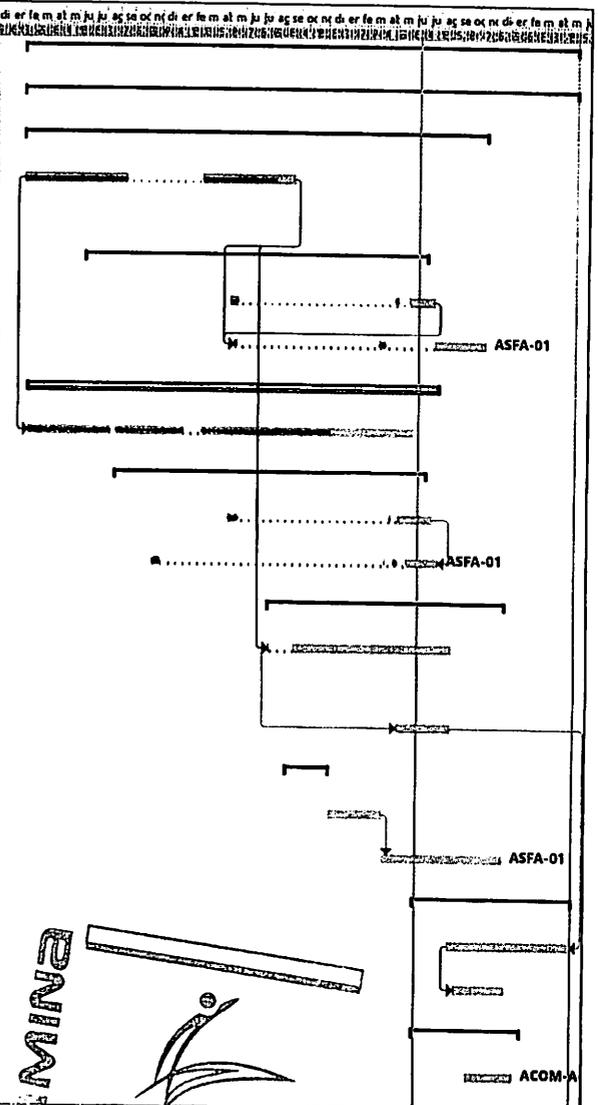

No. EXPEDIENTE
 INAPA-CCC-CP-2020-0017

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS - INAPA -
 LICITACION INAPA-CCC-CP-2020-0017

24-may.-22

RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS - GALEON, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA..

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

No.	ACTIVIDAD	MES SEM.	jun-22				jul-22				ago-22				sep-22				oct-22				nov-22				dic-22				ene-23				feb-23				mar-23				abr-23				may-23			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	EMPALME 20 @ 6 DE LINEA DE ADUCCION CON LINEA AC. MANTANZA																																																	
2	ELECTRICIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA																																																	
3	ESTACION DE BOMBEO																																																	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO																																																	
5	TERMINACION RED DE DISTRIBUCION LAS TABLAS																																																	
6	PRUEBAS HIDROSTATICAS DE RED DE DISTRIBUCION LAS TABLAS																																																	
7	TERMINACION CONSTRUCCION DEP. REGULADOR DE 200 M3 EN LAS TABLAS																																																	
8	REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES Y LIMPIEZA FINAL																																																	

[Handwritten signature]

