



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, DN.
22 de marzo del 2023**

INFORME DE CUBICACIÓN NO.2
PERIODO DE EJECUCIÓN: 24/10/2022 al 04/01/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Red De Acueducto Sabana De La Mar, Sector La
Aviación, Provincia Hato Mayor, Lote I
Contrato: 001-2022
Contratista: Ing. Ermenegilda Reyes Frometa
Provincia: Hato Mayor

Anexos : Reporte de Cubicación No.2
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Replanteo del terreno 6,936.86 M
- Suministro y colocación de tubería Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Corte y Reposición Carpeta Asfáltica (L=300.00 M)
- Acometidas urbanas Ø ½" (403 Unidades).

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

El avance actual se corresponde a la colocación de líneas de Ø4" y Ø3", de acometidas y piezas especiales en algunos puntos. Esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 46.88%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación No. 2, de Redes De La Aviación, Están la colocación de tuberías de Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G. con una longitud total de 620.20 M, la tubería de Ø4'' con una longitud de 601.90 M de PVC SDR-26 6''C/J.G. y 4.5 M de tubería de Ø6'' PVC SDR-26 6''C/J.G., la colocación de piezas especiales y la colocación de 105 acometidas.




Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Reyna C. Hernández Mateo
Supervisora de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

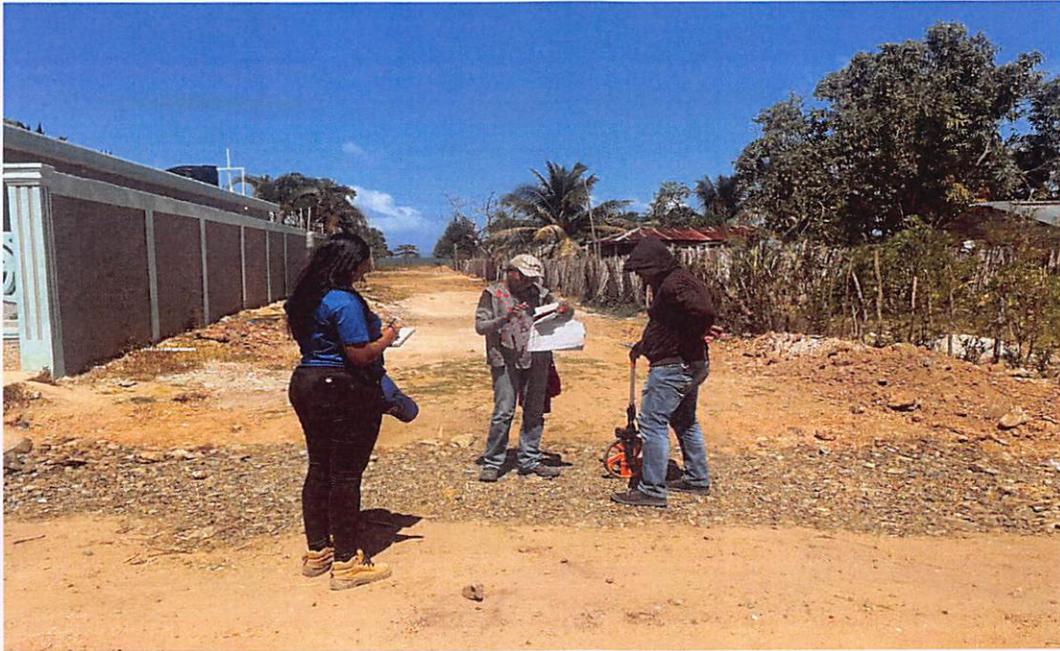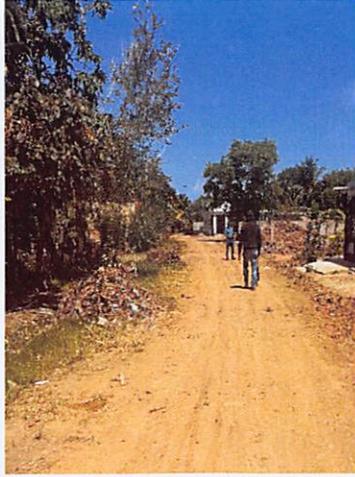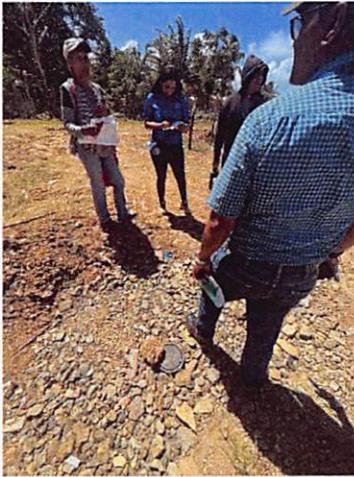



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
10 de Enero del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 15/08/2022 al 29/12/2022

Referencia : **Obra:** Ampliación De Red De Acueducto Sabana
De La Mar, Sector Los Solares, Provincia Hato Mayor
Lote III
Contrato: 003-2022
Contratista: Ing. Emmanuel Enrique Peralta Sanabria
Provincia: Hato Mayor

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3 d/f 10/01/2023
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

A) RED SECTOR LOS SOLARES

- Replanteo De 7,525.69 M
- Movimiento De Tierra Con Un Vol= 5272.41 M3
- Excavación En Roca Con Equipo(Incluye Extracción) 30%
- Excavación Material Compacto Con Equipo)70%
- Suministro Material De Mina Para Relleno(Aprobación Supervisión) 30%
- Relleno Compactado A Cada 0.20 M
- Suministro Y Colocación De
- Asiento De Arena
- Bote De Material Con Camión A Una Distancia De 13Km(Incluye Carguío Y Esparcimiento

- Colocación De Tubería
- Suministro Y Colocación De Válvulas
- Prueba Hidrostática
- Cruce De Alcantarillado Ø 6 Acero L = 3.00 M (2 Ud)
- Acometidas Urbanas
- Señalización
- Varios

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En la actualidad podemos decir que esta obra posee un avance de un 41.70%.

ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las actividades importantes de esta cubicación #3, destaca la partida de replanteo, la excavación de 939.06 M3 de material compacto con equipo, el suministro de 1,334.00 M de tubería de Ø3", y la colocación de 31.00 acometidas urbanas.

Atentamente,


Ing. Carlos Cuartos Tejeda Guerrero
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

