



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

13 de noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 23/08/2023 HASTA 06/10/2023

Referencia / Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones- El Copey a Loma Atravesada Estación De Bombeo y Línea de Impulsión Desde Estación E0 + 000 Hasta E2 + 690, Provincia Monte Cristi, Zona I, Lote IX.”

Contrato: 010-2022

Contratista: Stendhal Guaroa Ramírez Vicioso

Provincia: Montecristi

Anexo: -Reporte de Cubicación No.3
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- La construcción de una estación de bombeo y 2,690 metros de tubería de línea de impulsión en tubería de 4” SDR-21.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución, con un avance de ejecución de 89.09%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Colocación de válvulas y estructura de estación de bombeo.

Atentamente,

Víctor A. Felipe De La R.

Ing. Víctor A. Felipe De La Rosa
Supervisor de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

14 de noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 23/08/2022 HASTA 06/10/2022

Referencia / Obra: " Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones- El Copey A Loma Atravesada, Depósito Regulador, Línea de Conducción y Redes estación E5+124 (DR) Hasta E0+700, Provincia Montecristi, Zona I."
Contrato: 024-2022
Contratista: Osiris Ángel Morales Brito
Provincia: Montecristi

Anexo: -Reporte de Cubicación No.4
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- La construcción de un deposito regulador (D.R.) y 700 metros de tubería de conducción en tubería de 4''.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución, se colocó el 100% de las tuberías, todos los accesorios del depósito regulador y caseta de vigilancia.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Colocación de válvulas y accesorios del D.R, esta obra se encuentra en ejecución con avance de 86.52%

Atentamente,

Victor A. Felipe De La R.

Ing. Víctor A. Felipe De La Rosa
Supervisor de Obras



Narciso González
Ing. Narciso González
Supervisor Electromecánico





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Victor A. Felipe Dela R.
FOTOS

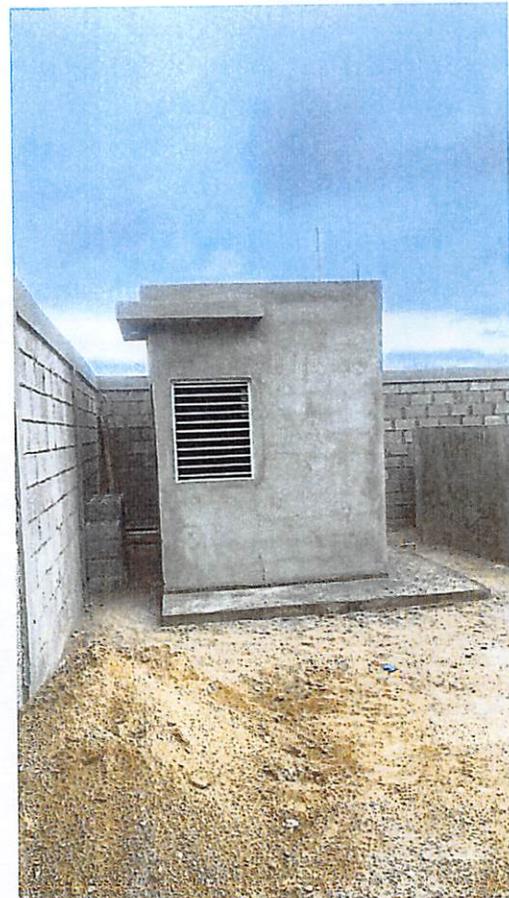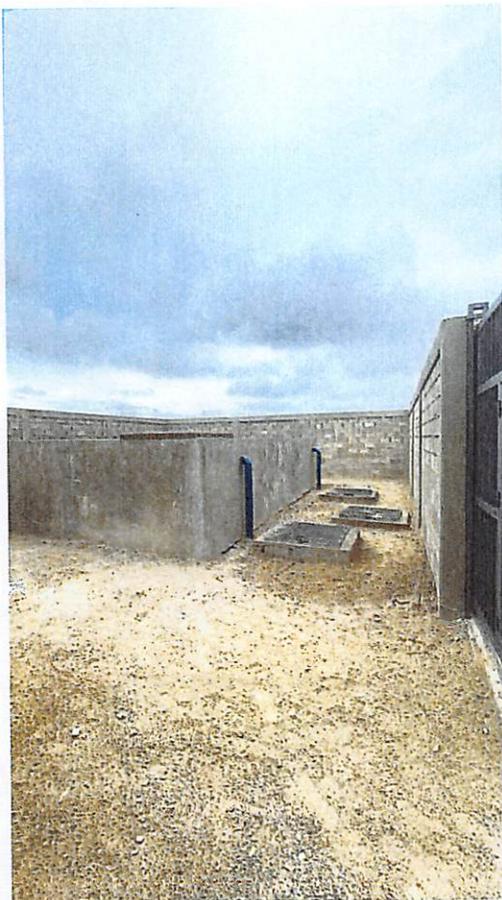



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

26 de octubre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 23/05/2023 HASTA 12/09/2023

Referencia Obra: " Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones-El Copey A Loma Atravesada, Línea De Conducción y Redes Desde Estación E2+820 Hasta E5+620, Provincia Montecristi, Zona I, Lote XIII "

Contrato: 004-2022
Contratista: Arantxa Rodríguez
Provincia: Montecristi

Anexo: -Reporte de Cubicación No.3
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Línea de Impulsión: esta obra tiene previsto ejecutar 4,895.00 m de línea de impulsión, disperso en 2,800.00 de tubería Ø 4" PVC SDR-26 y 1,795.00 de tubería Ø 3" PVC SDR-26.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución, se colocaron las tuberías, estamos a punto de empezar la prueba de las tuberías. Esta obra alcanza un avance de ejecución de un 89.95%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Colocación de válvulas de aire, válvulas de desagüe y acometidas...

Atentamente,

Víctor A. Felipe De La R.

Ing. Víctor A. Felipe De La Rosa
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

FOTOS

