

Modo de		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	febrero 2021 marzo 2021																															
Id	tarea							26	28	30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
1		RED DISTRIBUCION LOS SOLARES	262.13 días	dom 29/1/23	lun 29/1/24		\$16,457,396.00																																
2																																							
3		PUESTA EN POSESION Y DESCENSO A TERRENO	0 días	dom 29/1/23	dom 29/1/23		\$0.00																																
4		REPLANTEO	4 días	lun 30/1/23	jue 2/2/23	3	\$275,000.00																																
5																																							
6		MOVIMIENTO DE TIERRA:	207 días	vie 3/2/23	lun 20/11/23	4	\$9,544,901.91																																
7		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	67 días	vie 3/2/23	lun 8/5/23	4	\$4,149,901.91																																
8		ASIENTO DE ARENA	13 días	mar 9/5/23	jue 25/5/23	7	\$2,100,000.00																																
9		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	49 días	mié 13/9/23	lun 20/11/23	70FC-80 días;17	\$2,370,000.00																																
10		BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM	7 días	mar 14/2/23	mié 22/2/23	7CC+7 días	\$925,000.00																																
11																																							
12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA:	329 días	jue 9/6/22	mar 12/9/23		\$3,450,000.00																																
13		"TUBERIA Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.) +2% DE PERDIDA POR CAMPANA"	71 días	jue 9/6/22	jue 15/9/22		\$2,450,000.00																																
14		Tramo 1 Tubería Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.)	15 días	vie 9/6/23	jue 29/6/23	21;29;73	\$455,000.00																																
15		Tramo 2 Tubería Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.)	15 días	mié 5/7/23	mar 25/7/23	28;64;14	\$375,000.00																																
16		Tramo 3 Tubería Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.)	15 días	lun 31/7/23	vie 18/8/23	25;65;15	\$395,000.00																																
17		Tramo 4 Tubería Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.)	14 días	jue 24/8/23	mar 12/9/23	16;66	\$640,000.00																																
18		Tramo 7 Tubería Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.)	15 días	mié 5/7/23	mar 25/7/23	69	\$585,000.00																																
19		TUBERIA Ø4" PVC (SDR-26 C/I.G.) +2% DE PERDIDA POR CAMPANA	26 días	vie 28/4/23	vie 2/6/23		\$1,000,000.00																																
20		"Tramo 1 tubería Ø4" PVC (SDR-26 C/I.G.)"	10 días	vie 28/4/23	jue 11/5/23	7CC+8 días;8FC-21	\$400,000.00																																
21		Tramo 2 tubería Ø4" PVC (SDR-26 C/I.G.)	12 días	jue 18/5/23	vie 2/6/23	20;72	\$600,000.00																																
22																																							
23		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	97 días	vie 5/5/23	lun 18/9/23		\$382,535.15																																
24		CODO Ø3"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	2 días	mié 13/9/23	jue 14/9/23	17	\$36,500.00																																
25		CODO Ø3"x 90° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	2 días	mar 18/7/23	mié 19/7/23	31;32	\$39,276.00																																
26		TAPON Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	4 días	mié 13/9/23	lun 18/9/23	17	\$36,072.00																																
27		TAPON Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	3 días	mié 26/7/23	vie 28/7/23	18	\$47,000.49																																
28		TEE DE Ø3" X Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	2 días	vie 30/6/23	lun 3/7/23	14	\$38,750.00																																
29		TEE DE Ø4" X Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	6 días	vie 5/5/23	vie 12/5/23	20FC-5 días	\$36,500.00																																
30		JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø4"	2 días	mar 9/5/23	mié 10/5/23	20CC+7 días	\$52,000.00																																
31		JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE Ø3"	2 días	mar 11/7/23	mié 12/7/23	14CC+22 días	\$48,938.86																																
32		ANCLAJE PARA PIEZAS	3 días	jue 13/7/23	lun 17/7/23	30;31	\$49,500.00																																
33																																							
34		ACOMETIDAS RURALES (356 U)	209 días	lun 30/1/23	jue 16/11/23		\$1,910,903.37																																
61																																							
62		PRUEBA HIDROSTATICA	91 días	vie 12/5/23	vie 15/9/23		\$639,056.37																																
63		TUBERIA Ø3" PVC (SDR-26 C/I.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	56 días	vie 30/6/23	vie 15/9/23	14	\$128,556.37																																
71		"TUBERIA Ø4" PVC (SDR-26 C/I.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA"	20 días	vie 12/5/23	jue 8/6/23	20	\$530,500.00																																
72		Prueba tramo 1 Tub. 4" + 2% perdida	4 días	vie 12/5/23	mié 17/5/23	20	\$255,000.00																																
73		Prueba tramo 1 Tub. 4" + 2% perdida	4 días	lun 5/6/23	jue 8/6/23	21	\$275,500.00																																
74																																							
75		LIMPIEZA FINAL	2 días	vie 17/11/23	lun 20/11/23	34;62	\$235,000.00																																
76																																							
77		ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA PROYECTO	262.13 días	dom 29/1/23	lun 29/1/24	70;56;27;9;18;75	\$0.00																																


[Firma]

Proyecto: monte plata los solar	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo al comienzo	Hito externo	Progreso manual
Fecha: jue 25/5/23	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
	Hito	Tarea inactivo	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proyecto: monte plata los solar Fecha: jue 25/5/23	Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		solo fin		Hito externo		Progreso manual	
	División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual						Fecha limite			
	Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas				Progreso			

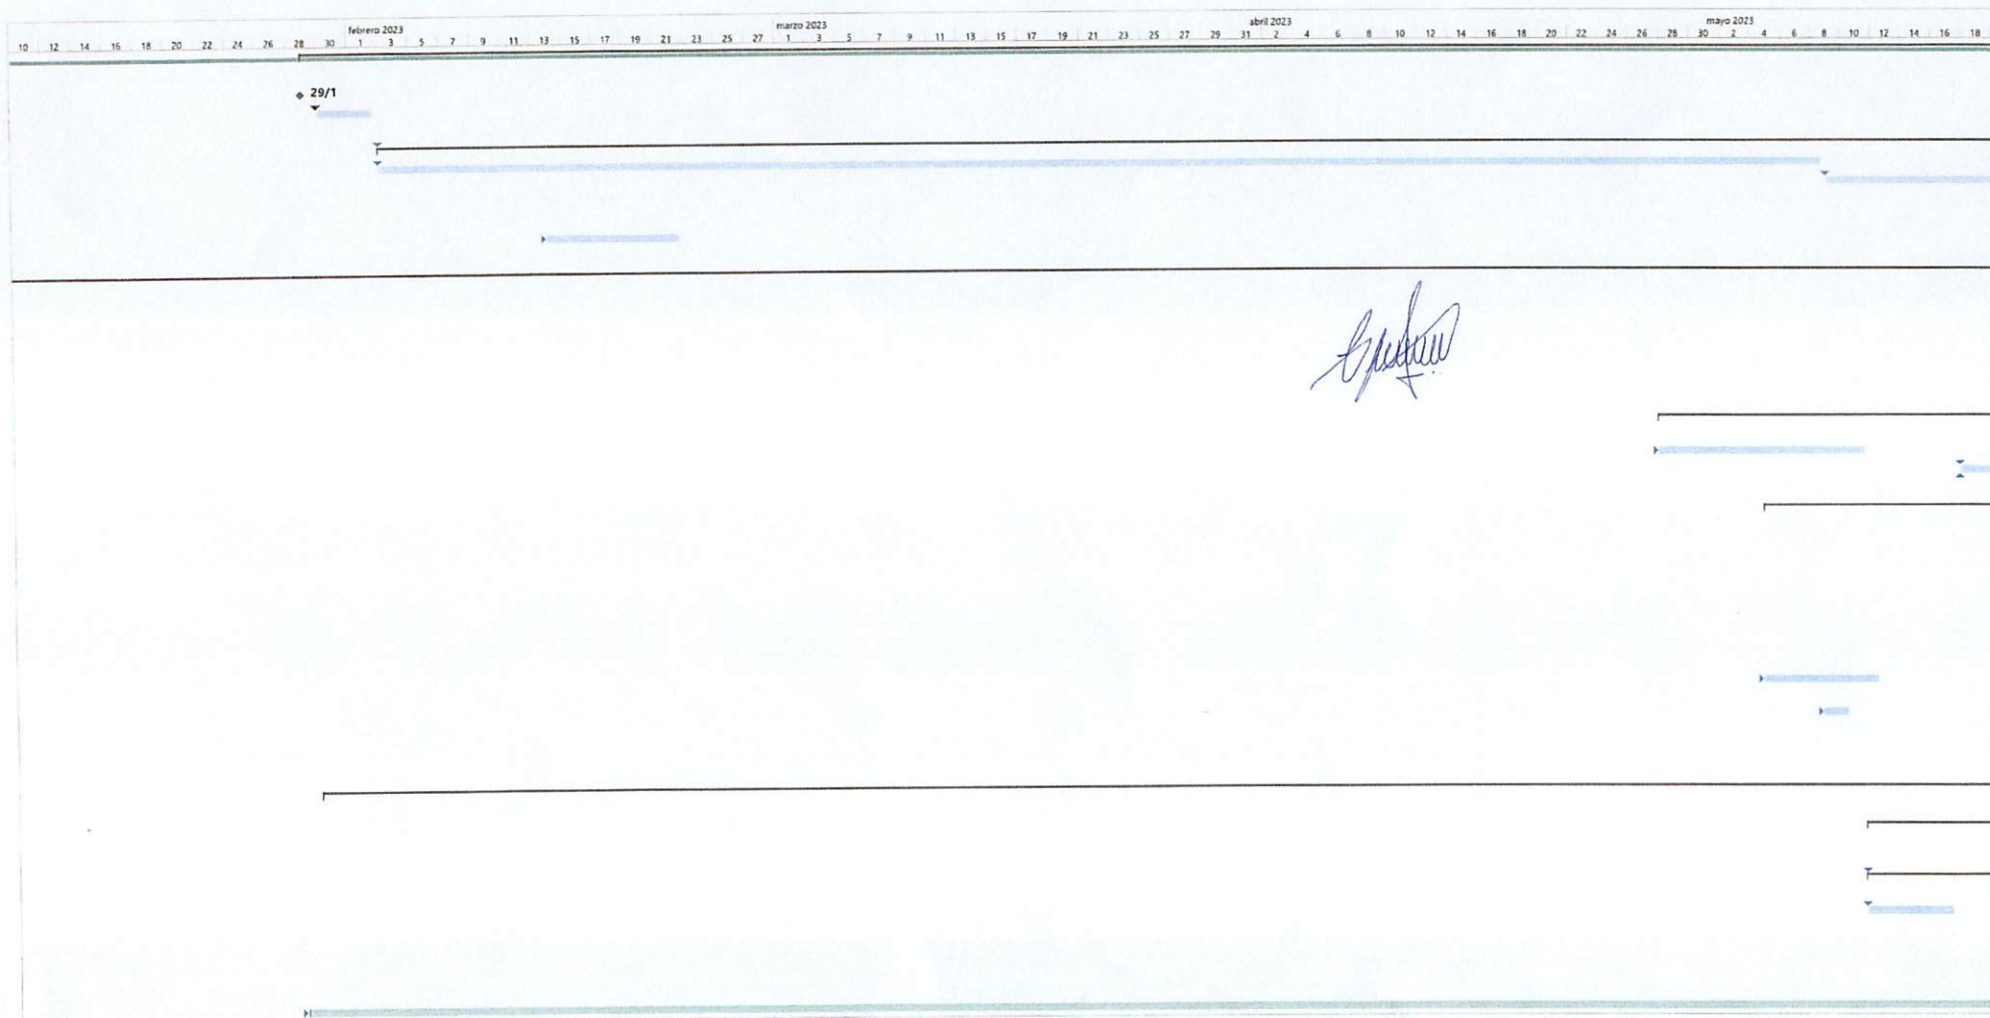

Proyecto: monte plata los solar
Fecha: jue 25/5/23

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva


Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

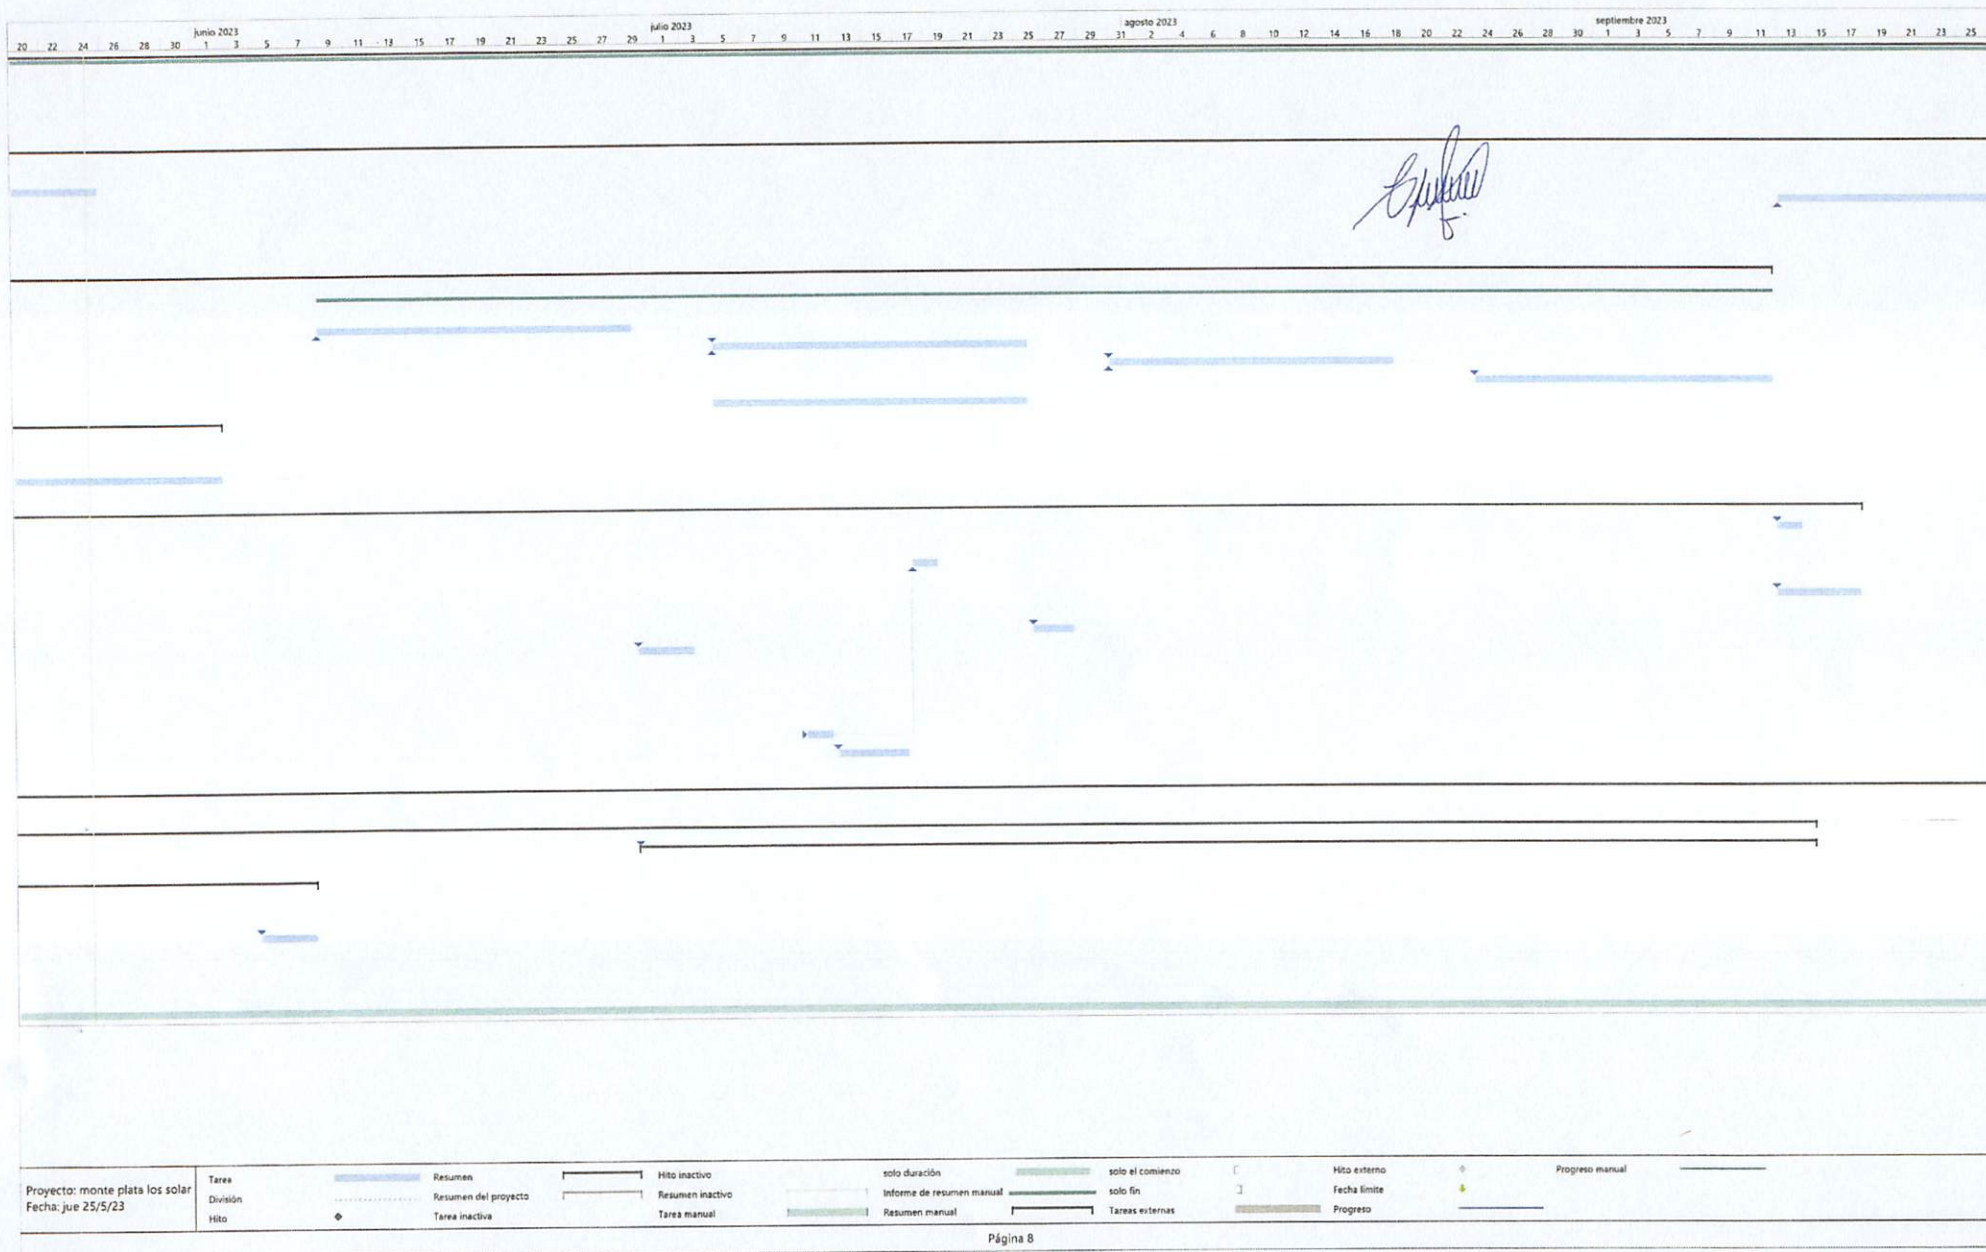

[Handwritten signature]

Proyecto: monte plata los solar	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
Fecha: jue 25/5/23	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
	Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	
1	OBRA DE TOMA Y ESTACION BOMBEO GUANUMA	1016.88 días	mar 16/11/21	jue 30/1/25	91%	
2	PRELIMINARES	620.63 días	mar 16/11/21	mié 8/11/23	100%	
36	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO	752.25 días	vie 23/9/22	jue 30/1/25	86%	
37	OBRA DE TOMA Y DIQUE	735.25 días	vie 23/9/22	lun 13/1/25	97%	
61	FIN DE OBRA TOMA Y DIQUE	0 días	lun 13/1/25	lun 13/1/25	0%	13/1
62	TOMA LATERAL Y CANAL DE CAPTACION	282.88 días	sáb 3/12/22	lun 30/10/23	100%	
70	FIN TOMA LATERAL Y CANAL DEL CAPTACION	0 días	vie 3/1/25	vie 3/1/25	0%	3/1
71	EDIFICACIONES	542.75 días	mar 30/5/23	jue 30/1/25	71%	
78	FIN EDIFICACIONES	0 días	jue 30/1/25	jue 30/1/25	0%	30/1
79	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO	457.05 días	mié 30/8/23	lun 27/1/25	51%	
86	FIN ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO	0 días	lun 27/1/25	lun 27/1/25	0%	27/1
87	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	30 días	mié 11/10/23	mié 29/1/25	27%	
88	FIN DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO	0 días	jue 30/1/25	jue 30/1/25	0%	30/1



Proyecto: Cronograma OT EB G Fecha: mar 28/11/23	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

