


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023												2024				2025				2026	
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1		Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I, No. SNIP14766 - Lote B - Red De Distribución Sector Partido.	416 días	lun 11/4/24	mar 3/3/26																							
2		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mié 11/2/22	mié 11/2/22																							
3		RED DE DISTRIBUCIÓN A	92 días	mié 11/2/22	jue 2/16/23																							
4		PRELIMINARES	2 días	mié 11/2/22	jue 11/3/22																							
5		Replanteo	2 días	mié 11/2/22	jue 11/3/22																							
6		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=5,039.52 M)	7 días	vie 11/4/22	vie 11/11/22																							
7		Corte de Asfalto e=2" (2 lados)	3 días	vie 11/4/22	lun 11/7/22	5																						
8		Remoción de carpeta Asfáltica	2 días	mar 11/8/22	mié 11/9/22	7																						
9		Bote material Asfáltico c/camión de botadero)	2 días	jue 11/10/22	vie 11/11/22	8																						
10		MOVIMIENTO DE TIERRA	12 días	sáb 11/12/22	vie 11/25/22																							
11		Excavación material compacto c/equipo	3 días	sáb 11/12/22	mar 11/15/22	9																						


Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen Inactivo	Tareas externas
	División		Tarea manual	Hito externo
	Hito		solo duración	Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual	Progreso manual
	Tarea Inactiva		solo el comienzo	
	Hito Inactivo		solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras			2023				2024				2025				2026	
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	
12	eq	Asiento de arena (Suministro y colocación)	1 día	mié 11/16/22	mié 11/16/22	11																
13	eq	Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	3 días	mié 11/16/22	vie 11/18/22	11																
14	eq	Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión)	1.5 días	sáb 11/19/22	lun 11/21/22	13																
15	eq	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	2.5 días	lun 11/21/22	mié 11/23/22	14																
16	eq	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)	2 días	jue 11/24/22	vie 11/25/22	15																
17	eq	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	10 días	vie 11/4/22	mar 11/15/22																	
18	eq	De Ø6 PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana	5 días	vie 11/4/22	mié 11/9/22	5																

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	5
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																
							T3	T4	2023				2024				2025				2026	
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1			
19	eq	De Ø4 PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana	5 días	vie 11/4/22	mié 11/9/22	5																
20	eq	De Ø3 PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana	5 días	jue 11/10/22	mar 11/15/22	19																
21	eq	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	31 días	jue 11/17/22	jue 12/22/22																	
22	eq	De Ø6 PVC (SDR-26) c/J. G.	7 días	jue 11/17/22	jue 11/24/22	12,18																
23	eq	De Ø4 ' PVC (SDR-26) c/J. G	14 días	vie 11/25/22	sáb 12/10/22	12,19,22																
24	eq	De Ø3 ' PVC (SDR-26) c/J. G	10 días	lun 12/12/22	jue 12/22/22	12,20,23																
25	eq	PRUEBA HIDROSTÁTICA	26 días	vie 11/25/22	sáb 12/24/22																	
26	eq	De Ø6 PVC (SDR-26) c/J. G.	1 día	vie 11/25/22	vie 11/25/22	22																
27	eq	De Ø4 PVC (SOR-26) c/J. G.	2 días	lun 12/12/22	mar 12/13/22	23,26																
28	eq	De Ø3 PVC (SOR-26) c/J. G.	2 días	vie 12/23/22	sáb 12/24/22	24,27																
29	eq	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	18 días	lun 12/12/22	sáb 12/31/22																	

Proyecto: cronograma - inapa
Fecha: lun 4/14/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023				2024				2025				2026			
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	
30	■	PVC SCH-40 (C/CEMENTO SOLVENTE TANGIT)	14 días	lun 12/12/22	mar 12/27/22				■													
31	■	Codo 3 x 45°	1 día	vie 12/23/22	vie 12/23/22	24			▼													
32	■	Codo 3 x 90°	2 días	sáb 12/24/22	lun 12/26/22	31			▼													
33	■	Codo 4 x 45°	1 día	lun 12/12/22	lun 12/12/22	23			▼													
34	■	Codo 4" x 90°	1 día	mar 12/13/22	mar 12/13/22	33			▼													
35	■	Tee 3" x 3"	1 día	mar 12/27/22	mar 12/27/22	32			▼													
36	■	Tee 4" x 4"	2 días	mié 12/14/22	jue 12/15/22	34			▼													
37	■	Reducción 4 x 3 PVC SCH-40	1 día	vie 12/16/22	vie 12/16/22	36			▼													
38	■	Anclaje de H. S. Fc = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño)	1 día	sáb 12/17/22	sáb 12/17/22	37			▼													
39	■	ACERO (c/protección anticorrosiva):	3 días	lun 12/19/22	mié 12/21/22				■													
40	■	Tee 6" x 3"	1 día	lun 12/19/22	lun 12/19/22	38			▼													
41	■	Junta tipo tapón de 3	1 día	mar 12/20/22	mar 12/20/22	40			▼													
42	■	Anclaje de H. A. Fc = 210 kg/cmm p/piezas (Según detalle de diseño)	1 día	mié 12/21/22	mié 12/21/22	41			▼													

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha limite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

ETDC

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023		2024				2025				2026		
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1		
43	eq	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	7 días	jue 12/22/22	jue 12/29/22														
44	eq	Válvula de Compuerta de Ø3 H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de gonna y junta dresser)	1 día	jue 12/22/22	jue 12/22/22	42													
45	eq	Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de gonna y junta dresser)	2 días	vie 12/23/22	sáb 12/24/22	44													

Proyector: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo	Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo
	Hito		solo duración		Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual
	Tarea inactiva		solo el comienzo		
	Hito inactivo		solo fin		

ETDC

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
							T3	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4
46	eq	Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser)	1 día	lun 12/26/22	lun 12/26/22	45												
47	eq	Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño)	3 días	mar 12/27/22	jue 12/29/22	46												
48	eq	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)	2 días	vie 12/30/22	sáb 12/31/22													

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

ETC

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023				2024				2025				2026	
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
49	A	De Ø4 en tubería de Ø4 Platillado, Completa (Incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta dresser, movimiento de tierra y anclaje)	2 días	vie 12/30/22	sáb 12/31/22	47														
50	A	CRUCES	9 días	lun 1/2/23	mié 1/11/23															
51	A	CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=16.00 M (1 UD)	9 días	lun 1/2/23	mié 1/11/23															
52	A	Replanteo	1 día	lun 1/2/23	lun 1/2/23	49														
53	A	Suministro de Tubería de Ø4" Acero SCH-40 (Incluye brazos)	1 día	mar 1/3/23	mar 1/3/23	52														
54	A	Suministro de Codo de Ø4" x 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	1 día	mié 1/4/23	mié 1/4/23	53														

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas
	División		Tarea manual		Hito externo
	Hito		solo duración		Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual
	Tarea inactiva		solo el comienzo		
	Hito inactivo		solo fin		

ETPC

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras			2023				2024				2025				2026			
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
55	ca	Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" 150 PSI	1 día	jue 1/5/23	jue 1/5/23	54																		
56	ca	Anclaje de H. A. Fc – 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño)	0.5 días	vie 1/6/23	vie 1/6/23	55																		
57	ca	Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación)	0.5 días	vie 1/6/23	vie 1/6/23	56																		
58	ca	Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación)	0.5 días	sáb 1/7/23	sáb 1/7/23	57																		
59	ca	Abrazadera (incluye pernos)	0.5 días	sáb 1/7/23	sáb 1/7/23	58																		
60	ca	Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)	3 días	lun 1/9/23	mié 1/11/23	59																		

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			


ETDC

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023		2024				2025				2026			
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
61	ES	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE Ø3" ACERO	8 días	mar 1/3/23	mié 1/11/23			■												
62	ES	Replanteo	1 día	mar 1/3/23	mar 1/3/23	52		▼												
63	ES	Suministro de Tuberia de Ø3" Acero SCH-40 (Incluye brazos)	1 día	mié 1/4/23	mié 1/4/23	62		▼												
64	ES	Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de GI3" 150 PSI	1 día	jue 1/5/23	jue 1/5/23	63		▼												
65	ES	Anclaje de H. A. Fc = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle dediseño)	0.5 días	vie 1/6/23	vie 1/6/23	64		▼												
66	ES	Excavación material compacto c/equipo	0.5 días	vie 1/6/23	vie 1/6/23	65		▼												
67	ES	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	0.5 días	sáb 1/7/23	sáb 1/7/23	66		▼												

ETX

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo	Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo
	Hito	◆	solo duración		Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual
	Tarea inactiva		solo el comienzo	☐	
	Hito inactivo		solo fin	☐	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023		2024				2025				2026								
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
68	eq	Bote de material in situ	0.5 días	sáb 1/7/23	sáb 1/7/23	67																			
69	eq	Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)	3 días	lun 1/9/23	mié 1/11/23	68																			
70	eq	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):	7 días	jue 1/12/23	jue 1/19/23																				
71	q	ACOMETIDAS URBANAS	7 días	jue 1/12/23	jue 1/19/23																				
72	q	De 03"	4 días	jue 1/12/23	lun 1/16/23	69																			
73	q	De 04"	3 días	mar 1/17/23	jue 1/19/23	72																			
74	q	DEMOLICIÓN DE:	3 días	vie 1/20/23	lun 1/23/23																				
75	q	Acera de 1.00 m	1 día	vie 1/20/23	vie 1/20/23	73																			
76	q	Contén	1 día	sáb 1/21/23	sáb 1/21/23	75																			
77	q	Bote de material demolido c/camión	1 día	lun 1/23/23	lun 1/23/23	76																			
78	q	REPOSICIÓN DE:	6 días	sáb 1/21/23	vie 1/27/23																				
79	q	Acera de 1.00 m	3 días	sáb 1/21/23	mar 1/24/23	75																			
80	q	Contén	3 días	mié 1/25/23	vie 1/27/23	79																			

Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas
	División		Tarea manual		Hito externo
	Hito		solo duración		Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual
	Tarea inactiva		solo el comienzo		
	Hito inactivo		solo fin		

ETDC

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023				2024				2025				2026			
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	
81	■	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	15 días	sáb 1/28/23	mar 2/14/23				■													
82	■	Imprimación sencilla	3 días	sáb 1/28/23	mar 1/31/23	80			■													
83	■	Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia)	8 días	mié 2/1/23	jue 2/9/23	82			■													
84	■	Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx.	4 días	vie 2/10/23	mar 2/14/23	83			■													
85	■	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO	5 días	vie 2/10/23	mié 2/15/23				■													
86	■	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolos	5 días	vie 2/10/23	mié 2/15/23	83			■													

Proyecto: cronograma - Inapa
Fecha: lun 4/14/25


Tarea		Resumen inactivo	Tareas externas
División		Tarea manual	Hito externo
Hito		solo duración	Fecha límite
Resumen		Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto		Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva		solo el comienzo	
Hito inactivo		solo fin	

ETX

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023				2024				2025				2026			
							T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	
87	□	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	90 días	vie 11/4/22	jue 2/16/23																	
88	□	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)	90 días	vie 11/4/22	jue 2/16/23	5																
89	□	VARIOS	91 días	mié 11/2/22	jue 2/16/23																	
90	+	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubas galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tuba cuadrado 4"X 4"	1 día	mié 11/2/22	mié 11/2/22																	
91	□	CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)	1 día	mié 11/2/22	mié 11/2/22																	
92	+	FIN DEL PROYECTO	0 días	jue 2/16/23	jue 2/16/23																	
Proyecto: cronograma - inapa Fecha: lun 4/14/25		Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas																
		División		Tarea manual		Hito externo																
		Hito	◆	solo duración		Fecha límite																
		Resumen		Informe de resumen manual		Progreso																
		Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual																
		Tarea inactiva		solo el comienzo																		
		Hito inactivo		solo fin																		
Página 12																						

[Handwritten signature]

ETX

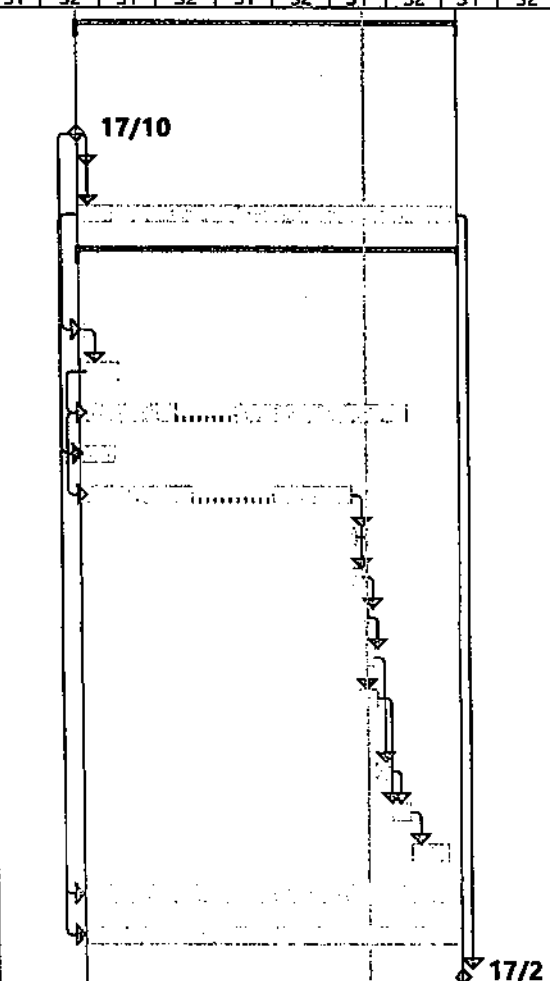Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022		2023		2024		2025		2026	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
2	INICIO	0 días	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
3	VALLAN ANUNCIANDO OBRA	1 día	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
4	CAMPAMENTO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
5	RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
6	PRELIMINAR	10 días	lun 24/10/22	vie 4/11/22										
7	CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	75 días	lun 7/11/22	vie 17/2/23										
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	600 días	lun 7/11/22	lun 25/8/25										
9	SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	lun 24/10/22	vie 3/2/23										
10	COLOCACION DE TUBERIA	420 días	lun 7/11/22	vie 28/2/25										
11	PRUEBA HIDROSTATICA	10 días	lun 3/3/25	vie 14/3/25										
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	25 días	lun 3/3/25	vie 4/4/25										
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	10 días	lun 7/4/25	vie 18/4/25										
14	CRUCES	15 días	lun 21/4/25	vie 9/5/25										
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO	45 días	lun 17/3/25	vie 16/5/25										
16	DEMOLICION DE ACERAS, CONTENES Y BOTE	35 días	lun 12/5/25	vie 27/6/25										
17	REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	45 días	lun 30/6/25	vie 29/8/25										
18	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	90 días	lun 1/9/25	jue 1/1/26										
19	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
20	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
21	FIN	0 días	mar 17/2/26	mar 17/2/26										

D/o Leonardo A. Astib

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022		2023		2024		2025		2026	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
2	INICIO	0 días	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
3	VALLAN ANUNCIANDO OBRA	1 día	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
4	CAMPAMENTO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
5	RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
6	PRELIMINAR	10 días	lun 24/10/22	vie 4/11/22										
7	CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	75 días	lun 7/11/22	vie 17/2/23										
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	600 días	lun 7/11/22	lun 25/8/25										
9	SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	lun 24/10/22	vie 3/2/23										
10	COLOCACION DE TUBERIA	420 días	lun 7/11/22	vie 28/2/25										
11	PRUEBA HIDROSTATICA	10 días	lun 3/3/25	vie 14/3/25										
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	25 días	lun 3/3/25	vie 4/4/25										
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	10 días	lun 7/4/25	vie 18/4/25										
14	CRUCES	15 días	lun 21/4/25	vie 9/5/25										
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO	45 días	lun 17/3/25	vie 16/5/25										
16	DEMOLICION DE ACERAS, CONTENES Y BOTE	35 días	lun 12/5/25	vie 27/6/25										
17	REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	45 días	lun 30/6/25	vie 29/8/25										
18	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	90 días	lun 1/9/25	jue 1/1/26										
19	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
20	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
21	FIN	0 días	mar 17/2/26	mar 17/2/26										

D.º Leonardo A. Astibero

Yanel J. Fernandez

CRONOGRAMA
Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

Mo Nombre de tarea de tarea	Duración	Costo	oct '24	nov '24	dic '24	ene '25	feb '25	mar '25	abr '25	may '25	jun '25	jul '25	ago '25	sep '25	oct '25	nov '25
1 PROYECTO LOTE H RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO - EQUILIBRIO ECONOMICO-ADICIONALES	249 días	\$18,725,772.23														
2 PRESUPUESTO CONTRATADO	249 días	\$9,043,303.75														
3 PRELIMINARES	52 días	\$49,312.03														
4 Replanteo	20 días	\$49,312.03														
5 CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=3,361.42 M)	57 días	\$437,215.66														
6 Corte de Asfalto e=2" (2 lados)	25 días	\$315,973.48														
7 Remoción de carpeta Asfáltica	40 días	\$90,596.88														
8 Bote material Asfáltico e/cam ón (incluye esparcimiento en lugar de botadero)	15 días	\$30,645.30														
9 MOVIMIENTO DE TIERRA	115 días	\$2,306,534.98														
10 Excavación material compacto e/equipo	70 días	\$374,134.64														
11 Asiento de arena (Suministro y colocación)	70 días	\$347,338.10														
12 Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	70 días	\$510,314.03														
13 Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión)	70 días	\$450,772.00														
14 Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	70 días	\$375,949.41														
15 Bote material sobrante (incluye esparcimiento en botadero)	70 días	\$248,026.80														
16 SUMINISTRO DE TUBERÍA:	10 días	\$2,022,682.55														
17 De 04" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por campana	3 días	\$442,145.34														
18 De 03" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por campana	4 días	\$1,580,537.21														
19 COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	103 días	\$96,177.07														
20 De 04" PVC (SDR-26) c/l. G.	32 días	\$15,981.07														
21 De 03" PVC (SDR-26) c/l. G.	65 días	\$80,196.00														
22 PRUEBA HIDROSTÁTICA	12 días	\$170,002.35														
23 De 04" PVC (SDR-26) c/l. G.	6 días	\$25,747.01														
24 De 03" PVC (SDR-26) c/l. G.	6 días	\$141,255.34														
25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	106 días	\$57,269.52														

Proyecto: PROYECTO LOTE H R	Tarea	Tarea activa	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
Fecha: vie 27/12/24	División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha Cierre	Resumen de línea base
	Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
	Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
	Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	

CRONOGRAMA


Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

Mo Nombre de tarea	Duración	Costo	oct '24	nov '24	dic '24	ene '25	feb '25	mar '25	abr '25	may '25	jun '25	jul '25	ago '25	sep '25	oct '25	nov '25
1. ACERO SCH-40 (e/protección anticorrosiva):	75 días	\$48,271.44														
2. Cruz 6" x 3"	6 días	\$3,561.33														
3. Reducción 6" a 4"	6 días	\$2,769.55														
4. Junta tipo tapón de 4"	6 días	\$7,381.28														
5. Junta Tipo tapón de 3"	6 días	\$7,603.85														
6. Junta mecánica tipo Dresser de 6" 150 PSI	6 días	\$17,641.96														
7. Junta mecánica tipo Dresser de 4" 150 PSI	6 días	\$1,702.54														
8. Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño)	6 días	\$7,610.93														
9. PVC SCH-40 (e/cemento solvente Tangit):	106 días	\$8,998.08														
10. Codo 3" x 45°	20 días	\$1,458.48														
11. Codo 4" x 45°	15 días	\$1,252.06														
12. Tee 3" x 3"	20 días	\$2,265.96														
13. Tee 4" x 4"	5 días	\$876.02														
14. Anclaje de H. A. F'c = 180 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño)	4 días	\$3,145.56														
15. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	71 días	\$168,508.32														
16. Válvula de Compuerta de 03" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, untas de goma y junta dresser)	4 días	\$66,576.88														
17. Válvula de Compuerta de 04" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, untas de goma y junta dresser)	4 días	\$79,971.28														
18. Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño)	4 días	\$21,960.16														
19. CRUCES:	9 días	\$63,589.53														
20. CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE 03" ACERO SCH-40 1=20.00 M (1 UD)	9 días	\$63,589.53														
21. Replanteo	1 día	\$600.00														
22. Suministro de Tubería de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos)	2 días	\$35,756.60														
23. Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 e/protección anticorrosiva	2 días	\$4,932.40														

Proyecto: PROYECTO LOTE H R Fecha: vie 27/12/24	Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Mito externo	Mito de línea base
	División	Mito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
	Mito	Resumen inactivo	solo al comienzo	Tareas críticas	Progreso
	Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
	Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	

CRONOGRAMA


Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

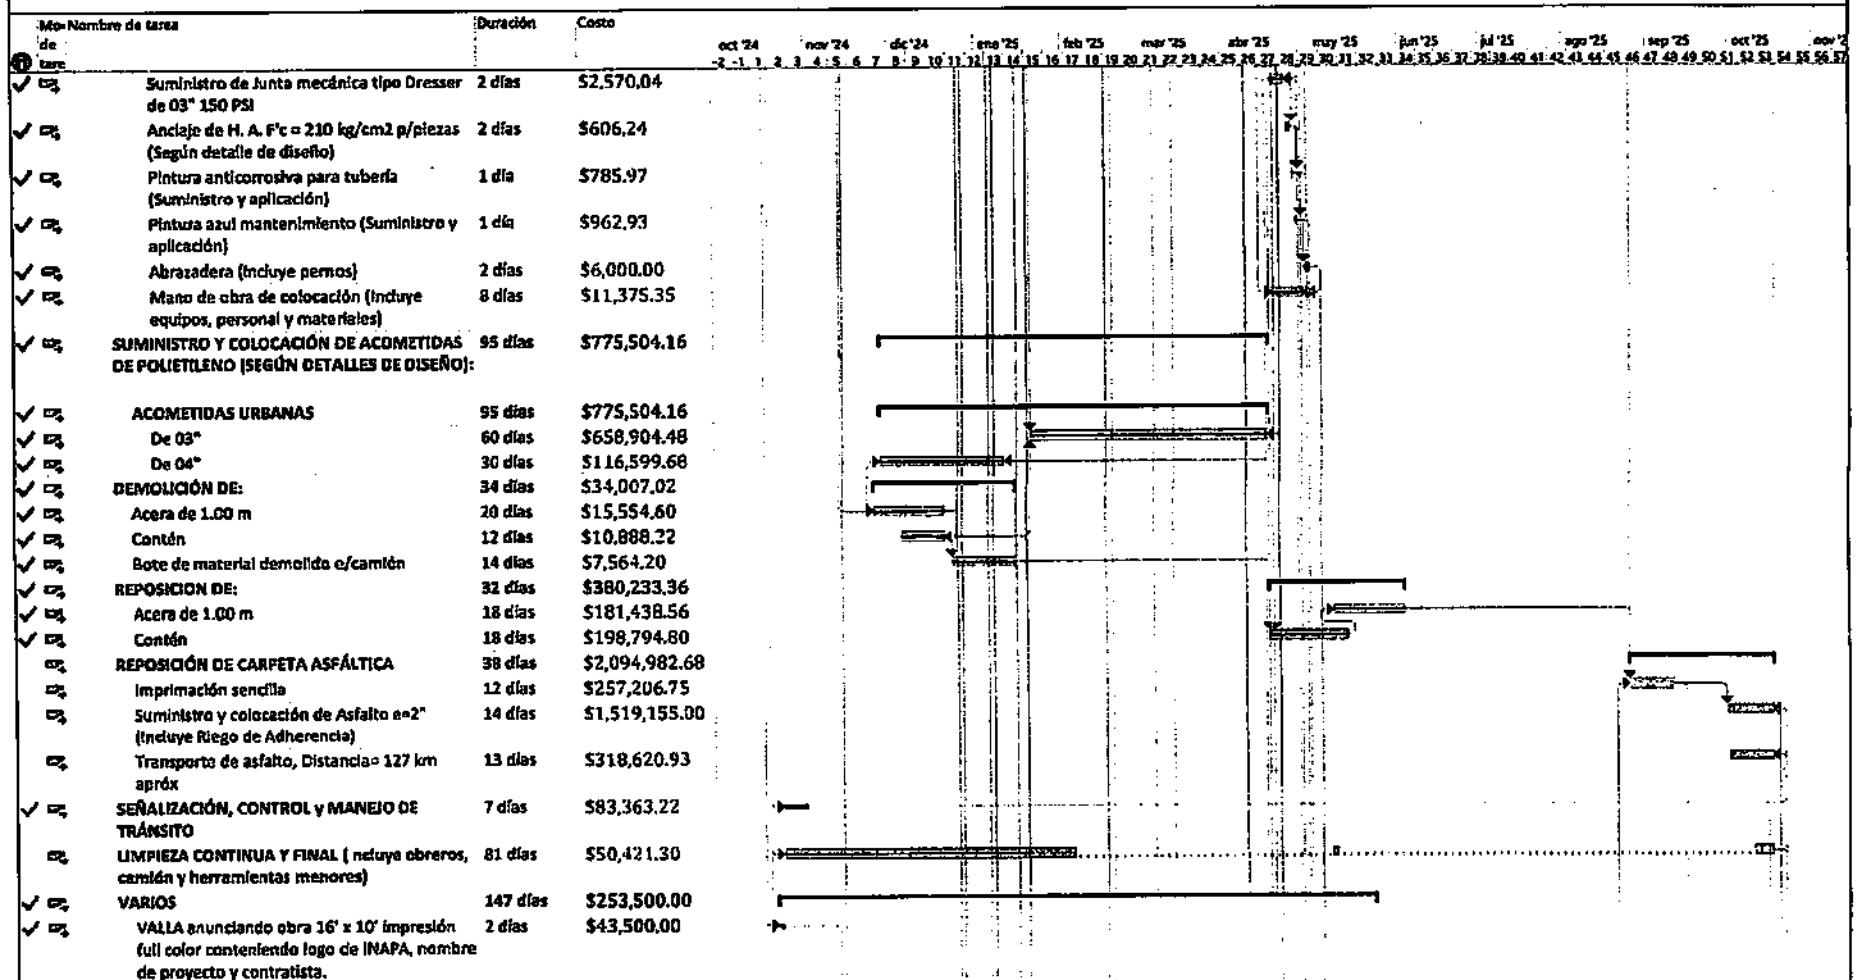

Proyecto: PROYECTO LOTE H R Fecha: vie 27/12/24	Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
	División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
	Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
	Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
	Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	

PROGRAMACION ADICIONALES ACUEDUCTO MULTIPLE LA GORRA PROVINCIA DAJABON

1 de 4

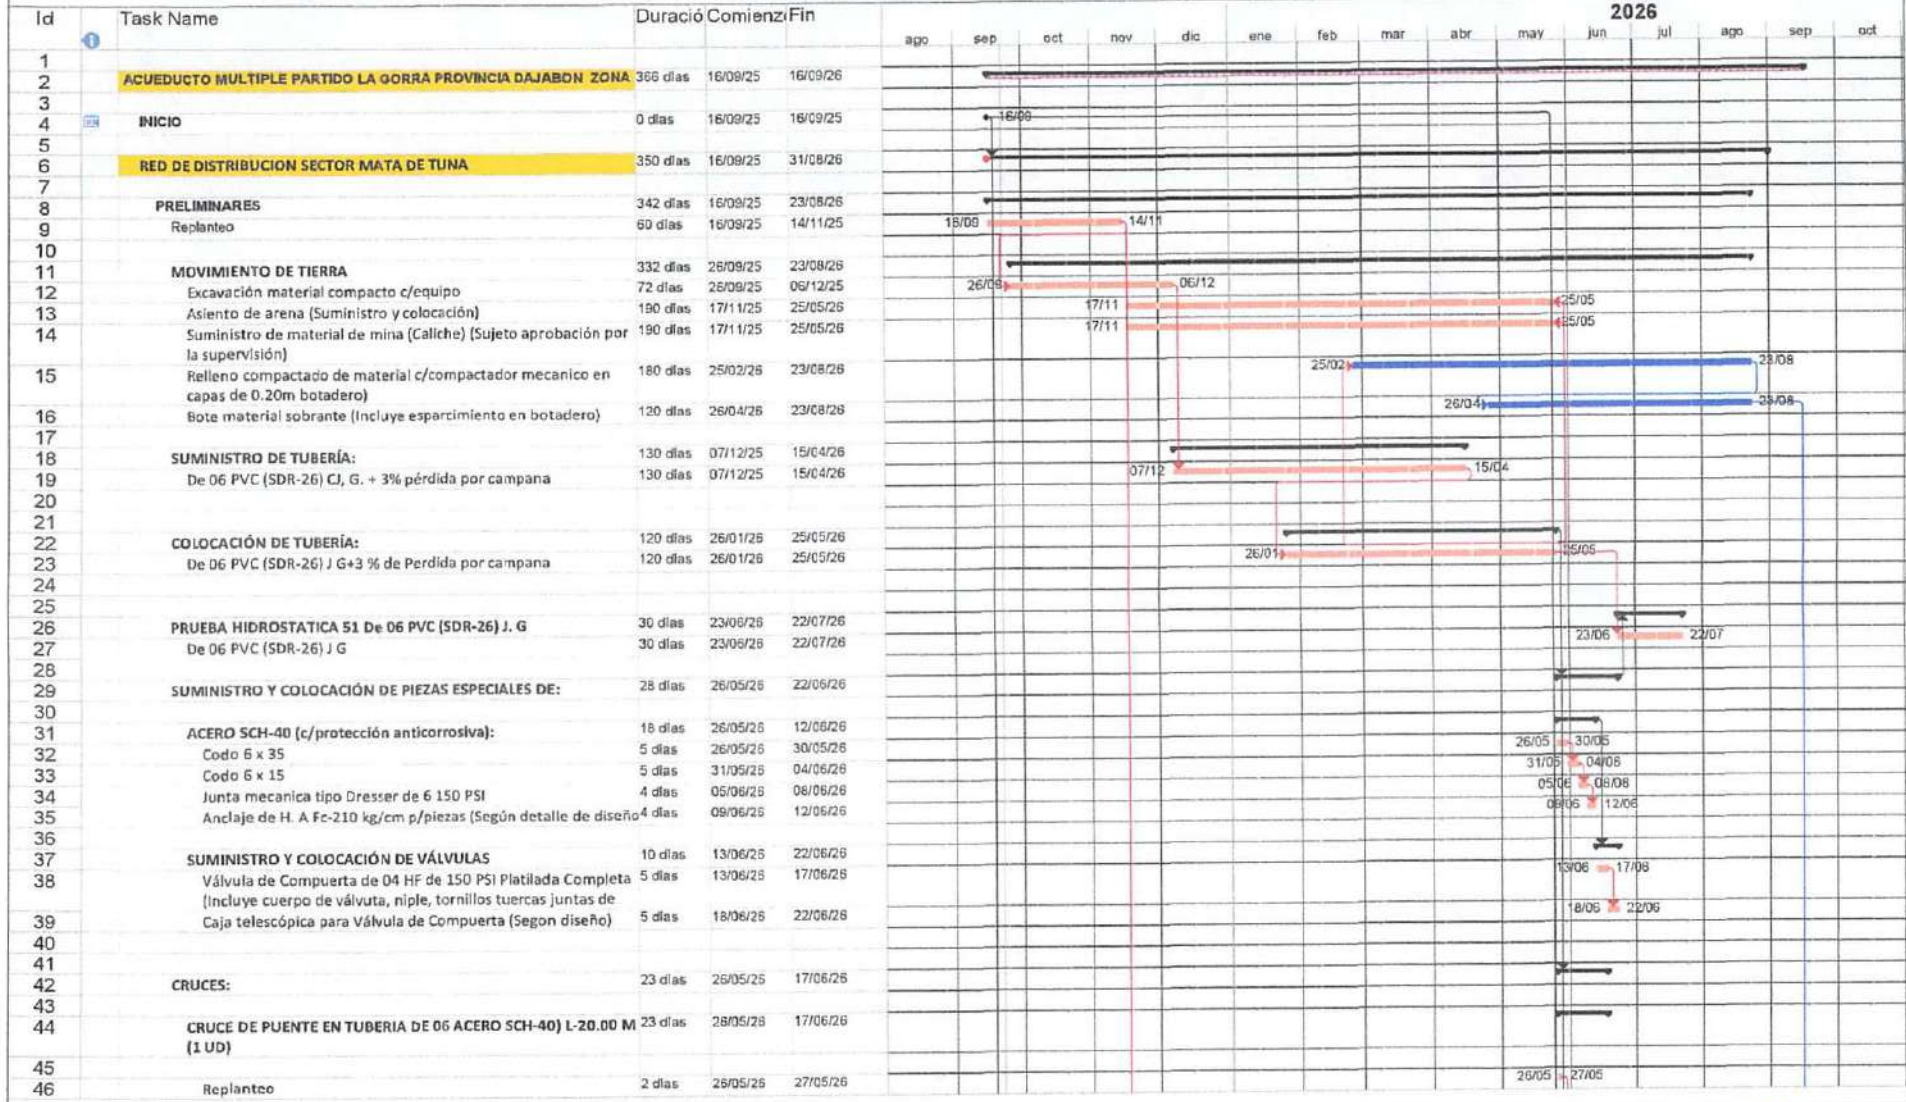


1 de 4

[Handwritten signature]



PROGRAMACION ADICIONALES ACUEDUCTO MULTIPLE LA GORRA PROVINCIA DAJABON

2 de 4

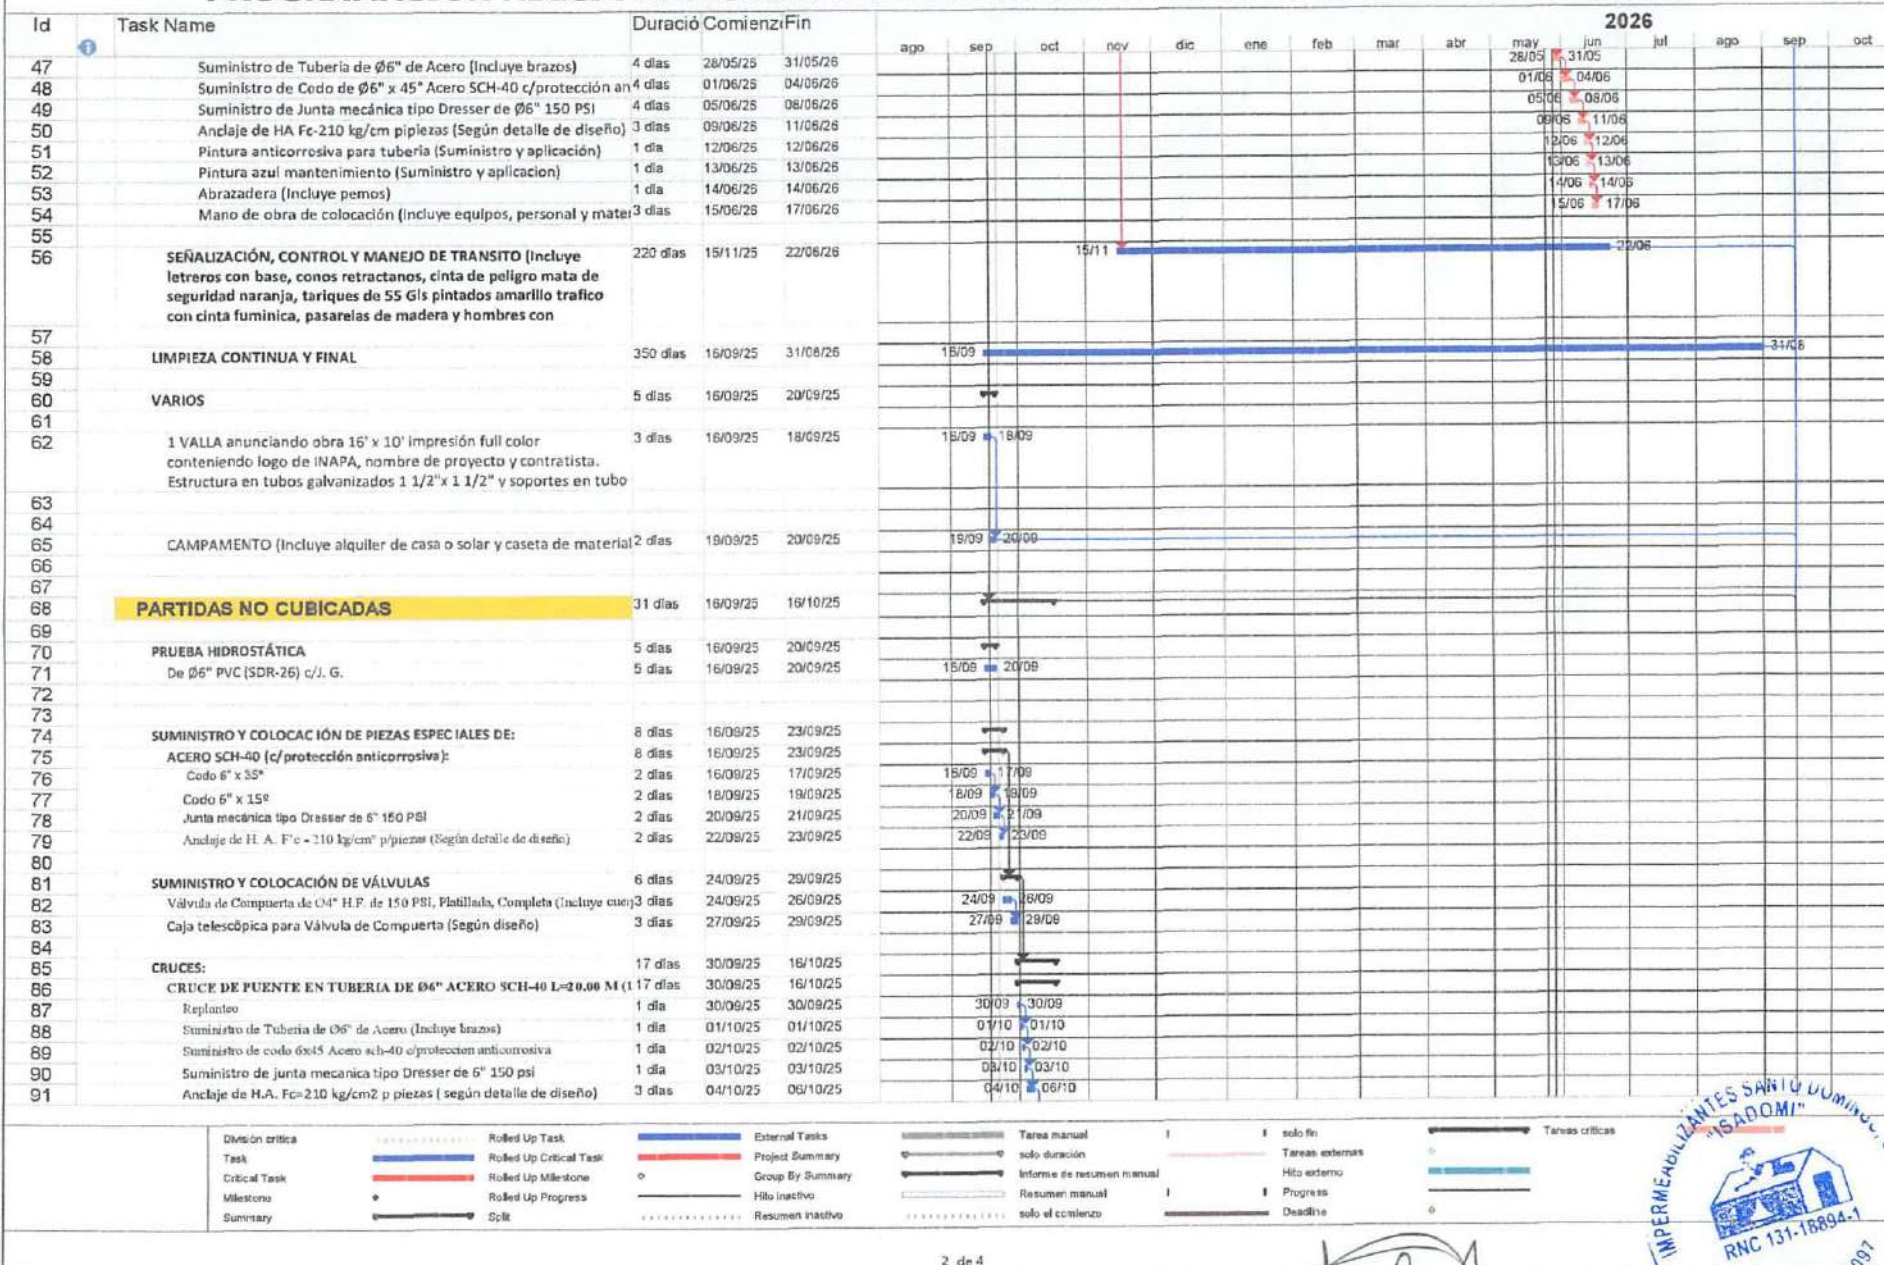

Handwritten signature



PROGRAMACION ADICIONALES ACUEDUCTO MULTIPLE LA GORRA PROVINCIA DAJABON

3 de 4

Id	Task Name	Duració	Comienzi	Fin	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
92	Pintura anticorrosiva para tuberías (suministro y colocación)	1 día	07/10/25	07/10/25			07/10												
93	Pintura azul mantenimiento (suministro y aplicación)	1 día	08/10/25	08/10/25			08/10												
94	Abrazadera (incluye Pernos)	1 día	09/10/25	09/10/25			09/10												
95	Mano de obra de colocación (incluye equipos, personal y material)	7 días	10/10/25	16/10/25			10/10												
96																			
97	PARTIDAS CUBICADAS	184 días	16/09/25	16/03/26															
98																			
99																			
100	PRELIMINARES	157 días	16/09/25	19/02/26															
101																			
102	MOVIMIENTO DE TIERRA	157 días	16/09/25	19/02/26															
103	Excavación material compacto c/equipo	60 días	16/09/25	14/11/25															
104	Asiento de arena (Suministro y colocación)	7 días	15/11/25	21/11/25															
105	Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	10 días	28/01/26	06/02/26															
106	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	8 días	07/02/26	14/02/26															
107	Botte material sobrante (Incluye esparramamiento en botadero)	5 días	15/02/26	19/02/26															
108																			
109	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	2 días	22/11/25	23/11/25															
110	De Ø6" PVC (SDR-26) c/l. G. + 3% pérdida por campona	2 días	22/11/25	23/11/25															
111	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	65 días	24/11/25	27/01/26															
112	De Ø6" PVC (SDR-26) c/l. G.	65 días	24/11/25	27/01/26															
113																			
114																			
115	SEÑALIZACIÓN CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye letreros con base conos refractorios, cinta de peligro, mallas de seguridad naranja, tanques de 55 galones pintados de amarillo trafico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola, cha	60 días	16/09/25	14/11/25															
116	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (incluye obreros camion y herramientas meno	50 días	28/01/26	18/03/26															
117																			
118	VARIOS	30 días	16/09/25	15/10/25															
119	VALLA anunciando obra 16x10 Impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista, estructura en tubos galvanizados 1 1/2x1 1/2 y soportes en tubo cuadrado 4x4	2 días	16/09/25	17/09/25															
120	CAMPAMENTO (incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)	30 días	16/09/25	15/10/25															
121																			
122																			
123																			
124																			
125																			
126																			
127	ADICIONALES	114 días	26/05/26	16/09/26															
128																			
129	REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR MATA DE TUNA	95 días	26/05/26	28/08/26															
130																			
131	PRELIMINARES	15 días	28/05/26	09/06/26															
132	Replanteo para tubería	15 días	28/05/26	09/06/26															
133																			
134																			
135	MOVIMIENTO DE TIERRA:	80 días	10/06/26	28/08/26															
136	Excavación material compacto de equipo	7 días	10/06/26	16/06/26															
137	Asiento de arena (suministro y colocación)	3 días	17/06/26	19/06/26															

División crítica	-----	Roll Up Task	-----	External Tasks	-----
Task	-----	Roll Up Critical Task	-----	Project Summary	-----
Critical Task	-----	Roll Up Milestone	-----	Group By Summary	-----
Milestone	-----	Roll Up Progress	-----	Hito inactivo	-----
Summary	-----	Split	-----	Resumen inactivo	-----

Tarea manual	-----	Informe de resumen manual	-----
solo duración	-----	Resumen manual	-----
Informe de resumen manual	-----	solo el comienzo	-----

solo fin	-----	Tareas críticas	-----
Tareas externas	-----	Hito externo	-----
Progress	-----	Deadline	-----



PROGRAMACION ADICIONALES ACUEDUCTO MULTIPLE LA GORRA PROVINCIA DAJABON

4 de 4

Id	Task Name	Duració	Comienz	Fin	2026											
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
138	Relleno compactado C/compactador mecánico en capas de 0.20 M)	5 días	22/08/26	26/08/26												
139	Bote de material con camión D=5 KM (incluye esparcimiento en botadero)	2 días	27/08/26	28/08/26												
140																
141	SEÑALIZACIÓN, CONTROL y manejo del tránsito (Incluye: letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gal pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chaleco	15 días	26/05/26	09/06/26												
142	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)	5 días	26/05/26	30/05/26												
143																
144	VARIOS:	2 días	26/05/26	27/05/26												
145	Campamento (alquilar de casa con o sin solar y caseta para materiales)	2 días	26/05/26	27/05/26												
146																
147	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	3 días	20/06/26	22/06/26												
148	De 3" PVC SDR-26 C/J.G. + 2% por pérdida de campana	3 días	20/06/26	22/06/26												
149																
150	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	60 días	23/06/26	21/08/26												
151	De 3" PVC SDR-26 C/J.G.	60 días	23/06/26	21/08/26												
152																
153	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS:	3 días	22/08/26	24/08/26												
154	De 3" PVC-SDR-26 C/J.G.	3 días	22/08/26	24/08/26												
155																
156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PVC Y ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	8 días	25/08/26	01/09/26												
157	Codo 3"x 90° PVC SCH-40	2 días	25/08/26	26/08/26												
158	Codo 3"x 45° PVC SCH-40	2 días	27/08/26	28/08/26												
159	Junta mecánica tipo dresser 3" (160 PSI)	3 días	29/08/26	31/08/26												
160	Tapón 3" PVC SCH-40	1 día	01/09/26	01/09/26												
161																
162																
163																
164	ACOMETIDAS:	15 días	02/09/26	16/09/26												
165	Suministro y colocación de acometidas rurales en polietileno, según detalle incluye base hormigon armado para llave de chorro	15 días	02/09/26	16/09/26												
166																
167																
168																
169	CORRECCIONES DE AVERIAS	13 días	23/06/26	05/07/26												
170																
171	Suministro de tuberías	4 días	23/06/26	26/06/26												
172	Tubería 3 pulgadas pvc sdr-26 c/j/g	1 día	23/06/26	23/06/26												
173	Tubería de 1 pvc sch-40	1 día	24/06/26	24/06/26												
174	tubería 3/4 pvc sch-40	1 día	25/06/26	25/06/26												
175	Tubería 1/2 pvc sch-40	1 día	26/06/26	26/06/26												
176	colocacion de piezas especiales	4 días	23/06/26	26/06/26												
177																
178																
179																
180	Colocacion de tuberías	9 días	27/06/26	05/07/26												
181	Tubería 3 pulgadas pvc sdr-21 c/j/g	3 días	27/06/26	29/06/26												
182	Tubería de 1 pvc sch-40	2 días	30/06/26	01/07/26												
183	tubería 3/4 pvc sch-40	2 días	02/07/26	03/07/26												
184	Tubería 1/2 pvc sch-40	1 día	04/07/26	04/07/26												

División crítica	-----	Roll Up Task	-----	External Tasks	-----	Tarea manual	-----	solo fin	-----	Tareas críticas	-----
Task	-----	Roll Up Critical Task	-----	Project Summary	-----	solo duración	-----	Tareas externas	-----	-----	-----
Critical Task	-----	Roll Up Milestone	-----	Group By Summary	-----	Informe de resumen manual	-----	Hito externo	-----	-----	-----
Milestone	-----	Roll Up Progress	-----	Hito inactivo	-----	Resumen manual	-----	Progress	-----	-----	-----
Summary	-----	Split	-----	Resumen inactivo	-----	solo el comienzo	-----	Deadline	-----	-----	-----

Handwritten signature



PROGRAMACION ADICIONALES ACUEDUCTO MULTIPLE LA GORRA PROVINCIA DAJABON

5 de 4

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2026											
					ago	sep	oct	nov	dici	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
185																
186	Conexión de tuberías	1 día	05/07/25	05/07/25											05/07	05/07
187																
188	Suministro de tuberías Departamento de Operaciones	1 día	27/06/25	27/06/25												
189	Suministro de tuberías de 6 pulgadas x 19 pies pvc sdr-26 con y/g	1 día	27/06/25	27/06/25											27/06	27/06
190																
191																
192																
193	FIN DEL PROYECTO	0 días	16/09/25	16/09/25												16/09



División crítica		Rolled Up Task		External Tasks		Tarea manual		solo fin		Tareas críticas	
Task		Rolled Up Critical Task		Project Summary		solo duración		Tareas externas			
Critical Task		Rolled Up Milestone		Group By Summary		Informe de resumen manual		Hito externo			
Milestone		Rolled Up Progress		Hito inactivo		Resumen manual		Progress			
Summary		Split		Resumen inactivo		solo el comienzo		Deadline			

[Handwritten signature]

**PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-
Red De Distribucion Sector Los Babosos.**

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022

resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/2022

	Descripción	MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
A	RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS																																				
1.-	PRELIMINAR																																				
1.1.-	Replanteo																																				
2.-	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. 2,047.74M)																																				
2.1.-	Corte de Asfalto e=2" (2 lados)																																				
2.2.-	Remoción de carpeta Asfáltica																																				
2.3.-	Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero)																																				
3.-	MOVIMIENTO DE TIERRA																																				
3.1.-	Excavación material compacto c/equipo																																				
3.2.-	Asiento de arena (Suministro y colocación)																																				
3.3.-	Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión)																																				
3.4.-	Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la supervisión)																																				
3.5.-	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
3.6.-	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)																																				
4.-	SUMINISTRO DE TUBERÍA:																																				
4.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. * 2% pérdida por campana																																				
5.-	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:																																				
5.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
6.-	PRUEBA HIDROSTÁTICA																																				
6.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
7.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:																																				
7.1.-	PVC SCH-40 (c/memento solvente Tangit):																																				
7.1.1	Codo 3" x 45°																																				
7.1.2.-	Tee 3" x 3"																																				
7.1.3.-	Tee 4" x 4"																																				
7.1.4.	Reducción Ø4" a Ø3"																																				
7.1.5	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (según detalle de																																				
7.2.-	ACERO (c/protección anticorrosiva):																																				
7.2.1	Junta tapón de 3"																																				
7.2.2	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de																																				
8.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN , DETALLES DE DISEÑO)																																				
8.1.-	Hidrante de Ø3" platillado, en tubería de Ø3" (Incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta dresser, movimiento de tierra y anclaje)																																				

**PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-
Red De Distribucion Sector Los Babosos.**

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022

resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/2022

	Descripción	MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
9.-	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE @4" ACERO SCH-40 L=4.00 M (1 UD)																																				
9.1	Replanteo																																				
9.2	Suministro de Tubería de 04" Acero SCH-40 (Incluye brazos)																																				
9.3	Suministro de Codo de 04" x 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva																																				
9.4	Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de B4" 150 PSI																																				
9.5	Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño)																																				
9.6	Excavación material compacto c/equipo																																				
9.7	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
9.8	Bote de material in situ																																				
9.9	Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)																																				
10.-	10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)																																				
10.1	ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES																																				
10.2	Acometidas Urbanas de 03" (8 ud)																																				
10.3	Acometidas Rurales de 03" (34 ud)																																				
10.2	DEMOLICIÓN DE:																																				
10.2.1	Acera de 1.00 m																																				
10.2.2	Contén																																				
10.2.3	Bote de material demolido c/camión																																				
10.3	REPOSICIÓN DE:																																				
10.3.1	Acera de 1.00 m																																				
10.3.2	Contén																																				
11.-	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA																																				
11.1	Imprimación sencilla																																				
11.2	Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia)																																				
11.3	Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx.																																				
12.-	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO																																				
	Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chachefos y cascos de seguridad)																																				
13.-	Limpieza continua y final (Incluye obreros, camión y herramientas menores)																																				
2	VARIOS																																				
1	VALLA anunciando obra 16" x 10" impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"																																				
2	CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)																																				

**PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-
Red De Distribucion Sector Los Babosos.**

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022

resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/202

	Descripción	MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO																																				
	Presupuesto EE (Partidas NO Cubicadas)																																				
A	RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS																																				
3.-	MOVIMIENTO DE TIERRA																																				
3.1.-	Excavación material compacto c/equipo																																				
3.2.-	Asiento de arena (Suministro y colocación)																																				
3.3.-	Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión)																																				
3.5.-	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
3.6.-	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)																																				
5.-	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:																																				
5.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
9.-	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE @4" ACERO SCH-40 L=4.00 M (1 UD)																																				
9.1	Replanteo																																				
9.6	Excavación material compacto c/equipo																																				
9.7	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
9.8	Bote de material in situ																																				
9.9	Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)																																				
	Presupuesto EE (Partidas Cubicadas)																																				
3.-	MOVIMIENTO DE TIERRA																																				
3.1.-	Excavación material compacto c/equipo																																				
3.2.-	Asiento de arena (Suministro y colocación)																																				
3.3.-	Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión)																																				
3.5.-	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
3.6.-	Bole material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)																																				
5.-	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:																																				
5.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
7.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:																																				
7.1.-	PVC SCH-40 (c/memento solvente Tangit):																																				
7.1.1	Codo 3" x 45°																																				
7.1.2.-	Tee 3" x 3"																																				
7.1.3.-	Tee 4" x 4"																																				
7.1.4.	Reducción Ø4" a Ø3"																																				
7.2.-	ACERO (c/protección anticorrosiva):																																				
7.2.1	Junta tapón de 3"																																				

**PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-
Red De Distribucion Sector Los Babosos.**

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022

resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/2022

	Descripción	MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
10.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)																																				
10.1	ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES																																				
10.2	Acometidas Urbanas de Ø3" (8 ud)																																				
12.-	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO Incluye: Letreros con base ,Conos Retractivos, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas , charchafes y cascos de seguridad)																																				
13.-	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)																																				
Z	VARIOS																																				
1	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"																																				
	AUMENTO DE CANTIDAD (A.C.)																																				
A	RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS																																				
3.-	MOVIMIENTO DE TIERRA																																				
3.1.-	Excavación material compacto c/equipo																																				
3.2.-	Asiento de arena (Suministro y colocación)																																				
3.3.-	Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la supervisión)																																				
3.5.-	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
3.6.-	Bole material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)																																				
5.-	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:																																				
5.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
9.-	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE @4" ACERO SCH-40 L=4.00 M (1 UD)																																				
9.1	Replanteo																																				
9.6	Excavación material compacto c/equipo																																				
9.7	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																				
9.8	Bote de material in situ																																				
9.9	Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)																																				
Z	VARIOS																																				
2	CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)																																				

PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido -La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-Red De Distribucion Sector Los Babosos.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Inq. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022

resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/202

Descripción		MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
B	NUEVAS PARTIDAS (N.P.)																																				
	RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS																																				
	1.- CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE @3" ACERO SCH-40 L= 6.20 M (1 UD)																																				
	1.1 Replanteo																																				
	1.2 Suministro de Tubería de 04" Acero SCH-40 (Incluye brazos) 3.5 Tubos																																				
	1.3 Suministro de Codo de 04" x 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva																																				
	1.4 Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de B4" 150 PSI																																				
	1.5 Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño)																																				
	1.6 Valvula de aire Hierro fundido 150 PSI Roscada Z-Tide de Ø1" (Completa)																																				
	1.7 Camisa Ø8" Acero protección de Valvula																																				
1.8 Angular L2" x 2" x 20" (Soporte al Cabezal de H.A.)																																					
1.9 Planchuela 2" x 3/16" x 20" (Soporte al Cabezal de H.A.)																																					
1.10' Expansiones Tipo Hilty (Anclje a H.A.)																																					
2.11 Movimiento de Tierra																																					
2.11.1 Excavación material compacto c/equipo																																					
2.11.2 Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																					
2.11.3 Bote de material in situ																																					
2.11.4 Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)																																					
2	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE @3" ACERO SCH-40 L= 3.50 M (1 UD)																																				
	2.1 Replanteo																																				
	2.2 Suministro de Tubería de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos) 3.5 Tubos																																				
	2.3 Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva																																				
	2.4 Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de 3" 150 PSI																																				
	2.5 Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño)																																				
	2.6 Valvula de aire Hierro fundido 150 PSI Roscada Z-Tide de Ø1" (Completa)																																				
	2.7 Camisa Ø8" Acero protección de Valvula																																				
	2.8 Angular L2" x 2" x 20" (Soporte al Cabezal de H.A.)																																				
	2.9 Planchuela 2" x 3/16" x 20" (Soporte al Cabezal de H.A.)																																				
2.10' Expansiones Tipo Hilty (Anclje a H.A.)																																					
2.11 Movimiento de Tierra																																					
2.11.1 Excavación material compacto c/equipo																																					
2.11.2 Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m																																					
2.11.3 Bote de material in situ																																					
2.11.4 Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)																																					
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)																																				
	3.1 Acometidas Urbanas de 03" x 1/2" Longitud de 9.00 m																																				
	3.2 Acometidas Urbanas de 03" x 1/2" Longitud de 5.00 m																																				
	3.3 Acometidas Urbanas de 03" x 1/2" Longitud de 3.500 m																																				

**PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-
Red De Distribucion Sector Los Babosos.**

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022

resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/202

	Descripción	MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
C	COLOCACION TUBERIA DE Ø3" EN AMINILLA																																				
1.-	PRELIMINAR																																				
1.1.-	Replanteo																																				
2	PRUEBA HIDROSTÁTICA																																				
2.1	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:																																				
3.1	PVC SCH-40 (c/memento solvente Tangit):																																				
3.2	Codo 3" x 45°																																				
3.3	Tee 3" x 3"																																				
3.4	Tee 4" x 4"																																				
3.5	Reducción Ø4" a Ø3"																																				
3.6	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (según detalle de																																				
3.7	ACERO (c/protección anticorrosiva):																																				
3.7.1	Junta tapón de 3"																																				
3.7.2	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de																																				
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS (SEGUN DETALLES DE																																				
4.1	Disfraz																																				
4.1	Acometidas Urbanas de Ø3" Longitud Manguera de 3.00 prom																																				
5	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO																																				
5.1	Incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chacheos y cascos de seguridad)																																				
6	Limpieza continua y final (Incluye obreros, camión y herramientas menores)																																				
D	COLOCACION TUBERIA DE Ø3" EN DOÑA PURA - LA GORRA																																				
1.-	PRELIMINAR																																				
1.1.-	Replanteo																																				
2	PRUEBA HIDROSTÁTICA																																				
6.1.-	De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.																																				
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:																																				
3.1	PVC SCH-40 (c/memento solvente Tangit):																																				
3.2	Codo 3" x 45°																																				
3.3	Tee 3" x 3"																																				
3.4	Reducción Ø4" a Ø3"																																				
3.5	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (según detalle de																																				
3.7	ACERO (c/protección anticorrosiva):																																				
3.7.1	Junta tapón de 3"																																				
3.7.1	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de																																				

**PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L-
Red De Distribucion Sector Los Babosos.**


CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis Tejeda

Contrato No. 107/2022


resupuesto Actualizado No.2 d/f Marzo/202

	Descripción	MES - 1				MES - 2				MES - 3				MES - 4				MES - 5				MES - 6				MES - 7				MES - 8				MES - 9			
		oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
9.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)																																				
9.1	Acometidas Urbanas de 03" Longitud Manguera de 3.00 prom																																				
10.-	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO																																				
10.1	incluye: Letreros con base ,Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 Gl pintados amarillo trafico con cinta luminica, Pasarelas de Madera y hombres con banderolas, chachefos y cascos de seguridad)																																				
11.-	Limpieza continua y final (Incluye obreros, camión y herramientas menores)																																				
E	SUMINISTRO DE TUBERÍA:																																				
1	Suministro de tubería de Ø8" PVC (SDR-26) c/J. G. * 2% pérdida por campana																																				


Ing. Maritza Adonis Tejeda
Contratista

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA

Nº	Nombre de ítem	Número	Texto	Duración	Comienzo	Fin	M 1, 2023	M 2, 2023	M 3, 2023	M 4, 2023	M 5, 2023	M 6, 2023	M 7, 2023	M 8, 2023	M 9, 2023	M 10, 2023	M 11, 2023	M 12, 2023
1	Ampliación Acueducto Múltiple Perdo - La Goma, Provincia Bolívar.	0	365 días	dom 10/11/24	jun 10/11/25													
2	UNICIÓN	0	0 días	dom 10/11/24	dom 10/11/24													
3	RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LA GORRA, Provincia Bolívar.	0	310 días	dom 10/11/24	mar 10/11/25													
4	PRELIMINAR	0	300 días	mar 10/11/24	mar 10/11/25													
5	RED DE DISTRIBUCIÓN	0	310 días	dom 10/11/24	jun 10/11/25													
6	CORTE, EXTINCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. 2.25M)	0	300 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
7	Corte de Asfalto 2" (2 botes)	1100.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
8	Reparación de carpeta Asfáltica	1400.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
9	Reparación de Asfalto (Reparación superficial en lugar de botes)	10.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
10	MOVIMIENTO DE TIERRA	0	200 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
11	Extinción material compacto de bote	1000.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
12	Atalaya de arena (Superficie y extinción)	1000.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
13	Superficie de material de bote (según a aprobación por la supervisión)	1000.00 M	31 días	vie 9/5/25	jun 9/5/25													
14	Superficie de material de bote (según a aprobación por la supervisión)	1000.00 M	72 días	dom 30/3/25	mar 10/11/25													
15	Pavimento compactado de material compactado existente en capas de 0.25m	1000.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
16	Reparación superficial (Reparación superficial en botes)	1000.00 M	202 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
17	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	0	30 días	dom 10/11/24	mar 10/11/25													
18	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0. + 2% pérdida por compresión	1000.00 M	15 días	mar 10/11/24	jun 9/11/24													
19	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0. + 2% pérdida por compresión	1000.00 M	20 días	dom 10/11/24	abr 30/11/24													
20	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0. + 2% pérdida por compresión	1000.00 M	30 días	dom 10/11/24	may 10/11/24													
21	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	0	100 días	mar 10/11/24	jun 10/11/25													
22	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0.	1000.00 M	20 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
23	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0.	1000.00 M	20 días	abr 10/4/25	jun 10/11/25													
24	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0.	1000.00 M	110 días	mar 10/11/24	dom 30/3/25													
25	PUBERÍA HIDROSTÁTICA	0	72 días	dom 30/3/25	mar 10/11/25													
26	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0.	1000.00 M	40 días	abr 10/4/25	jun 20/5/25													
27	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0.	1000.00 M	22 días	jun 10/11/25	mar 10/11/25													
28	De 4" PVC (SDR-35) c/c. 0.	1000.00 M	40 días	dom 30/3/25	vie 9/5/25													
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	0	120 días	mar 10/11/24	abr 10/4/25													
30	PVC SCH-40 (columbina solvente Tangle):	0	100 días	mar 10/11/24	jun 20/5/25													
31	Codo 90°	1 Ud	100 días	mar 10/11/24	jun 20/5/25													
32	Tee 90°	1 Ud	100 días	mar 10/11/24	jun 20/5/25													
33	Reducción 4" a 3"	1 Ud	100 días	mar 10/11/24	jun 20/5/25													
34	Anchete de H. S. FC = 100 kg/cm² p/planos (según detalle de diseño)	0.25 M3	100 días	mar 10/11/24	jun 20/5/25													
35	ACERO (aprobación antiorrosión):	0	110 días	jun 20/5/25	abr 10/4/25													
36	Codo 90°	1 Ud	10 días	jun 20/5/25	jun 20/5/25													
37	Codo 90°	1 Ud	10 días	jun 20/5/25	abr 10/4/25													
38	Codo 90°	1 Ud	10 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
39	Codo 90°	1 Ud	10 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
40	Codo 90°	1 Ud	10 días	abr 10/4/25	jun 10/11/25													
41	Codo 90°	1 Ud	10 días	abr 10/4/25	abr 10/4/25													
42	Reducción 90°	1 Ud	10 días	jun 20/5/25	dom 10/11/25													
43	Junta de bote de 2"	1 Ud	10 días	jun 20/5/25	abr 10/4/25													
44	Junta de bote de 2" Dresser 3" 100 PSI	20 Ud	30 días	jun 20/5/25	abr 10/4/25													
45	Junta de bote de 2" Dresser 3" 100 PSI	12 Ud	20 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
46	Anchete de H. S. FC = 100 kg/cm² p/planos (según detalle de diseño)	0.25 M3	80 días	jun 20/5/25	dom 30/3/25													
47	Anchete H.A. FC=110 kg/cm² para placas (según detalle de diseño)	0.68 M3	70 días	abr 10/4/25	abr 10/4/25													
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	0	20 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
49	Válvula de Compuerta de 40" H.P. de 100 PSI. (Completa)	3 Ud	20 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
50	Caja telescópica para Válvula de Compuerta (según detalle de diseño)	3 Ud	20 días	dom 30/3/25	abr 10/4/25													
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO)	0	30 días	abr 10/4/25	jun 10/11/25													
52	Hidrante de 2" estándar, en tubería de 3"	1 Ud	30 días	abr 10/4/25	jun 10/11/25													
53	CRUCES:	0	120 días	jun 20/5/25	vie 9/5/25													

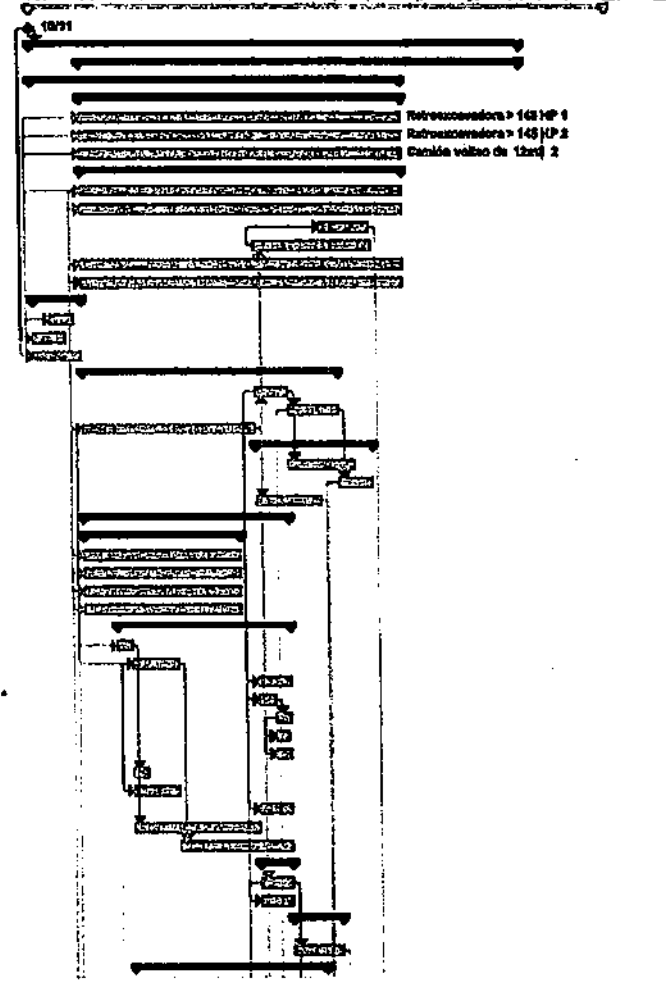

Project: Ampliación Acueducto Múltiple

Date: má 14/5/25

División crítica

Task

Critical Task

Milestone

Summary

Roll Up Task

Roll Up Critical Task

Roll Up Milestone

Roll Up Progress

Split

External Task

Project Summary

Group By Summary

Task Inactive

Task Inactive

File Inactive

Resumen Inactivo

Yana manual

Solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Solo al comienzo

Solo fin

Progress

Deadline


Tareas críticas

Resumen Inactivo

Contratista

IGNACIO BOLIVAR RUIZ

PROGRAMA DE TRABAJO

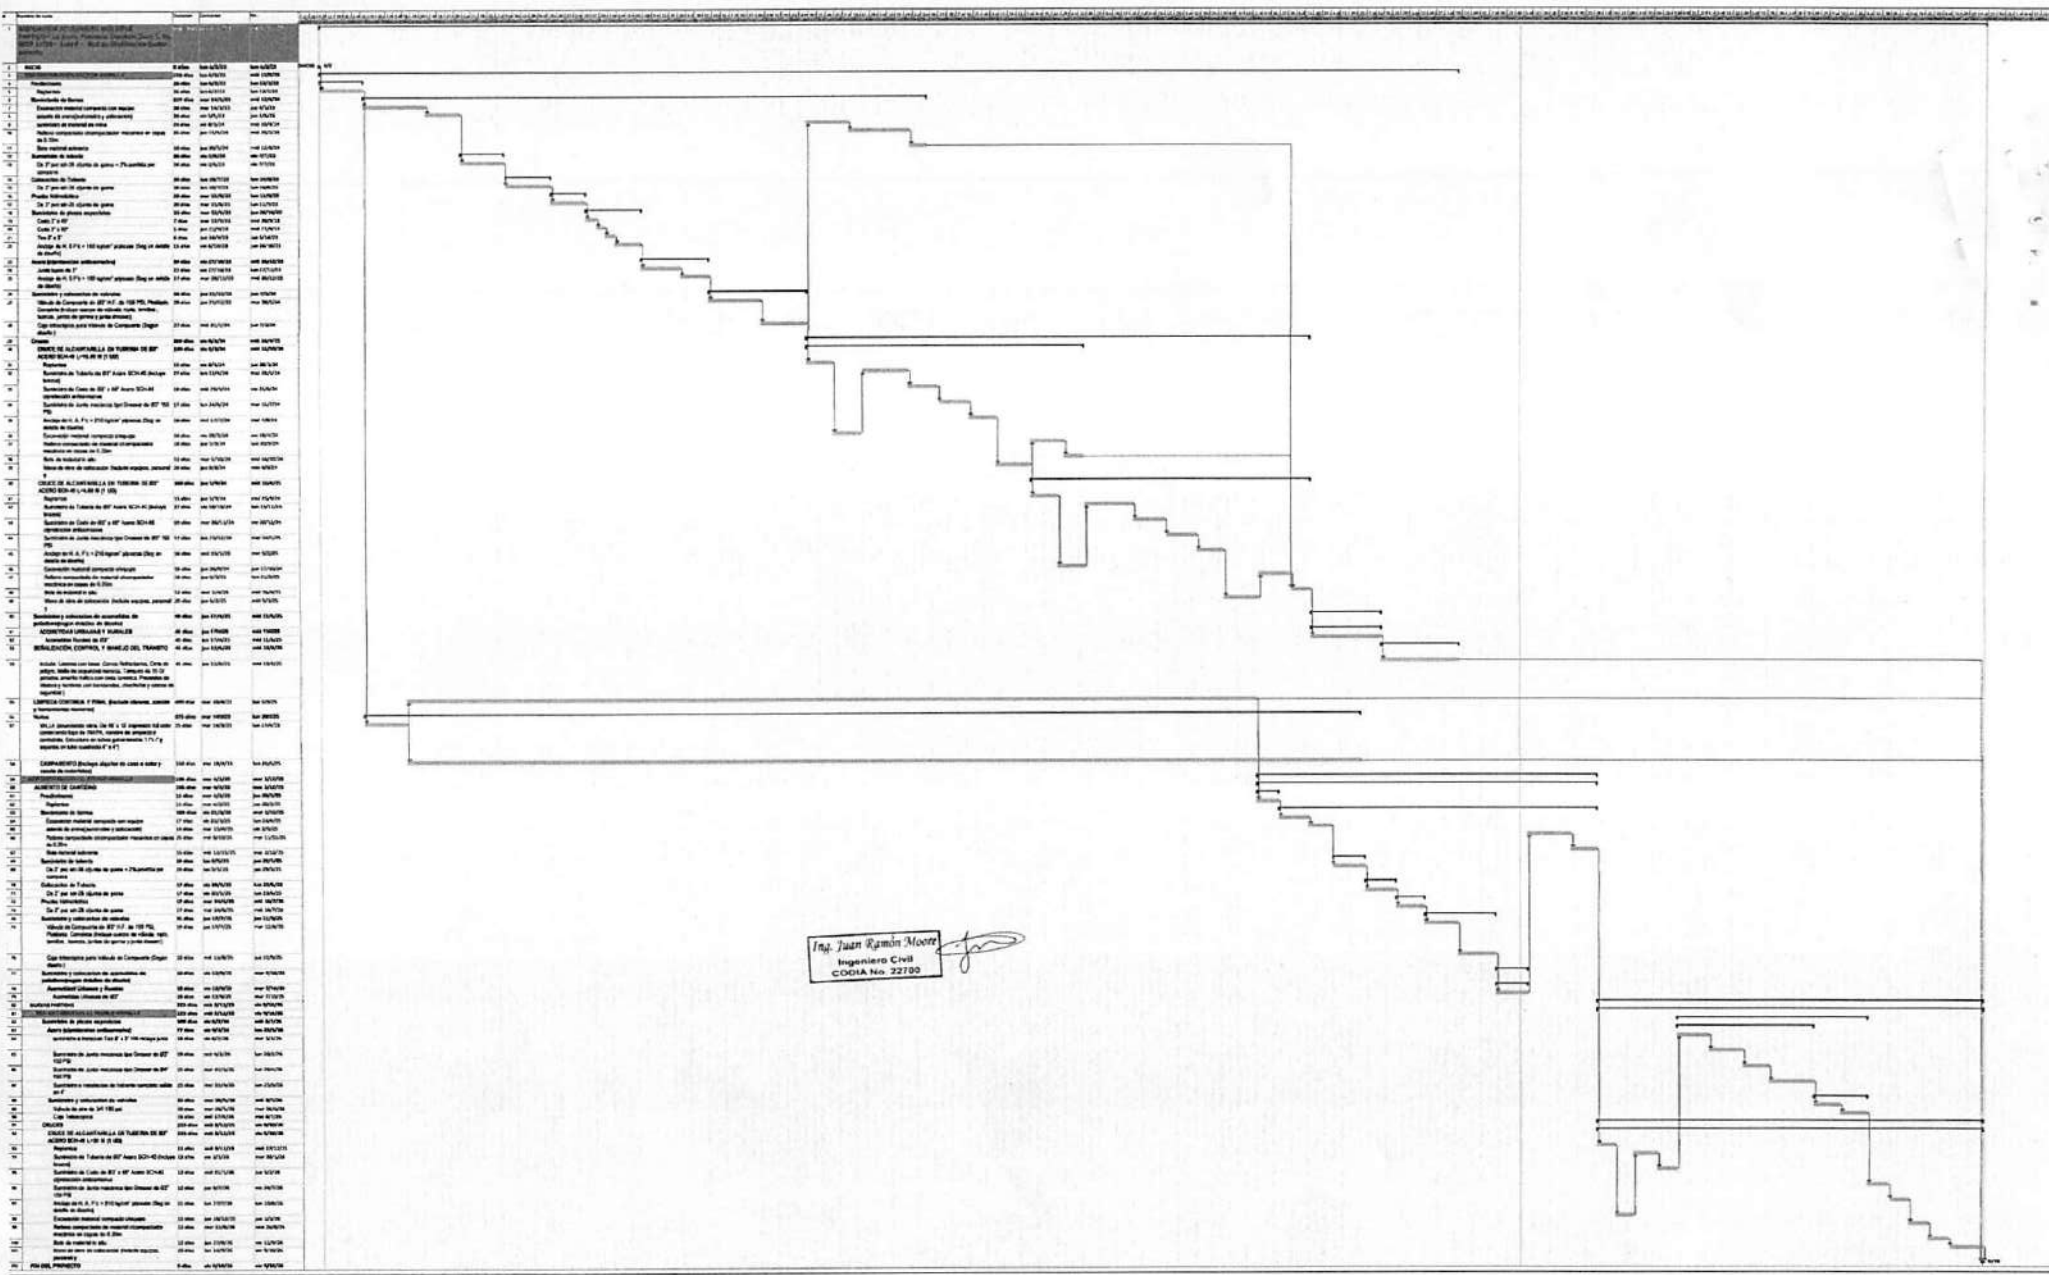


Ing. Juan Ramón Moore
Ingeniero Civil
CODIA No. 22190

Acueducto Múltiple las Gomas prov. Dagobón, Isla Q., sector La Cumbre																		
N	O	Estado en obra	Nombre de ítem	Duración	Comienzo	Fin	13 ene 24											
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1	✓	Clase Aéreo	420 días	lun 24/10/24	sáb 28/7/25												
2	2	✓	Replanteo	4.33 días	mar 10/12/24	sáb 14/12/24												
3	3	✓	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA (LONG. = 1.874.11 M)	7.33 días	vie 23/12/24	sáb 23/12/24												
4	4	✓	Corte de Asfalto 2" (2 lados)															
5	5	✓	Remoción de carpeta Asfáltica															
6	6	✓	Bote material Asfáltico c/camion (Incluye esparcimiento en lugar de botadero)															
7	7	✓	MUEVIMIENTO DE TIERRA	181.31 días	mar 27/12/24	lun 28/7/25												
8	8	✓	Excavación material compacto c/ equipo															
9	9	✓	Asiento de arena (Suministro y colocación)															
10	10	✓	Suministro de material de mina caliche (según a aprobación por la supervisión)															
11	11	✓	Suministro de material de base (según a aprobación por la supervisión)															
12	12	✓	Refrero compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m															
13	13	✓	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)															
14	14	✓	SUMINISTRO DE TUBERIAS:	8.31 días	vie 26/12/24	lun 30/12/24												
15	15	✓	De 04" PVC (SDR-26) c/ G. + 2% perdida por compans															
16	16	✓	De 03" PVC (SDR-26) c/ G. + 2% perdida por compans															
17	17	✓	COLOCACION DE TUBERIAS:	189.51 días	lun 13/12/24	lun 11/7/25												
18	18	✓	De 04" PVC (SDR-26) c/ G.															
19	19	✓	De 03" PVC (SDR-26) c/ G.															
20	20	✓	PRUEBA HIDROSTATICA	182.31 días	lun 13/12/25	lun 11/7/25												
21	21	✓	De 04" PVC (SDR-26) c/ G.															
22	22	✓	De 03" PVC (SDR-26) c/ G.															
23	23	✓	ARMISTRO Y COLOCACION DE PIZARRAS ESPEZIALES	44.31 días	lun 14/1/25	sáb 6/7/25												
24	24	✓	PVC SCH-40 (c/ cemento solvente tipo Tanguit)															
25	25	✓	Codo 3" x 45°															
26	26	✓	Codo 4" x 45°															
27	27	✓	Tee 3" x 3"															
28	28	✓	Tee 4" x 4"															
29	29	✓	Reducción 4" x 3"															
30	30	✓	Anclaje de H. S. P. = 150 kg/cm2 p/pizarras (Segun detalle de diseño)															
31	31	✓	ACERO (c/ protección anticorrosiva):															
32	32	✓	Junta lapas de 3"															
33	33	✓	Junta lapas de 4"															
34	34	✓	Anclaje de H. S. P. = 150 kg/cm2 p/pizarras (Segun detalle de diseño)															
35	35	✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	5.31 días	mar 18/2/25	vie 28/2/25												
36	36	✓	Valvula de Compuerta de 04" N.F. de 150 PSI, Planchada,															
37	37	✓	Completa (Incluye campo de valvula, niple, tornillos, tuercas, junta de goma y junta dresser)															
38	38	✓	Caja telescópica para Valvula de Compuerta (Segun detalle)															
39	39	✓	PUNTE PUBLICA DE 1 LLAVES EN TUBERIA DE 04"	5.31 días	lun 14/4/25	sáb 19/4/25												
40	40	✓																
41	41	✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (SEGON DETALLES DE DISEÑO)	5.31 días	vie 9/5/25	lun 15/5/25												
42	42	✓																
43	43	✓	De 04" en tubería de 04" Planchada, Completa (Incluye hidrante, valvula de compuerta, caja telescópica, niple, tee, reducción, junta Dresser, con instaln de borta y anclaje)															
44	44	✓	CRUCES:	4.31 días	lun 26/5/25	lun 27/5/25												
45	45	✓	CRUCE DE PUNTE EN TUBERIA DE 04" ACERO SCH-40															
46	46	✓	Replanteo															
47	47	✓	Suministro de Tubería de 04" Acero SCH-40 (Incluye brazos)															
48	48	✓	Suministro de Codo de 04" x 45° Acero SCH-40															
49	49	✓	Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de 04" 150 PSI															
50	50	✓	Anclaje de H. A. P. = 210 kg/cm2 p/pizarras (Segun detalle de diseño)															
51	51	✓	Pinura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación)															
52	52	✓	Pinura igual matemáticas (Suministro y aplicación)															
53	53	✓	Abrazaderas (Incluye pernos de colocación)															
54	54	✓	Mazo de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)															
55	55	✓	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 03" ACERO SCH-40	7.31 días	vie 22/5/25	sáb 29/5/25												
56	56	✓	Replanteo															
57	57	✓	Suministro de Tubería de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos)															
58	58	✓	Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 c/ protección anticorrosiva															
59	59	✓	Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de 03" 150 PSI															
60	60	✓	Anclaje de H. A. P. = 210 kg/cm2 p/pizarras (Segun detalle de diseño)															
61	61	✓	Excavación material compacto c/ equipo															
62	62	✓	Refrero compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m															
63	63	✓	Bote de material in situ															
64	64	✓	Mazo de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)															
65	65	✓	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGUN DETALLES DE DISEÑO)	118.31 días	mar 15/1/25	lun 13/6/25												
66	66	✓	ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES															
67	67	✓	Acometidas Urbanas de 04"															
68	68	✓	Acometidas Urbanas de 03"															
69	69	✓	Acometidas Rurales de 03"															
70	70	✓	Acometidas Rurales de 04"															
71	71	✓	DEMOLICION DE	5.31 días	lun 14/4/25	sáb 19/4/25												
72	72	✓	Acero de 1.00 m															
73	73	✓	Cantón															
74	74	✓	Bote de material demolido c/ camion															
75	75	✓	REPOSICION DE:															
76	76	✓	Acero de 1.00m															
77	77	✓	Cantón															
78	78	✓	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRAMITO	182.31 días	sáb 7/12/24	sáb 14/6/25												
79	79	✓	Incluye: Letreros con base, Conos Refractorios, Cinta de peligro, Mts de seguridad naranja, Tanques de 55 GL planchados amarillo trafico con cinta luminiscente, Pasarelas de (Madera y bombas con bendederos, 1 seguridad) chalcas y cascos de															
80	80	✓	LONGITUD CONTINUA Y FINAL (Incluye obra, control y mantenimiento)	282.31 días	lun 5/12/24	sáb 30/7/25												
81	81	✓	SUB-TOTAL FASE A															
82	82	✓	Z VARIOS															
83	83	✓	VALLA necesidad obra 14' x 19' Impresos full color	5.31 días	mar 27/12/24	lun 23/12/24												
84	84	✓	conociendo logo de INAPA, nombre de proyecto y construcciones															
85	85	✓	Estructura en tubos galvanizados 1 1/2 x 1 1/2															
86	86	✓	sáb cuadrado 4" x 4"															
87	87	✓	CARPINTERIA (Incluye alfiler de casa a taller y mazo de material)	9.06 días	lun 22/12/24	sáb 31/12/24												

ING. FRANCISCO RAFAEL PEÑA ALMONTE

Proyecto: Proyecto 1	Tarea: Inspección del proyecto	Tarea manual: Inspección del proyecto	Tarea de campo: Inspección del proyecto	Tarea de oficina: Inspección del proyecto	Tarea de laboratorio: Inspección del proyecto	Tarea de transporte: Inspección del proyecto	Tarea de almacenamiento: Inspección del proyecto	Tarea de mantenimiento: Inspección del proyecto	Tarea de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de salud: Inspección del proyecto	Tarea de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de cultura: Inspección del proyecto	Tarea de deporte: Inspección del proyecto	Tarea de arte: Inspección del proyecto	Tarea de ciencia: Inspección del proyecto	Tarea de tecnología: Inspección del proyecto	Tarea de innovación: Inspección del proyecto	Tarea de emprendimiento: Inspección del proyecto	Tarea de liderazgo: Inspección del proyecto	Tarea de comunicación: Inspección del proyecto	Tarea de negociación: Inspección del proyecto	Tarea de resolución de conflictos: Inspección del proyecto	Tarea de toma de decisiones: Inspección del proyecto	Tarea de planificación: Inspección del proyecto	Tarea de organización: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de recursos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de riesgos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de calidad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de medio ambiente: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de salud: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de cultura: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de deporte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de arte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de ciencia: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de tecnología: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de innovación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de emprendimiento: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de liderazgo: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de comunicación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de negociación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de resolución de conflictos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de toma de decisiones: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de planificación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de organización: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de recursos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de riesgos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de calidad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de medio ambiente: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de salud: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de cultura: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de deporte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de arte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de ciencia: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de tecnología: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de innovación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de emprendimiento: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de liderazgo: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de comunicación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de negociación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de resolución de conflictos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de toma de decisiones: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de planificación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de organización: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de recursos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de riesgos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de calidad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de medio ambiente: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de salud: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de cultura: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de deporte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de arte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de ciencia: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de tecnología: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de innovación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de emprendimiento: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de liderazgo: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de comunicación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de negociación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de resolución de conflictos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de toma de decisiones: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de planificación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de organización: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de recursos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de riesgos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de calidad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de medio ambiente: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de salud: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de cultura: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de deporte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de arte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de ciencia: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de tecnología: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de innovación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de emprendimiento: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de liderazgo: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de comunicación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de negociación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de resolución de conflictos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de toma de decisiones: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de planificación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de organización: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de recursos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de riesgos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de calidad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de medio ambiente: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de salud: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de cultura: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de deporte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de arte: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de ciencia: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de tecnología: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de innovación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de emprendimiento: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de liderazgo: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de comunicación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de negociación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de resolución de conflictos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de toma de decisiones: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de planificación: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de organización: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de recursos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de riesgos: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de calidad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de medio ambiente: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de seguridad: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de salud: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de bienestar: Inspección del proyecto	Tarea de gestión de cultura: Inspección del proyecto
----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	--	--	--

ING. FRANCISCO RAFAEL PEÑA ALMONTE

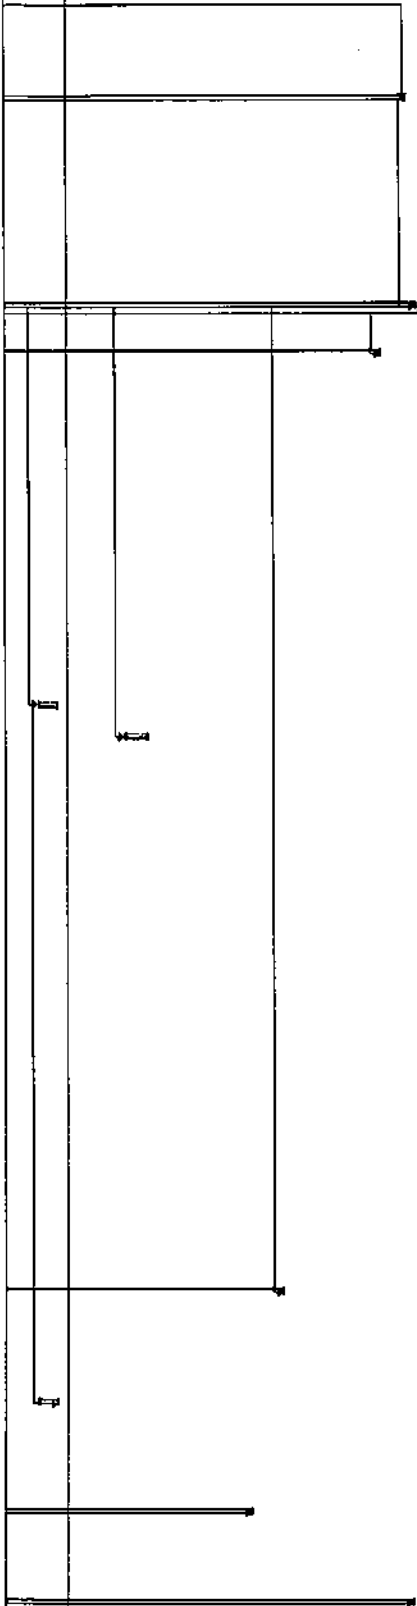

[Handwritten signature]

ING. FRANCISCO RAFAEL PEÑA ALMONTE

Proyecto: Proyecto 1
Fecha: 11/11/21

Tipo:
Código:
Haga:
Revisión:

Resumen del proyecto:
Resumen de la obra:
Resumen de la obra:

Tarea manual:
Tarea manual:
Tarea manual:

Tarea manual:
Tarea manual:
Tarea manual:

Tarea manual:
Tarea manual:
Tarea manual:

Tarea manual:
Tarea manual:
Tarea manual:

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	26	05 Apr '26	12 Apr '26	19 Apr '26	26 Apr '26	03 May '26	10 May '26	17 May '26	24 May '26	31 May '26	07 Jun '26	14 Jun '26
1						T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
2		Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote R- Red De Distribución Sector Los	168 days	Tue 31/03/26	Mon 12/10/26												
3																	
4		INICIO	0 days	Tue 31/03/26	Tue 31/03/26	31/03											
5		RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS INDIOS	167 days	Wed 01/04/26	Mon 12/10/26												
6		VARIOS	167 days	Wed 01/04/26	Mon 12/10/26												
7		VALLA anunciando obra 16' x 10' Impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x	22 days	Wed 01/04/26	Sat 25/04/26												
9																	
12		TRAMO 1	23 days	Fri 17/04/26	Wed 13/05/26												
13		PRELIMINAR	23 days	Fri 17/04/26	Wed 13/05/26												
14		Replanteo	4 days	Fri 17/04/26	Tue 21/04/26												
15																	
16		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA	4 days	Tue 21/04/26	Fri 24/04/26												
17		Corte de Asfalto e=2" (2	3 days	Tue 21/04/26	Thu 23/04/26												
18		Remoción de carpeta	3 days	Wed 22/04/26	Fri 24/04/26												
19		Bote material Asfáltico c/compón (Incluye esparcimiento	2 days	Thu 23/04/26	Fri 24/04/26												
20		MOVIMIENTO DE TIERRA	17 days	Fri 24/04/26	Wed 13/05/26												
21		Excavación material compacto	5 days	Fri 24/04/26	Wed 29/04/26												
22		Asiento de arena (Suministro y	3 days	Mon 27/04/26	Wed 29/04/26												
23		Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por la	4 days	Thu 30/04/26	Mon 04/05/26												
24		Suministro de material de base (sujeto a aprobación por la	4 days	Fri 01/05/26	Tue 05/05/26												
25		Relleño compactado de material c/compactador mecánico en capas de	5 days	Mon 04/05/26	Fri 08/05/26												
26		Bote material sobrante (Incluye esparcimiento	4 days	Sat 09/05/26	Wed 13/05/26												
27		SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 days	Fri 24/04/26	Sat 25/04/26												
28		De 04" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por	2 days	Fri 24/04/26	Sat 25/04/26												

Proyecto: Ampliación acueducto
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

Task	Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
29	W	De 03" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por	2 days	Fri 24/04/26	Sat 25/04/26
30	W	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 days	Tue 05/05/26	Sat 09/05/26
31	W	De 04" PVC (SDR-26) c/l.	5 days	Tue 05/05/26	Sat 09/05/26
32	W	De 03" PVC (SDR-26) c/l.	5 days	Tue 05/05/26	Sat 09/05/26
33	W	PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 days	Mon 11/05/26	Tue 12/05/26
34	W	De 04" PVC (SDR-26) c/l.	2 days	Mon 11/05/26	Tue 12/05/26
35	W	De 03" PVC (SDR-26) c/l.	2 days	Mon 11/05/26	Tue 12/05/26
36	W	TRAMO 2	12 days	Thu 14/05/26	Wed 27/05/26
37	W	PRELIMINAR	1 day	Thu 14/05/26	Thu 14/05/26
38	W	Replanteo	1 day	Thu 14/05/26	Thu 14/05/26
39	W				
40	W	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA	4 days	Fri 15/05/26	Tue 19/05/26
41	W	Corte de Asfalto e-2" (2 lados)	3 days	Fri 15/05/26	Mon 18/05/26
42	W	Remoción de carpeta Asfáltica	3 days	Sat 16/05/26	Tue 19/05/26
43	W	Bote material Asfáltico e/camión (Incluye esparcimiento en	2 days	Mon 18/05/26	Tue 19/05/26
44	W	MOVIMIENTO DE TIERRA	9 days	Mon 18/05/26	Wed 27/05/26
45	W	Excavación material	3 days	Mon 18/05/26	Wed 20/05/26
46	W	Asiento de arena (Suministro y colocación)	2 days	Fri 22/05/26	Sat 23/05/26
47	W	Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por	2 days	Thu 21/05/26	Fri 22/05/26
48	W	Suministro de material de base (sujeto a aprobación por	2 days	Tue 26/05/26	Wed 27/05/26
49	W	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en	3 days	Fri 22/05/26	Mon 25/05/26
50	W	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero).	2 days	Mon 25/05/26	Tue 26/05/26
51	W	SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 days	Sat 23/05/26	Mon 25/05/26
52	W	De 04" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por	2 days	Sat 23/05/26	Mon 25/05/26
53	W	De 03" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por	2 days	Sat 23/05/26	Mon 25/05/26
54	W	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	1 day	Thu 21/05/26	Thu 21/05/26
55	W	De 04" PVC (SDR-26) c/l. G.	1 day	Thu 21/05/26	Thu 21/05/26
56	W	De 03" PVC (SDR-26) c/l. G.	1 day	Thu 21/05/26	Thu 21/05/26
57	W				
58	W	PRUEBA HIDROSTÁTICA	4 days	Fri 22/05/26	Tue 26/05/26

Proyecto: Ampliación acueducto
Fecha: Mon 22/09/25

110

REFERENCES

Resumen del proyecto

Tasa inactiva

 Resumen Inactivo

Tarea manual

Informa de resum

Resumen main

solo duration

Informe de resumen manual [ver documento](#)

Resumen manual

☐ solo el comercio

— solo fin 1

Tareas externas

al comienzo

In 1

external

Hita externo

Fecha Emite

Processo

•

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	35%
35-44	25%
45-54	15%
55-64	10%
65-74	5%
75-84	2%
85+	1%

Progreso manual

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	26	05 Apr '26	12 Apr '26	19 Apr '26	26 Apr '26	03 May '26	10 May '26	17 May '26	24 May '26	31 May '26	07 Jun '26	14 Jun '26
59		De 04" PVC (SDR-26) c/L. G.	4 days	Fri 22/05/26	Tue 26/05/26												
60		De 03" PVC (SDR-26) c/L. G.	4 days	Fri 22/05/26	Tue 26/05/26												
61		TRAMO 3	21 days	Thu 28/05/26	Sat 20/06/26												
62		PRELIMINAR	21 days	Thu 28/05/26	Sat 20/06/26												
63		Replanteo	1 day	Thu 28/05/26	Thu 28/05/26												
64																	
65		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA	20 days	Fri 29/05/26	Sat 20/06/26												
66		Corte de Asfalto e=2" (2	3 days	Fri 29/05/26	Mon 01/06/26												
67		Remoción de carpeta	3 days	Sat 30/05/26	Tue 02/06/26												
68		Bote material Asfáltico e/camión (Incluye esparcimiento	2 days	Mon 01/06/26	Tue 02/06/26												
69		MOVIMIENTO DE TIERRA	18 days	Mon 01/06/26	Sat 20/06/26												
70		Excavación material compacto e/equipo.	3 days	Mon 01/06/26	Wed 03/06/26												
71		Asiento de arena (Suministr	3 days	Mon 01/06/26	Wed 03/06/26												
72		Suministro de material de mina (sujeto a aprobación	15 days	Thu 04/06/26	Sat 20/06/26												
73		Suministr 6 days de material de base (sujeto a	6 days	Thu 04/06/26	Wed 10/06/26												
74		Relleno compacta de material c/compac mecánico en capas	3 days	Fri 05/06/26	Mon 08/06/26												
75		Bote material sobrante (Incluye esparcimi	2 days	Tue 09/06/26	Wed 10/06/26												
76		SUMINIST 2 days DE	2 days	Thu 04/06/26	Fri 05/06/26												
77		De 04" PVC (SDR-26) c/L. G. + 2%	2 days	Thu 04/06/26	Fri 05/06/26												
78		De 03" PVC (SDR-26) c/L. G. + 2%	2 days	Thu 04/06/26	Fri 05/06/26												
79		COLOCAC 5 days DE	5 days	Thu 11/06/26	Tue 16/06/26												
80		De 04" PVC (SDR-26)	5 days	Thu 11/06/26	Tue 16/06/26												
81		De 03" PVC (SDR-26)	5 days	Thu 11/06/26	Tue 16/06/26												
82																	
83		PRUEBA HIDROST/	4 days	Wed 17/06/26	Sat 20/06/26												

Proyecto: Ampliación acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	26	05 Apr '26	12 Apr '26	19 Apr '26	26 Apr '26	03 May '26	10 May '26	17 May '26	24 May '26	31 May '26	07 Jun '26	14 Jun '26
84		De 04" PVC (SDR-26)	4 days	Wed 17/06/26	Sat 20/06/26												
85		De 03" PVC (SDR-26)	4 days	Wed 17/06/26	Sat 20/06/26												
86		TRAMO 4	27 days	Mon 22/06/26	Wed 22/07/26												
87		PRELIMINAR	1 day	Mon 22/06/26	Mon 22/06/26												
88		Replanteo	1 day	Mon 22/06/26	Mon 22/06/26												
89																	
90		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA	5 days	Mon 22/06/26	Fri 26/06/26												
91		Corte de Asfalto e=2" (2 lados)	3 days	Mon 22/06/26	Wed 24/06/26												
92		Remoción de carpeta Asfáltica	3 days	Mon 22/06/26	Wed 24/06/26												
93		Bote material Asfáltico e/camión (incluye esparcimiento en	2 days	Thu 25/06/26	Fri 26/06/26												
94		MOVIMIENTO DE TIERRA	26 days	Tue 23/06/26	Wed 22/07/26												
95		Excavación material	4 days	Tue 23/06/26	Fri 26/06/26												
96		Asiento de arena (Suministro y colocación).	4 days	Tue 07/07/26	Fri 10/07/26												
97		Suministro de material de mina (sujeto a aprobación por	3 days	Sat 27/06/26	Tue 30/06/26												
98		Suministro de material de base (sujeto a aprobación por	3 days	Sat 11/07/26	Tue 14/07/26												
99		Relleno compactado de material c/compactador mecánico en	3 days	Wed 15/07/26	Fri 17/07/26												
100		Bote material sobrante (incluye esparcimiento en botadero).	4 days	Sat 18/07/26	Wed 22/07/26												
101		SUMINISTRO DE TUBERÍA	2 days	Tue 23/06/26	Wed 24/06/26												
102		De 04" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por	2 days	Tue 23/06/26	Wed 24/06/26												
103		De 03" PVC (SDR-26) c/l. G. + 2% pérdida por	2 days	Tue 23/06/26	Wed 24/06/26												
104		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	5 days	Wed 01/07/26	Mon 06/07/26												
105		De 04" PVC (SDR-26) c/l. G.	5 days	Wed 01/07/26	Mon 06/07/26												
106		De 03" PVC (SDR-26) c/l. G.	5 days	Wed 01/07/26	Mon 06/07/26												
107																	
108		PRUEBA HIDROSTÁTICA	4 days	Tue 07/07/26	Fri 10/07/26												
109		De 04" PVC (SDR-26) c/l. G.	4 days	Tue 07/07/26	Fri 10/07/26												
110		De 03" PVC (SDR-26) c/l. G.	3 days	Tue 07/07/26	Thu 09/07/26												
111		TRAMO 5	34 days	Thu 23/07/26	Mon 31/08/26												
112		PRELIMINAR	1 day	Thu 23/07/26	Thu 23/07/26												
113		Replanteo	1 day	Thu 23/07/26	Thu 23/07/26												
114		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA	5 days	Fri 24/07/26	Wed 29/07/26												

Proyecto: Ampliación acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

[illegible]

Proyecto: Ampliación acueducto
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea		Resumen
División		Resumen del proyecto
Hilo		Tarea inactiva

 Hito inactivo
 Resumen inactivo
 Tarca manual

- ☐ solo duración
- ☐ Informe de resu
- ☒ Resumen man

solo duración		solo el comienzo
Informe de resumen manual		solo fin
Resumen manual		Tareas externas

[	Hito externo
]	Fecha límite
	Progreso

Hito externo		Progreso manual
Fecha Emite		
Progreso		

100

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	26	05 Apr '26	12 Apr '26	19 Apr '26	26 Apr '26	03 May '26	10 May '26	17 May '26	24 May '26	31 May '26	07 Jun '26	14 Jun '26
150	■	Cuneta	1 day	Tue 01/09/26	Tue 01/09/26												
151	■	AVERIAS EN TUBOS 6 days	6 days	Wed 02/09/26	Tue 08/09/26												
152	■	De 1/2", 3/4", 1"	6 days	Wed 02/09/26	Tue 08/09/26												
153	■	De 1 1/2" Y 2"	6 days	Wed 02/09/26	Tue 08/09/26												
154	■	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS CONEXION EN LINEA DE 6" A 4, CON UNA SALIDA DE 3"	2 days	Tue 01/09/26	Wed 02/09/26												
155	■	Suministro de YEE DE ACERO	2 days	Tue 01/09/26	Wed 02/09/26												
156	■	Suministro de Junta mecanica tipo Dresser de	2 days	Tue 01/09/26	Wed 02/09/26												
157	■	Suministro de Junta mecanica tipo Dresser de	2 days	Tue 01/09/26	Wed 02/09/26												
158	■	Suministro de Junta mecanica tipo Dresser de	2 days	Tue 01/09/26	Wed 02/09/26												
159	■	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de	2 days	Tue 01/09/26	Wed 02/09/26												
160	■	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA PARA CAMBIO DE DIRECCION EN	2 days	Wed 02/09/26	Thu 03/09/26												
161	■	Suministro de codo de 3" x 45 acero SCH-40 C/ proteccion anticorrosiva y pintura	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												
162	■	Suministro de Junta mecanica tipo Dresser de	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												
163	■	Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm2p/piezas (Según detalle de diseño) incluye pintura	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
164	■	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	2 days	Wed 02/09/26	Thu 03/09/26												
165	■	Suministro e instalacion en tuberia de 4" (valvula de compuerta aplanada)	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												
166	■	Suministro e instalacion en tuberia de 2" (valvula de compuerta aplanada)	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												
167	■	Suministro e instalacion de jaulas de proteccion para valvulas	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
168	■	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE 3" ACERO	2 days	Wed 02/09/26	Thu 03/09/26												
169	■	Replanteo	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												

Proyecto: Ampliacion acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	Informe de resumen manual	solo el contenido	Hito externo	Progreso manual
Division	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Resumen manual	solo fin	Fecha limite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Tareas externas	Progreso		

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	26	01 Apr '26	12 Apr '26	19 Apr '26	26 Apr '26	03 May '26	10 May '26	17 May '26	24 May '26	31 May '26	07 Jun '26	14 Jun '26
170		Suministro e instalacion en tubería de 3" (incluye brazos, pintura	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												
171		Suministro de codo de 3" x 45 acero sch-40	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
172		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (SEGÚN DETALLES DE	1 day	Fri 04/09/26	Fri 04/09/26												
173		De Ø4" en tubería de Ø4" Platillado, Completa (incluye hidrante, válvula de compuerta, caja telescópica, nipple, tee,	1 day	Fri 04/09/26	Fri 04/09/26												
174		JUNTAS DRESSER 1 day EN PRUEBAS HIDROSTÁTICA	1 day	Fri 04/09/26	Fri 04/09/26												
175		Suministro e instalacion de junta dresser De Ø4" y de	1 day	Fri 04/09/26	Fri 04/09/26												
176																	
177		TRAMO 7	155 days	Wed 15/04/26	Mon 12/10/26												
178		CRUCES:	155 days	Wed 15/04/26	Mon 12/10/26												
179		CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40	4 days	Wed 02/09/26	Sat 05/09/26												
180		Replanteo	4 days	Wed 02/09/26	Sat 05/09/26												
181		Suministro de Tubería de Ø4" Acero	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
182		Suministro de Codo de Ø4" x 45" Acero SCH-80	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
183		Suministro de Junta mecánica tipo Dresser	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
184		Anclaje de H. A. P'c = 210 kg/cm2p/pie (Según	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
185		Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y	1 day	Thu 03/09/26	Thu 03/09/26												
186		Pintura azul mantenimiento (Suministro y	1 day	Fri 04/09/26	Fri 04/09/26												
187		Abrazadera.	1 day	Wed 02/09/26	Wed 02/09/26												
188		Mano de obra de colocación (Incluye equipos,	4 days	Wed 02/09/26	Sat 05/09/26												
189																	

Proyecto: Ampliacion acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracion
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	25	05 Apr '26	12 Apr '26	19 Apr '26	26 Apr '26	03 May '26	10 May '26	17 May '26	24 May '26	31 May '26	07 Jun '26	14 Jun '26
190	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE	1 day	Sat 05/09/26	Sat 05/09/26												
191		ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
192		Acometidas Urbanas de	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
193		Acometidas Urbanas de	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
194		Acometidas Rurales de 04"	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
195		Acometidas Rurales de 03"	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
196		DEMOLICIÓN DE:	2 days	Mon 07/09/26	Tue 08/09/26												
197		Acera de 1.00 x 1	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
198		Contén	1 day	Mon 07/09/26	Mon 07/09/26												
199		Bote de material	1 day	Tue 08/09/26	Tue 08/09/26												
200		REPOSICIÓN DE:	2 days	Tue 08/09/26	Wed 09/09/26												
203		REPOSICIÓN DE CARPETA	3 days	Wed 02/09/26	Fri 04/09/26												
204		Imprimación sencilla	2 days	Wed 02/09/26	Thu 03/09/26												
205		Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de	2 days	Thu 03/09/26	Fri 04/09/26												
206		Transporte de asfalto, Distancia =	2 days	Thu 03/09/26	Fri 04/09/26												
207		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas	155 days	Wed 15/04/26	Mon 12/10/26												
208																	
209		FIN	0 days	Mon 12/10/26	Mon 12/10/26												

Proyecto: Ampliación acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

[illegible][illegible]

Proyecto: Ampliación acueducto	Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
Fecha: Mar 22/09/25	División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
	Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Página 9

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

Proyecto: Ampliación acueducto
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea
Descrió
Hito

- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva

	Hito inactivo
	Resumen inactivo
	Tarea manual

☐ solo duración
☐ Informe de resumen manual
☒ Resumen manual

- solo el comienzo
- solo fin
- Tareas externas


Hilo externo
Fecha límite
Proyecto

Progreso mensual

[illegible]

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comentario		Hito externo		Progreso manual
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso		Progreso

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

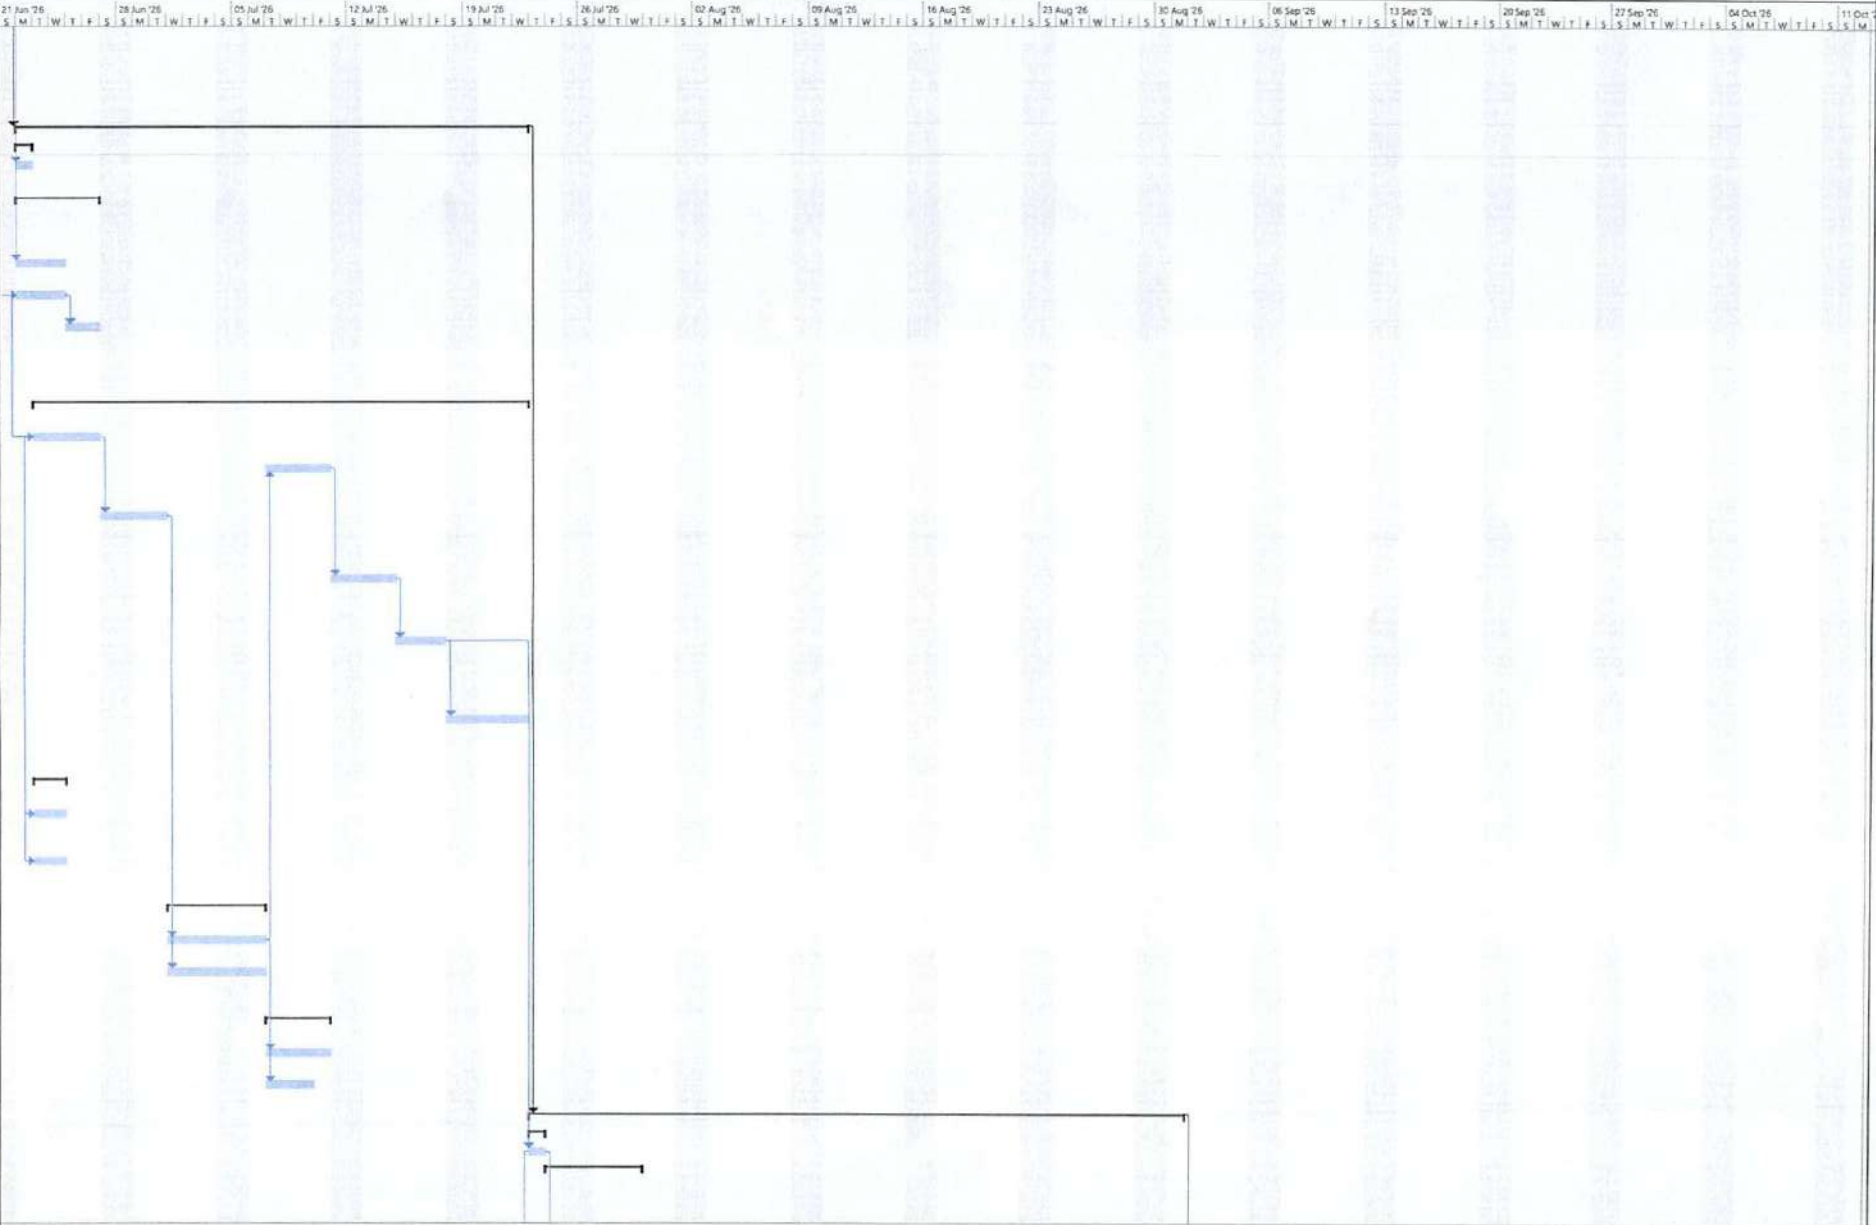

Proyecto: Ampliación acueducto
Fecha: Mar 22/09/25

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual


Informe de resumen manual
Resumen manual

Resumen manual
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

RAYNERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

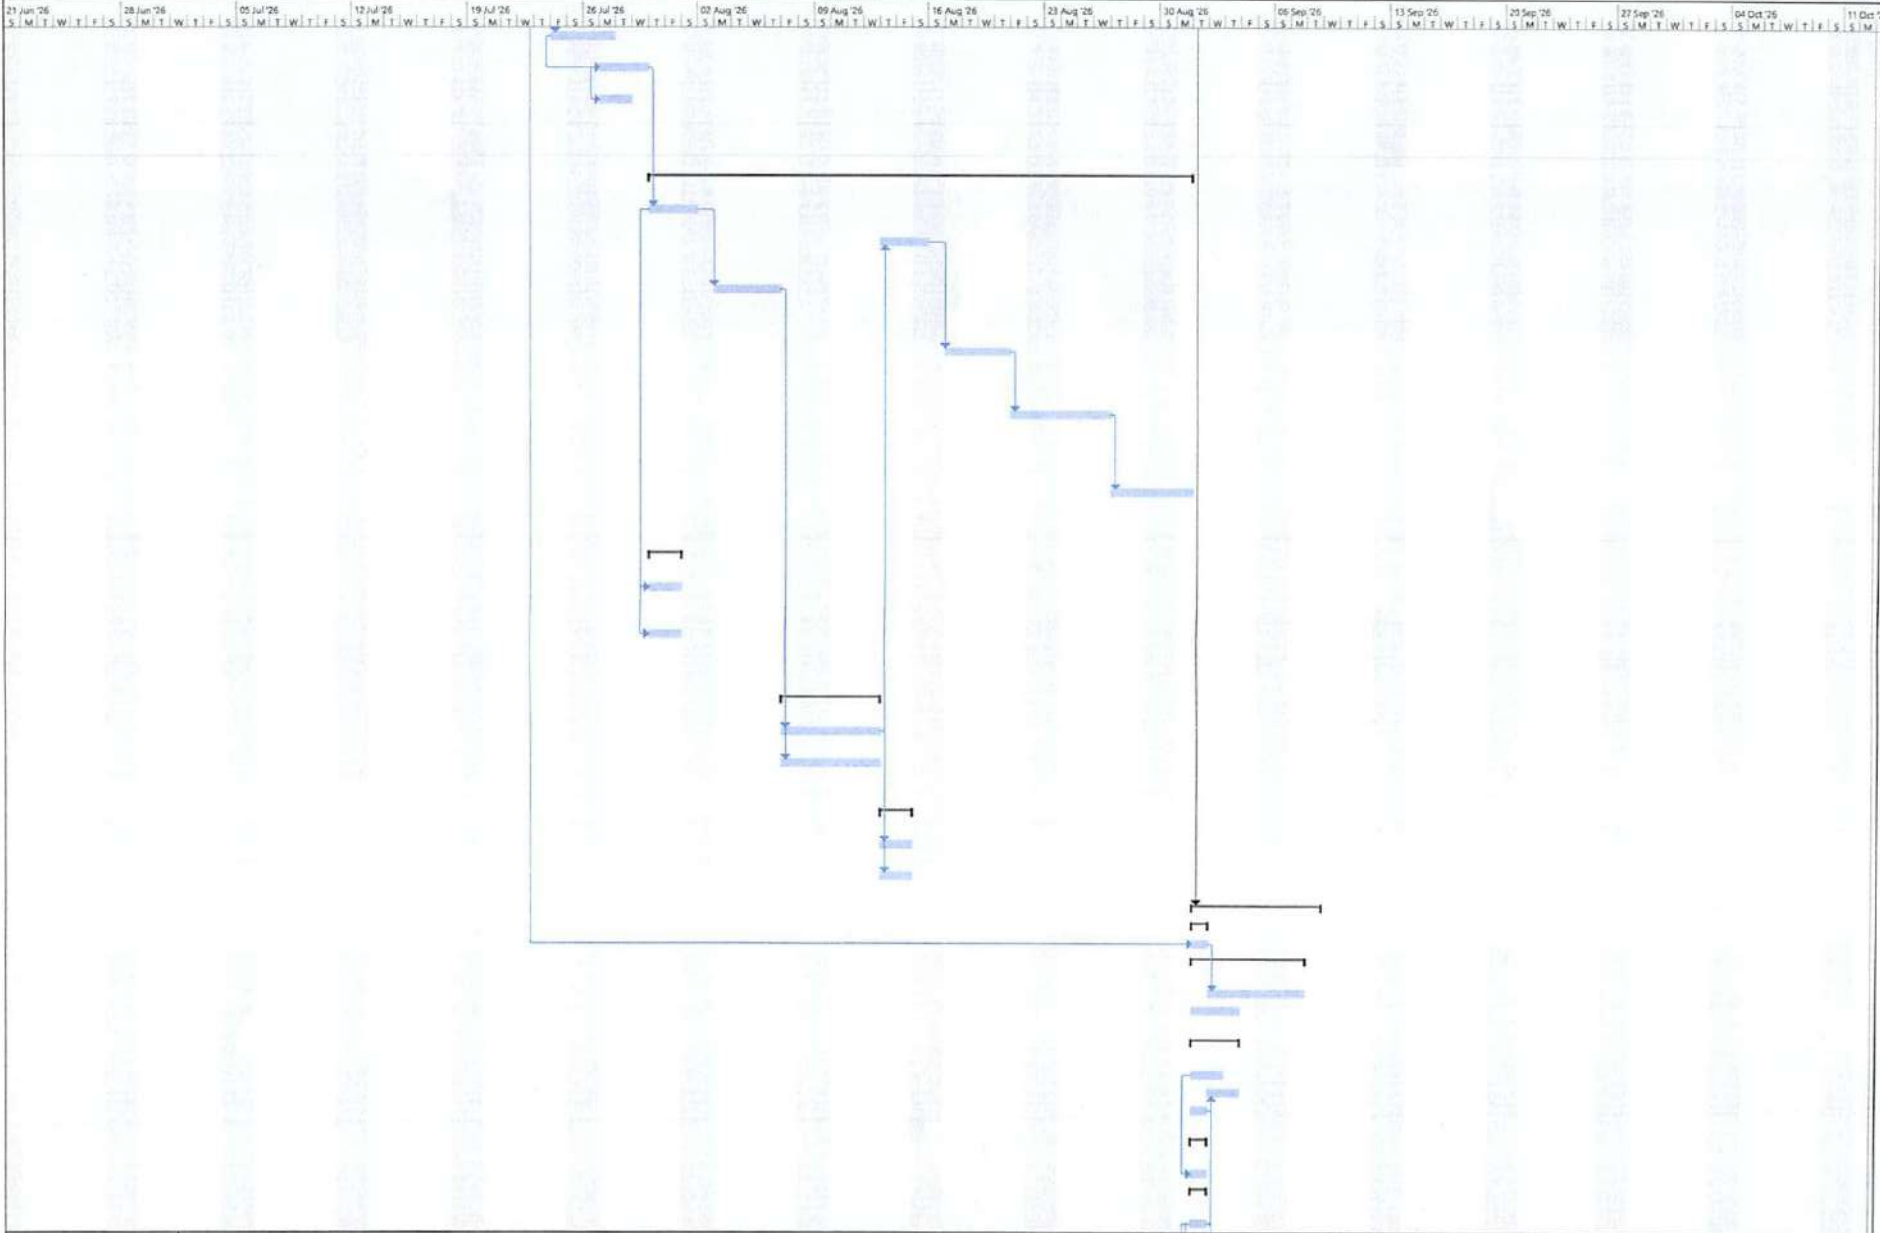

Proyecto: Ampliación acueducto
Fecha: Mar 22/09/25

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual


solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el consentimiento
solo fee
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

RAYNERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

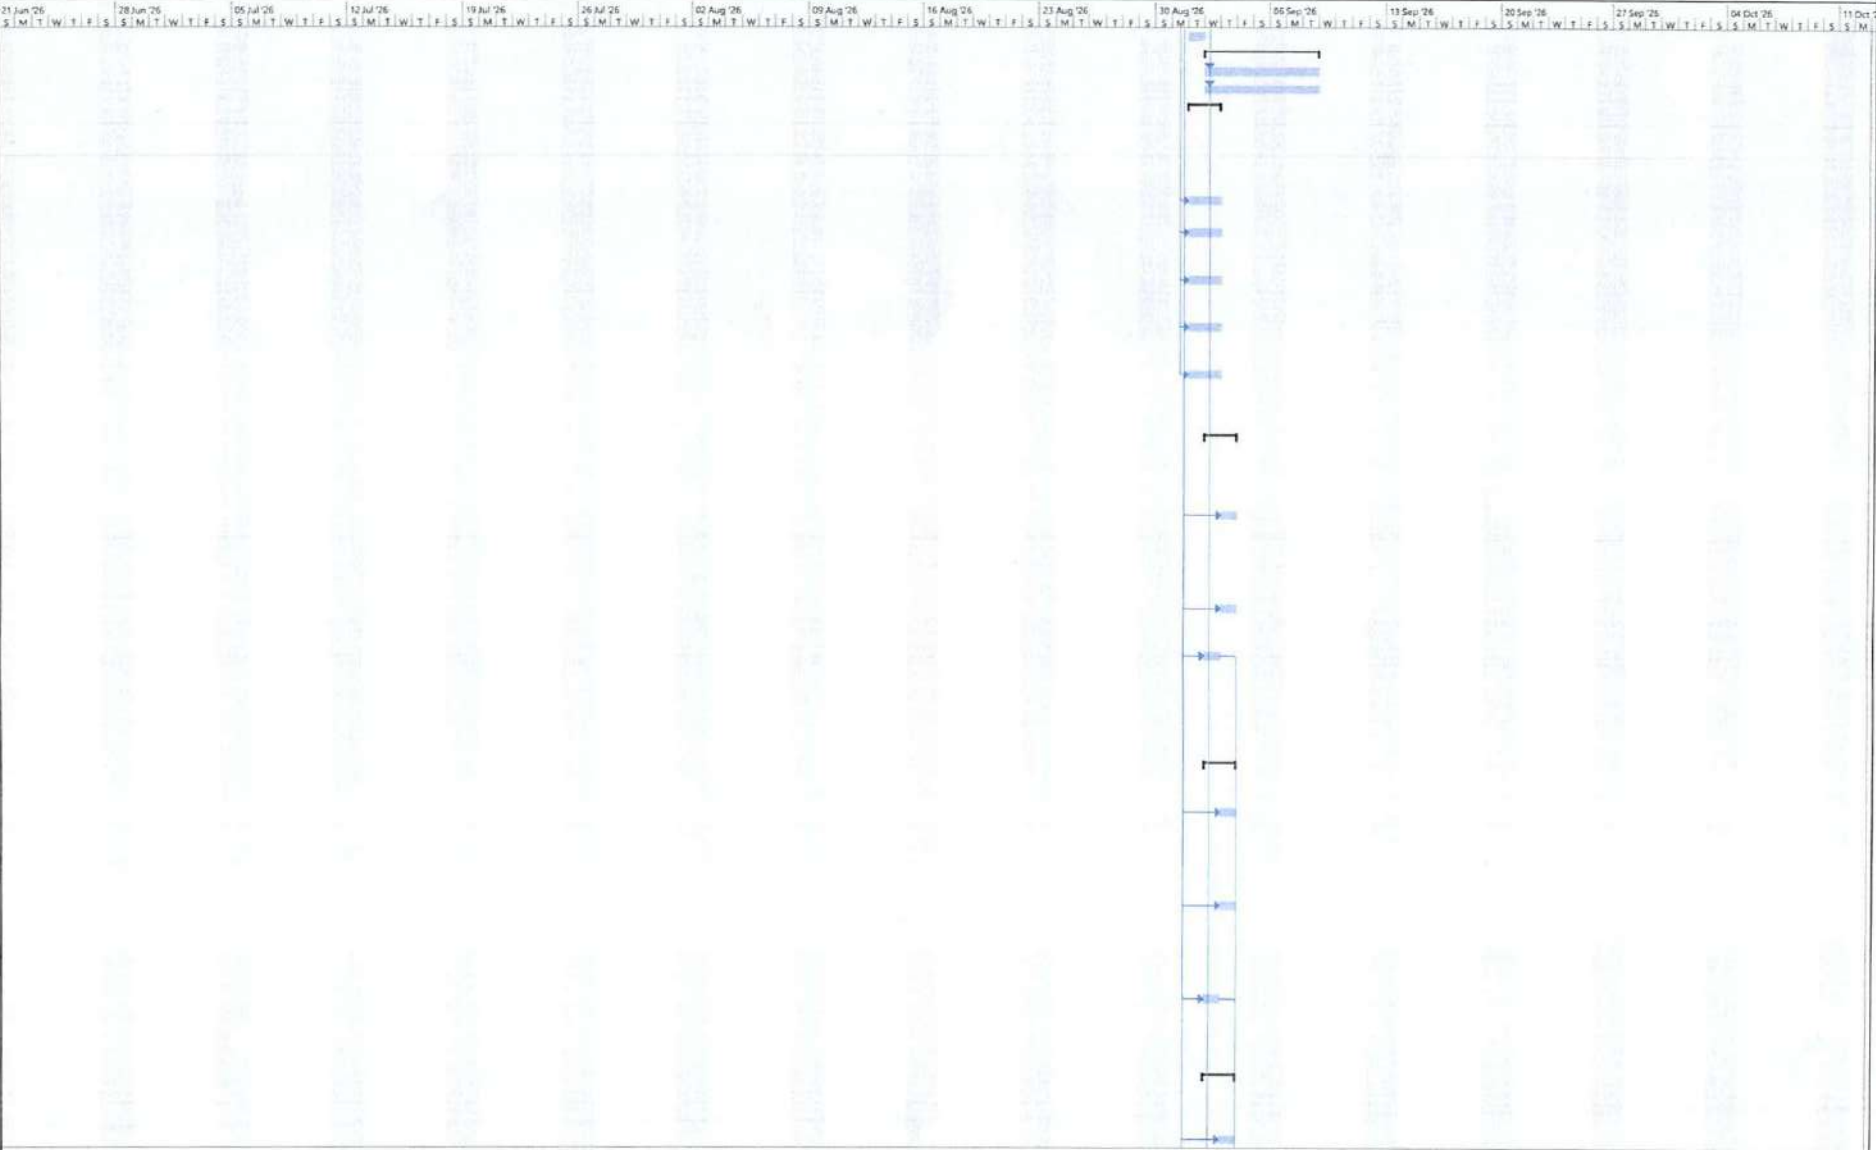

Proyecto: Ampliación acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

Informe de resumen manual
Resumen manual

Informe de resumen manual
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

RAYNIERIS BLADENNYS PIÑA COMAS

Proyecto: Ampliacion acueduct
Fecha: Mon 22/09/25

Tarea
División
Hito

	Resumen
	Resumen del proyecto
	Tarea inactiva


	Hito inactivo
	Resumen inactivo
	Tarea manual

solo duración		solo el comienzo
informe de resumen manual		solo fin
Resumen manual		Tareas externas.

	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso

Hito externo
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

[illegible]

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022	2023	2024	2025	2026
							S1	S2	S1	S2	S1
1			AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, RED DE DISTRIBUCION SECTOR HATICO VIEJO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25	13/10				
2			INICIO	0 días	jue 13/10/22	jue 13/10/22					
3			VALLAN ANUNCIANDO OBRA	1 día	jue 13/10/22	jue 13/10/22					
4			CAMPAMENTO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25					
5			RED DE DISTRIBUCION SECTOR HATICO VIEJO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25					
6			PRELIMINAR	10 días	jue 20/10/22	mié 2/11/22					
7			CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	90 días	jue 3/11/22	mié 8/3/23					
8			MOVIMIENTO DE TIERRA	600 días	jue 3/11/22	jue 21/8/25					
9			SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	jue 20/10/22	mié 1/2/23					
10			COLOCACION DE TUBERIA	380 días	jue 3/11/22	mié 1/1/25					
11			PRUEBA HIDROSTATICA	10 días	jue 2/1/25	mié 15/1/25					
12			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	25 días	jue 2/1/25	mié 5/2/25					
13			CRUCES	15 días	jue 6/2/25	mié 26/2/25					
14			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO	45 días	jue 16/1/25	mié 19/3/25					
15			DEMOLICION DE ACERAS, CONTENES Y BOTE	35 días	jue 27/2/25	mié 16/4/25					
16			REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	35 días	jue 17/4/25	mié 4/6/25					
17			REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	60 días	jue 5/6/25	mié 27/8/25					
18			SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25					
19			LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25					
20			FIN	0 días	lun 13/10/25	lun 13/10/25					

Bejar

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
1	Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote T - Línea de	11/10/24	14/10/25															
2	PREUMINAR	11/10/24	25/10/24															
3	Replanteo	11/10/24	25/10/24															
4	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=4,455.00 M)	11/10/24	31/10/24															
5	Corte de Asfalto e=2 (2 lados)	11/10/24	31/10/24															
6	Remoción de carpeta Asfáltica	11/10/24	30/10/24															
7	Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en de botadero)	11/10/24	21/10/24															
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	11/10/24	11/7/25															
9	Excavación material compacto c/equipo	11/10/24	28/5/25															
10	Asiento de arena (Suministro y colocación)	11/10/24	22/5/25															
11	Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	11/10/24	21/5/25															
12	Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión)	11/10/24	11/7/25															
13	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	11/10/24	11/7/25															
14	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)	11/10/24	11/7/25															
15	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	11/10/24	11/7/25															
16	De Ø8 PVC (SDR-26) c/J, G, + 3% pérdida por campana	11/10/24	11/7/25															
17	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	4/11/24	4/8/25															
18	De Ø8" PVC (SDR-26) c/J, G.	4/11/24	4/8/25															
19	PRUEBA HIDROSTÁTICA	18/11/24	18/8/25															
20	De Ø8" PVC (SDR-26) c/J, G.	18/11/24	18/8/25															
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	5/11/24	5/8/25															
22	ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):	5/11/24	5/8/25															
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	5/11/24	5/8/25															
24	Suministro y colocación de válvulas, caja telescópica y registros	5/11/24	5/8/25															
25	CÁMARA PARTIDORA DE PRESIÓN DE H.A. (2.80M x 6.10M x 2.07M) EN TUBERÍA DE 8"	11/11/24	14/4/25															
26	Incluye movimiento de tierra, terminación de superficie, válvulas, cajas telescópicas, piezas, tuberías, juntas mecánicas tipo Dresser y mano de obra (Según detalle de diseño)	11/11/24	14/4/25															
27	CRUCES:	13/11/24	9/12/24															
28	CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø8" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)	13/11/24	9/12/24															
29	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	11/10/24	11/9/25															
30	Imprimación sencilla	11/10/24	10/7/25															
31	Suministro y colocación de Asfalto e=2 (Incluye Riego de Adherencia)	12/12/24	11/9/25															
32	Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx.	11/12/24	10/9/25															
33	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO	11/10/24	13/10/25															
34	(Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y casc	11/10/24	13/10/25															

Proyecto: Palacio Barahona Lot
Fecha: 3/3/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración

Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
35	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	11/10/24	13/10/25															
36	(Incluye obreros, camión y herramientas menores)	11/10/24	13/10/25															
37	VARIOS	14/10/24	14/10/25															
38	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" X4"	14/10/24	14/10/25															
39	CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)	14/10/24	14/10/25															

Proyecto: Palacio Barahona Lot
Fecha: 3/3/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración

Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

◆
↓
—
—

Zony Grullón

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 2, 2022Semestre 1, 2023Semestre 2, 2023Semestre 1, 2024Semestre 2, 2024Semestre 1, 2025Semestre 2, 2025Semestre 1, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						S	N	E	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O

