

CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T3 T4 2023 T1 T2 T3 T4 2024 T1 T2 T3 T4 2025 T1 T2 T3 T4 2026 T1 T2 T3											
1		93%	LOTE 1 - AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD	863 días	10-02-23	07-03-26													
2		100%	Orden de Inicio	0 días	10-02-23	10-02-23													
3		88%	Campamento	693 días	17-02-23	11-08-25	2CC+6 días												
4		100%	Fabricación e Instalación de Letreros	3 días	21-02-23	23-02-23	3CC+2 días												
5		89%	A- OBRA DE TOMA - LÍNEA DE ADUCCIÓN - DESARENADOR - CÁRCAMO DE BOMBEO AGUAS CRUDAS	806 días	26-04-23	07-03-26													
6		100%	A-1 CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE GRAVA	14 días	14-06-23	30-06-23													
7		100%	Construcción de columnas de grava	14 días	14-06-23	30-06-23	3CC+54 días												
8		100%	A-2 CONSTRUCCION DE PILOTES	74 días	18-09-23	21-12-23													
9		100%	Elaboración estudio ETB (sondeo SPT)	6 días	18-09-23	25-09-23	7FC+60 días												
10		100%	Autorización construcción de pilotes INAPA	0 días	02-11-23	02-11-23	9CC												
11		100%	Armado canastos de pilotes	4 días	02-11-23	08-11-23	10												
12		100%	Construcción de pilotes (48 unides)	12 días	08-11-23	23-11-23	11,69,114												
13		100%	Limpieza y demolición de cabezal de pilotes, colocación de relleno (granzote) y nivelación	7 días	23-11-23	01-12-23	12												
14		100%	Prueba de integridad PIT	1 día	01-12-23	01-12-23	15CF-2 días												
15		100%	Preparación de pilotes para prueba	3 días	05-12-23	08-12-23	125												
16		100%	Prueba de carga en pilotes	4 días	08-12-23	13-12-23	15												
17		100%	Demolición de cabezal de pilotes luego de prueba PDA	3 días	16-12-23	20-12-23	16												
18		100%	Limpieza de área	1 día	20-12-23	21-12-23	17												
19		2%	A-3 CAJUELA DE CAPTACIÓN EN CANAL EXISTENTE	276 días	16-12-24	02-12-25													
20		60%	PRELIMINARES	201 días	16-12-24	28-08-25													
21		0%	Eliminación Vertederos improvisados	1 día	28-08-25	28-08-25	22CC+2 días												
22		0%	Replanteo y control topográfico	1 día	26-08-25	26-08-25	48FC+12 días,23,315												
23		100%	Construcción de ataguía para delimitación de área de trabajo	3 días	16-12-24	18-12-24	48FC+12 días												
24		0%	MOVIMIENTO DE TIERRA / PREPARACIÓN DE TERRENO	10 días	26-08-25	06-09-25													
25		0%	Excavación y bote de material compactado	10 días	26-08-25	06-09-25	22CC												
26		0%	Relleno compactación c/compactador mecánico	10 días	26-08-25	06-09-25	25CC												
27		0%	Demolición con compresor de sección de muro HA	10 días	26-08-25	06-09-25	25CC												
28		0%	HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2	36 días	08-09-25	22-10-25													
29		0%	Losa de cimentación	8 días	11-09-25	20-09-25	33												
30		0%	Muros	15 días	22-09-25	09-10-25	29												
31		0%	Viga de refuerzo	4 días	10-10-25	15-10-25	30												
32		0%	Losa de techo	10 días	10-10-25	22-10-25	31CC												

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea Agrupar por síntesis
División Tarea resumida
Hito Hito resumido
Resumen Progreso resumido
Resumen del proyecto Tareas externas

Hito externo Tarea inactiva
Hito inactivo Resumen inactivo
Resumen manual Tarea manual

solo duración Fecha límite
Informe de resumen manual Progreso
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023				2024				2025				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
33		0%	Hormigón simple F'c=100kg/cm²	3 días	08-09-25	10-09-25	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea	■	Agrupar por síntesis
División		Tarea resumida
Hito	◆	Hito resumido
Resumen	▬	Progreso resumido
Resumen del proyecto	▬	Tareas externas

■	Hito externo
▬	Tarea inactiva
◆	Hito inactivo
▬	Resumen inactivo
▬	Tarea manual

▬	solo duración
▬	Informe de resumen manual
▬	Resumen manual
▬	solo el comienzo
▬	solo fin

Fecha límite

Progreso



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% complet	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
67	✓	100%	Replanteo y control topográfico	3 días	20-09-23	22-09-23	9CC+2 días												
68	✓	100%	Bote de material con camión D=5 km	3 días	20-09-23	22-09-23	66CC												
69	✓	100%	Relleno compactado	2 días	23-09-23	26-09-23	66												
70	✓	100%	HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2 EN:	101 días	02-12-23	18-04-24													
71	✓	100%	Losa cimentacion plana	14 días	30-01-24	15-02-24	72,75CC+25 días												
72	✓	100%	Losa cimentacion en rampa	18 días	06-12-23	29-12-23	78												
73	✓	100%	Muros	10 días	12-02-24	23-02-24	74CC												
74	✓	100%	Muros sobre losa plana	25 días	12-02-24	14-03-24	71FC-4 días												
75	✓	100%	Muros sobre losa en rampa	44 días	23-12-23	14-03-24	72CC+75%												
76	✓	100%	Vigas V1	4 días	09-03-24	14-03-24	74FC-5 días, 73,75FC-4 d												
77	✓	100%	Losa de pasarela	9 días	08-04-24	18-04-24	76CC												
78	✓	100%	Colocación de hormigón simple f'c=100kg/cm²	3 días	02-12-23	06-12-23	14												
79	✓	100%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN EN ENTRADA, SALIDA Y LAVADO DE LODOS	145 días	05-03-24	11-09-24													
80	✓	100%	Replanteo de tuberías	4 días	09-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
81	✓	100%	Excavación material compactado c/equipo	4 días	09-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
82	✓	100%	Bote de material con camión D=5 km (incluye carga y esparcimiento en botadero)	4 días	09-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
83	✓	100%	Relleno compactacion c/compactador mecanico	4 días	09-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
84	✓	100%	INSTALACIONES MECANICAS	96.2 días	09-05-24	11-09-24													
85	✓	100%	Tubería Ø30" Acero (conexión desarenador - estación de bombeo y conexión registros - desarenador)	4 días	10-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
86	✓	100%	Tubería Ø8" Acero SCH-40	2 días	09-09-24	10-09-24	90												
87	✓	100%	Yee Ø30"x30" Acero	4 días	09-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
88	✓	100%	Codo Ø30"x45º Acero	4 días	09-05-24	15-05-24	92FC+10 días												
89	✓	100%	Junta mecánica tipo Dresser Ø30" (150 PSI)	4 días	10-06-24	14-06-24	92FC+10 días												
90	✓	100%	Válvula mariposa de Ø30" H.F. 150 PSI platillada completa	4 días	10-06-24	14-06-24	92FC+10 días												
91	✓	100%	Válvula de compuerta de Ø8" H.F. 150 PSI platillada completa para limpieza de las cámaras	1 día	11-09-24	11-09-24	86												
92	✓	100%	Registro H.A. (2.60 x 2.60 x 3.91) para válvulas en entrada al desarenador	18 días	05-03-24	25-04-24	94CC-1 día												
93	✓	100%	Registro H.A. (3.25 x 3.10 x 2.54) para válvulas en entrada al desarenador	18 días	05-03-24	25-04-24	94CC-1 día												
94	✓	100%	Registro cámara de arena en H.A. (2.80 x 2.80 x 7.91) m para válvulas compuertas Ø8"	22 días	07-03-24	25-04-24	75FC-6 días												
95	✓	100%	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	145.7 días	15-03-24	24-09-24													
96	✓	100%	Piso pulido en H.S.	1 día	15-05-24	15-05-24	97,77,98												
97	✓	100%	Pañete interior (Incluye vigas, columnas y techo)	10 días	15-03-24	01-04-24	75FC+1 día												
98	✓	100%	Pañete exterior (Losa pasarela)	5 días	18-04-24	24-04-24	77												

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea Agrupar por síntesis
División Tarea resumida
Hito Hito resumido
Resumen Progreso resumido
Resumen del proyecto Tareas externas

Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Fecha límite

Progreso



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod% de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								2023				2024				2025				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
99	✓	100%	Cantos general	10 días	15-03-24	03-05-24	97CC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea Agrupar por síntesis
División Tarea resumida
Hito Hito resumido
Resumen Progreso resumido
Resumen del proyecto Tareas externas

Hito externo solo duración
Tarea inactiva Informe de resumen manual
Hito inactivo Resumen manual
Resumen inactivo solo el comienzo
Tarea manual solo fin

Fecha limite Progreso
C
J



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% complet	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
132	✓	100%	Aditivo plastificante para hormigones estructurales	62 días	21-12-23	15-03-24	116CC												
133	✓	100%	Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales	62 días	21-12-23	15-03-24	132CC												
134	✓	100%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:	257.5 días	20-09-23	27-08-24													
135	✓	100%	Junta de goma hidrofílica de 9"	38 días	10-01-24	29-02-24	119FF												
136	✓	100%	Pasante para huecos en la losa de techo en tubería Ø 8" PVC (niple)	2 días	13-03-24	15-03-24	124FF												
137	✓	100%	Escalera de acceso al deposito del carcamo en acero inoxidable. (3 ud)	7 días	19-08-24	27-08-24	127												
138	✓	100%	Tapa HG tipo cisterna 1.00mx1.00m	1 día	01-07-24	01-07-24	137CC												
139	✓	100%	Uso Bomba de achique Ø4"	10 días	20-09-23	02-10-23	112CC												
140	✓	100%	A-4-2 CASETA DE BOMBEO	213 días	15-03-24	19-12-24													
141	✓	100%	HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2 EN:	20 días	15-03-24	12-04-24													
142	✓	100%	Viga V2 (0.25mx0.40m) - 4.21 qq/m³	4 días	19-03-24	25-03-24	144CC+2 días												
143	✓	100%	Viga V1 (0.35mx0.70m) - 2.28 qq/m³	6 días	05-04-24	12-04-24	144FC+2 días												
144	✓	100%	Columnas C1 (0.45mx0.45m) - 7.47 qq/m³ (11uds) h=5.00m	12 días	15-03-24	03-04-24	124												
145	✓	100%	Losa de techo de la caseta e=0.15m - 0.96 qq/m³ (Incluye alero)	6 días	05-04-24	12-04-24	143CC												
146	✓	100%	MURO DE BLOCK	21 días	15-04-24	11-05-24													
147	✓	100%	De 6" con bastones Ø3/8" @ 0.80 (sobre cárcamo)	7 días	15-04-24	30-04-24	145												
148	✓	100%	De 6" con bastones Ø3/8" @ 0.80 en antepecho	2 días	15-04-24	16-04-24	145												
149	✓	100%	Suministro y colocación de foam de poliestireno expandido en juntas de muro de blocks y elementos estructurales	7 días	15-04-24	23-04-24	147CC												
150	✓	100%	Ventanas de block calados	3 días	08-05-24	11-05-24	147,158												
151	✓	100%	INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO	29.5 días	08-05-24	14-06-24													
152	✓	100%	Suministro de Viga W 12 x 30, angulares, pernos, tornillos y Trolley	1 día	08-05-24	08-05-24	160												
153	✓	100%	Mano de obra Instalación Viga Riel el Techo	5 días	10-06-24	14-06-24	152												
154	✓	100%	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	141.5 días	20-04-24	21-10-24													
155	✓	100%	Piso pulido en H.S.	1 día	06-05-24	06-05-24	157												
156	✓	100%	Fraguache	3 días	20-04-24	24-04-24	147FC-2 días												
157	✓	100%	Pañete interior (Incluye vigas, columnas y techo)	7.5 días	24-04-24	04-05-24	156												
158	✓	100%	Pañete exterior (Incluye antepecho)	10 días	24-04-24	08-05-24	156												
159	✓	100%	Cantos general	10 días	24-04-24	08-05-24	156												
160	✓	100%	Fino de techo (Incluye área de la terraza en cota +7.80)	1 día	10-05-24	10-05-24	157CC+5 días												
161	✓	100%	Zabaleta de techo	1 día	11-05-24	13-05-24	160												
162	✓	100%	Pintura acrílica en muros y blocks calados (incluye base blanca)	5 días	20-05-24	02-10-24	155,151												
163	✓	100%	Impermeabilizante en techo, de lona asfáltico de e= 4.00 mm	1 día	21-10-24	21-10-24	161												
164	✓	100%	PORTAJE	2 días	16-12-24	17-12-24													

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas

Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual


solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin

Fecha límite
Progreso



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								T3	T4	2023				T4	2024				T2	T3	T4	2025				T3	T4	2026				T1	T2	T3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
165	✓	100%	Puerta doble de tola de 1/4" (2.70 x 2.00) m	2 días	16-12-24	17-12-24	155,152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

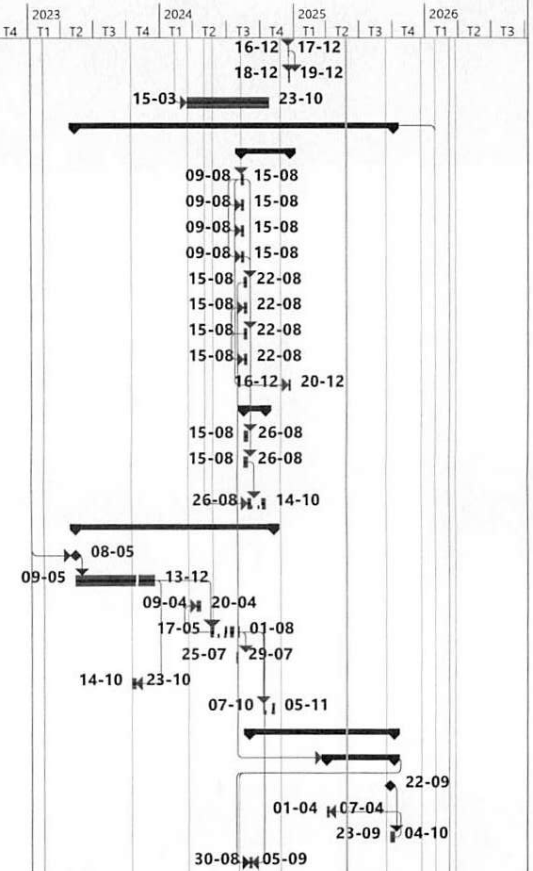

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha limite
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo		
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin		



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod. de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023				2024				2025				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
197	✓	100%	Mano de obra eléctrica	5 días	05-09-24	11-09-24	192,196																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Progreso

C

J



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								2023				2024				2025			
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
231	✓	100%	Verja de protección en ventanas	1 día	24-06-24	24-06-24	230							24-06	24-06				
232	✓	100%	INSTALACIÓN SANITARIA	54 días	30-04-24	08-07-24													
233	✓	100%	Suministro de Aparatos Sanitarios, Tinaco, Desagues, Columna de Ventilacion y Cortina	1 día	10-06-24	08-07-24	231FC-2 días							10-06	08-07				
234	✓	100%	Construccion Cámara de Inspección	7 días	15-05-24	23-05-24	208							15-05	23-05				
235	✓	100%	Séptico (1.90x1.10) M	7 días	15-05-24	25-06-24	208							15-05	25-06				
236	✓	100%	Tubería y piezas	2 días	30-04-24	01-05-24	200CC							30-04	01-05				
237	✓	100%	Mano de obra instalación aparatos sanitarios	5 días	12-06-24	28-06-24	231							12-06	28-06				
238	✓	100%	Cerámica en baño	1 día	08-07-24	08-07-24	214							08-07	08-07				
239	✓	100%	Filtrante para descarga de aguas residuales	2 días	15-05-24	17-05-24	235CC							15-05	17-05				
240	✓	100%	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	9.7 días	12-06-24	25-06-24													
241	✓	100%	Entrada general (incluye panel de braeker de 8/16 circuitos)	1 día	12-06-24	25-06-24	231							12-06	25-06				
242	✓	100%	Salidas luces cenitales	2 días	12-06-24	25-06-24	231							12-06	25-06				
243	✓	100%	Salidas tomacorrientes doble 120 V	2 días	12-06-24	25-06-24	231							12-06	25-06				
244	✓	100%	Salidas interruptor sencillos	2 días	12-06-24	25-06-24	231							12-06	25-06				
245	✓	100%	Salidas interruptor dobles	2 días	12-06-24	25-06-24	231							12-06	25-06				
246	✓	100%	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	83 días	30-04-24	23-10-24	199CC							30-04	23-10				
247	✓	100%	A-8 VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS	330 días	09-10-23	17-12-24													
248	✓	100%	VERJA EN BLOQUES DE 6 VIOLINADOS CRUCE AYUNTAMIENTO	89 días	09-10-23	05-02-24													
249	✓	100%	PRELIMINARES	2 días	09-10-23	11-10-23													
250	✓	100%	Replanteo verja	2 días	09-10-23	11-10-23	110FC+10 días							09-10	11-10				
251	✓	100%	MOVIMIENTO DE TIERRA	35 días	11-10-23	25-11-23													
252	✓	100%	Excavación zapatas a mano	5 días	11-10-23	17-10-23	250CC+2 días							11-10	17-10				
253	✓	100%	Reposición material compactado	5 días	11-11-23	25-11-23	262							11-11	25-11				
254	✓	100%	Bote de material con camión d=5 km	5 días	11-10-23	17-10-23	252CC							11-10	17-10				
255	✓	100%	HORMIGÓN ARMADO EN:	46.5 días	01-11-23	02-01-24													
256	✓	100%	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m	10 días	01-11-23	14-11-23	252							01-11	14-11				
257	✓	100%	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m	10 días	01-11-23	14-11-23	256CC							01-11	14-11				
258	✓	100%	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m	9 días	17-11-23	29-11-23	262FC-50%							17-11	29-11				
259	✓	100%	Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20)m	6 días	29-11-23	06-12-23	258,262							29-11	06-12				
260	✓	100%	Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m	2 días	29-12-23	02-01-24	266							29-12	02-01				
261	✓	100%	MUROS	14.5 días	11-11-23	29-11-23													
262	✓	100%	Block 8" Ø3/8"@0.60 m BNP	10 días	11-11-23	23-11-23	256FC-25%							11-11	23-11				
263	✓	100%	Block 6" Ø3/8"@0.60 m SNP violinado	12 días	11-11-23	29-11-23	262CC							11-11	29-11				
264	✓	100%	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	18 días	18-12-23	12-01-24													

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Progreso

C

J



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023												2024				2025				2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
265	✓	100%	Fraguache	3 días	18-12-23	20-12-23	259FC-2 días							18-12	20-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Progreso

C

J

CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart														
								2023				2024				2025				2026		
299	✓	100%	Cantos	9.5 días	10-05-24	04-06-24	298CC															
300	✓	100%	PINTURA	10 días	21-10-24	01-11-24	309															
301	✓	100%	Pintura base blanca en vigas y columnas	5 días	21-10-24	25-10-24	298															
302	✓	100%	Acrilica azul turquesa en vigas y columnas	5 días	26-10-24	01-11-24	301															
303	✓	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE:	207 días	21-03-24	17-12-24																
304	✓	100%	Alambre galvanizado tipo trinchera	5 días	24-06-24	15-07-24	298FC-2 días															
305	✓	100%	Junta expansiva con tiras de foam 1/2"	18 días	21-03-24	24-04-24	294CC															
306	✓	100%	Estructura metalica para soporte de alambre trinchera con angulares	6 días	11-06-24	15-07-24	304CC															
307	✓	100%	Puerta corrediza long=4.0 m	2 días	16-12-24	17-12-24	292															
308	✓	100%	Regado y nivelación de grava para embellecimiento	2 días	25-10-24	28-10-24	301FC-1 día															
309	✓	100%	REPARACIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR LAS AGUAS	7 días	24-06-24	02-07-24	296															
310	✓	100%	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	123 días	11-03-24	01-11-24	280CC															
311	✗	20%	DESVÍO CANAL UFE	299 días	14-01-25	28-01-26																
312	✓	100%	Entrega rediseño desvío canal UFE	1 día	14-01-25	14-01-25																
313	✓	100%	Aprobación de rediseño desvío por INAPA	10 días	15-01-25	27-01-25	312															
314	✗	32%	Construcción de desvío (incluye movimiento de tierra y geomembrana)	30 días	04-03-25	31-07-25	313															
315	✗	0%	Construcción de ataguía en geobags	18 días	02-08-25	25-08-25	314FC+1 día															
316	✗	0%	Reconstrucción Canal UFE	45 días	03-12-25	28-01-26	19															
317	✗	0%	PAISAJISMO Y PAVIMENTACIÓN	30 días	29-01-26	07-03-26	12,168,311															
318	✗	99%	B- LÍNEA DE IMPULSIÓN No.1, Ø20" HD DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO #1 HASTA PLANTA POTABILIZADORA 300 LPS	610.82 días	09-03-23	16-05-25																
319	✗	98%	PRELIMINAR	610.82 días	09-03-23	16-05-25																
320	✗	98%	Replanteo	66 días	09-03-23	16-05-25	327CC															
321	✗	98%	MOVIMIENTO DE TIERRA	610.82 días	09-03-23	16-05-25																
322	✗	98%	Excavación material compacto c/equipo	66 días	09-03-23	16-05-25	327CC															
323	✗	98%	Relleno compactado de material c/compactador mecánico	66 días	09-03-23	16-05-25	327CC															
324	✗	98%	Suministro y colocación de asiento de arena	66 días	09-03-23	16-05-25	327CC															
325	✗	98%	Bote material sobrante	66 días	09-03-23	16-05-25	327CC															
326	✗	98%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA	610.82 días	09-03-23	16-05-25																
327	✗	98%	Suministro y Colocacion de Tubería de Ø20" Hierro Dúctil K9	66 días	09-03-23	16-05-25	425FC-50%															
328	✓	100%	COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	66 días	09-03-23	14-02-24	327CC															
329	✓	100%	ANCLAJES DE PIEZAS ESPECIALES	35 días	12-08-24	14-10-24	328															
330	✓	100%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	491 días	09-03-23	13-12-24																

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas

Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart															
								2023				2024				2025				2026			
331	✓	100%	Suministro de Válvula de desagüe de Ø8" H.F. de 250 PSI y de aire combinada de Ø3" H.F. de 250 PSI	30 días	09-03-23	02-05-23	327CC	09-03-23					02-05-23										
332	✓	100%	Colocación de válvulas de desagüe	10 días	03-06-24	14-06-24	334CC+75%						03-06-24										
333	✓	100%	Colocación de válvulas de aire	7 días	05-12-24	13-12-24	332																
334	✓	100%	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA VÁLVULAS	30 días	12-12-23	30-10-24	327CC+85%,329FF+8 días																
335	✓	98%	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	66 días	09-03-23	16-05-25	320CC	09-03-23															
336	✓	98%	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	66 días	09-03-23	16-05-25	320CC	09-03-23															
337	✓	93%	C- DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 8,000 M3, CIRCULAR	669 días	13-05-23	01-10-25																	
338	✓	100%	DISEÑO Y LIBERACIÓN DE TERRENO (INAPA)	0 días	13-05-23	13-05-23	2CC+70 días																
339	✓	100%	APROBACIÓN DE INAPA CAMBIO DE MATERIAL DEL DEPÓSITO REGULADOR	0 días	20-09-23	20-09-23	338FC+100 días																
340	✓	100%	PRELIMINARES	3.5 días	22-05-23	25-05-23																	
341	✓	100%	Limpieza y desbrose	3 días	22-05-23	24-05-23	338FC+5 días																
342	✓	100%	Replanteo y control topografico	1 día	24-05-23	25-05-23	341																
343	✓	100%	MOVIMIENTO DE TIERRA (OTRA EMPRESA)	0 días	02-10-23	02-10-23	342																
344	✓	100%	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELO	5 días	19-09-23	25-09-23	343FC-10 días																
345	✓	100%	LOSA DE CIMENTACION	43.5 días	04-01-24	03-03-24																	
346	✓	100%	Replanteo y control topografico	40 días	04-01-24	26-02-24	344FC+76 días																
347	✓	100%	MOVIMIENTO DE TIERRA	23 días	04-01-24	05-02-24																	
348	✓	100%	Excavación de Roca c/equipo	14 días	04-01-24	23-01-24	346CC																
349	✓	100%	Bote de material (capa 1 vegetal) con camión, distancia 11 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero)	12.54 días	04-01-24	30-01-24	348CC																
350	✓	100%	Elaboración de suelo cemento	2 días	31-01-24	01-02-24	349																
351	✓	100%	Prueba de placa rígida	2 días	02-02-24	05-02-24	350																
352	✓	100%	BASE DE CONCRETO	20.5 días	05-02-24	03-03-24																	
353	✓	100%	HORMIGON DE LIMPIEZA F'C=140 kg/cm2, E=0.05 m	20.5 días	05-02-24	03-03-24																	
354	✓	100%	Excavacion para poceta	2 días	12-02-24	13-02-24	359																
355	✓	100%	Colocacion de tubería en poceta hasta salir de area de tanque	2 días	14-02-24	15-02-24	354																
356	✓	100%	Anclaje de poceta en hormigón	1 día	03-03-24	03-03-24	355,365FF																
357	✓	100%	Colocacion de niveles e=0.10 m	2 días	05-02-24	07-02-24	351																
358	✓	100%	Revision de niveles con topografia	1 día	07-02-24	08-02-24	357																
359	✓	100%	Vaciado de hormigon de limpieza y nivelación	2 días	08-02-24	10-02-24	358																
360	✓	100%	LOSA DE CIMENTACION	14 días	13-02-24	03-03-24																	
361	✓	100%	Enguarderado de losa de fundacion e=0.35 m, esto incluye perforaciones para colocacion de torcho en ø3/8 para madera, colocacion de plywood y madera	2.5 días	23-02-24	26-02-24	359																

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea		Agrupar por síntesis
División		Tarea resumida
Hito		Hito resumido
Resumen		Progreso resumido
Resumen del proyecto		Tareas externas

	Hito externo
	Tarea inactiva
	Hito inactivo
	Resumen inactivo
	Tarea manual

	solo duración
	Informe de resumen manual
	Resumen manual
	solo el comienzo
	solo fin

Fecha final
Piso




CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2023 2024 2025 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
362	✓	100%	Envarillado de losa, colocacion de ø1/2 1era camada, colocacion de burros o soportes, colocacion de 2da camada	10 días	13-02-24	26-02-24	361FC-9 días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea	■	Agrupar por síntesis	◆	Hito externo	◆	solo duración	■	Fecha límite
División		Tarea resumida	■	Tarea inactiva	■	Informe de resumen manual	■	Progreso
Hito	◆	Hito resumido	◆	Hito inactivo	◆	Resumen manual	■	
Resumen	■	Progreso resumido	■	Resumen inactivo	■	solo el comienzo	■	
Resumen del proyecto	■	Tareas externas	■	Tarea manual	■	solo fin	■	



**CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD -
LOTE I**

Id	Mod. de tare	% completo	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																								
								2023				2024				2025				2026											
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4						
393	✓🔧	100%	Gestión de compras de válvulas de mariposa Ø24" 150 PSI	30 días	07-08-23	14-09-23	384CC			07-08			14-09																		
394	✓🔧	100%	Colocación de tubería Ø24" acero SCH-20 s/costura c/protección protección anticorrosiva	26.5 días	01-02-25	06-03-25	386CC,391,392									01-02				06-03											
395	✓🔧	100%	Colocación de piezas especiales (codos, juntas y tee)	26.5 días	01-02-25	06-03-25	387CC,392									01-02				06-03											
396	✓🔧	100%	Colocación de válvulas de Mariposa Ø24" 150 PSI	1 día	30-12-24	30-12-24	388CC,397,393									30-12				30-12											
397	✓🔧	100%	Registro H.A. para valvulas en desagüe	10 días	16-12-24	15-02-25	389CC,394,395									16-12				15-02											
398	✓🔧	89%	TUBERÍA DE ENTRADA DESDE PTAR	497 días	07-08-23	17-05-25																									
399	✓🔧	100%	Gestión de compras de tuberías acero Ø30" SCH-20 s/costura c/protección protección anticorrosiva	100 días	07-08-23	13-12-23	401CC			07-08			13-12																		
400	✓🔧	100%	Gestión de compras de piezas especiales (codos, juntas dressers y tee)	100 días	07-08-23	13-12-23	401CC			07-08			13-12																		
401	✓🔧	100%	Gestión de compras de válvulas de Mariposa Ø30" 150 PSI	67 días	07-08-23	31-10-23	384CC			07-08			31-10																		
402	🔧⚙️	43%	Colocación de tubería Ø30" Acero SCH-20 c/protección protección anticorrosiva	20 días	21-04-25	15-05-25	399													21-04		15-05									
403	🔧⚙️	43%	Colocación de piezas especiales (codos, juntas y tee)	20 días	21-04-25	15-05-25	402CC													21-04		15-05									
404	🔧⚙️	0%	Colocación de válvulas de mariposa Ø30" 150 PSI	2 días	15-05-25	17-05-25	405													15-05		17-05									
405	🔧⚙️	43%	Registro H.A. para válvulas mariposa Ø30" 150 PSI	20 días	21-04-25	15-05-25	402CC													21-04		15-05									
406	🔧⚙️	0%	DESINFECCION DE TANQUE W-TANK TORO	5 días	30-07-25	05-08-25	367,379													30-07		05-08									
407	🔧⚙️	0%	PRUEBA DE TANQUE W-TANK TORO	15 días	05-08-25	23-08-25	406													05-08		23-08									
408	🔧⚙️	0%	MURAL Y LOGO DE INAPA	10 días	25-08-25	05-09-25	367,379,407													25-08		05-09									
409	🔧⚙️	0%	EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA	15 días	05-09-25	24-09-25	408													05-09		24-09									
410	🔧⚙️	0%	LIMPIEZA FINAL	5 días	25-09-25	01-10-25	409													25-09		01-10									
411	🔧⚙️	97%	D- LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE Ø24" HD- C25 Y Ø20" PVC SDR-26 DESDE DEPÓSITO REGULADOR EN HORMIGÓN ARMADO,CAPACIDAD 8,000 M3 A CONSTRUIR HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 5,265 M3 EXISTENTE	756.5 días	10-02-23	23-10-25																									
412	✓🔧	100%	REPLANTEO	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		
413	✓🔧	100%	CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=2,240 M	200.63 días	10-02-23	30-10-23																									
414	✓🔧	100%	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	114.5 días	10-02-23	30-10-23	412CC			10-02			30-10																		
415	✓🔧	100%	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	114.5 días	10-02-23	30-10-23	414CC			10-02			30-10																		
416	✓🔧	100%	Bote de material c/camión (d= de 5 km).	114.5 días	10-02-23	30-10-23	415CC			10-02			30-10																		
417	✓🔧	100%	MOVIMIENTO DE TIERRA	245.2 días	10-02-23	28-12-23																									
418	✓🔧	100%	Excavación material compacto	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		
419	✓🔧	100%	Nivelación en fondo de zanja	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		
420	✓🔧	100%	Asiento de arena	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		
421	✓🔧	100%	Suministro de material de mina	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		
422	✓🔧	100%	Relleno compactado con compactador mecánico	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		
423	✓🔧	100%	Bote de material con camón (d= 5 km)	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC			10-02			28-12																		

Project: Acueducto Navarrete


Date: 26-05-25

Tarea		Agrupar por síntesis		Hito externo		solo duración		Fecha limite
División		Tarea resumida		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso
Hito		Hito resumido		Hito inactivo		Resumen manual		
Resumen		Progreso resumido		Resumen inactivo		solo el comienzo		
Resumen del proyecto		Tareas externas		Tarea manual		solo fin		



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% complet	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
424	✓	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA	245.3 días	10-02-23	28-12-23		
425	✓	100%	Suministro y Colocacion de Tuberia de Ø24" Hierro Ductil C25	123 días	10-02-23	28-12-23	2CC	
426	✓	100%	Suministro y Colocacion de Tuberia de Ø20" PVC SDR 21	33 días	16-05-23	30-10-23	425CC+20 días	
427	✓	100%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (Codos y Anclajes en HA)	125 días	10-02-23	28-12-23	425CC	
428	✓	100%	COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE DESAGÜE	10 días	05-03-24	07-06-24	425CC+90%,431	
429		0%	COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE	10 días	10-10-25	23-10-25	425CC+90%,428,438,446	
430	✓	100%	CONSTRUCCION DE BYPASS Y CONEXIÓN A TANQUE EXISTENTE	30 días	30-04-24	12-11-24	437CC-2 días	
431	✓	100%	CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA VÁLVULAS	20 días	12-12-23	05-03-24	425CC+90%	
432	✓	100%	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO	125 días	10-02-23	28-12-23	412CC	
433	✓	100%	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	125 días	10-02-23	28-12-23	412CC	
434		75%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CRUCES ELEVADO HIERRO DUCTIL	576.5 días	21-09-23	10-10-25		
435	✓	100%	GESTIÓN DE COMPRAS DE MATERIALES	109 días	21-09-23	23-02-24	425CC+50%	
436	✓	100%	Aprobación diseño estructural INAPA	0 días	20-05-24	20-05-24		
437	✓	100%	Obra civil de los cruces elevados UFE	10 días	29-05-24	11-06-24	436	
438		0%	Cruce elevado en Canal Ulises Espailat LC 24" H.D.	50 días	05-05-25	07-07-25		
439		0%	Empalme 1	20 días	05-05-25	29-05-25	437	
440		0%	Empalme 2	15 días	18-06-25	07-07-25	439FC+15 días	
441		59%	Cruce elevado en Puente Arroyo LC 24" H.D.	205 días	23-01-25	10-10-25	436	
442	✓	100%	Construcción muros de gaviones y suelo cemento	15 días	23-01-25	03-03-25	436	
443	✓	100%	Construcción de pilotes	5 días	04-03-25	10-03-25	442	
444	✓	100%	Fundaciones y pedestales cruce elevado Arroyo	4 días	26-03-25	31-03-25	443	
445	✓	100%	Instalación de estructura (incluye tuberías HD)	5 días	08-04-25	14-04-25	444	
446		0%	Construcción de Z cruce Cañada Arroyo Guanabano	20 días	16-09-25	10-10-25	445,438	
447	✓	100%	Cruce de Alcantarilla en cañada (Zona Franca) LC 24" H.D.	30.7 días	15-03-24	26-04-24		
448	✓	100%	Replanteo y demolición de aceras	3 días	15-03-24	02-04-24	425FC+58 días	
449	✓	100%	Instalación mecánica	12 días	08-04-24	26-04-24	448	
450	✓	100%	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	56 días	15-04-24	26-06-24		
451	✓	100%	Preparación para imprimación (corte, bote y colocación base)	8 días	15-04-24	24-04-24	422FC+5 días	
452	✓	100%	Imprimación sencilla	1 día	13-05-24	27-05-24	451	
453	✓	100%	Suministro y colocación de Asfalto e=2" (Incluye Riego de Adherencia)	2 días	24-06-24	25-06-24	452	
454	✓	100%	Limpieza final	1 día	26-06-24	26-06-24	453	
455		0%	Fin de Proyecto	0 días	07-03-26	07-03-26	5,318,337,411	
456		0%	Entrega de Proyecto	0 días	07-03-26	07-03-26	455,5	

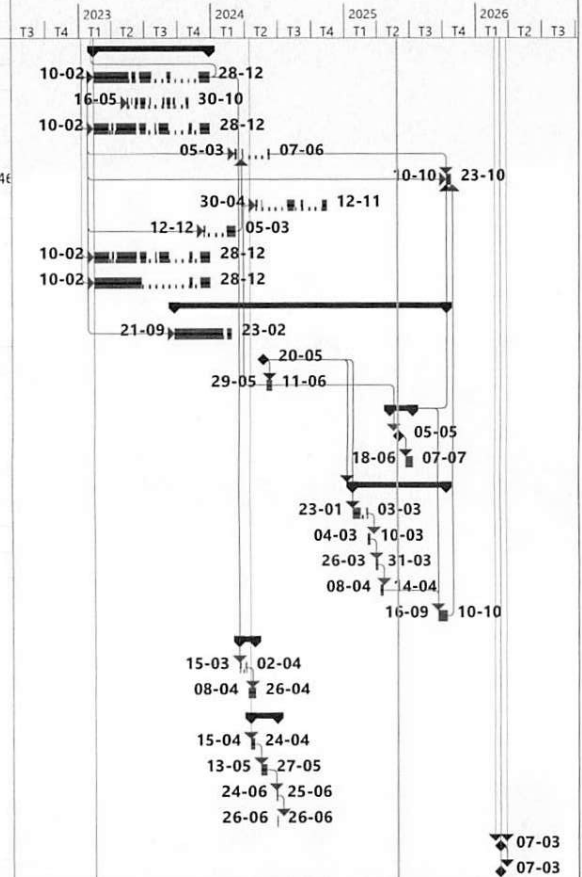

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas

Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin


Fecha limite
Progreso





[Handwritten signature]



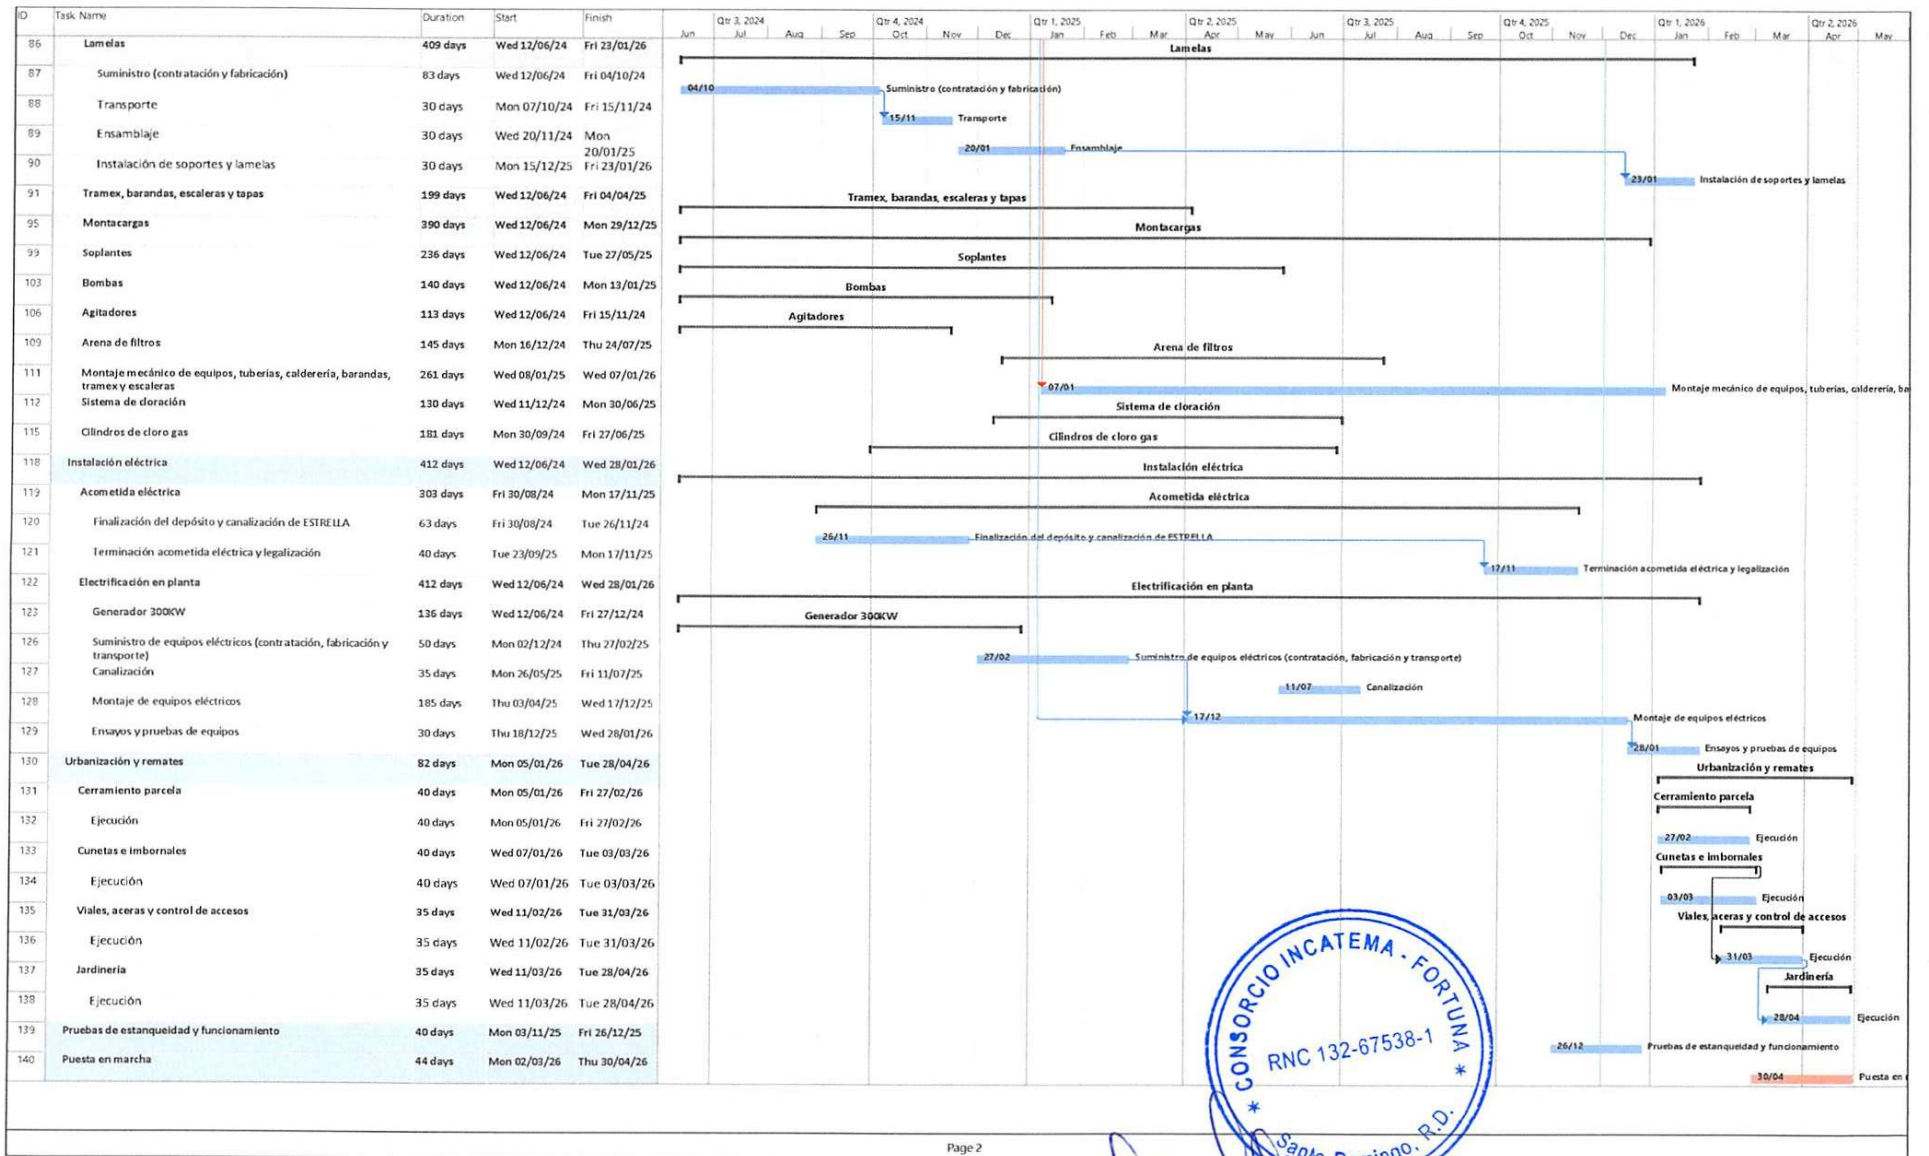

[Handwritten signature]
