



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- Terminación Alcantarillado Sanitario Juan Dolio y Guayacanes Parte B

Contrato:

-053/2005

Contratista:

- Constructora Montebianco, S.R.L.

Fecha de Cubicación:

-Desde 1/9/2025, hasta 15/10/2025

Cubicación:

-18

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Redes Colectoras:**
 - Colocación de tuberías 21,587 ml (Varios Diámetros).
 - Registros Prefabricados 440 uds.
 - Acometidas Domiciliarias 1,332 uds.
- **Estaciones de bombeo (6mx8m) 5uds.**
- **Línea de Impulsión:**
 - Colocación de tuberías 7,585.61 ml (Varios Diámetros).

Avance actual del proyecto

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos: | Enero 2022. |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%: | 15 Diciembre 2021 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 78% |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Resumen de actividades


En esta cubicacion se estan presentando los trabajos ejecutados en la calle 20 y 10 de septiembre de San Pedro de Macoris en la ejecucion del pluvial, los trabajos ejecutados en las estaciones de bombeo de esta provincia con la instalacion de las bombas nuevas, transformadores, paneles electricos, arrancadores suaves y rehabilitacion general de las 4 estaciones de bombeo.



La instalacion de las tuberias que completan las redes que aportan a la Estacion de Bombeo 4 de Juan Dolio, ademas de los hormigones de dicha estacion de bombeo.

Guayacanes se completa el total de las tuberias a colocar en las redes y linea de impulsion (compra por parte del contratista de la cantidad total para asegurar precio actual), tambien el 50% de los registros para la compra de estos.




Héctor López
Ing. Héctor A. López L.


Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras





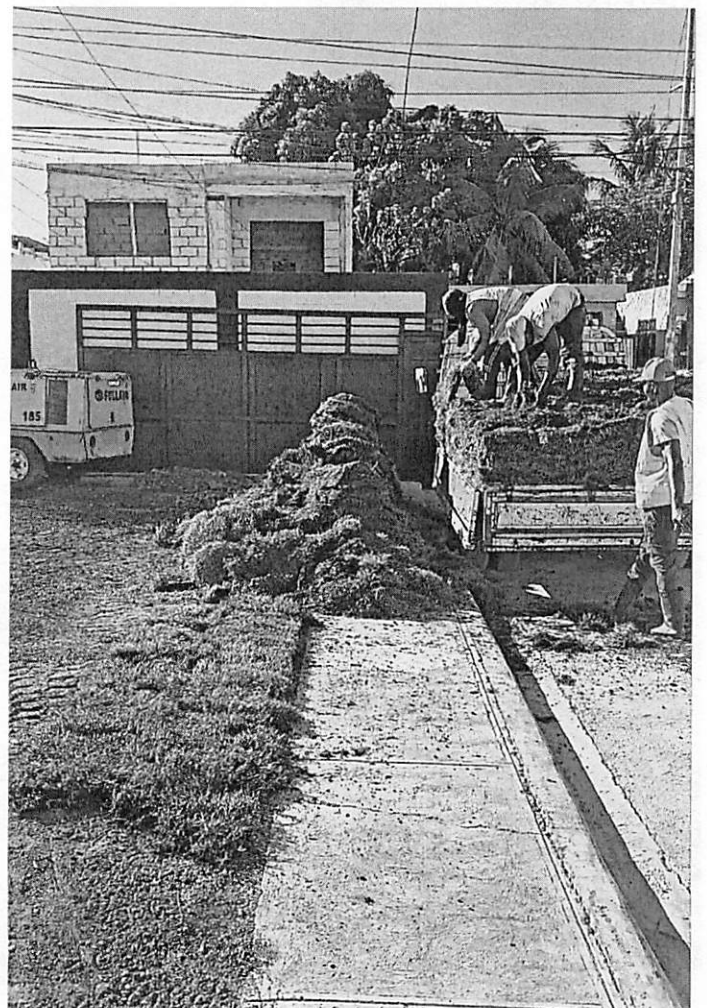
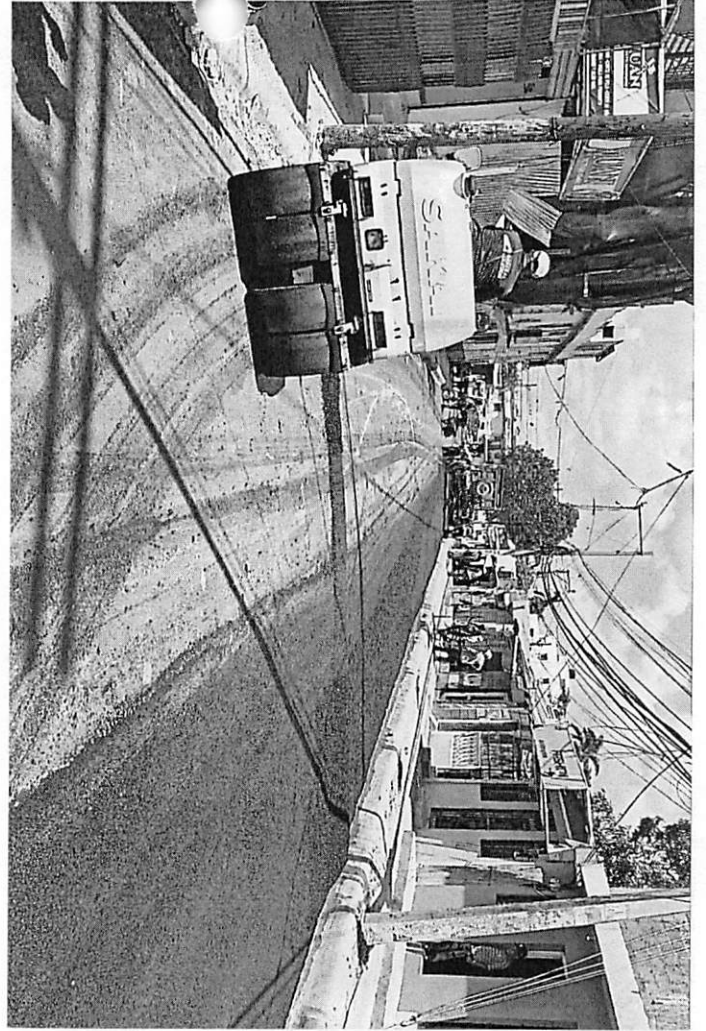





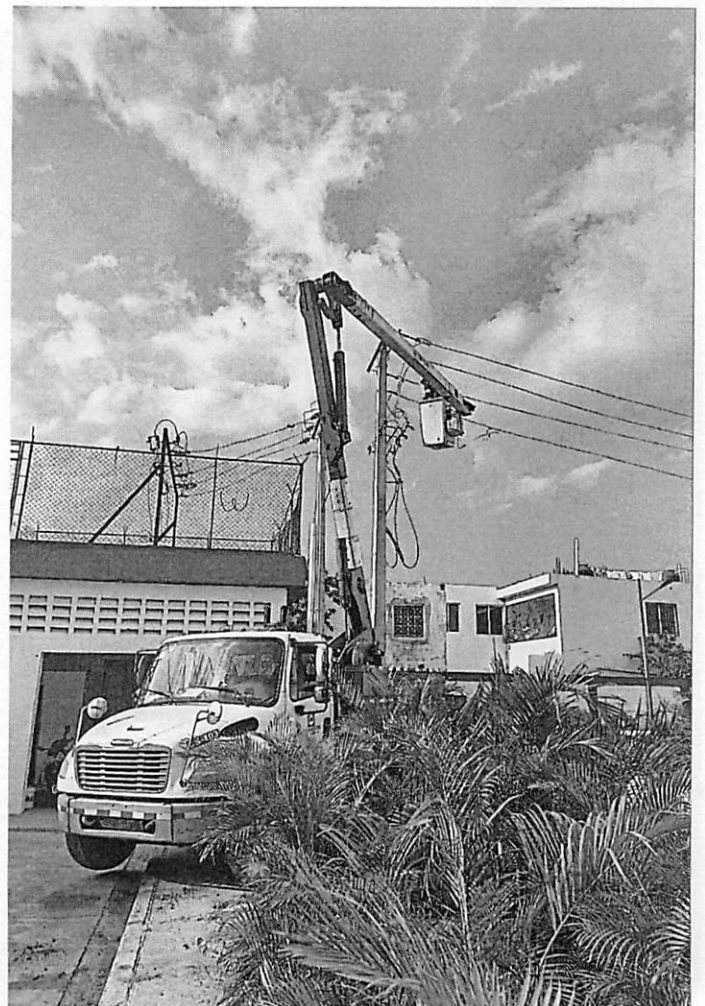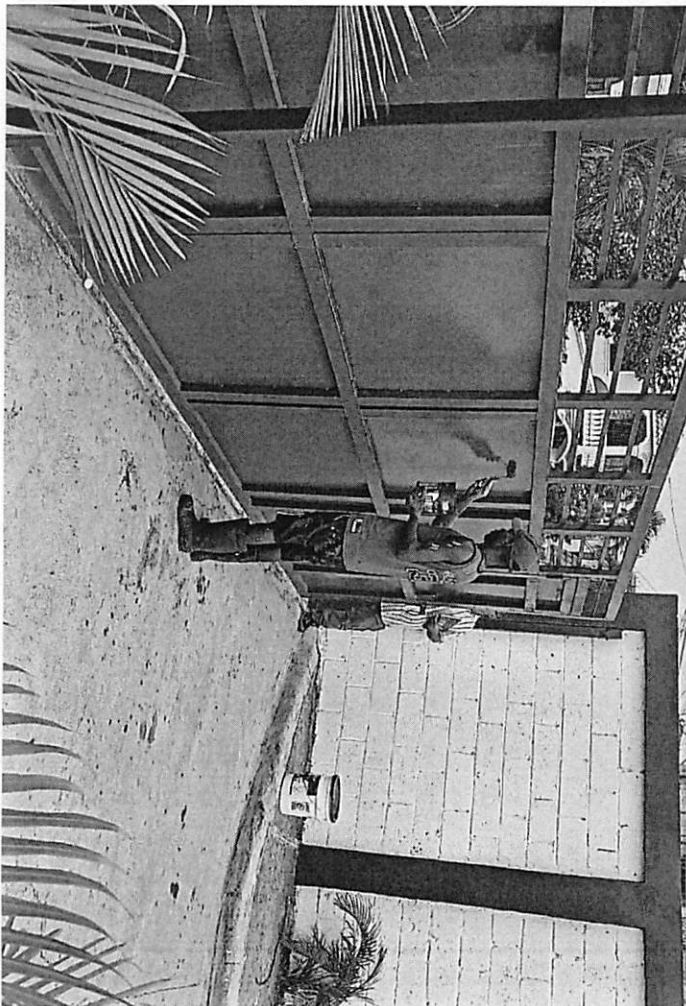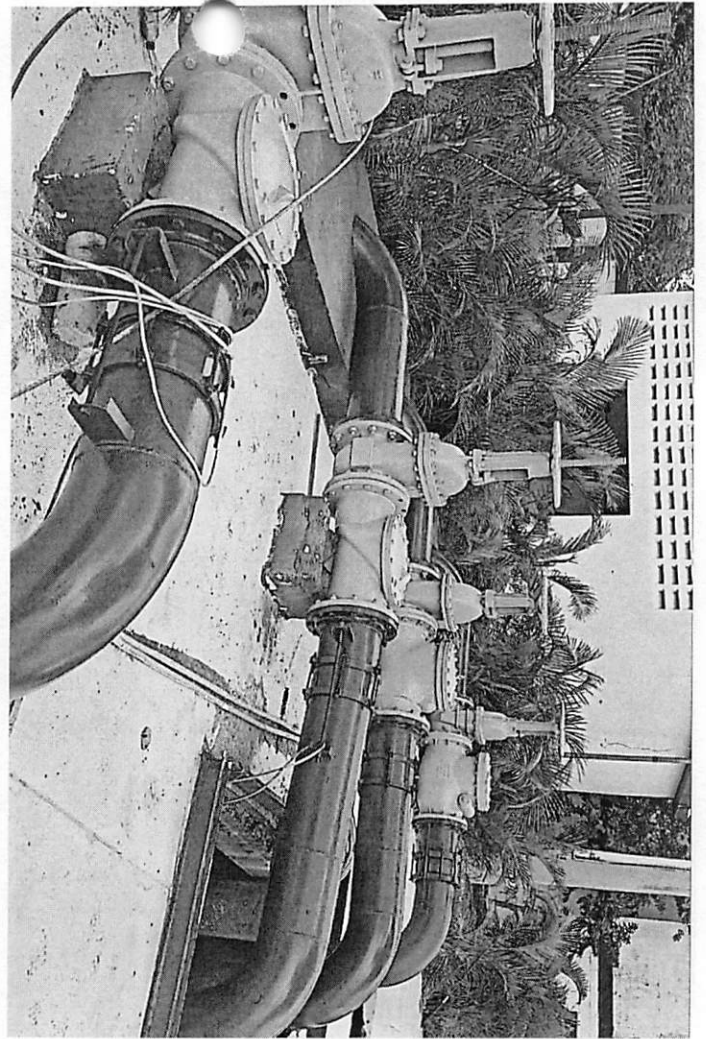

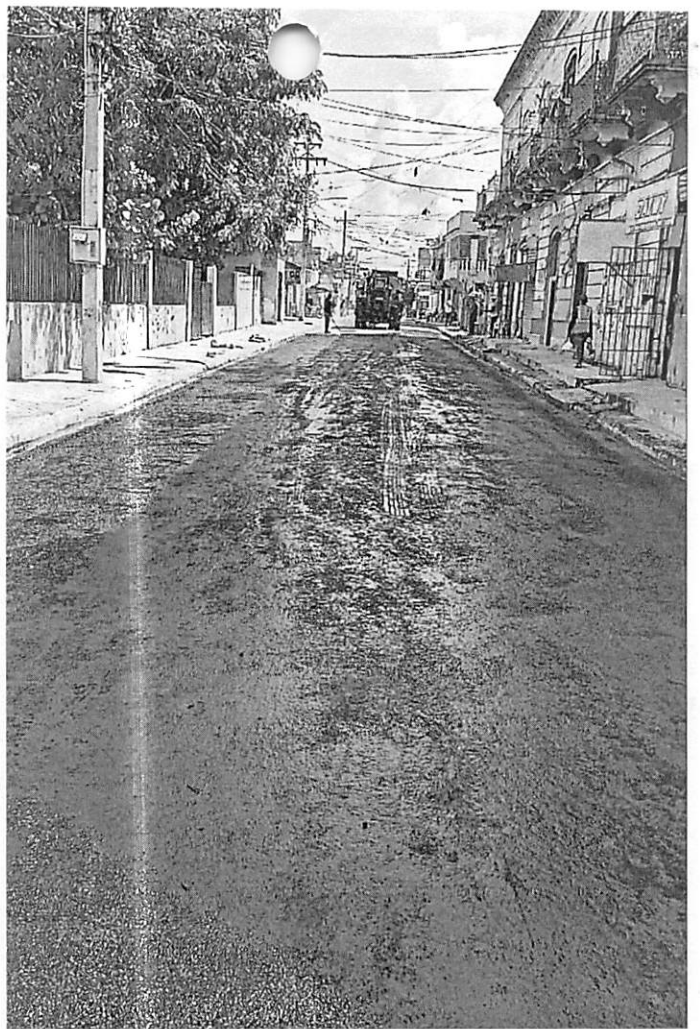

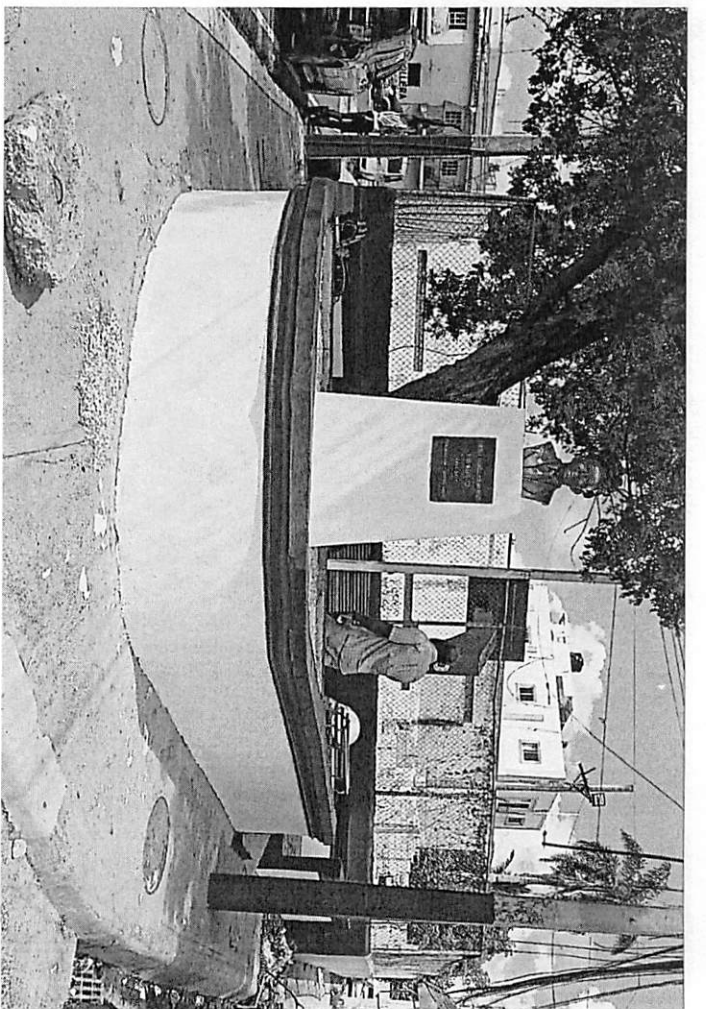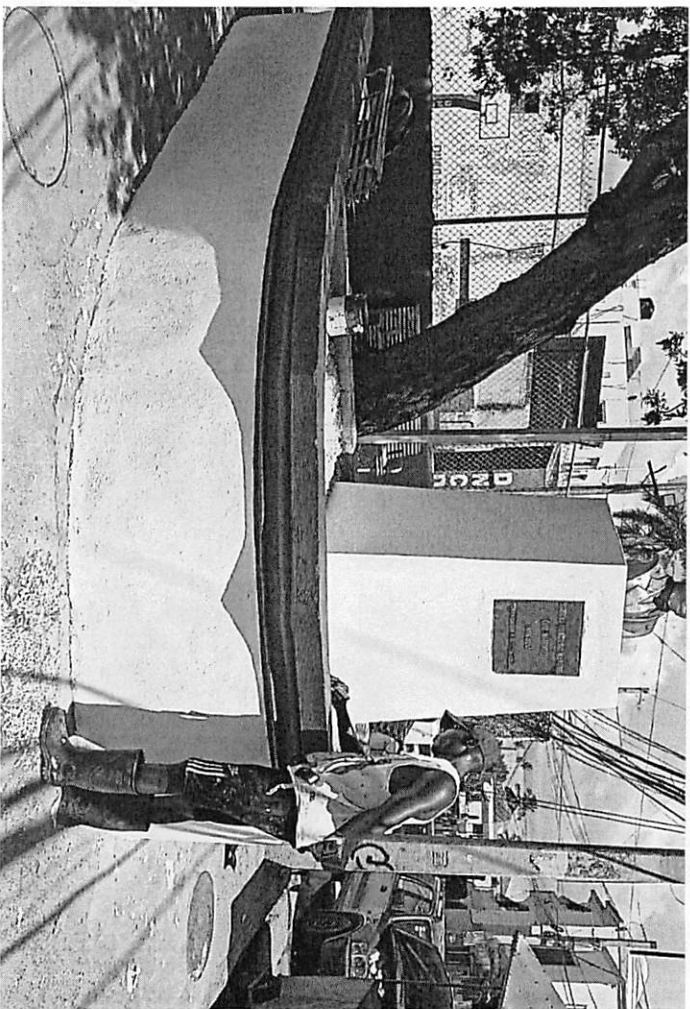

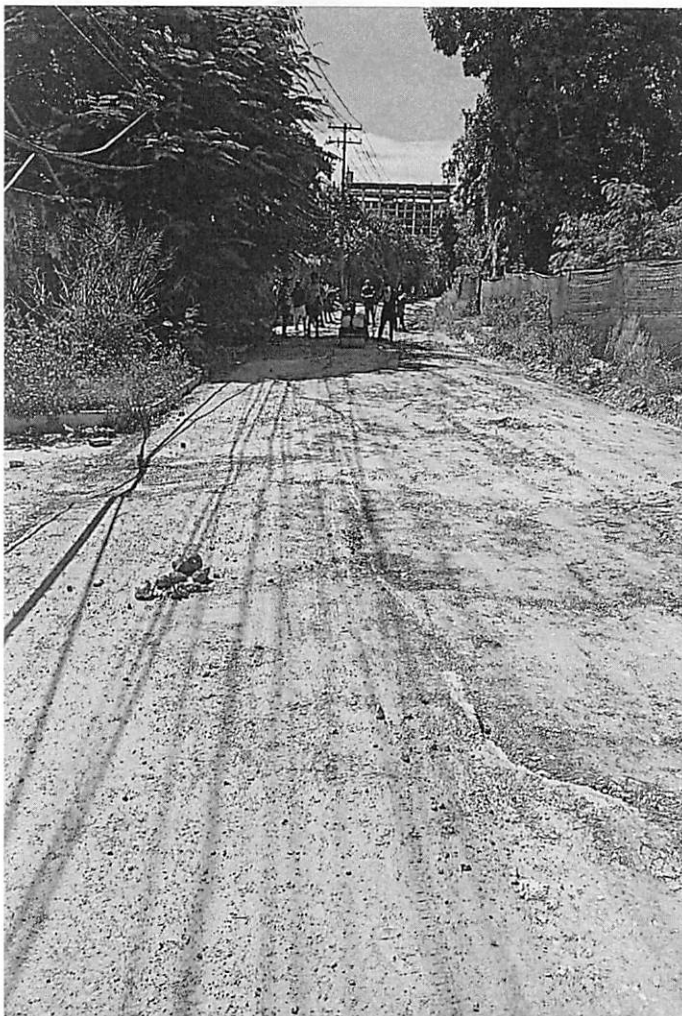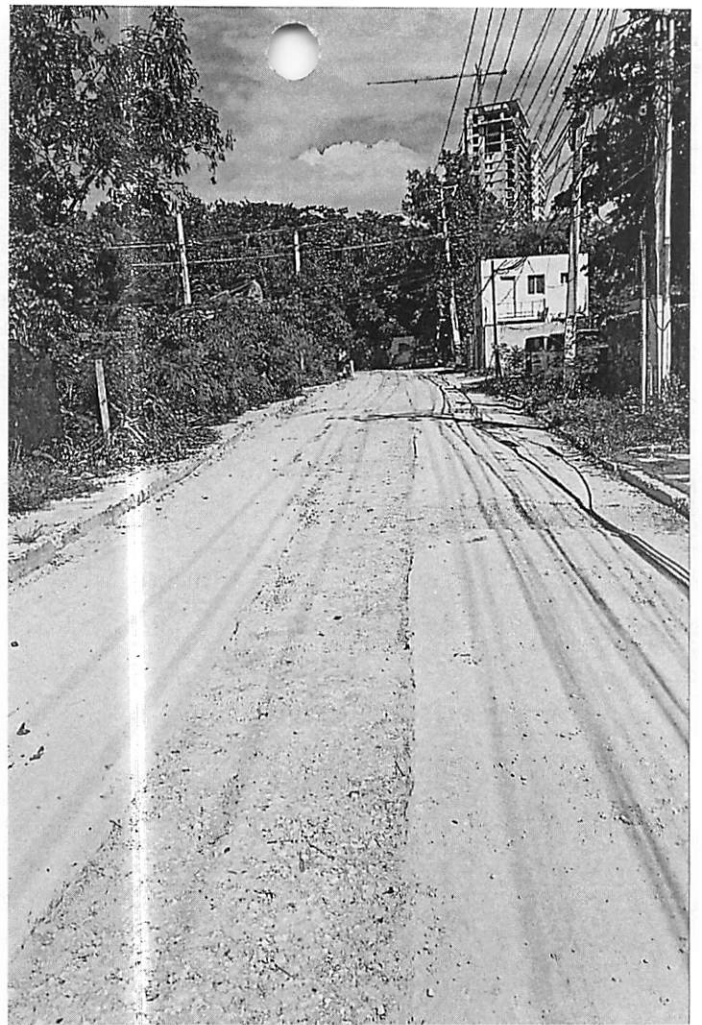

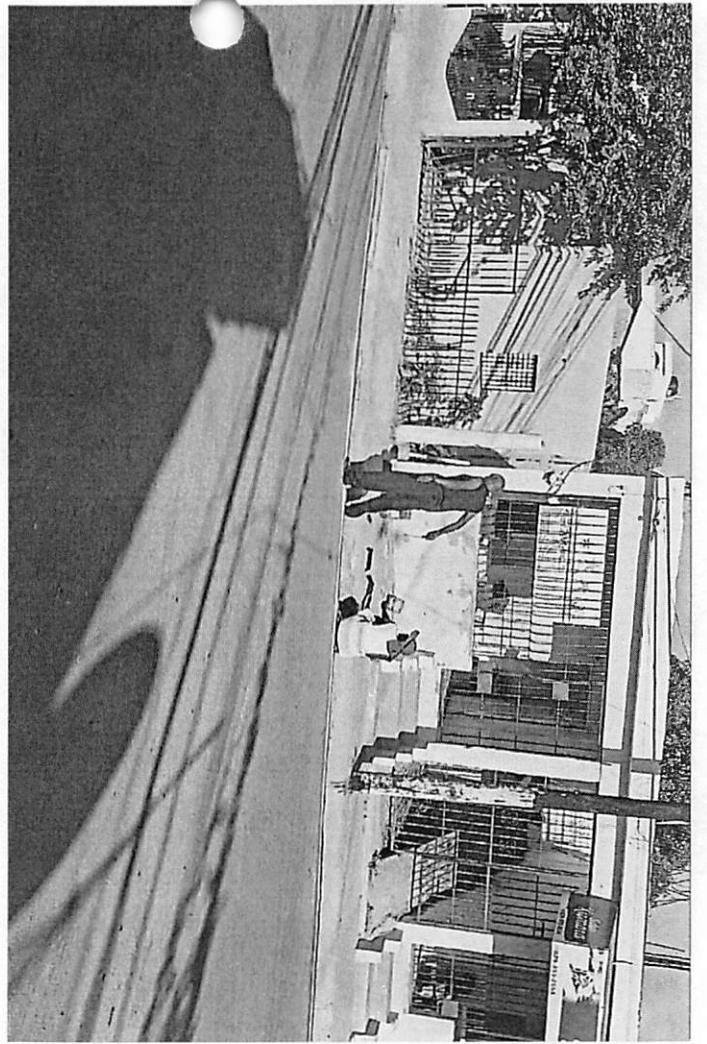





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

18-11-2025

INFORME TÉCNICO

Cub. 19

Proyecto:

- Terminación Alcantarillado Sanitario Juan Dolio y Guayacanes Parte B

Contrato:

-053/2005

Contratista:

- Constructora Montebianco, S.R.L.

Fecha de Cubicación:

-Desde 16/10/2025, hasta 15/11/2025.

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Redes Colectoras:**
 - Colocación de tuberías 21,587 ml (Varios Diámetros).
 - Registros Prefabricados 440 uds.
 - Acometidas Domiciliarias 1,332 uds.
- **Estaciones de bombeo (6mx8m) 5uds.**
- **Línea de Impulsión:**
 - Colocación de tuberías 7,585.61 ml (Varios Diámetros).

Avance actual del proyecto

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos: | Enero 2022. |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20%: | 15 Diciembre 2021 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 68.56% |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

En la presente cubicación se están presentando el completo para la compra de los registros HA a ser utilizados en las redes colectoras del municipio de Guayacanes, así asegurar los precios de suministro con los suplidores. También se están cubriendo un porcentaje del PA para la ejecución de la Estación de Bombeo 03 de Juan Dolio.

Héctor A. López
Ing. Héctor A. López L.

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

