



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
02 de marzo del 2025

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 5
PERIODO DE EJECUCION DESDE 07-04-2025 AL 05-05-2025

Referencia : **Obra:** Redes, Guanuma Segunda Parte, Provincia Santo Domingo-Monte Plata
Contrato: 041/2021
Contratista: Grupo Caspitel S.R.L.
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Red de Distribución comunidad Guanuma (E- 2+920 A 3+180), N/A por nudos

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Suministro y colocación de 1877.16 ml de Tuberías Ø3" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, 1474.96 ml de suministro y colocación de Tuberías Ø6" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, 678.30 ml de suministro y colocación de Tuberías Ø4" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana.
- Suministro y Colocación de Piezas Especiales.
- Suministro y Colocación de 6 Válvulas de Compuerta de "3 platillada incl. 2 juntas de gomas, 2 Niple Platillados, 2 juntas mecánicas tipo Dresser y 2 pares de tornillos
- Suministro y Colocación de 5 Válvulas de Compuerta de 4" platillada incl. 2 juntas de gomas, 2 Niple Platillados, 2 juntas mecánicas tipo Dresser y 2 pares de tornillo
- Suministro y Colocación de 4 Válvulas de Compuerta de 6" platillada incl. 2 juntas de gomas, 2 Niple Platillados, 2 juntas mecánicas tipo Dresser y 2 pares de tornillos
- 4 Cajas telescópicas.
- Prueba Hidrostática.
- Corte, Suministro y Colocación de Asfalto.
- Extracción de asfalto
- Bote Carpeta asfáltica

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta cubicación se procede a cubicar el equilibrio económico Presupuesto de Equilibrio Económico Partidas Cubicadas D/F Jun 2023

Porcentaje de ejecución es de 74.10%

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Willys F. Sánchez M
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisor de Obras

MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

04 de marzo 2026

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO. 5 PERIODO DE EJECUCION DESDE 07-04-2025 AL 05-05/2025

Referencia : **Obra:** Redes Los Rieles y Primera Parte Guanuma, Provincia Santo Domingo-
Monte Plata, lote I
Contrato: 024/2021
Contratista: Ing. Edward Núñez Viola
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Red de distribución en la comunidad de Guanuma primera parte, la cual contempla suministro y colocación de 4330.92ml de Tuberías Ø3" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, 704.52 ml de suministro y colocación de Tuberías Ø6" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, 341.70 ml de suministro y colocación de Tuberías Ø4" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana
- Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva,
- Suministro y Colocación de 1 Válvulas de Desagüe de 3" H.F. 200 PSI Platillada incl. 2 juntas Dresser, 2 niples Platillados, 2 juntas mecánicas tipo dresser y 2 pares de tornillos, 1 caja telescópica, 360 ud acometidas rurales, 15 ud acometidas urbanas
- Prueba Hidrostática.
- Corte, Suministro y Colocación de Asfalto.
- Extracción de asfalto.
- Bote Carpeta asfáltica.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta cubicación se procede a cubicar el equilibrio económico Presupuesto de Equilibrio Económico Partidas Cubicadas D/F Jul 2023

Porcentaje de ejecución es de 74.97%

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Willys F. Sánchez
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisor de Obras

MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

**Santo Domingo, D.N.
03 de enero del 2026**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 7 FINAL
PERIODO DE EJECUCION DESDE 07-01-2026 AL 02-02-2026***

Referencia : Obra: Línea De Conducción de 12'' Tramo Desde 6+419.80.80 Hasta Est. 7+435.60, Provincia Santo Domingo-Monte Plata, Lote IV
Contrato: 025-2021
Contratista: Juan Alberto Castro Peña
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.7 Final

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

Esta obra contempla la Línea de Conducción Tramo desde 6+419.80 hasta Est. 2+435.60, Suministro y Colocación de 1056.43ml tuberías Ø12" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 4 %Perd. P/Campana, 907.64 ml de tuberías Ø6" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Perd. P/Campana, 479.40 ml de tuberías Ø4" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, Prueba Hidrostática para tuberías de tuberías de Ø12", Ø6"y Ø4", Suministro y Colocación Piezas Especiales con Protección Anticorrosiva, Suministro y Colocación de 1ud. Válvula de Desague Ø4" H.F. Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), Válvula de aire combinada Ø2" H.F. 150 psi Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados dos juntas mecánicas tipo dresser y dos pares de tornillos), 7ud. Caja Telescópica para Válvula, Corte, Suministro y Colocación de Asfalto.


II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se encuentra en un 100% de ejecución, se procede a cubicar Presupuesto De Equilibrio Económico Financiero Partidas no cubicadas y Partidas Cubicadas, así como la devolución de retenido.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Milagros Corletto Q.
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

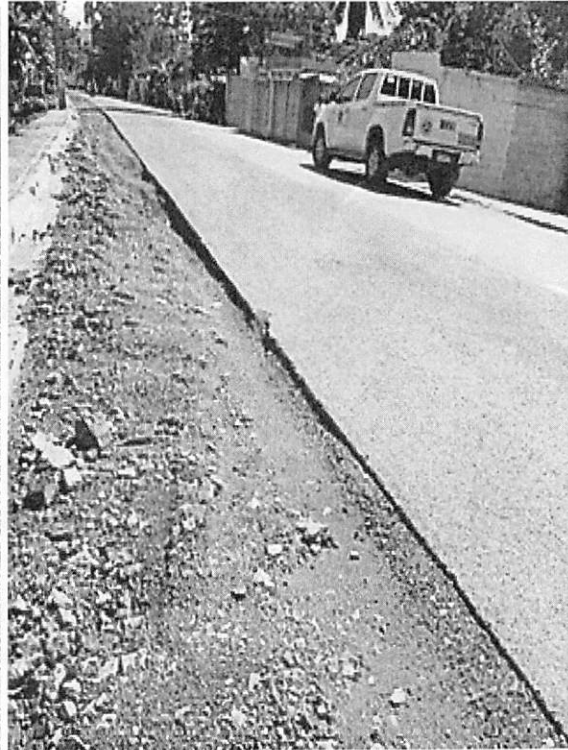



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

**Santo Domingo, D.N.
03 de enero de 2026**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.6 FINAL
PERIODO DE EJECUCION DESDE 8-01-2026 AL 02-02-2026***

**Referencia : Obra: Línea De Conducción 8" PVC Desde Est. (7+435.60) hasta (9+435.60), Provincia Santo Domingo-Monte Plata. ✓
Contrato: 018/2021 ✓
Contratista: Ing. Katusca Maholi Monegro Villafañá ✓
Provincia: Monte Plata**

Anexo : - Reporte de Cubicación No.6 Final ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Línea Conducción Desde Est. (7+435,60) Hasta Est. (9+035,60), Suministro y Colocación de 1,648 m Tuberías Ø8" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Per. P/Campana,
- Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva,
- Suministro y Colocación de 4 Válvulas de Compuerta Ø 3" y 3 de Ø 4" H.F. (Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple Platillado de Ø X 12", Junta Dresser Ø, Movimiento de Tierra y Mano de Obra) 150 PSI Platillada Completa, 2 válvulas de Desagüe de Ø 4" H.F. 200 PSI Platillada Completa (Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple Platillado de Ø X 12", Junta Dresser Ø, Tee de Acero del Ø y Un Tubo Acero del Ø), y 3 Válvula de Aire Combinada Ø2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), Válvula de Aire Combinada Ø2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos)
- 10 Caja Telescópica para Válvula,
- 2 Registro P/Válvulas de Aire, Según Detalle
- Prueba Hidrostática
- Corte, Suministro y Colocación de Asfalto
- Suministro y Colocación de Hidrante (Incluye Hidrante, Juntas Dresser, Válvula de Compuerta, Niple, Tee, Codo, Movimiento de Tierra, Anclaje y Mano de Obra).

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se encuentra en un 100% de ejecución, se procede a cubicar Presupuesto De Equilibrio Económico Financiero Partidas no cubicadas y Partidas Cubicadas, así como la devolución de retenido.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Milagros Corletto Q.
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA

