


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2024			tri 3, 2024			tri 4, 2024			tri 1, 2025			tri 2, 2025		
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
1		<b>CONSTRUCCION ACUEDUCTO MÚLTIPLE PUJADOR (OBRA DE TOMA, LÍNEA DE ADUCCIÓN, ESTACIONES DE BOMBEO, DEPÓSITOS REGULADORES SUPERFICIALES 600 M³ Y 150 M³ C/U CON SU VERJA PERIMETRAL EN BLOQUE Y LÍNEA DE IMPULSIÓN)</b>	261 días	lun 06/05/24	mié 28/05/25															
2		INICIO	0 días	lun 06/05/24	lun 06/05/24															
3		OBRA DE TOMA Y LINEA DE ADUCCION	205 días	mar 07/05/24	vie 07/03/25															
4		CAMINO DE ACCESO LONGITUD 237.15 M	15 días	mar 07/05/24	lun 27/05/24															
5		OBRA DE TOMA (CAJUELA DE CAPTACION, RIO CAÑO CLARO)	170 días	mar 28/05/24	jue 06/02/25															
6		LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE OBRA DE TOMA A CÁRCAMO DE BOMBEO	20 días	vie 07/02/25	vie 07/03/25															
7		ESTACION DE BOMBEO	90 días	jue 19/09/24	jue 06/02/25															
8		DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 600 M³, CASETA DE CLORACIÓN Y ESTACIÓN DE REBOMBEO	150 días	mar 07/05/24	vie 06/12/24															
9		LÍNEA DE IMPULSIÓN (DESDE DEPÓSITO REGULADOR DE 600 M³ HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 150 M³ )	30 días	lun 10/03/25	mar 22/04/25															
10		DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL 150 M³	110 días	lun 09/12/24	mié 28/05/25															
11		FIN	0 días	lun 06/05/24	lun 06/05/24															

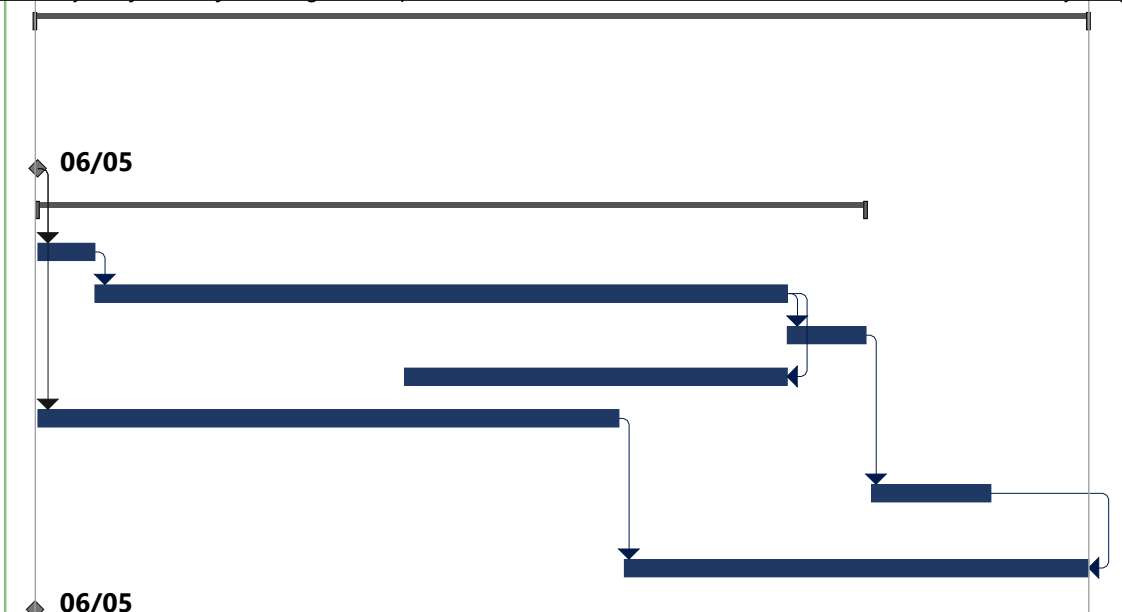

Proyecto: Programacion Const. Fecha: jue 25/04/24	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
