

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	Gantt Chart													
									14 nov '21	12 dic '21	9 ene '22	6 feb '22	6 mar '22									
1	✦	REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO, ACUEDUCTO MÚLTIPLE DUVERGÉ - LA COLONIA - VENGAN A VER	150 días	lun 22/11/21	mar 31/5/22				M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J		
2	✦	REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL)	50 días	lun 22/11/21	lun 24/1/22																	
3	✦	ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÓSITO	14.5 días	lun 22/11/21	jue 9/12/21																	
4	✦	Limpieza del área exterior	3 días	lun 22/11/21	jue 25/11/21		6	Trabajador 01														
5	✦	Nivelación con equipo	3.5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	6	7	Rodillo SD-100D o simil														
6	✦	Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60)	3 días	jue 25/11/21	lun 29/11/21	4	5	Trabajador 03														
7	✦	Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95%	3 días	vie 3/12/21	mar 7/12/21	5	9	Brigada Topográfica con Estación Total - Todo Costo;Rodillo Bote y carga a mano en camión 6M3[1];Trabajador 05														
8	✦	Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km)	1 día	mié 8/12/21	jue 9/12/21	9	11	6M3[1];Trabajador 05														
9	✦	Embellecimiento con gravilla	1 día	mar 7/12/21	mié 8/12/21	7	8	gravilla 3/4 @ 3/8"[1];														
10	✦	DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO:	9 días	jue 9/12/21	mar 21/12/21																	
11	✦	Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 apertura)	1 día	jue 9/12/21	vie 10/12/21	8	12	Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a														
12	✦	Desmote y retiro de fondo (a=53.46 m²)	3 días	vie 10/12/21	mié 15/12/21	11	13	Trabajador 08														
13	✦	Rotura de concreto en fondo	3 días	mié 15/12/21	sáb 18/12/21	12	14	Trabajador 09														
14	✦	Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km	2 días	sáb 18/12/21	mar 21/12/21	13	16	Bote y carga a mano en camión 6M3[1];Trabajador 10														
15	✦	EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO)	3 días	mar 21/12/21	vie 24/12/21																	
16	✦	Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60)	2 días	mar 21/12/21	jue 23/12/21	14	17	Trabajador 11														
17	✦	Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km)	1 día	jue 23/12/21	vie 24/12/21	16	20	Bote y carga a mano en camión 6M3[1];Trabajador 12														
18	✦	SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN	5 días	vie 24/12/21	vie 31/12/21																	
19	✦	Suministro y colocación arena lavada e=0.15 m +20% esponjamiento (53.46X0.15)	1.5 días	mar 28/12/21	jue 30/12/21	22	21	Arena gruesa Itabo lavada[1];Trabajador 13														
20	✦	Suministro material de base (caliche) e=0.60 m + 20% esponjamiento (53.46X0.20) m	1.5 días	vie 24/12/21	lun 27/12/21	17	22	Trabajador 14														
21	✦	Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm²	1 día	jue 30/12/21	vie 31/12/21	19	24;28	Trabajador 15														
22	✦	Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m	1 día	lun 27/12/21	mar 28/12/21	20	19	Trabajador 16														

Proyecto: Rehabilitación Depósito Fecha: mar 9/11/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	14 nov '21	12 dic '21	9 ene '22	6 feb '22	6 mar '22
									M	S	X	D	J
71		SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN	5 días	sáb 25/12/21	vie 31/12/21								
72		Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15)	1.5 días	mié 29/12/21	jue 30/12/21	75	74	Arena gruesa Itabo lavada[1];Trabajador 62					
73		Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20)	1.5 días	sáb 25/12/21	mar 28/12/21	70	75	Caliche[1];Trabajador 63					
74		Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm²	1 día	jue 30/12/21	vie 31/12/21	72	77;81	Trabajador 64					
75		Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m	1 día	mar 28/12/21	mié 29/12/21	73	72	Trabajador 65					
76		REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÓSITO	6 días	vie 31/12/21	sáb 8/1/22								
77		Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8'	3 días	vie 31/12/21	mié 5/1/22	74	78	Tolas, esp.=3/8" en plancha 4'x8'[1];Trabajador 65					
78		Cartabones refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8" L=20') rolad en frío	2 días	mié 5/1/22	vie 7/1/22	77	79	Trabajador 66					
79		Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70 m2)	1 día	vie 7/1/22	sáb 8/1/22	78	90	Trabajador 67					
80		REPARACIÓN EN TUBERIA DE DESAGÜE EN INTERIOR	6.5 días	vie 31/12/21	lun 10/1/22								
81		Desmote tubería de ø6" acero	0.5 días	vie 31/12/21	sáb 1/1/22	74	82	Trabajador 68					
82		Suministro tubería acero sin costura ø6" sch-40	0.5 días	sáb 1/1/22	lun 3/1/22	81	83	Trabajador 69;Suministro tubería					
83		Colocación tubería acero sin costura ø6" sch-40	0.5 días	lun 3/1/22	lun 3/1/22	82	84	Colocación tubería acero sin costura ø6"					
84		Suministro y colocación Codo ø6" x 90 acero sch-40	0.5 días	lun 3/1/22	mar 4/1/22	83	85	Trabajador 71					
85		Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías	0.5 días	mar 4/1/22	mar 4/1/22	84	86	Trabajador 72					
86		Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación)	0.5 días	mar 4/1/22	mié 5/1/22	85	87	Construcción escalera interior y exterior de depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @					
87		Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" ; (incluye suministro y colocación)	0.5 días	mié 5/1/22	mié 5/1/22	86	88	Trabajador 74					
88		Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m	3 días	mié 5/1/22	lun 10/1/22	87	90	Trabajador 75;Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bom					
89		APLICACIÓN DE SAND BLASTING (INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO), EN:	3 días	lun 10/1/22	jue 13/1/22								
90		Cilindro interior	0.5 días	lun 10/1/22	lun 10/1/22	88;79	92	Trabajador 76					
91		Cilindro exterior	0.5 días	mar 11/1/22	mié 12/1/22	94	93	Trabajador 77					
92		Cúpula interior	0.5 días	lun 10/1/22	mar 11/1/22	90	94	Trabajador 78					

Proyecto: Rehabilitación Depósito Fecha: mar 9/11/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	14 nov '21	12 dic '21	9 ene '22	6 feb '22	6 mar '22
93		Cúpula exterior	0.5 días	mié 12/1/22	mié 12/1/22	91	95	Trabajador 79	M	S	X	D	J
94		Fondo	0.5 días	mar 11/1/22	mar 11/1/22	92	91	Trabajador 80					
95		Tubería ø6"	0.5 días	mié 12/1/22	jue 13/1/22	93	97	Trabajador 81					
96		TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÓSITO	3 días?	jue 13/1/22	lun 17/1/22								
97		Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes	1 día?	jue 13/1/22	vie 14/1/22	95	98	Pintura Epóxica Sika -guard					
98		Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo	1 día?	vie 14/1/22	sáb 15/1/22	97	99	Pintura Epóxica Sika -guard 62[1];Trabajador 83					
99		Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo	1 día?	sáb 15/1/22	lun 17/1/22	98	101	Pintura Epóxica Sika -guard					
100		PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA)	1 día?	lun 17/1/22	mar 18/1/22								
101		Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6")	1 día?	lun 17/1/22	mar 18/1/22	99	105	Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo					
102		MISCELÁNEOS	5 días	mar 18/1/22	mar 25/1/22								
103		Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque.	1 día	mié 19/1/22	jue 20/1/22	105	104	Trabajador 86					
104		Ventilador	1 día	jue 20/1/22	vie 21/1/22	103	106	Trabajador 87					
105		Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.)	1 día	mar 18/1/22	mié 19/1/22	101	103	Trabajador 88					
106		Alquiler de andamio (cubicar según factura)	1 día	vie 21/1/22	lun 24/1/22	104	107	Trabajador 89					
107		Logo y letrero de INAPA en depósito	1 día	lun 24/1/22	mar 25/1/22	106	158						
108		REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METALICO SUPERFICIAL, CAPACIDAD 383 M³ (101,400 GL), DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA	125 días	lun 22/11/21	vie 29/4/22								
109		ACONDICIONAMIENTO ÁREA EXTERIOR DEL DEPÓSITO	15 días	lun 22/11/21	vie 10/12/21								
110		Limpieza del área exterior	3 días	lun 22/11/21	jue 25/11/21		112	Trabajador 90					
111		Nivelación con equipo	4 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	112	113	Trabajador 91;Motoniveladora 12H o similar[1]					
112		Suministro material de mina (caliche) de base e=0.30m+25% esponjamiento, D= km, (53.46x0.60)	3 días	jue 25/11/21	lun 29/11/21	110	111	Caliche[1];Trabajador 92					
113		Compactación con compactador mecánico en capas de 0.20m compactado al 95%	3 días	vie 3/12/21	mié 8/12/21	111	115	Alquiler compactador mecánico + transporte[1];Trabajador 93					
114		Bote de material sobrante (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5.00 km)	1 día	jue 9/12/21	vie 10/12/21	115	117	Bote y carga a mano en camión 6M3[1];Trabajador 94					
115		Embellacimiento con gravilla	1 día	mié 8/12/21	jue 9/12/21	113	114	Trabajador 95					
116		DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO:	6 días	vie 10/12/21	vie 17/12/21								

Proyecto: Rehabilitación Depósito
Fecha: mar 9/11/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica			
Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Progreso			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	14 nov '21	12 dic '21	9 ene '22	6 feb '22	6 mar '22							
									M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J
117		Apertura y cierre de hueco de (2.00x1.80)m acceso a interior deposito (1 abertura)	1 día	vie 10/12/21	sáb 11/12/21	114	118	Trabajador 96												
118		Desmonte y retiro de fondo (a=53.46 m²)	3 días	sáb 11/12/21	mié 15/12/21	117	119	Trabajador 97												
119		Bote de material con camión (incluye carguío y esparcimiento en botadero) D =5.00 km	2 días	mié 15/12/21	vie 17/12/21	118	121	Trabajador 98;Bote y carga a mano en camión 6M3[1]												
120		EXTRACCIÓN DE MATERIAL (DENTRO DEL DEPÓSITO)	3 días	vie 17/12/21	mié 22/12/21															
121		Extracción de material de base compacto a mano (53.46x0.60) m	2 días	vie 17/12/21	mar 21/12/21	119	122	Trabajador 99												
122		Bote de material (incluye carguío y esparcimiento en botadero) (D= 5 km)	1 día	mar 21/12/21	mié 22/12/21	121	125	Bote y carga a mano en camión 6M3[1];Trabajador												
123		SUMINISTRO MATERIAL DE REPOSICIÓN	5 días	mié 22/12/21	mar 28/12/21															
124		Suministro y colocación arena lavada e=0.15M+20% esponjamiento (53.46X0.15)	1.5 días	vie 24/12/21	lun 27/12/21	127	126	Trabajador 101;Arena gruesa Itabo lavada[1]												
125		Suministro material de base (caliche) e=0.40M + 20% esponjamiento (53.46X0.20)	1.5 días	mié 22/12/21	jue 23/12/21	122	127	Caliche[1];Trabajador 102												
126		Suministro y colocación de hormigón F'c=210kg/cm² o asfáltico. Incluye RC2, e=2"=0.05M	1 día	lun 27/12/21	mar 28/12/21	124	129;133	Trabajador 103												
127		Compactación al 95% del Proctor modificado con compactador mecánico en capas de 0.20m	1 día	jue 23/12/21	vie 24/12/21	125	124	Alquiler compactador mecánico + transporte[1];Trabajador												
128		REPARACIONES EN ESTRUCTURA INTERIOR DEL DEPÓSITO	6 días	mar 28/12/21	mié 5/1/22															
129		Sustitución: suministro e instalación tolas en fondo esp.=3/8" en plancha 4'x8'	3 días	mar 28/12/21	vie 31/12/21	126	130	Tolas, esp.=3/8" en plancha 4'x8'[1];Trabajador												
130		Refuerzo de fondo en (angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20')- rolado en frío	2 días	vie 31/12/21	mar 4/1/22	129	131	angular de 3" x 3" e=3/8 " L=20';Trabajador												
131		Resane hormigón simple en bordillo exterior (39.00 x 0.30)m (11.70m²)	1 día	mar 4/1/22	mié 5/1/22	130	138	Trabajador 107												
132		REPARACION EN TUBERIA DE DESAGÜE	4.5 días	mar 28/12/21	lun 3/1/22															
133		Aplicación de tratamiento anticorrosivo para tuberías	0.5 días	mar 28/12/21	mié 29/12/21	126	134	Trabajador 108												
134		Construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación)	0.5 días	mié 29/12/21	mié 29/12/21	133	135	Construcción escalera interior y exterior de depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ angulares 1½" x1½"[1];Tola de 1/4"[1];Trabajador												
135		Tapa (0.70 x 0.70) m en tola 1/4" y angulares 1½" x1½" : (incluye suministro y colocación)	0.5 días	mié 29/12/21	jue 30/12/21	134	136	angular 1½" x1½"[1];Tola de 1/4"[1];Trabajador												
136		Construcción de acera en hormigón simple F'c=180 kg/cm², ancho=1.00 m	3 días	jue 30/12/21	lun 3/1/22	135	138	Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)[1];Trabajador												

Proyecto: Rehabilitación Depósito
Fecha: mar 9/11/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	14 nov '21	12 dic '21	9 ene '22	6 feb '22	6 mar '22
									M	S	X	D	J
137		APLICACIÓN DE SAND BLASTING, EN:	2.5 días	mié 5/1/22	vie 7/1/22								
138		Cilindro interior	0.5 días	mié 5/1/22	mié 5/1/22	131;136	140	APLICACIÓN DE SAND E					
139		Cilindro exterior	0.5 días	jue 6/1/22	vie 7/1/22	142	141	APLICACIÓN DE SAND E					
140		Cúpula interior	0.5 días	mié 5/1/22	jue 6/1/22	138	142	APLICACIÓN DE SAND E					
141		Cúpula exterior	0.5 días	vie 7/1/22	vie 7/1/22	139	144	APLICACIÓN DE SAND E					
142		Fondo	0.5 días	jue 6/1/22	jue 6/1/22	140	139	APLICACIÓN DE SAND E					
143		TRATAMIENTO INTERIOR EN DEPÓSITO	3 días	vie 7/1/22	mié 12/1/22								
144		Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en paredes	1 día	vie 7/1/22	lun 10/1/22	141	145	Trabajador 117;Tratamiento con					
145		Tratamiento con recubrimiento epóxica Sika -guard 62 en tola de fondo	1 día	lun 10/1/22	mar 11/1/22	144	146	Trabajador 118;Tratamiento con recubrimiento epóxica					
146		Tratamiento con recubrimiento expósito Sika -guard 62 en techo	1 día	mar 11/1/22	mié 12/1/22	145	148	Tratamiento con recubrimiento epóxica					
147		PINTURA EXTERIOR EN DEPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA)	1 día	mié 12/1/22	jue 13/1/22								
148		Pintura epóxica tipo Amerlock 400 en exterior (pared, techo y tubería Ø6")	1 día	mié 12/1/22	jue 13/1/22	146	152	Pintura Epóxica Sika -guard 62[1];Trabajador 120					
149		MISCELÁNEOS	2.5 días	jue 13/1/22	lun 17/1/22								
150		Lámpara reflectora para iluminación interior de tanque.	0.5 días	jue 13/1/22	vie 14/1/22	152	151	Trabajador 121					
151		Ventilador	0.5 días	vie 14/1/22	vie 14/1/22	150	153	Trabajador 122					
152		Planta eléctrica (incluye combustible y transporte.)	0.5 días	jue 13/1/22	jue 13/1/22	148	150	Trabajador 123					
153		Alquiler de andamio (cubicar según factura)	0.5 días	vie 14/1/22	sáb 15/1/22	151	154	Trabajador 124					
154		Logo y letrero de INAPA en depósito	0.5 días	sáb 15/1/22	lun 17/1/22	153	158	Trabajador 125					
155		VARIOS	125 días	lun 22/11/21	vie 29/4/22								
156		Valla anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"	125 días	lun 22/11/21	vie 29/4/22		158	Trabajador 126					
157		Campamento (incluye alquiler del solar con o sin casa, baños móviles y caseta de materiales)	125 días	lun 22/11/21	vie 29/4/22		158	Trabajador 127					
158		Fin	0 días	vie 29/4/22	vie 29/4/22	157;154;107;54							

Proyecto: Reabilitación Depósit
Fecha: mar 9/11/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			



MOD o similar de 10 Tons.[1];Trabajador 04

osito (1 apertura);Trabajador 07

Proyecto: Rehabilitación Depósito
 Fecha: mar 9/11/21

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



mar '22 3 abr '22 1 may '22 29 may '22 26 jun '22 24 jul '22 21 ago '22 18 sep '22 16 oct '22 13 nov '22 11 dic '22 8 ene '23 5 feb '23
 J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V

br 17

[1];Trabajador 21

0;Trabajador 22

Trabajador 23

Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50m, apoyo cada 1.40m, (h=7.20m) (incluye instalación);Trabajador 25

Trabajador 26

Trabajador 28

Trabajador 29

Trabajador 30

Trabajador 31

Trabajador 32

Trabajador 32


Refrigerante epóxica Sika -guard 62

Refrigerante epóxica Sika -guard 62

Refrigerante epóxica Sika -guard 62

Proyecto: Rehabilitación Depósito Fecha: mar 9/11/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			



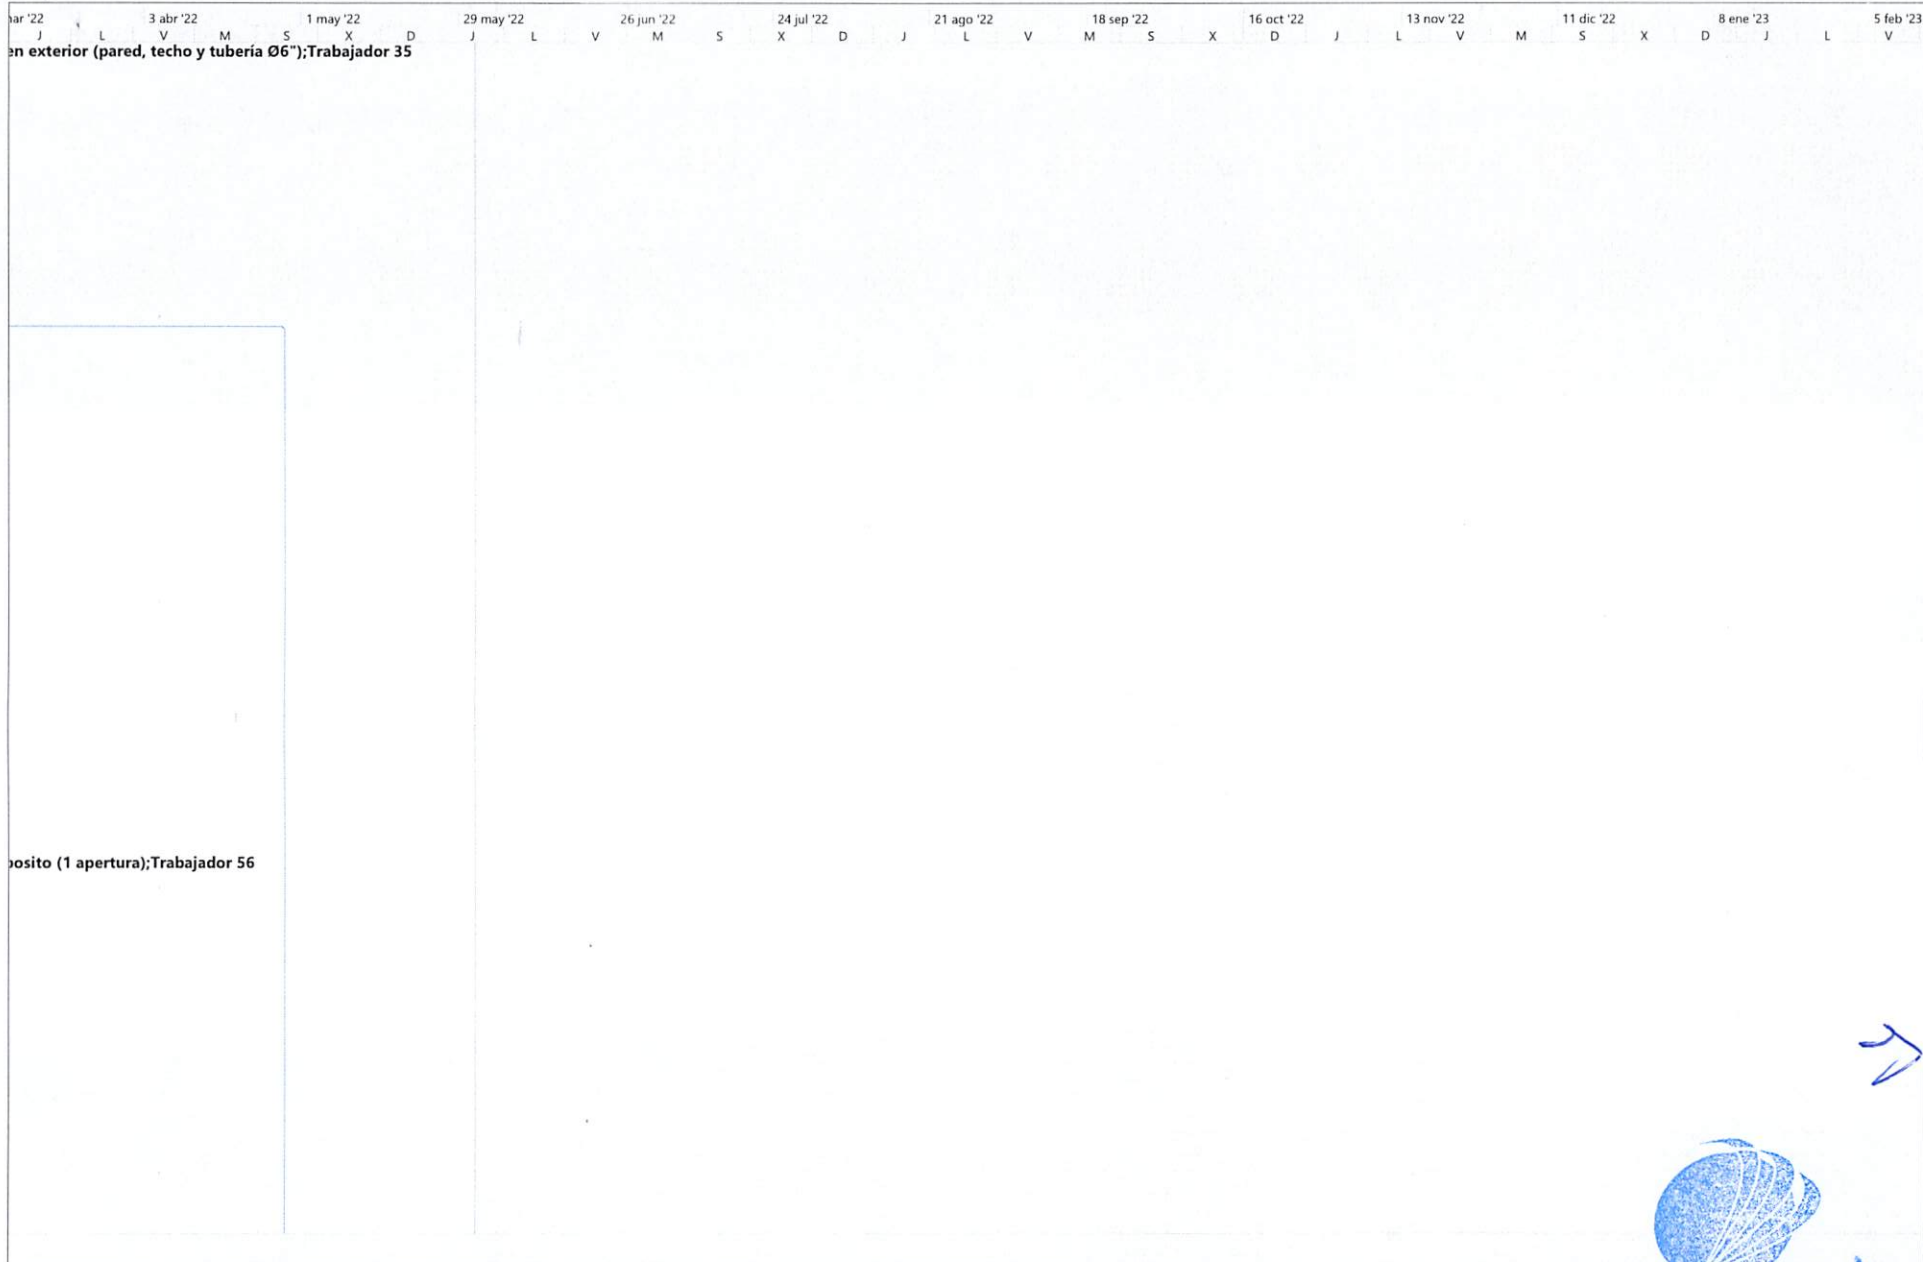

Proyecto: Rehabilitación Depósito Fecha: mar 9/11/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			





or 65

tura ø6" SCH-40[1]


10;Trabajador 70

epósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50m, apoyo cada 1.40m, (h=7.20m) (incluye instalación);Trabajador 73

luye bomba y colocación)[1]

Proyecto: Rehabilitación Depósito Fecha: mar 9/11/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



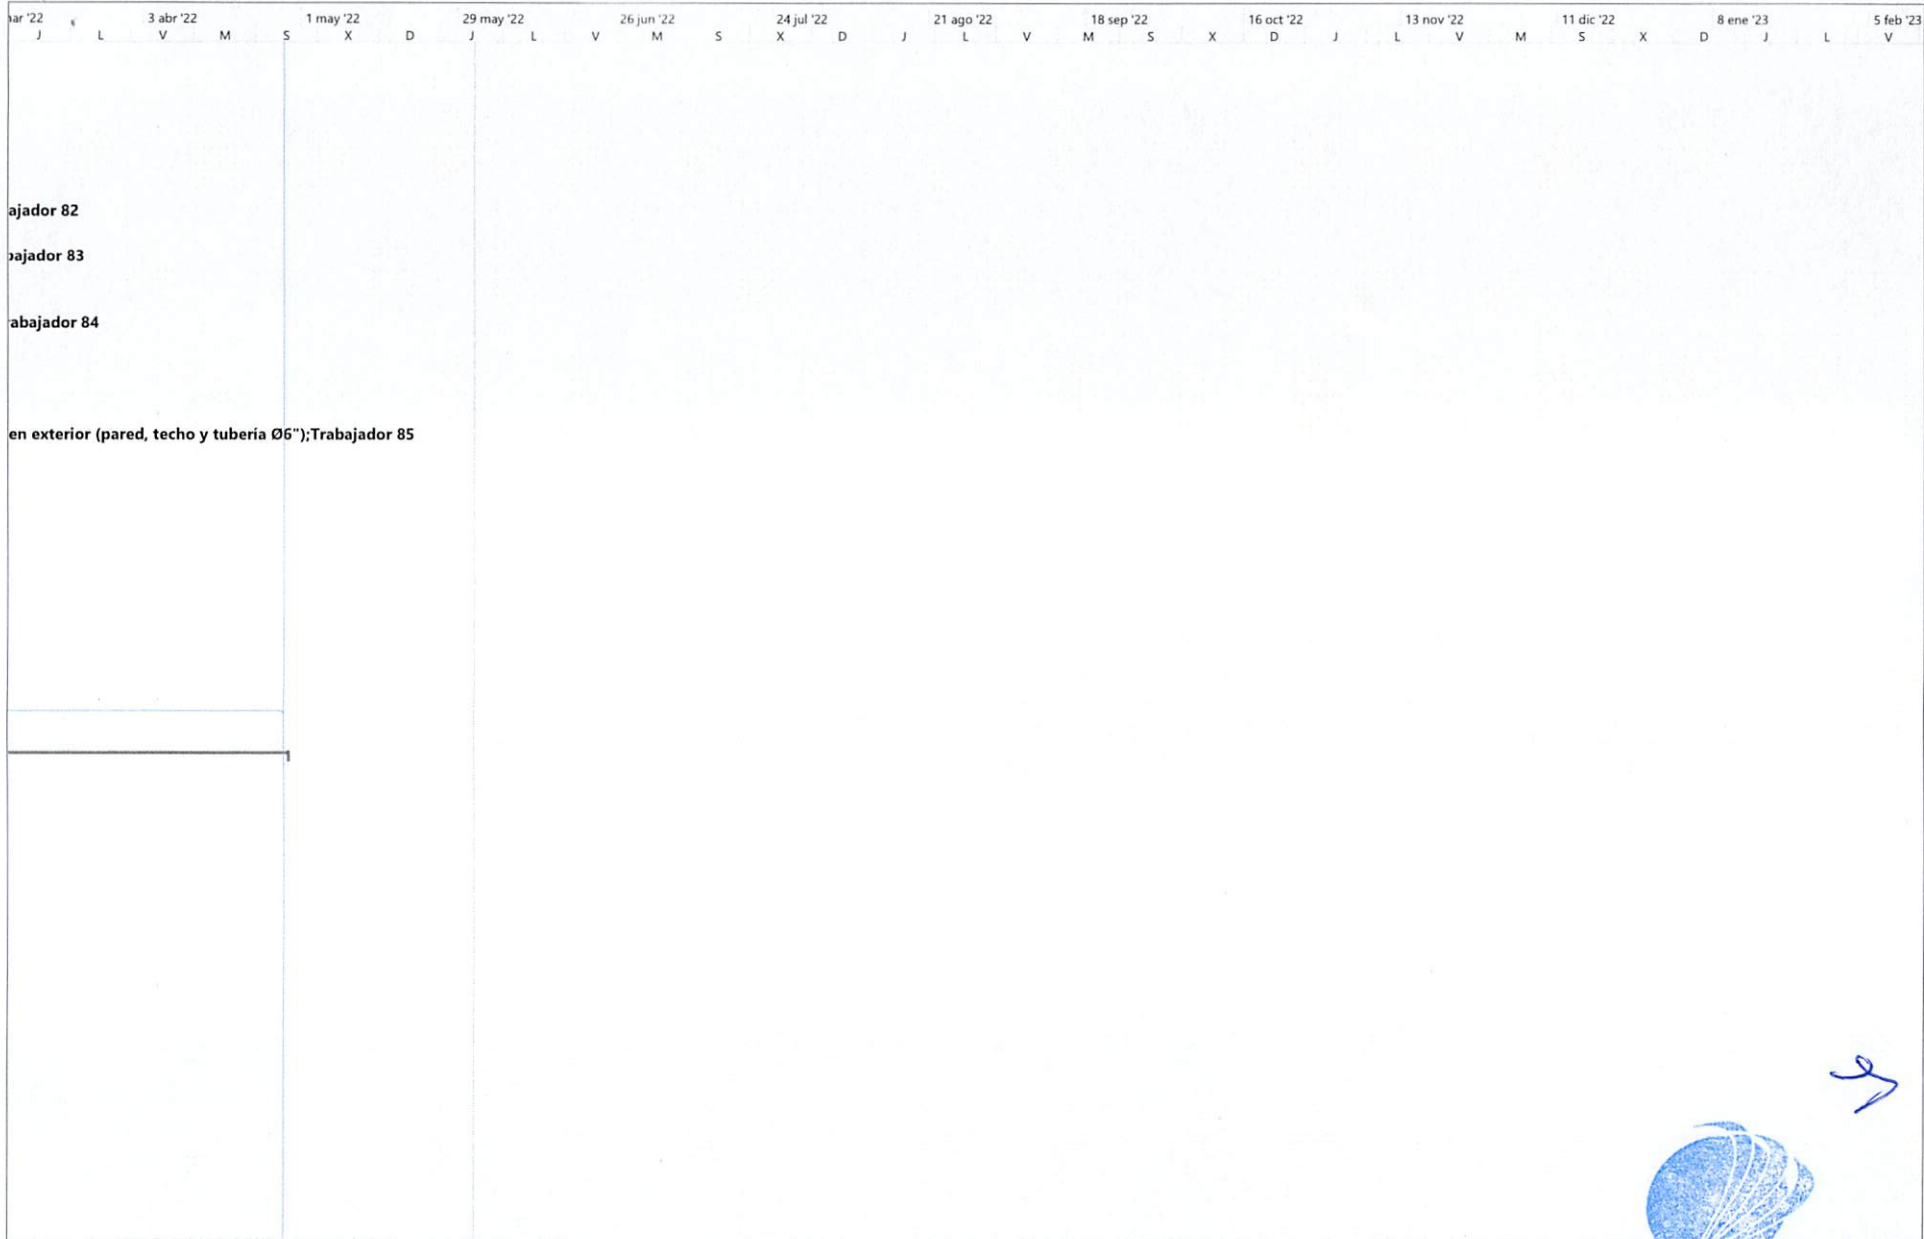

Proyecto: Rehabilitación Depósito
 Fecha: mar 9/11/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			





Trabajador 104

Trabajador 105

Trabajador 106

Trabajador 109, en acero inoxidable, en angulares 2" x2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50m, apoyo cada 1.40m, (h=7.20m) (incluye instalación);Trabajador 109

Trabajador 110

Trabajador 111



Proyecto: Rehabilitación Depósito Fecha: mar 9/11/21	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

mar '22 3 abr '22 1 may '22 29 may '22 26 jun '22 24 jul '22 21 ago '22 18 sep '22 16 oct '22 13 nov '22 11 dic '22 8 ene '23 5 feb '23

112
r 113
114
r 115
116

imiento epóxica Sika -guard 62

imiento epóxica Sika -guard 62

Sika -guard 62;Trabajador 119

Trabajador 120

Trabajador 126

Trabajador 127

29/4

Proyecto: Rehabilitación Depósito
Fecha: mar 9/11/21

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			
