




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2021 ene
1		<b>MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES (REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN)</b>	365 días	vie 29/1/21	vie 28/1/22		
2		Inicio	1 día	vie 29/1/21	vie 29/1/21		
3		<b>REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN OBRA DE TOMA</b>	23 días	sáb 30/1/21	dom 21/2/21		
4		LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DESARENADOR	10 días	sáb 30/1/21	lun 8/2/21	2	
5		CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO	13 días	mar 9/2/21	dom 21/2/21	4	
6		<b>LÍNEA DE ADUCCION DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	340 días	lun 22/2/21	jue 27/1/22		
7		REPLANTEO	2 días	lun 22/2/21	mar 23/2/21	5	
8		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	88 días	jue 24/6/21	dom 19/9/21		
9		EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN PRESENCIA DE AGUA	19 días	jue 24/6/21	lun 12/7/21	13	
10		RELLENO MATERIAL DE ZANJA	19 días	dom 22/8/21	jue 9/9/21	16	
11		BOTE DE MATERIAL EN SITIO	10 días	vie 10/9/21	dom 19/9/21	10	
12		<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA</b>	120 días	mié 24/2/21	mié 23/6/21		
13		Ø16 ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORR	120 días	mié 24/2/21	mié 23/6/21	7	
14		<b>COLOCACIÓN DE TUBERÍA</b>	69 días	mar 13/7/21	dom 19/9/21		
15		Ø16 ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORR	37 días	mar 13/7/21	mié 18/8/21	9	
16		ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 20.00 M (VER DETAL	3 días	jue 19/8/21	sáb 21/8/21	15	
17		LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO)	3 días	vie 10/9/21	dom 12/9/21	10	


  
 Proyecto: MEJORAMIENTO AC
   
 Fecha: jue 28/1/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Fecha: 28/12/21  
 Proyecto: MEJORAMIENTO AC

Hito final: 0  
 Hito inicial: 0  
 Resumen del proyecto  
 Resumen  
 Hito  
 División  
 Tarea

solo final  
 solo el comienzo  
 Resumen manual  
 Informe de resumen manual  
 solo duración  
 Tarea manual  
 Tarea final

Programa manual  
 Programa  
 Fecha límite  
 Hito externo  
 Tarea externa


Id	Nombre de la tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEBERMALES (REHABILITACIÓN OBRAS DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN)	366 días	vie 26/1/21	vie 28/1/21	
2	Inicio	1 día	vie 26/1/21	vie 26/1/21	
3	REHABILITACIÓN OBRAS DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN OBRAS DE TOMA	13 días	dom 30/1/21	dom 30/1/21	
4	LIMPIEZA OBRAS DE TOMA Y DESARREBADOR	10 días	váb 30/1/21	lun 8/2/21	
5	CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE DE AGUAS NEGRAS HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	13 días	mar 9/2/21	dom 9/2/21	
6	LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LA OBRAS DE TOMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	340 días	lun 22/2/21	lun 22/2/21	
7	REPINTOS	3 días	lun 22/2/21	mar 23/2/21	
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	88 días	lun 22/2/21	dom 23/3/21	
9	EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR CEBUPO EN PRESENCIA DE AGUA	10 días	lun 22/2/21	lun 22/2/21	
10	RELLENO MATERIAL DE SANJA	13 días	dom 22/2/21	lun 8/3/21	
11	BOLE DE MATERIAL EN METRO	10 días	vie 10/3/21	dom 13/3/21	
12	SUMINISTRO DE TUBERÍA	150 días	mié 24/2/21	mié 23/3/21	
13	Ø16 ACERO SCH-40, SIN COSTURA, CAPROTECCIÓN ANTICORR 120 días	120 días	mié 24/2/21	mié 23/3/21	
14	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	89 días	mar 13/3/21	dom 13/3/21	
15	Ø16 ACERO SCH-40, SIN COSTURA, CAPROTECCIÓN ANTICORR 37 días	37 días	mar 13/3/21	mié 13/3/21	
16	ANILLO DE HORMIGÓN ARMADO CADA 50.00 M (VER DETAL 3 días	3 días	lun 15/3/21	váb 2/4/21	
17	LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO)	3 días	vie 10/3/21	dom 13/3/21	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2021 ene
18		REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN HORMIGONCON MALLA ELECTROSOLDADA, VER DETALLE)	3 días	lun 13/9/21	mié 15/9/21	17	
19		REPOSICIÓN TAPA METÁLICA DEL DESARENADOR (VER DETALLE)	4 días	jue 16/9/21	dom 19/9/21	18	
20		USO DE BOMBA DE ACHIQUE Ø4	4 días	mar 13/7/21	vie 16/7/21	9	
21		<b>MURO DE GAVIONES</b>	<b>130 días</b>	<b>lun 20/9/21</b>	<b>jue 27/1/22</b>		
22		EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA C/EQUIPO	15 días	lun 20/9/21	lun 4/10/21	19	
23		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	15 días	mar 5/10/21	mar 19/10/21	22	
24		MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER TUBERIA Ø16 ACERO (VER DETALLE)	85 días	mié 20/10/21	mié 12/1/22	23	
25		ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y TUBERIAS RODAJE INTERNO DE EQUIPO PESADO (EXCAVADORA C/ESTERA) 3	15 días	jue 13/1/22	jue 27/1/22	24	
26		<b>VARIOS</b>	<b>364 días</b>	<b>sáb 30/1/21</b>	<b>vie 28/1/22</b>		
27		CAMPAMENTO	120 días	sáb 30/1/21	sáb 29/5/21	2	
28		VALLA ANUNCIANDO OBRA 16X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2	120 días	sáb 30/1/21	sáb 29/5/21	2	
29		Entrega	1 día	vie 28/1/22	vie 28/1/22	25	




Proyecto: MEJORAMIENTO AC  
Fecha: jue 28/1/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

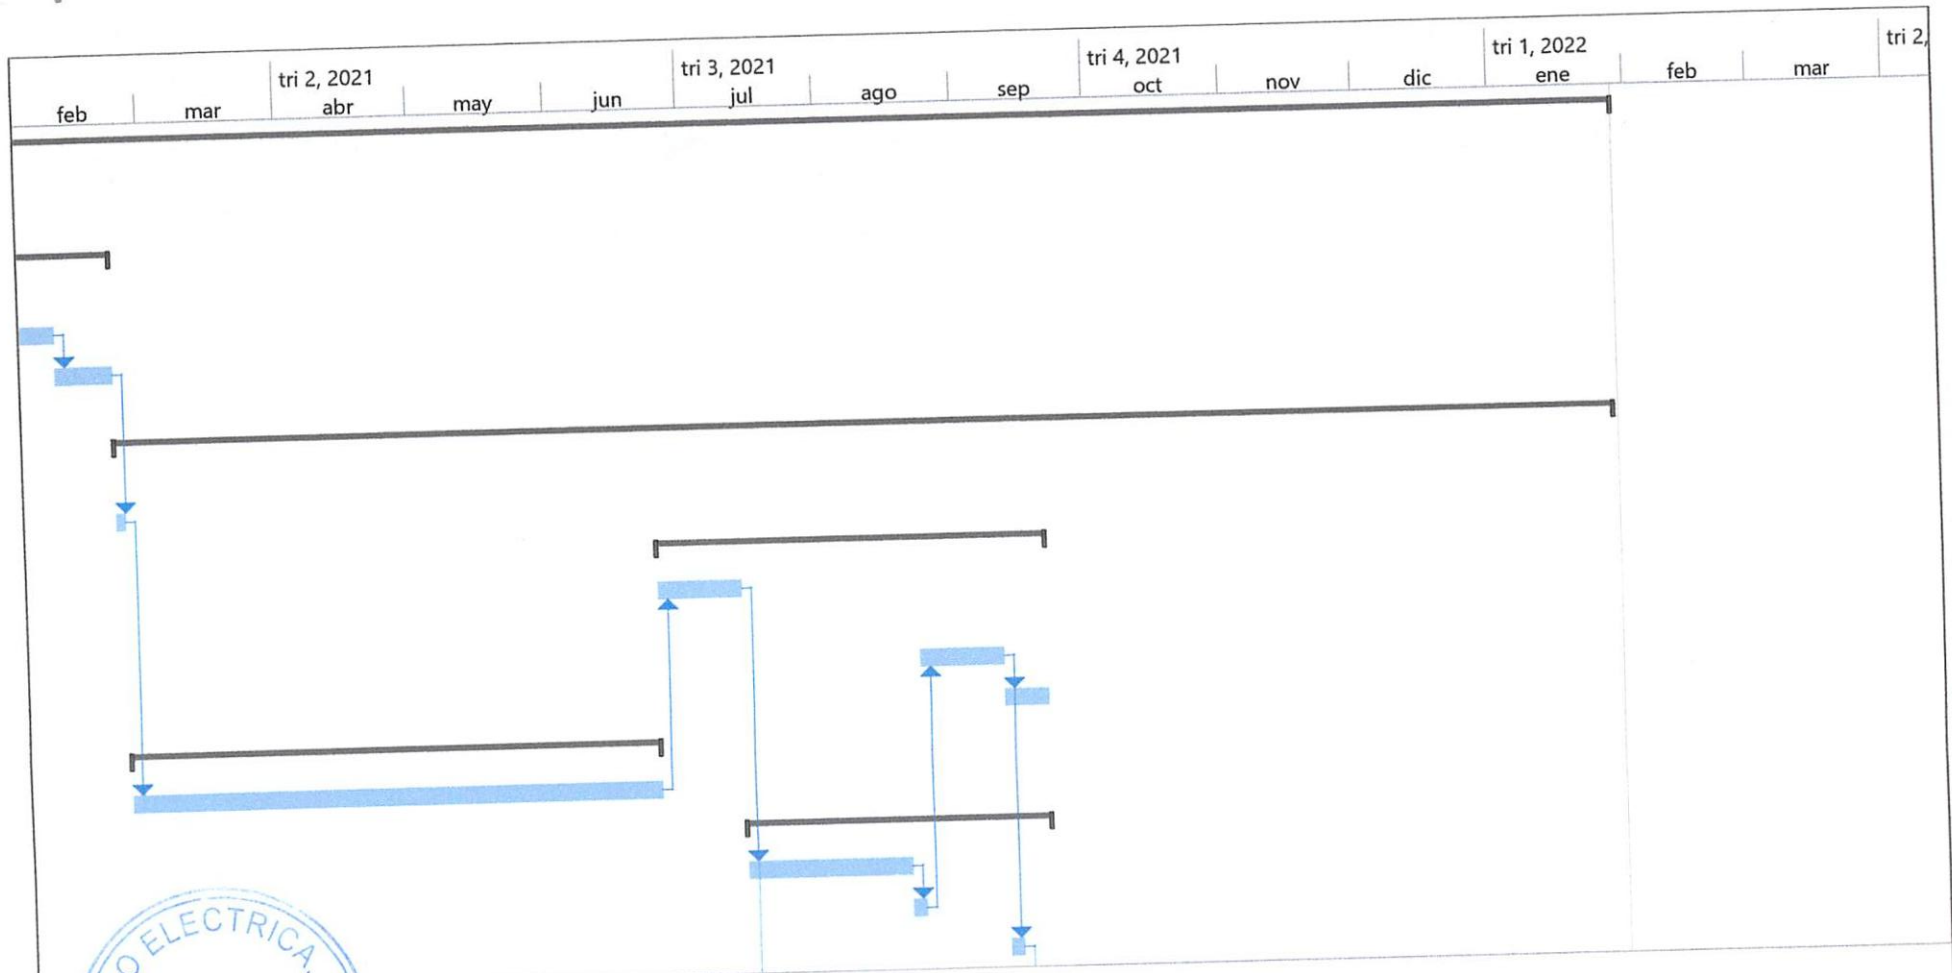

Proyecto: MEJORAMIENTO AC  
 Fecha: jue 28/1/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

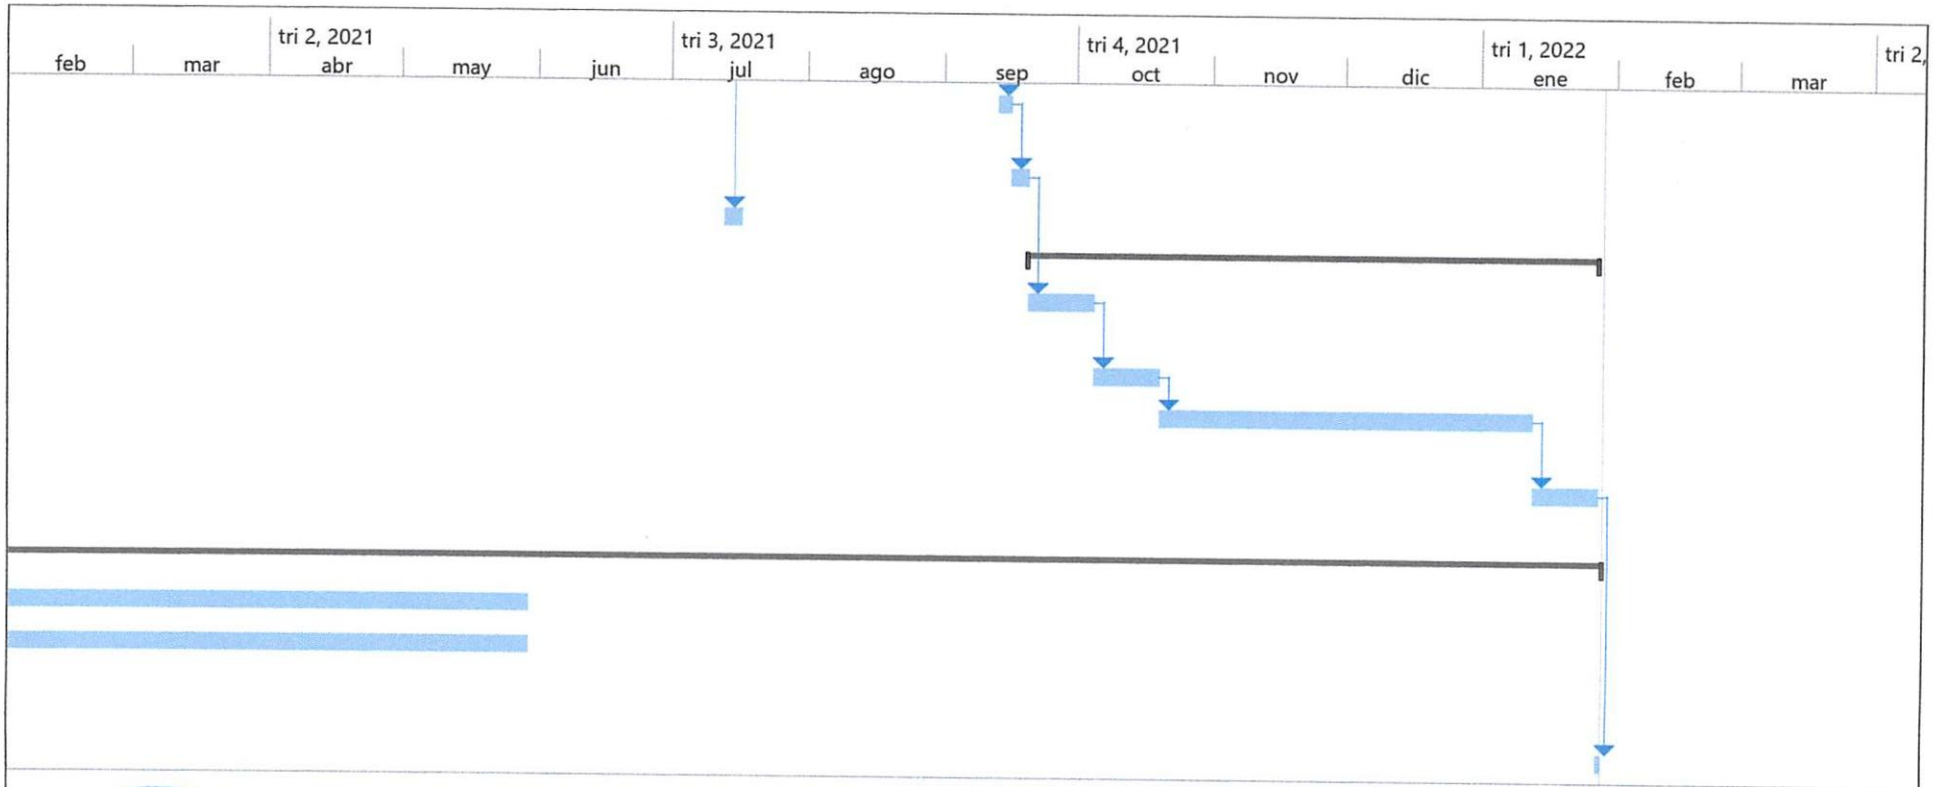

Proyecto: MEJORAMIENTO AC  
 Fecha: jue 28/1/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
