

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	
1		<b>LINEAS DE CONDUCCION 6" PVC (SDR-26) Y RED DE DISTRIBUCION 4" Y 3" PVC (SDR-26) DE LA COMUNIDAD CAOBETE</b>	<b>550 días?</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>mar 15/3/22</b>										
2		<b>PRIMERA ETAPA CAOBETE</b>													
3		<b>TRAMO 1: A HASTA P-29-T, 192.60 ML</b>	<b>8 días</b>	<b>jue 13/2/20</b>	<b>vie 21/2/20</b>										
4		SUMINISTRO TUBERIA 3" Y 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 13/2/20	jue 13/2/20										
5		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	2 días	vie 14/2/20	sáb 15/2/20										
6		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	vie 14/2/20	vie 14/2/20										
7		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	vie 14/2/20	sáb 15/2/20										
8		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	sáb 15/2/20	sáb 15/2/20										
9		COLOC. TUBERIAS 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	2 días	lun 17/2/20	mar 18/2/20										
10		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	2 días	lun 17/2/20	mar 18/2/20										
11		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 18/2/20	mar 18/2/20										
12		INST. CAJA TELESCOPICA P/ VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mié 19/2/20	mié 19/2/20										
13		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 19/2/20	mié 19/2/20										
14		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	jue 20/2/20	jue 20/2/20										
15		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 21/2/20	vie 21/2/20										
16		<b>TRAMO 2: P-29-T HASTA P-34-T, 213.60 ML</b>	<b>8 días</b>	<b>lun 24/2/20</b>	<b>mié 4/3/20</b>										
17		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 24/2/20	lun 24/2/20										
18		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 24/2/20	lun 24/2/20										
19		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	mar 25/2/20	mié 26/2/20										
20		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20										
21		COLOC. TUBERIAS 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20										
22		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20										
23		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20										
24		INST. CAJA TELESCOPICA P/ VALVULA 3", 4", 6"	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20										
25		CRUCE DE ALCANTARILLA B 4" ACERO SDH-80 REPLANTEO	1 día	lun 2/3/20	lun 2/3/20										
26		SUMINISTRO TUBERIA DE 4" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	lun 2/3/20	lun 2/3/20										
27		CODO 4"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 2/3/20	lun 2/3/20										
28		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4" (150 PSI)	1 día	lun 2/3/20	lun 2/3/20										
29		ANCLAJE DE FC=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	mar 3/3/20	mar 3/3/20										
30		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 3/3/20	mar 3/3/20										

*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P
31		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 4/3/20	mié 4/3/20										
32		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 4/3/20	mié 4/3/20										
33		<b>TRAMO 3: P-34-T HASTA P-38-T, 172 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 5/3/20</b>	<b>mar 10/3/20</b>										
34		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	jue 5/3/20	jue 5/3/20										
35		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	jue 5/3/20	jue 5/3/20										
36		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 9/3/20	mar 10/3/20										
37		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	lun 9/3/20	lun 9/3/20										
38		COLOC. TUBERIAS A4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	lun 9/3/20	lun 9/3/20										
39		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 9/3/20	lun 9/3/20										
40		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	lun 9/3/20	lun 9/3/20										
41		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	lun 9/3/20	lun 9/3/20										
42		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 10/3/20	mar 10/3/20										
43		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mar 10/3/20	mar 10/3/20										
44		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 10/3/20	mar 10/3/20										
45		<b>TRAMO 4: P-38-T HASTA P-40-T, 178.60 ML</b>	<b>7 días</b>	<b>mié 11/3/20</b>	<b>jue 19/3/20</b>										
46		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	mié 11/3/20	mié 11/3/20										
47		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	jue 12/3/20	jue 12/3/20										
48		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	mié 11/3/20	jue 12/3/20										
49		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	vie 13/3/20	vie 13/3/20										
50		COLOC. TUBERIAS A4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	3 días	lun 16/3/20	mié 18/3/20										
51		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 18/3/20	mié 18/3/20										
52		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 18/3/20	mié 18/3/20										
53		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mié 18/3/20	mié 18/3/20										
54		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 18/3/20	mié 18/3/20										
55		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	jue 19/3/20	jue 19/3/20										
56		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 19/3/20	jue 19/3/20										
57		<b>TRAMO 5: P-40-T HASTA P-21-T, 119.60 ML</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 20/3/20</b>	<b>jue 26/3/20</b>										
58		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	vie 20/3/20	vie 20/3/20										
59		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	sáb 21/3/20	sáb 21/3/20										
60		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 23/3/20	mar 24/3/20										
61		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20										

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P
62		COLOC. TUBERIAS 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20										
63		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20										
64		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20										
65		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20										
66		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 25/3/20	mié 25/3/20										
67		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	jue 26/3/20	jue 26/3/20										
68		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 26/3/20	jue 26/3/20										
69		<b>TRAMO 6: P-29-T HASTA P-17-T, 198.40 ML</b>	<b>7 días</b>	<b>vie 27/3/20</b>	<b>lun 6/4/20</b>										
70		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	vie 27/3/20	vie 27/3/20										
71		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 30/3/20	lun 30/3/20										
72		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 30/3/20	mar 31/3/20										
73		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 31/3/20	mar 31/3/20										
74		COLOC. TUBERIAS 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 31/3/20	mar 31/3/20										
75		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 31/3/20	mar 31/3/20										
76		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 1/4/20	mié 1/4/20										
77		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	jue 2/4/20	jue 2/4/20										
78		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 2/4/20	jue 2/4/20										
79		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	vie 3/4/20	lun 6/4/20										
80		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	lun 6/4/20	lun 6/4/20										
81		<b>TRAMO 7: P-17-T HASTA P-21-T, 210.00 ML</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 7/4/20</b>	<b>vie 17/4/20</b>										
82		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	mar 7/4/20	mar 7/4/20										
83		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	mié 8/4/20	mié 8/4/20										
84		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 13/4/20	mar 14/4/20										
85		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mié 15/4/20	mié 15/4/20										
86		COLOC. TUBERIAS 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 15/4/20	mié 15/4/20										
87		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 15/4/20	mié 15/4/20										
88		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 15/4/20	mié 15/4/20										
89		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mié 15/4/20	mié 15/4/20										
90		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 16/4/20	jue 16/4/20										
91		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	vie 17/4/20	vie 17/4/20										



*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo					mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M	P	
92		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 17/4/20	vie 17/4/20													
93		<b>TRAMO 8: P-11-T HASTA P-15-T, 204.00 ML</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 17/4/20</b>	<b>vie 24/4/20</b>													
94		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 20/4/20	lun 20/4/20													
95		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
96		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	vie 17/4/20	lun 20/4/20													
97		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	lun 20/4/20	lun 20/4/20													
98		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
99		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
100		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
101		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
102		CRUCE DE ALCANTARILLA E A3" ACERO SDH-80 REPLANTEO	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
103		SUMINISTRO TUBERIA DE A3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
104		CODO A3"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
105		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER A3" (150 PSI)	1 día	mar 21/4/20	mar 21/4/20													
106		ANCLAJE DE FC=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	mié 22/4/20	mié 22/4/20													
107		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 22/4/20	mié 22/4/20													
108		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	jue 23/4/20	vie 24/4/20													
109		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 24/4/20	vie 24/4/20													
110		<b>TRAMO 9: INTERCEPCION T18 (5C-9C) HASTA VC A3" H.F. 150 PSI, 116.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 23/4/20</b>	<b>mié 29/4/20</b>													
111		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 27/4/20	lun 27/4/20													
112		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
113		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	jue 23/4/20	vie 24/4/20													
114		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	vie 24/4/20	vie 24/4/20													
115		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	2 días	lun 27/4/20	mar 28/4/20													
116		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
117		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
118		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
119		CRUCE DE ALCANTARILLA 90" A3" ACERO SDH-80 REPLANTEO	2 días	lun 27/4/20	mar 28/4/20													
120		SUMINISTRO TUBERIA DE A3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													

*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo					mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M	P	
121		CODO A3"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
122		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER A3" (150 PSI)	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
123		ANCLAJE DE FC=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	mar 28/4/20	mar 28/4/20													
124		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 29/4/20	mié 29/4/20													
125		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 29/4/20	mié 29/4/20													
126		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 29/4/20	mié 29/4/20													
127		<b>TRAMO 10: P-12-T HASTA INTERCEPCION T8 (5C-9C), 164.00 ML</b>	<b>6 días</b>	<b>jue 30/4/20</b>	<b>mié 6/5/20</b>													
128		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	jue 30/4/20	jue 30/4/20													
129		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	vie 1/5/20	vie 1/5/20													
130		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 4/5/20	mar 5/5/20													
131		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 5/5/20	mar 5/5/20													
132		COLOC. TUBERIAS A4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 5/5/20	mar 5/5/20													
133		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 5/5/20	mar 5/5/20													
134		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 5/5/20	mar 5/5/20													
135		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mar 5/5/20	mar 5/5/20													
136		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 6/5/20	mié 6/5/20													
137		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 6/5/20	mié 6/5/20													
138		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 6/5/20	mié 6/5/20													
139		<b>TRAMO 11: P-32-T HASTA P-19-T, 167.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 7/5/20</b>	<b>mié 13/5/20</b>													
140		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	jue 7/5/20	jue 7/5/20													
141		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	vie 8/5/20	vie 8/5/20													
142		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	jue 7/5/20	vie 8/5/20													
143		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	lun 11/5/20	lun 11/5/20													
144		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	lun 11/5/20	lun 11/5/20													
145		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 11/5/20	lun 11/5/20													
146		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 12/5/20	mar 12/5/20													
147		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mar 12/5/20	mar 12/5/20													
148		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 12/5/20	mar 12/5/20													
149		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 13/5/20	mié 13/5/20													

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P	
150		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 13/5/20	mié 13/5/20											
151		<b>TRAMO 12: P-19-T HASTA VC Æ4" H.F. 150 PSI, 147.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 13/5/20</b>	<b>mar 19/5/20</b>											
152		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	jue 14/5/20	jue 14/5/20											
153		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	vie 15/5/20	vie 15/5/20											
154		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	mié 13/5/20	jue 14/5/20											
155		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	jue 14/5/20	jue 14/5/20											
156		COLOC. TUBERIAS Æ3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	2 días	vie 15/5/20	lun 18/5/20											
157		COLOC. PIEZAS Æ8"x4" Y Æ6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	lun 18/5/20	lun 18/5/20											
158		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	lun 18/5/20	lun 18/5/20											
159		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	lun 18/5/20	lun 18/5/20											
160		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA Æ4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	lun 18/5/20	lun 18/5/20											
161		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mar 19/5/20	mar 19/5/20											
162		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 19/5/20	mar 19/5/20											
163		<b>TRAMO 13: INTERCEPCION T11 (4C-5C) HASTA P-36-T, 211.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 19/5/20</b>	<b>lun 25/5/20</b>											
164		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	mié 20/5/20	mié 20/5/20											
165		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20											
166		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	mar 19/5/20	mié 20/5/20											
167		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mié 20/5/20	mié 20/5/20											
168		COLOC. TUBERIAS Æ3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20											
169		COLOC. PIEZAS Æ8"x4" Y Æ6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20											
170		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	jue 21/5/20	jue 21/5/20											
171		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	vie 22/5/20	vie 22/5/20											
172		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA Æ4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	vie 22/5/20	vie 22/5/20											
173		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	lun 25/5/20	lun 25/5/20											
174		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	lun 25/5/20	lun 25/5/20											
175		<b>TRAMO 14: P-21-T HASTA P-24-T, 322.00 ML</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 25/5/20</b>	<b>sáb 30/5/20</b>											
176		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	mar 26/5/20	mar 26/5/20											
177		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	mié 27/5/20	mié 27/5/20											
178		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 25/5/20	mar 26/5/20											
179		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 26/5/20	mar 26/5/20											



*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P	
180		COLOC. TUBERIAS 3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 27/5/20	mié 27/5/20											
181		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 27/5/20	mié 27/5/20											
182		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 27/5/20	mié 27/5/20											
183		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	jue 28/5/20	jue 28/5/20											
184		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 28/5/20	jue 28/5/20											
185		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	vie 29/5/20	sáb 30/5/20											
186		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	sáb 30/5/20	sáb 30/5/20											
187		<b>TRAMOS 15 Y 16: P-24-T HASTA P-25-T Y HASTA P-15-T, 146.00 + 70ML</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 1/6/20</b>	<b>sáb 6/6/20</b>											
188		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 1/6/20	lun 1/6/20											
189		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	mar 2/6/20	mar 2/6/20											
190		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	mié 3/6/20	jue 4/6/20											
191		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	jue 4/6/20	jue 4/6/20											
192		COLOC. TUBERIAS 3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 4/6/20	jue 4/6/20											
193		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	jue 4/6/20	jue 4/6/20											
194		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	jue 4/6/20	jue 4/6/20											
195		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	vie 5/6/20	vie 5/6/20											
196		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA 3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	vie 5/6/20	vie 5/6/20											
197		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	sáb 6/6/20	sáb 6/6/20											
198		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	sáb 6/6/20	sáb 6/6/20											
199		<b>SEGUNDA ETAPA CAOLETE</b>														
200		<b>TRAMO 1: P-2-T, P-4-T, P-5-T HASTA VC 4" H.F. 150 PSI, 133.00 ML Y TRAMO 2: P-11-T, E-12, 2 VC 4" H.F. 150 PSI, 44.00 ML "</b>	<b>6 días</b>	<b>lun 8/6/20</b>	<b>sáb 13/6/20</b>											
201		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 8/6/20	lun 8/6/20											
202		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 8/6/20	lun 8/6/20											
203		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	mar 9/6/20	mié 10/6/20											
204		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mié 10/6/20	mié 10/6/20											
205		COLOC. TUBERIAS 4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 11/6/20	jue 11/6/20											
206		COLOC. PIEZAS 8"x4" Y 6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	jue 11/6/20	jue 11/6/20											
207		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	jue 11/6/20	jue 11/6/20											
208		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	vie 12/6/20	vie 12/6/20											

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo					mayo					julio					septiembre				
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M						
209		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA Æ4" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	vie 12/6/20	vie 12/6/20																				
210		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	sáb 13/6/20	sáb 13/6/20																				
211		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	sáb 13/6/20	sáb 13/6/20																				
212		<b>TRAMO 3: C-P-3-T + P-6-T, 80.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 15/6/20</b>	<b>vie 19/6/20</b>																				
213		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 15/6/20	lun 15/6/20																				
214		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 15/6/20	lun 15/6/20																				
215		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	1 día	mar 16/6/20	mar 16/6/20																				
216		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 16/6/20	mar 16/6/20																				
217		COLOC. TUBERIAS Æ3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 17/6/20	mié 17/6/20																				
218		COLOC. PIEZAS Æ8"x4" Y Æ6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 17/6/20	mié 17/6/20																				
219		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 17/6/20	mié 17/6/20																				
220		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	jue 18/6/20	jue 18/6/20																				
221		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA Æ3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 18/6/20	jue 18/6/20																				
222		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	vie 19/6/20	vie 19/6/20																				
223		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 19/6/20	vie 19/6/20																				
224		<b>TRAMO 4: P-2-T + P-3-T, 90.00 ML</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 22/6/20</b>	<b>jue 25/6/20</b>																				
225		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 22/6/20	lun 22/6/20																				
226		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 22/6/20	lun 22/6/20																				
227		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	1 día	mar 23/6/20	mar 23/6/20																				
228		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 23/6/20	mar 23/6/20																				
229		COLOC. TUBERIAS Æ3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 23/6/20	mar 23/6/20																				
230		COLOC. PIEZAS Æ8"x4" Y Æ6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 23/6/20	mar 23/6/20																				
231		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 23/6/20	mar 23/6/20																				
232		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mié 24/6/20	mié 24/6/20																				
233		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA Æ3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 24/6/20	mié 24/6/20																				
234		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	jue 25/6/20	jue 25/6/20																				
235		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 25/6/20	jue 25/6/20																				
236		<b>TRAMO 5: P-8-T HASTA P-7-T, 168.00 ML</b>	<b>6 días</b>	<b>vie 26/6/20</b>	<b>vie 3/7/20</b>																				
237		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	vie 26/6/20	vie 26/6/20																				

Carla Sosa F.

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P	
238		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	vie 26/6/20	vie 26/6/20											
239		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	2 días	lun 29/6/20	mar 30/6/20											
240		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mié 1/7/20	mié 1/7/20											
241		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 1/7/20	mié 1/7/20											
242		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 1/7/20	mié 1/7/20											
243		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 1/7/20	mié 1/7/20											
244		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	jue 2/7/20	jue 2/7/20											
245		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 2/7/20	jue 2/7/20											
246		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	vie 3/7/20	vie 3/7/20											
247		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 3/7/20	vie 3/7/20											
248		<b>TRAMO 6: P-7-T HASTA P-5-T, 112.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 6/7/20</b>	<b>vie 10/7/20</b>											
249		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 6/7/20	lun 6/7/20											
250		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 6/7/20	lun 6/7/20											
251		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	1 día	lun 6/7/20	lun 6/7/20											
252		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 7/7/20	mar 7/7/20											
253		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 7/7/20	mar 7/7/20											
254		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 8/7/20	mié 8/7/20											
255		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	jue 9/7/20	jue 9/7/20											
256		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	jue 9/7/20	jue 9/7/20											
257		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 9/7/20	jue 9/7/20											
258		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	vie 10/7/20	vie 10/7/20											
259		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 10/7/20	vie 10/7/20											
260		<b>TRAMO 7: P-5-T HASTA P-6-T, 120.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>lun 13/7/20</b>	<b>vie 17/7/20</b>											
261		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 13/7/20	lun 13/7/20											
262		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 13/7/20	lun 13/7/20											
263		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	1 día	lun 13/7/20	lun 13/7/20											
264		ASIENTO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mar 14/7/20	mar 14/7/20											
265		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mié 15/7/20	mié 15/7/20											
266		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 15/7/20	mié 15/7/20											
267		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mié 15/7/20	mié 15/7/20											
268		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	jue 16/7/20	jue 16/7/20											

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P	
269		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 16/7/20	jue 16/7/20											
270		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	vie 17/7/20	vie 17/7/20											
271		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	vie 17/7/20	vie 17/7/20											
272		<b>TRAMO 8: P-7-T HASTA P-9-T, 307.00 ML</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 16/7/20</b>	<b>mié 22/7/20</b>											
273		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	lun 20/7/20	lun 20/7/20											
274		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 20/7/20	lun 20/7/20											
275		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	3 días	jue 16/7/20	lun 20/7/20											
276		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	lun 20/7/20	lun 20/7/20											
277		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 21/7/20	mar 21/7/20											
278		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mar 21/7/20	mar 21/7/20											
279		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	mar 21/7/20	mar 21/7/20											
280		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	mié 22/7/20	mié 22/7/20											
281		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	mar 21/7/20	mar 21/7/20											
282		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 22/7/20	mié 22/7/20											
283		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 22/7/20	mié 22/7/20											
284		<b>TRAMO 9: P-9-T HASTA P-10-T, 322.00 ML</b>	<b>550 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>mar 15/3/22</b>											
285		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	jue 23/7/20	jue 23/7/20											
286		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	jue 23/7/20	jue 23/7/20											
287		EXCAVACION MATERIAL COMPACT. C/EQU. 70%	3 días	vie 17/7/20	mar 21/7/20											
288		ASIEN TO DE ARENA (INCL. ACARREO INTERNO)	1 día	mié 22/7/20	mié 22/7/20											
289		COLOC. TUBERIAS A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	jue 23/7/20	jue 23/7/20											
290		COLOC. PIEZAS A8"x4" Y A6"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	jue 23/7/20	jue 23/7/20											
291		ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS	1 día	jue 23/7/20	jue 23/7/20											
292		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6"	1 día	vie 24/7/20	vie 24/7/20											
293		PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.)	1 día	vie 24/7/20	vie 24/7/20											
294		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	lun 27/7/20	mar 28/7/20											
295		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 28/7/20	mar 28/7/20											
296		<b>AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>											
297		<b>LINEAS DE CONDUCCION A6" PVC (SDR-26) Y RED DE DISTRIBUCION A4" Y A3" PVC (SDR-26) DE LA COMUNIDAD CAOBETE</b>	<b>1 día?</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>											

◆ 17/2

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre		
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M	P
298		<b>PRELIMINARES</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
299		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	mié 29/7/20	mié 29/7/20												
300		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
301		<b>EXCACION CON CLASIFICACION V=3,675.00M3</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
302		EXCAVACION ROCA C/EQUIPO (INCLUYE EXTRACCION 30%)	1 día	jue 30/7/20	jue 30/7/20												
303		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70%	2 días	jue 30/7/20	vie 31/7/20												
304		ASIEN TO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO)	1 día	lun 3/8/20	lun 3/8/20												
305		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	lun 3/8/20	lun 3/8/20												
306		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	3 días	lun 17/2/20	mié 19/2/20												
307		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5KM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	2 días	lun 17/2/20	mar 18/2/20												
308		<b>SUMINISTRO DE TUBERIA:</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
309		TUBERIA A4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	lun 3/8/20	lun 3/8/20												
310		TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	lun 3/8/20	lun 3/8/20												
311		<b>COLOCACION DE TUBERIA:</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
312		TUBERIA A4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	mar 4/8/20	mar 4/8/20												
313		TUBERIA A3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	mar 4/8/20	mar 4/8/20												
314		<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS)</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
315		TAPON A3" PVC	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20												
316		<b>CRUCES</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
317		<b>CRUCE DE ALCANTARILLA C-E-F A3" ACERO SCH-80 L=5.00M (3 UNIDADES)</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
318		SUMINISTRO TUBERIA DE A3" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	mar 4/8/20	mar 4/8/20												
319		MANO DE OBRA	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20												
320		<b>CRUCE DE ALCANTARILLA F A8" ACERO SCH-40 L=5.00M (3 UNIDADES)</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
321		SUMINISTRO TUBERIA DE A8" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20												
322		CODO A8"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20												
323		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER A8" (150 PSI)	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20												
324		<b>ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO</b>	0 días	lun 17/2/20	lun 17/2/20												
325		TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD A1/2" INTERNO L=7	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20												
326		ADAPTADOR MACHO A1/2" ROSCADO A MANGUERA	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20												
327		CODO A1/2"x90° HG	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20												
328		TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO A1/2" (BASTONES)	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20												
329		NIPLE A1/2" H.G.	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20												
330		COUPLING A1/2" H.G.	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20												

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre			
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M	P	
331		LLAVE DE CHORRO Ø1/2" BRONCE	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20													
332		CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20													
333		PEDESTAL H.S (0.80x0.15)	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20													
334		EXCAVACION Y TAPADO (240.23 + 70.16)	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20													
335		MANO DE OBRA PLOMERO	7 días	mié 5/8/20	jue 13/8/20													
336		<b>SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
337		CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE USO DE LETREROS, USO DE CONOS REFRACTARIOS Y HOMBRES CON BANDEROLAS)	7 días	jue 30/7/20	vie 7/8/20													
338		SEÑALIZACION, PASARELAS, CONTROL Y SEGURIDAD EN LA VIA	7 días	jue 30/7/20	vie 7/8/20													
339		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	7 días	vie 14/8/20	lun 24/8/20													
340		<b>VARIOS</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
341		CAMPAMENTO (INC. ALQUILER DE CASA O SOLAR, ALMACEN)	120 días	lun 15/2/21	vie 30/7/21													
342		<b>NUEVAS PARTIDAS (N.P)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
343		<b>LINEAS DE CONDUCCION Ø6" PVC (SDR-26) Y RED DE DISTRIBUCION Ø4" Y Ø3" PVC (SDR-26) DE LA COMUNIDAD CAOBETE</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
344		<b>ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
345		COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA)	7 días	vie 14/8/20	lun 24/8/20													
346		COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA)	7 días	vie 14/8/20	lun 24/8/20													
347		<b>CRUCE DE ALCANTARILLA F Ø8" ACERO SCH-40 L=5.00M</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
348		CORTE CARPETA ASFALTICA E=3"	1 día	mar 25/8/20	mar 25/8/20													
349		EXTRACCION CARPETA ASFALTICA E= 3"	1 día	mar 25/8/20	mar 25/8/20													
350		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION (DIST= 5 KM)	1 día	mar 25/8/20	mar 25/8/20													
351		SUMINISTRO TUBERIA DE Ø8" PVC SDR-26 C/J.G.	1 día	mar 25/8/20	mar 25/8/20													
352		VALVULA DE AIRE Ø 2" (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION)	1 día	jue 27/8/20	jue 27/8/20													
353		PROTECTOR EN TUBERIA DE ACERO Ø8" ACERO SCH-40, LONGITUD APROXIMADA 0.80 M	1 día	mié 26/8/20	mié 26/8/20													
354		USO DE RETRO PALA	2 días	mié 26/8/20	jue 27/8/20													
355		MANO DE OBRA	3 días	jue 27/8/20	lun 31/8/20													
356		<b>REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES EN DIAMETROS DE Ø 1/2"</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
357		SUMINISTRO DE TUBERIA Ø 1/2" PVC SCH-40	1 día	mar 1/9/20	mar 1/9/20													
358		SUMINISTRO DE COUPLIN Ø 1/2"	1 día	mar 1/9/20	mar 1/9/20													
359		MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTE	1 día	mar 1/9/20	mar 1/9/20													
360		USO DE RETRO PALA	1 día	mar 1/9/20	mar 1/9/20													
361		<b>REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES EN DIAMETROS Ø 2"</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>													
362		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Ø 2" PVC SDR-26	1 día?	mié 2/9/20	mié 2/9/20													
363		SUMINISTRO DE COUPLIN Ø 2"	1 día?	mié 2/9/20	mié 2/9/20													

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	
364		MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTE	1 día?	mié 2/9/20	mié 2/9/20										
365		USO DE RETRO PALA	1 día?	mié 2/9/20	mié 2/9/20										
366		<b>REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES EN DIAMETROS Ø 3"</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
367		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Ø 3" PVC SDR-26	1 día	jue 3/9/20	jue 3/9/20										
368		SUMINISTRO DE COUPLIN Ø 3"	1 día	jue 3/9/20	jue 3/9/20										
369		MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTE	1 día	jue 3/9/20	jue 3/9/20										
370		USO DE RETRO PALA	1 día	jue 3/9/20	jue 3/9/20										
371		<b>REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXISTENTES EN DIAMETROS Ø 4"</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
372		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Ø 3" PVC SDR-26	1 día	vie 4/9/20	vie 4/9/20										
373		SUMINISTRO DE COUPLIN Ø 3"	1 día	vie 4/9/20	vie 4/9/20										
374		MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTE	1 día	vie 4/9/20	vie 4/9/20										
375		USO DE RETRO PALA	1 día	vie 4/9/20	vie 4/9/20										
376		<b>USO DE BOMBA DE ACHIQUE (PARA SACAR AGUA DE ZANJAS)</b>	<b>5 días</b>	<b>mié 5/8/20</b>	<b>mar 11/8/20</b>										
377		<b>DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE BADENES</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
378		DEMOLICION DE BADENES PARA CRUCE DE TUBERIAS	1 día	mié 12/8/20	mié 12/8/20										
379		BOTE MATERIAL ROTURA BADEN	1 día	mié 12/8/20	mié 12/8/20										
380		HORMIGON CICLOPEO EN RECONSTRUCCION DE BADEN	1 día	mié 12/8/20	mié 12/8/20										
381		RECONSTRUCCION DE BADEN (H.A. 210 KG/CM3)	1 día	mié 12/8/20	mié 12/8/20										
382		<b>SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA RELLENO EN ZANJAS</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
383		RELLENO CON MATERIAL TOSCA EN ZANJAS CON INSERVIBLE	9 días	mié 5/8/20	lun 17/8/20										
384		<b>DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS (PARA COLOCAR ACOMETIDAS)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
385		DEMOLICION DE ACERAS PARA CRUCE DE TUBERIAS	5 días	vie 14/8/20	jue 20/8/20										
386		BOTE MATERIAL ROTURA ACERAS	2 días	vie 14/8/20	lun 17/8/20										
387		HORMIGON EN REPOSICION DE ACERAS	5 días	vie 14/8/20	jue 20/8/20										
388		RELLENO CON ARENA PARA ACERAS	2 días	vie 14/8/20	lun 17/8/20										
389		<b>HORMIGON CICLOPEO EN ALCANTARILLA (CRUCE DE TUBER</b>	<b>1 día?</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
390		<b>CONEXIÓN CON LA CARRETERA PIMENTEL - CAOBETE 1ERA. PARTE (CASERIO) CON CALLES LOS RIELES, CRUCE CANAL</b>	<b>1 día?</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
391		CORTE CARPETA ASFALTICA E=3"	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20										
392		EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA E=3"	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20										
393		BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D=5 KM, (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20										
394		TEE Ø 3" X Ø 3" ACERO SCH-80 CON	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20										
395		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 3" (150 PSI)	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20										
396		SUMINISTRO DE TUBERIA Ø 3" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANAc	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20										

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre	
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P	
397		COLOCACION TUBERIA Ø 3'' PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANAc	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20											
398		EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	1 día	mié 5/8/20	mié 5/8/20											
399		<b>CRUCE PUENTE DE F Ø 12'' ACERO SCH-40 L= 36.00M (3 UNIDADES)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>											
400		<b>1ER. CRUCE DE 12'' (ALCANTARILLA) POR ABAJO</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>											
401		REPLANTEO	1 día	lun 15/2/21	lun 15/2/21											
402		CORTE CA ERPETA ASFALTICA E=3''	1 día	mar 16/2/21	mar 16/2/21											
403		EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA E=3''	1 día	mié 17/2/21	mié 17/2/21											
404		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 18/2/21	jue 18/2/21											
405		SUMINISTRO TUBERIA A12 PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	vie 19/2/21	vie 19/2/21											
406		COLOCACION TUBERIA A12 PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	2 días	lun 22/2/21	mar 23/2/21											
407		SUMINISTRO TUBERIA DE A12" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	vie 19/2/21	vie 19/2/21											
408		COLOCACION TUBERIA DE A12" ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	2 días	lun 22/2/21	mar 23/2/21											
409		CODO A12"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVO	1 día	mié 24/2/21	mié 24/2/21											
410		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER A12" (150 PSI)	1 día	mié 24/2/21	mié 24/2/21											
411		ANCLAJE DE F'C=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	jue 25/2/21	jue 25/2/21											
412		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	lun 22/2/21	lun 22/2/21											
413		BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 23/2/21	mar 23/2/21											
414		EXCAVACION DE MATERIAL CON EQUIPO	1 día	vie 19/2/21	vie 19/2/21											
415		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA TOSCA	1 día	vie 19/2/21	vie 19/2/21											
416		<b>2DO. CRUCE DE 12'' (1ER. CRUCE DE PUENTE)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>											
417		REPLANTEO	1 día	mié 24/2/21	mié 24/2/21											
418		CORTE CA ERPETA ASFALTICA E=3''	1 día	jue 25/2/21	jue 25/2/21											
419		EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA E=3''	1 día	vie 26/2/21	vie 26/2/21											
420		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	lun 1/3/21	lun 1/3/21											
421		SUMINISTRO TUBERIA DE Ø12'' ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	mar 2/3/21	mar 2/3/21											
422		COLOCACION TUBERIA DE Ø12'' ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	2 días	mié 3/3/21	jue 4/3/21											
423		CODO A12"x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVO	1 día	vie 5/3/21	vie 5/3/21											
424		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER A12" (150 PSI)	1 día	lun 8/3/21	lun 8/3/21											
425		VALVULA DE AIRE Ø 12'' EN TUBERIA DE Ø 12'' (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA INSTALACION)	1 día	vie 12/3/21	vie 12/3/21											

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	
426		ANCLAJE DE FC=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	lun 8/3/21	lun 8/3/21										
427		USO DE BOMBA PARA SACAR EL AGUA	3 días	mié 3/3/21	vie 5/3/21										
428		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 10/3/21	mié 10/3/21										
429		BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 11/3/21	jue 11/3/21										
430		EXCAVACION DE MATERIAL CON EQUIPO	1 día	mar 2/3/21	mar 2/3/21										
431		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA TOSCA	1 día	mar 9/3/21	mar 9/3/21										
432		<b>3ER. CRUCE DE 12'' (2DO. CRUCE PUENTE)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
433		REPLANTEO	1 día	mié 10/3/21	mié 10/3/21										
434		CORTE CA ERPETA ASFALTICA E=3''	1 día	lun 15/3/21	lun 15/3/21										
435		EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA E=3''	1 día	mar 16/3/21	mar 16/3/21										
436		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mié 17/3/21	mié 17/3/21										
437		SUMINISTRO TUBERIA Ø12'' PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	jue 18/3/21	jue 18/3/21										
438		COLOCACION TUBERIA Ø12'' PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	3 días	mié 24/3/21	vie 26/3/21										
439		SUMINISTRO TUBERIA DE Ø12'' ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	1 día	jue 18/3/21	jue 18/3/21										
440		COLOCACION TUBERIA DE Ø12'' ACERO SCH-80 SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO	3 días	mié 24/3/21	vie 26/3/21										
441		CODO Ø12''x45° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVO	1 día	lun 29/3/21	lun 29/3/21										
442		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø12'' (150 PSI)	1 día	mar 30/3/21	mar 30/3/21										
443		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 4" (150 PSI)	1 día	mié 31/3/21	mié 31/3/21										
444		SUMINISTRO TUBERIA Ø4'' PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPAN	1 día	jue 1/4/21	jue 1/4/21										
445		ANCLAJE DE FC=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	mar 30/3/21	mar 30/3/21										
446		VALVULA DE AIRE Ø 12" EN TUBERIA DE Ø 12" (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA INSTALACION)	1 día	mié 7/4/21	mié 7/4/21										
447		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	vie 2/4/21	lun 5/4/21										
448		BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 6/4/21	mar 6/4/21										
449		EXCAVACION DE MATERIAL CON EQUIPO	3 días	vie 19/3/21	mar 23/3/21										
450		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA TOSCA	1 día	jue 1/4/21	jue 1/4/21										
451		<b>HIDRANTE</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
452		HIDRANTE DE ACERO	1 día	lun 12/4/21	lun 12/4/21										
453		TEE Ø 4'' X 4'' ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	jue 8/4/21	jue 8/4/21										
454		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 4" (150 PSI)	1 día	vie 9/4/21	vie 9/4/21										
455		VALVULA DE COMPUERTA Ø 4" H.F. 150 PSI	1 día	mar 13/4/21	mar 13/4/21										

◆ 17/2

◆ 17/2

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	
456		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA Ø 4"	1 día	mié 14/4/21	mié 14/4/21										
457		SUMINISTRO TUBERIA DE Ø 2" PVC	1 día	jue 8/4/21	jue 8/4/21										
458		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 2" (150 PSI)	1 día	vie 9/4/21	vie 9/4/21										
459		COPLIN DE Ø 2"	1 día	vie 9/4/21	vie 9/4/21										
460		ANCLAJE DE FC = 210 KG/CM2 SEGÚN DISEÑO	1 día	mar 13/4/21	mar 13/4/21										
461		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	vie 16/4/21	lun 19/4/21										
462		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 20/4/21	mar 20/4/21										
463		USO DE EQUIPO PARA EXCAVACION (RETRO PALA)	1 día	mié 7/4/21	mié 7/4/21										
464		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA	1 día	jue 15/4/21	jue 15/4/21										
465		<b>LEVANTAMIENTO DE CAJAS TELESCOPICA: YA QUE EL AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DE PIMENTEL MEJORARON LAS CALLES Y CALLEJONES ECHANDO CALICHE</b>	0 días	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
466		<b>LEVANTAMIENTO DE CAJA TELESCOPICA EN VALVULA DE φ 4" (TRES UNIDADES)</b>	0 días	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
467		PEDAZO DE TUBO φ 6", PARA SUBIRLA, LONGITUD APROXIMADA 0.50 M	1 día	jue 22/4/21	jue 22/4/21										
468		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	vie 23/4/21	vie 23/4/21										
469		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	lun 26/4/21	lun 26/4/21										
470		CONSTRUCCION LOSA H.A.PARA CAJA	1 día	mar 27/4/21	mar 27/4/21										
471		USO DE RETRO PALA	1 día	mié 21/4/21	mié 21/4/21										
472		MANO DE OBRA	1 día	mié 28/4/21	mié 28/4/21										
473		<b>LEVANTAMIENTO DE CAJA TELESCOPICA EN VALVULA DE φ 3" (UNA UNIDADES)</b>	0 días	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
474		PEDAZO DE TUBO φ 6", PARA SUBIRLA, LONGITUD APROXIMADA 0.50 M	1 día	vie 30/4/21	vie 30/4/21										
475		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	lun 3/5/21	lun 3/5/21										
476		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	mar 4/5/21	mar 4/5/21										
477		CONSTRUCCION LOSA H.A.PARA CAJA	1 día	mié 5/5/21	mié 5/5/21										
478		MANO DE OBRA	1 día	jue 6/5/21	jue 6/5/21										
479		USO DE RETRO PALA	1 día	jue 29/4/21	jue 29/4/21										
480		<b>SOLUCIONANDO AVERIAS (TRES AVERIAS)</b>	0 días	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
481		REPLANTEO	3 días	lun 10/1/22	mié 12/1/22										
482		CORTE CARPETA ASFALTICA E=3"	3 días	jue 13/1/22	lun 17/1/22										
483		EXTRACCION CARPETA ASFALTICA E= 3"	3 días	mar 18/1/22	jue 20/1/22										

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo			mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	P
484		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	3 días	vie 21/1/22	mar 25/1/22										
485		SUMINISTRO TUBERIA DE 8" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	mié 26/1/22	mié 26/1/22										
486		COLOCACION TUBERIA DE 8" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	3 días	jue 27/1/22	lun 31/1/22										
487		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER φ8" (150 PSI)	3 días	mar 1/2/22	jue 3/2/22										
488		USO BOMBA PARA SACAR EL AGUA	9 días	jue 27/1/22	mar 8/2/22										
489		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	3 días	vie 4/2/22	mar 8/2/22										
490		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	3 días	mié 9/2/22	vie 11/2/22										
491		EXCAVACION DE MATERIAL CON EQUIPO	1 día	mié 26/1/22	mié 26/1/22										
492		<b>AVERIAS EN ACERA EN EL PESCOZON</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
493		REPLANTEO	1 día	lun 14/2/22	lun 14/2/22										
494		CORTE ACERA E=10"	1 día	mar 15/2/22	mar 15/2/22										
495		EXTRACCION CARPETA DE HORMIGON EN ACERA E= 10"	1 día	mié 16/2/22	mié 16/2/22										
496		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 17/2/22	jue 17/2/22										
497		SUMINISTRO TUBERIA DE 8" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22										
498		COLOCACION TUBERIA DE 8" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22										
499		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER φ8" (150 PSI)	1 día	mar 22/2/22	mar 22/2/22										
500		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	1 día	mié 23/2/22	mié 23/2/22										
501		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	1 día	jue 24/2/22	jue 24/2/22										
502		RECONSTRUCCION ACERA	2 días	vie 25/2/22	lun 28/2/22										
503		USO DE RETRO PALA	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22										
504		<b>DESAGUES EN LOS PUENTES GUISA, CUCA Y PUENTE 8" EN CAOBETE ARRIBA</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 17/2/20</b>	<b>lun 17/2/20</b>										
505		TEE φ 8" X 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	1 día	mié 2/3/22	mié 2/3/22										
506		VALVULA DE COMPUERTA Ø 4" H.F. 150 PSI	3 días	jue 3/3/22	lun 7/3/22										
507		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA Ø 4"	3 días	mar 8/3/22	jue 10/3/22										
508		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 8" (150 PSI)	2 días	jue 3/3/22	vie 4/3/22										
509		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER Ø 4" (150 PSI)	2 días	mar 8/3/22	mié 9/3/22										
510		SUMINISTRO TUBERIA DE 4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	mié 2/3/22	mié 2/3/22										
511		COLOCACION TUBERIA DE 4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	3 días	jue 3/3/22	lun 7/3/22										


*Carla Sosa F.*









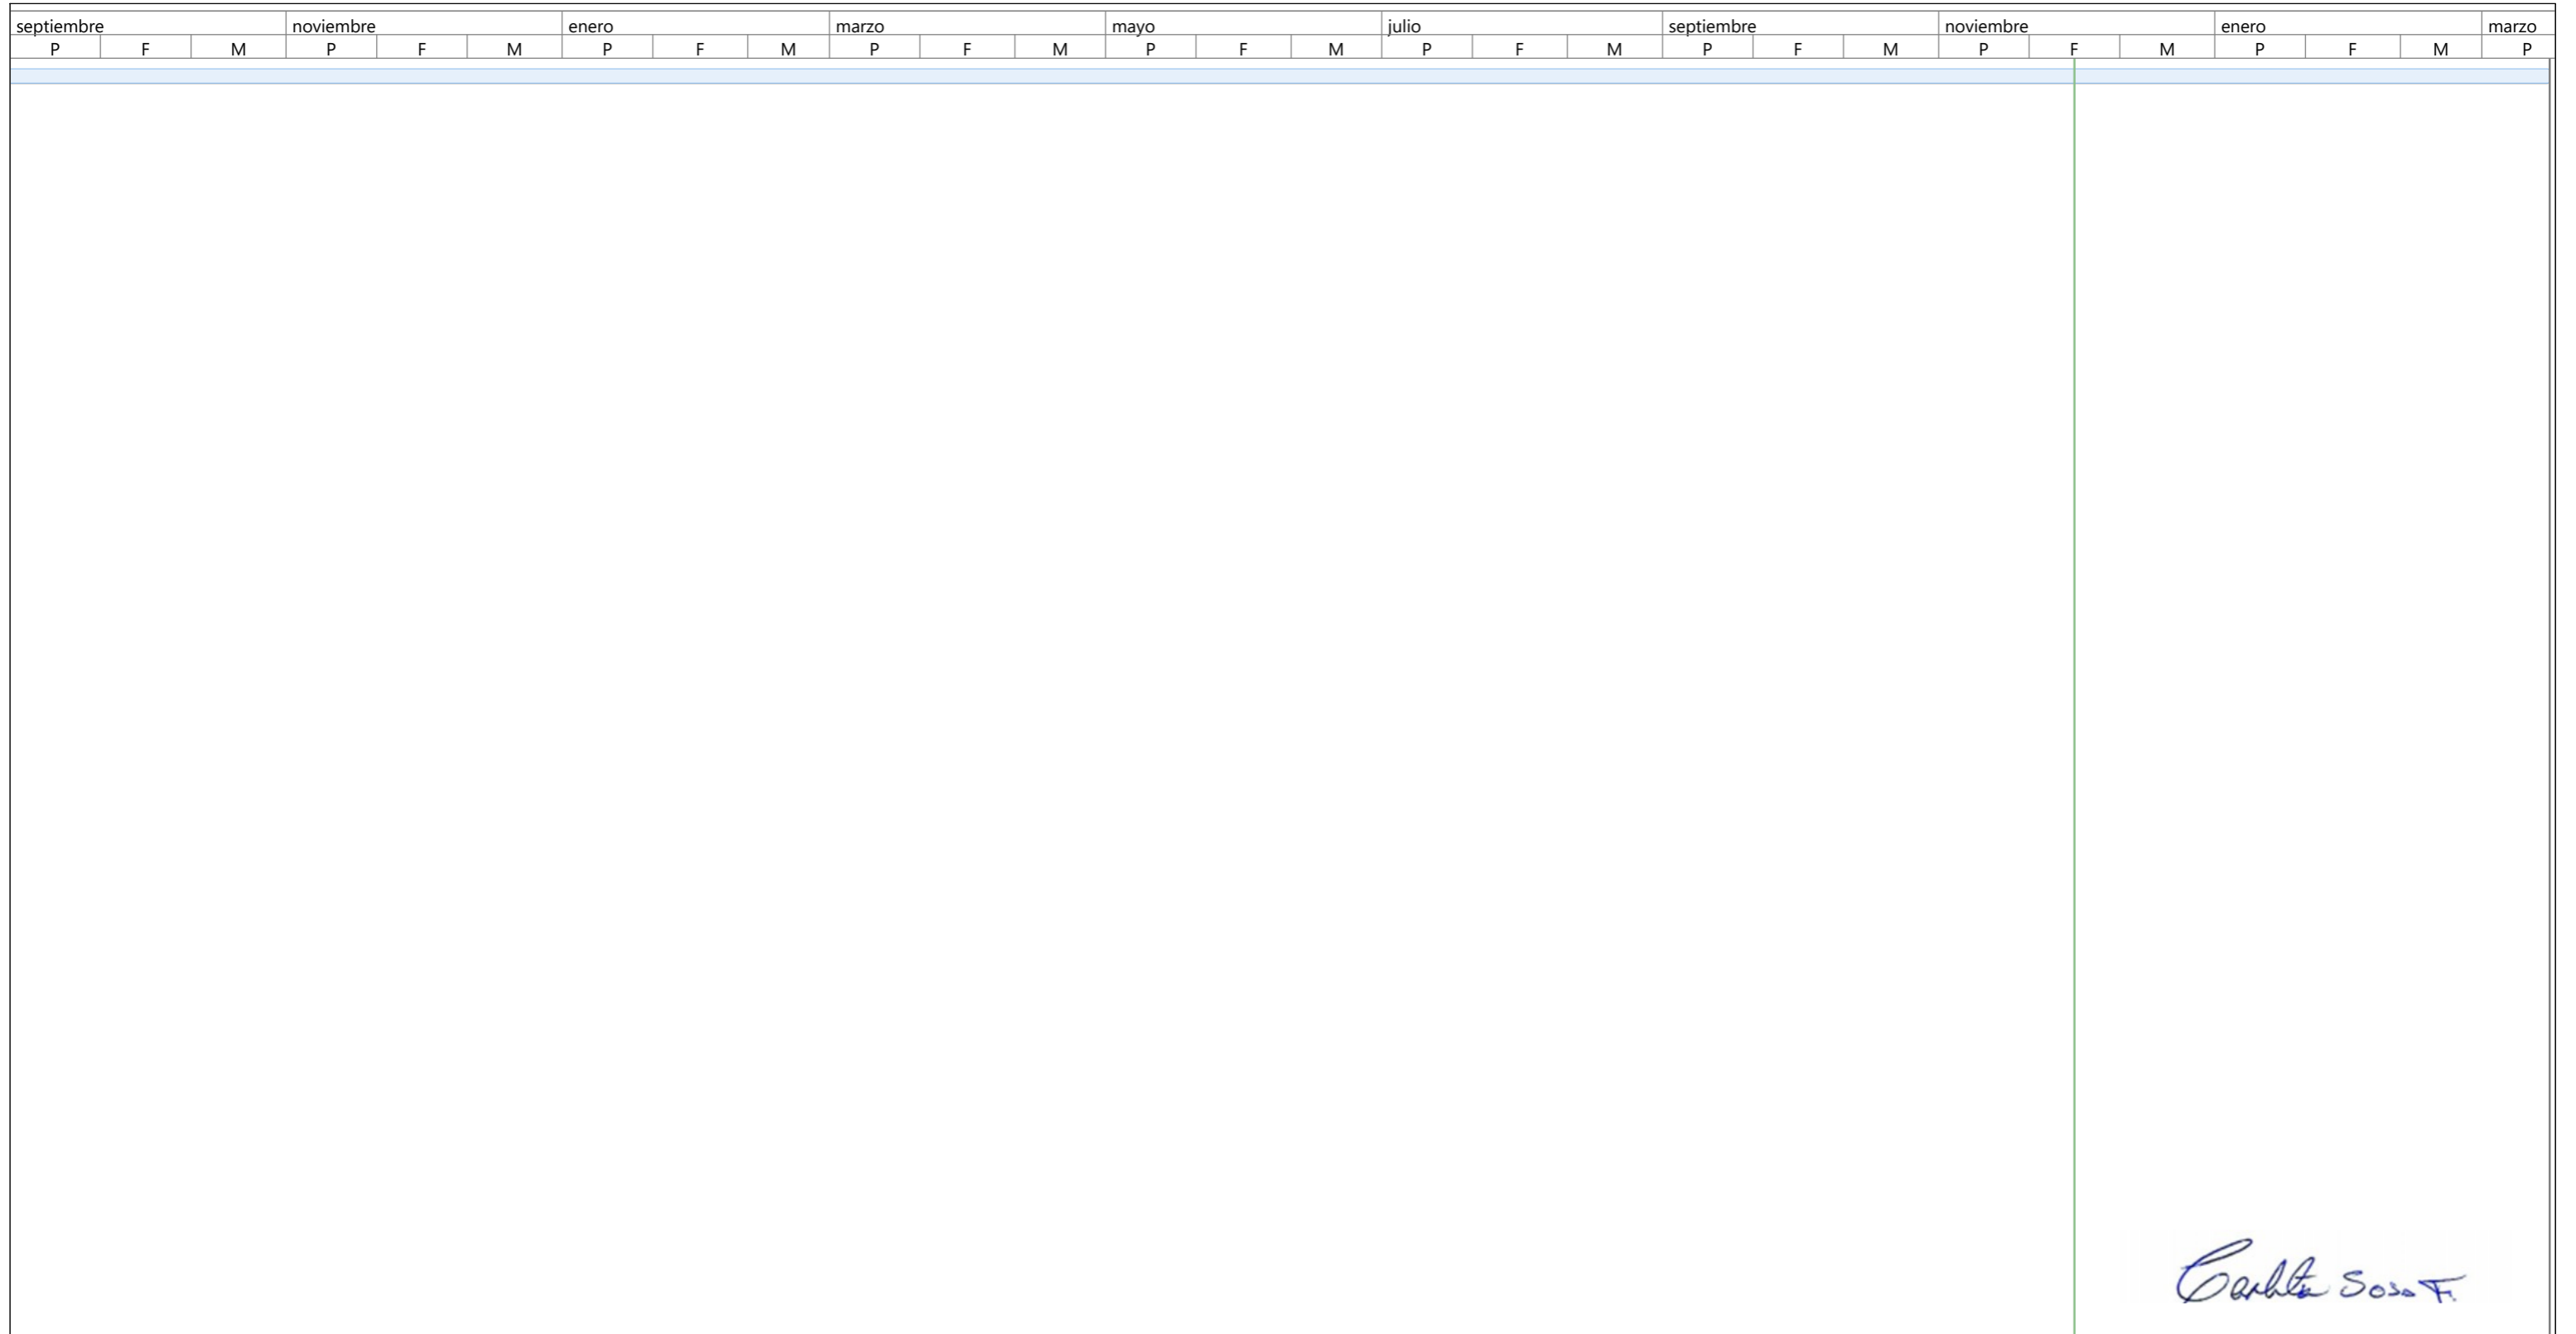










Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	marzo					mayo			julio			septiembre
						F	M	P	F	M	P	F	M	P	F	M	P
512		SUMINISTRO TUBERIA DE 6" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	1 día	mié 2/3/22	mié 2/3/22												
513		COLOCACION TUBERIA DE 6" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA	3 días	jue 3/3/22	lun 7/3/22												
514		CODOS 4" PVC DE PRESION	1 día	mar 8/3/22	mar 8/3/22												
515		USO DE BOMBA DE ACHIQUE	3 días	mié 2/3/22	vie 4/3/22												
516		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS 0.20	2 días	mar 8/3/22	mié 9/3/22												
517		BOTE CARPETA EXTRAIDA (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	3 días	jue 10/3/22	lun 14/3/22												
518		CONSTRUCCION ACERA ENCIMA TUBOS DE 4"	1 día	mar 15/3/22	mar 15/3/22												
519		USO DE RETRO PALA	3 días	vie 25/2/22	mar 1/3/22												









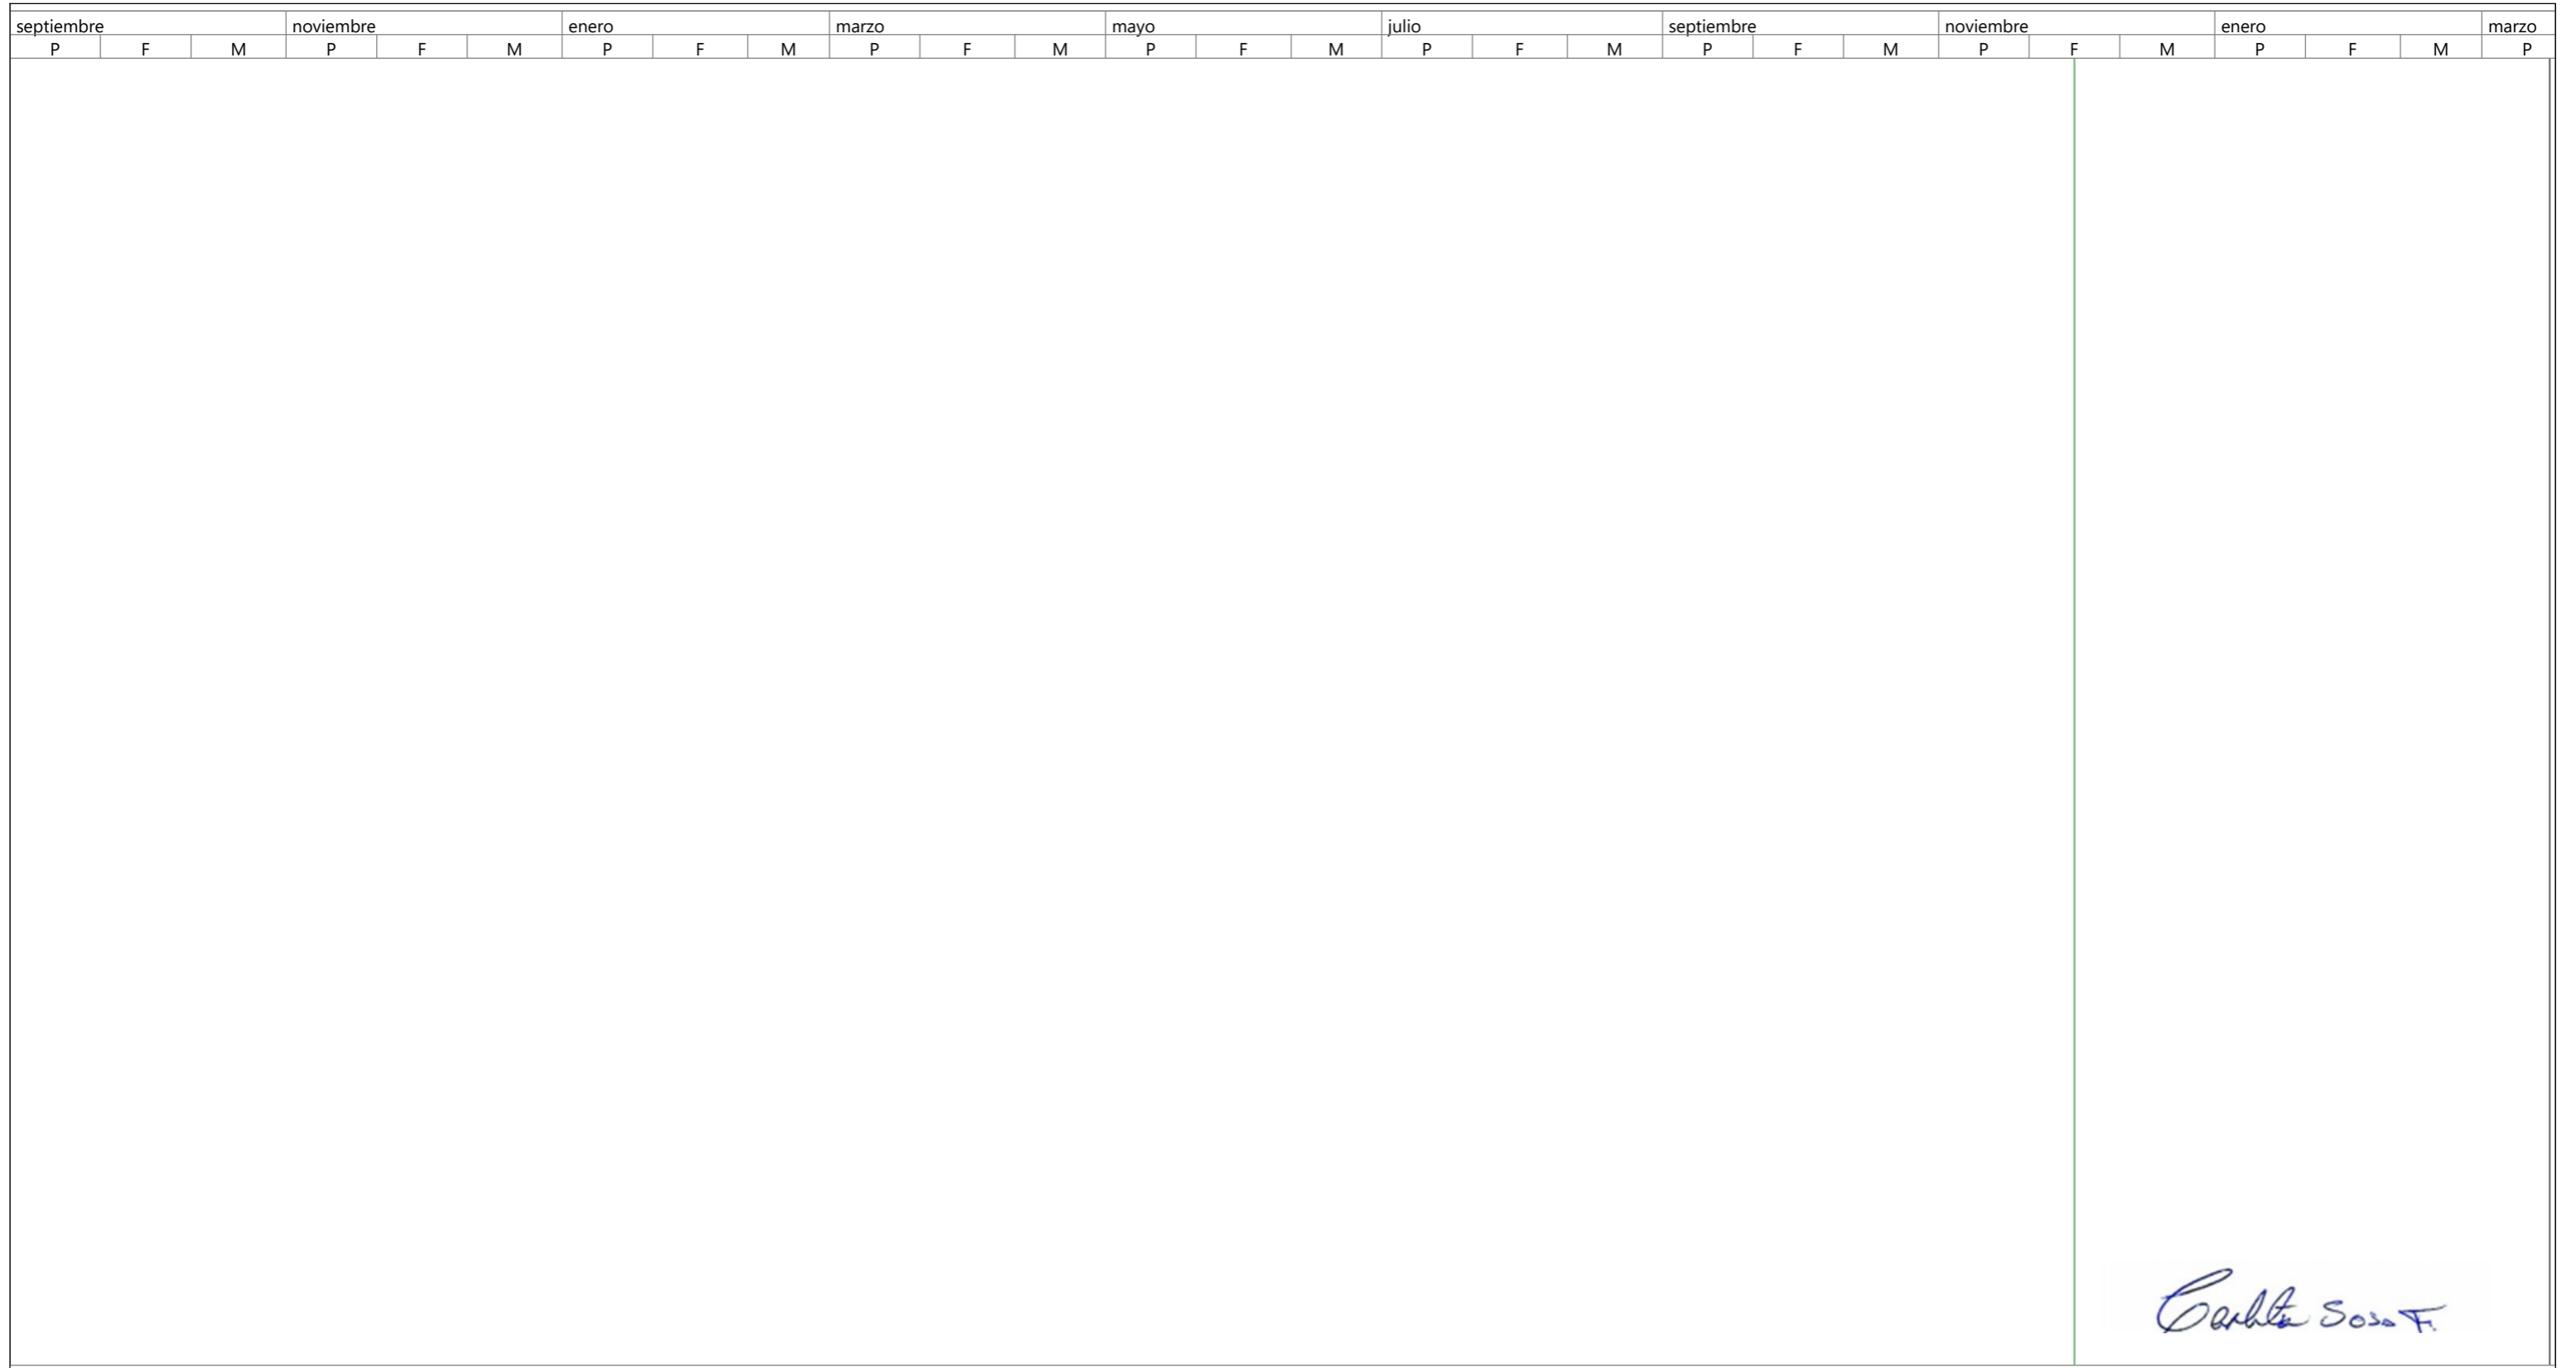










*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			









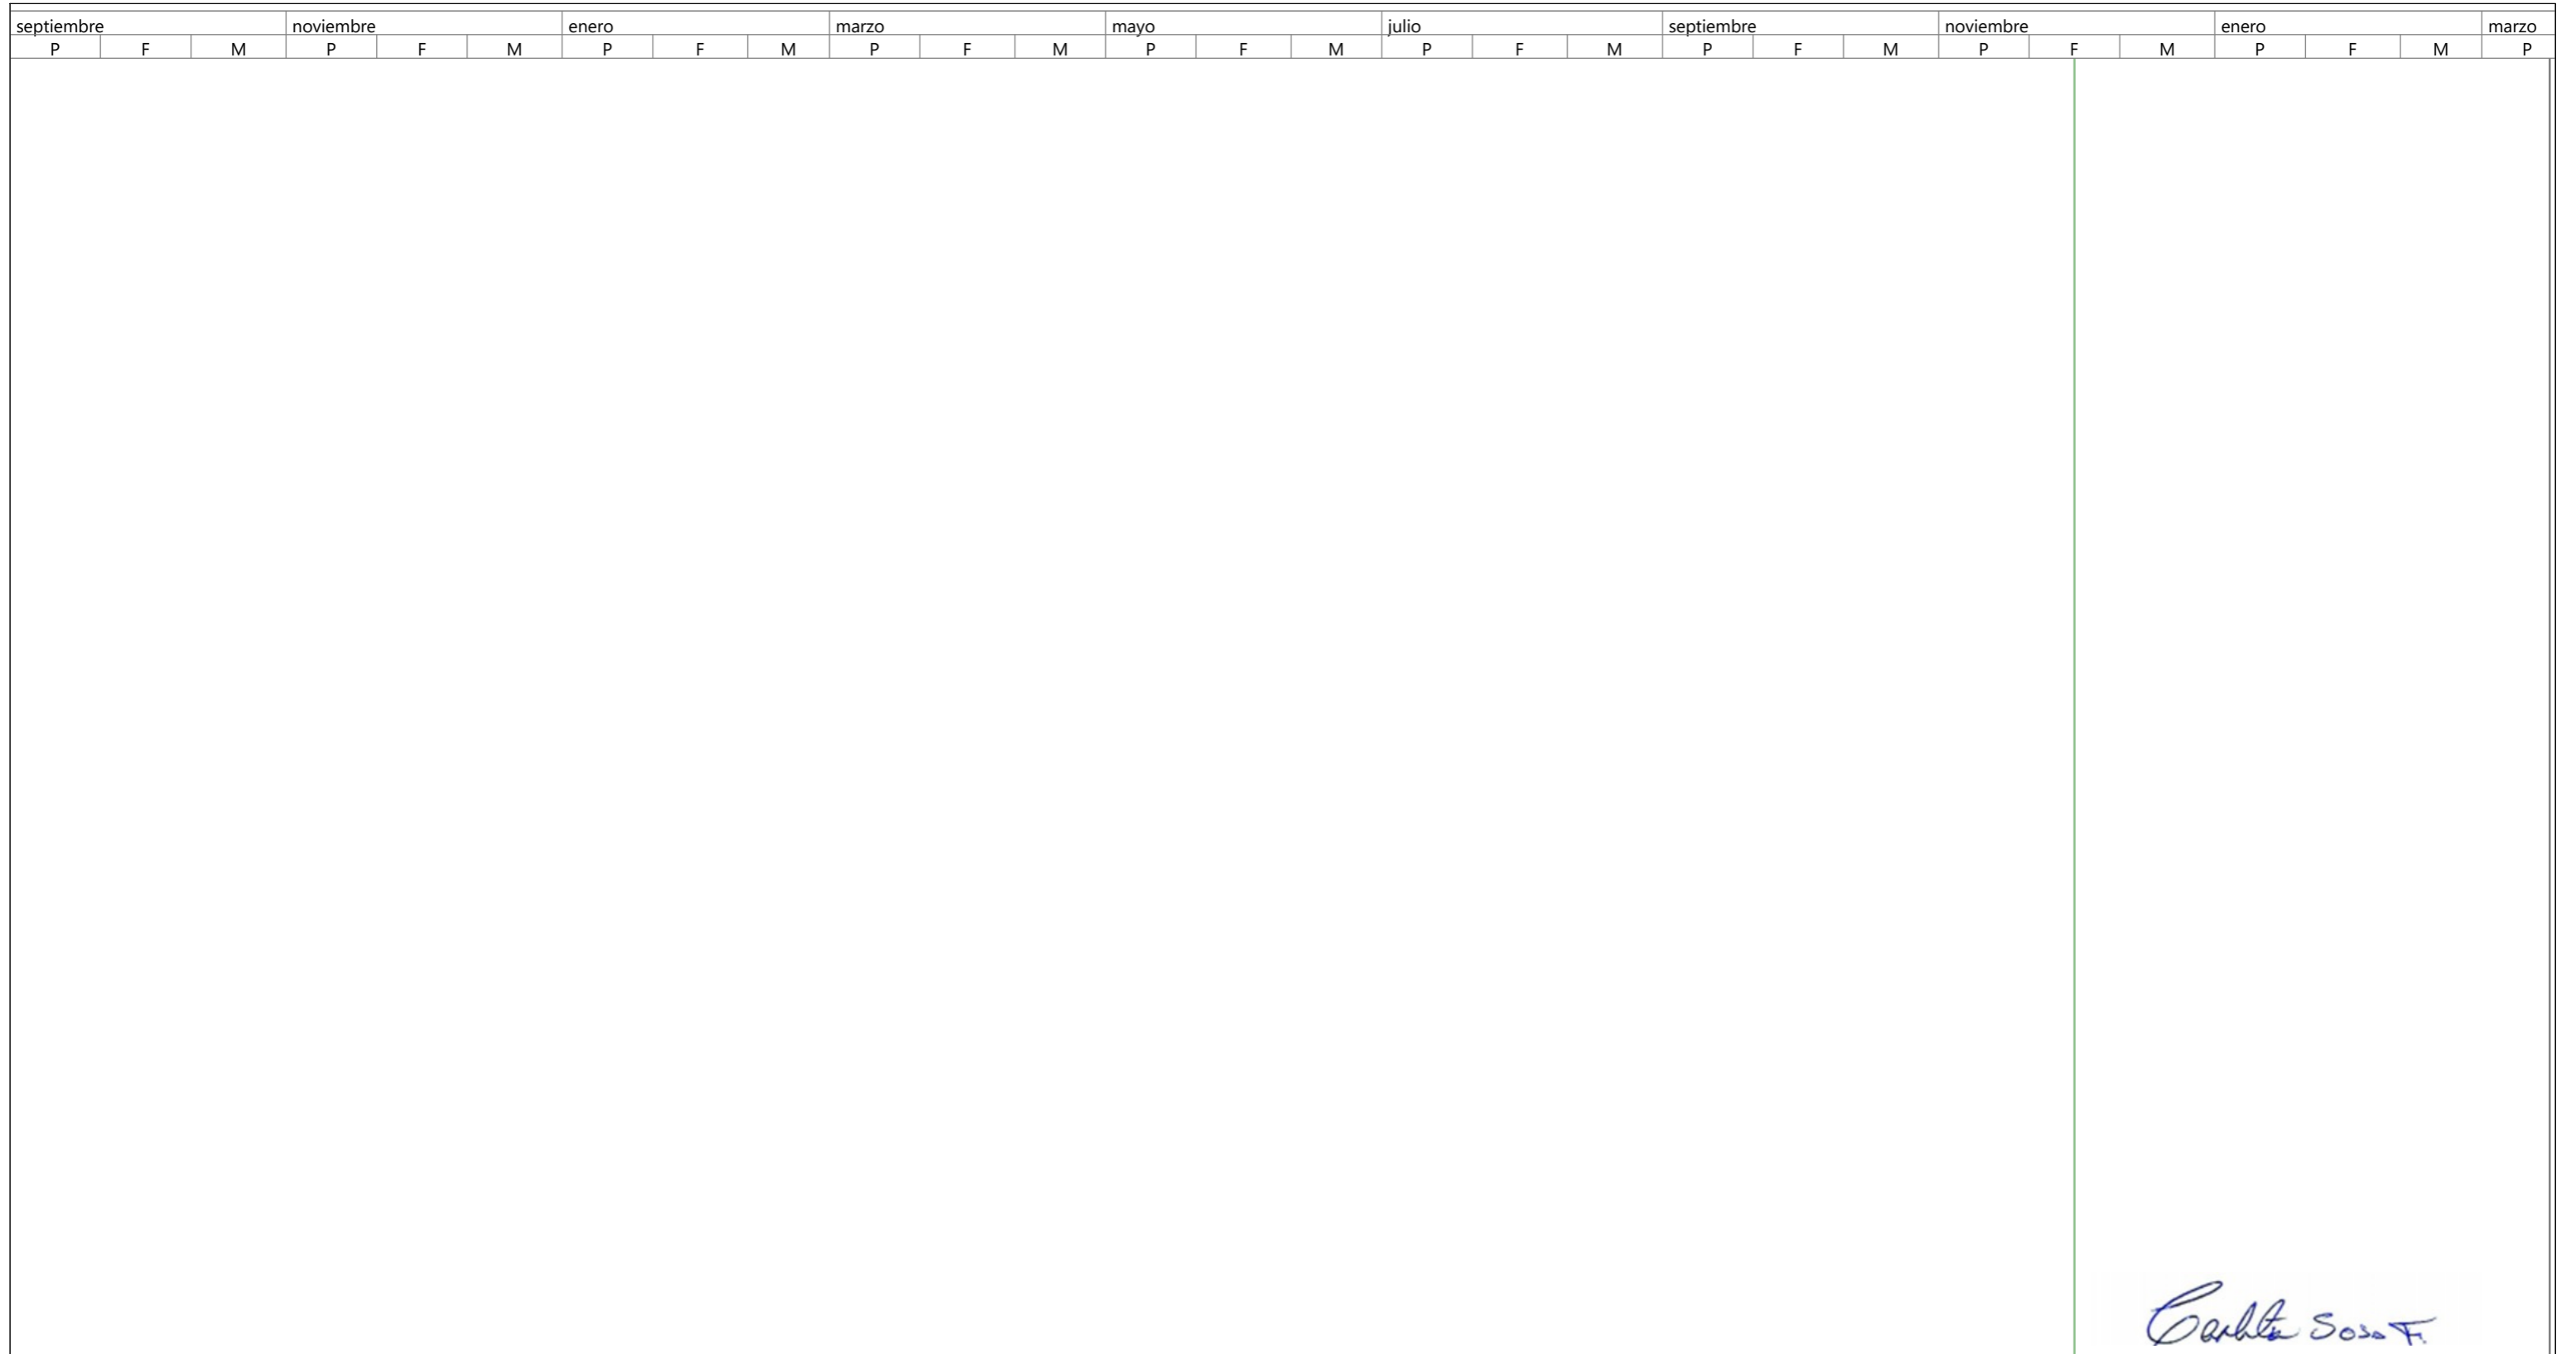












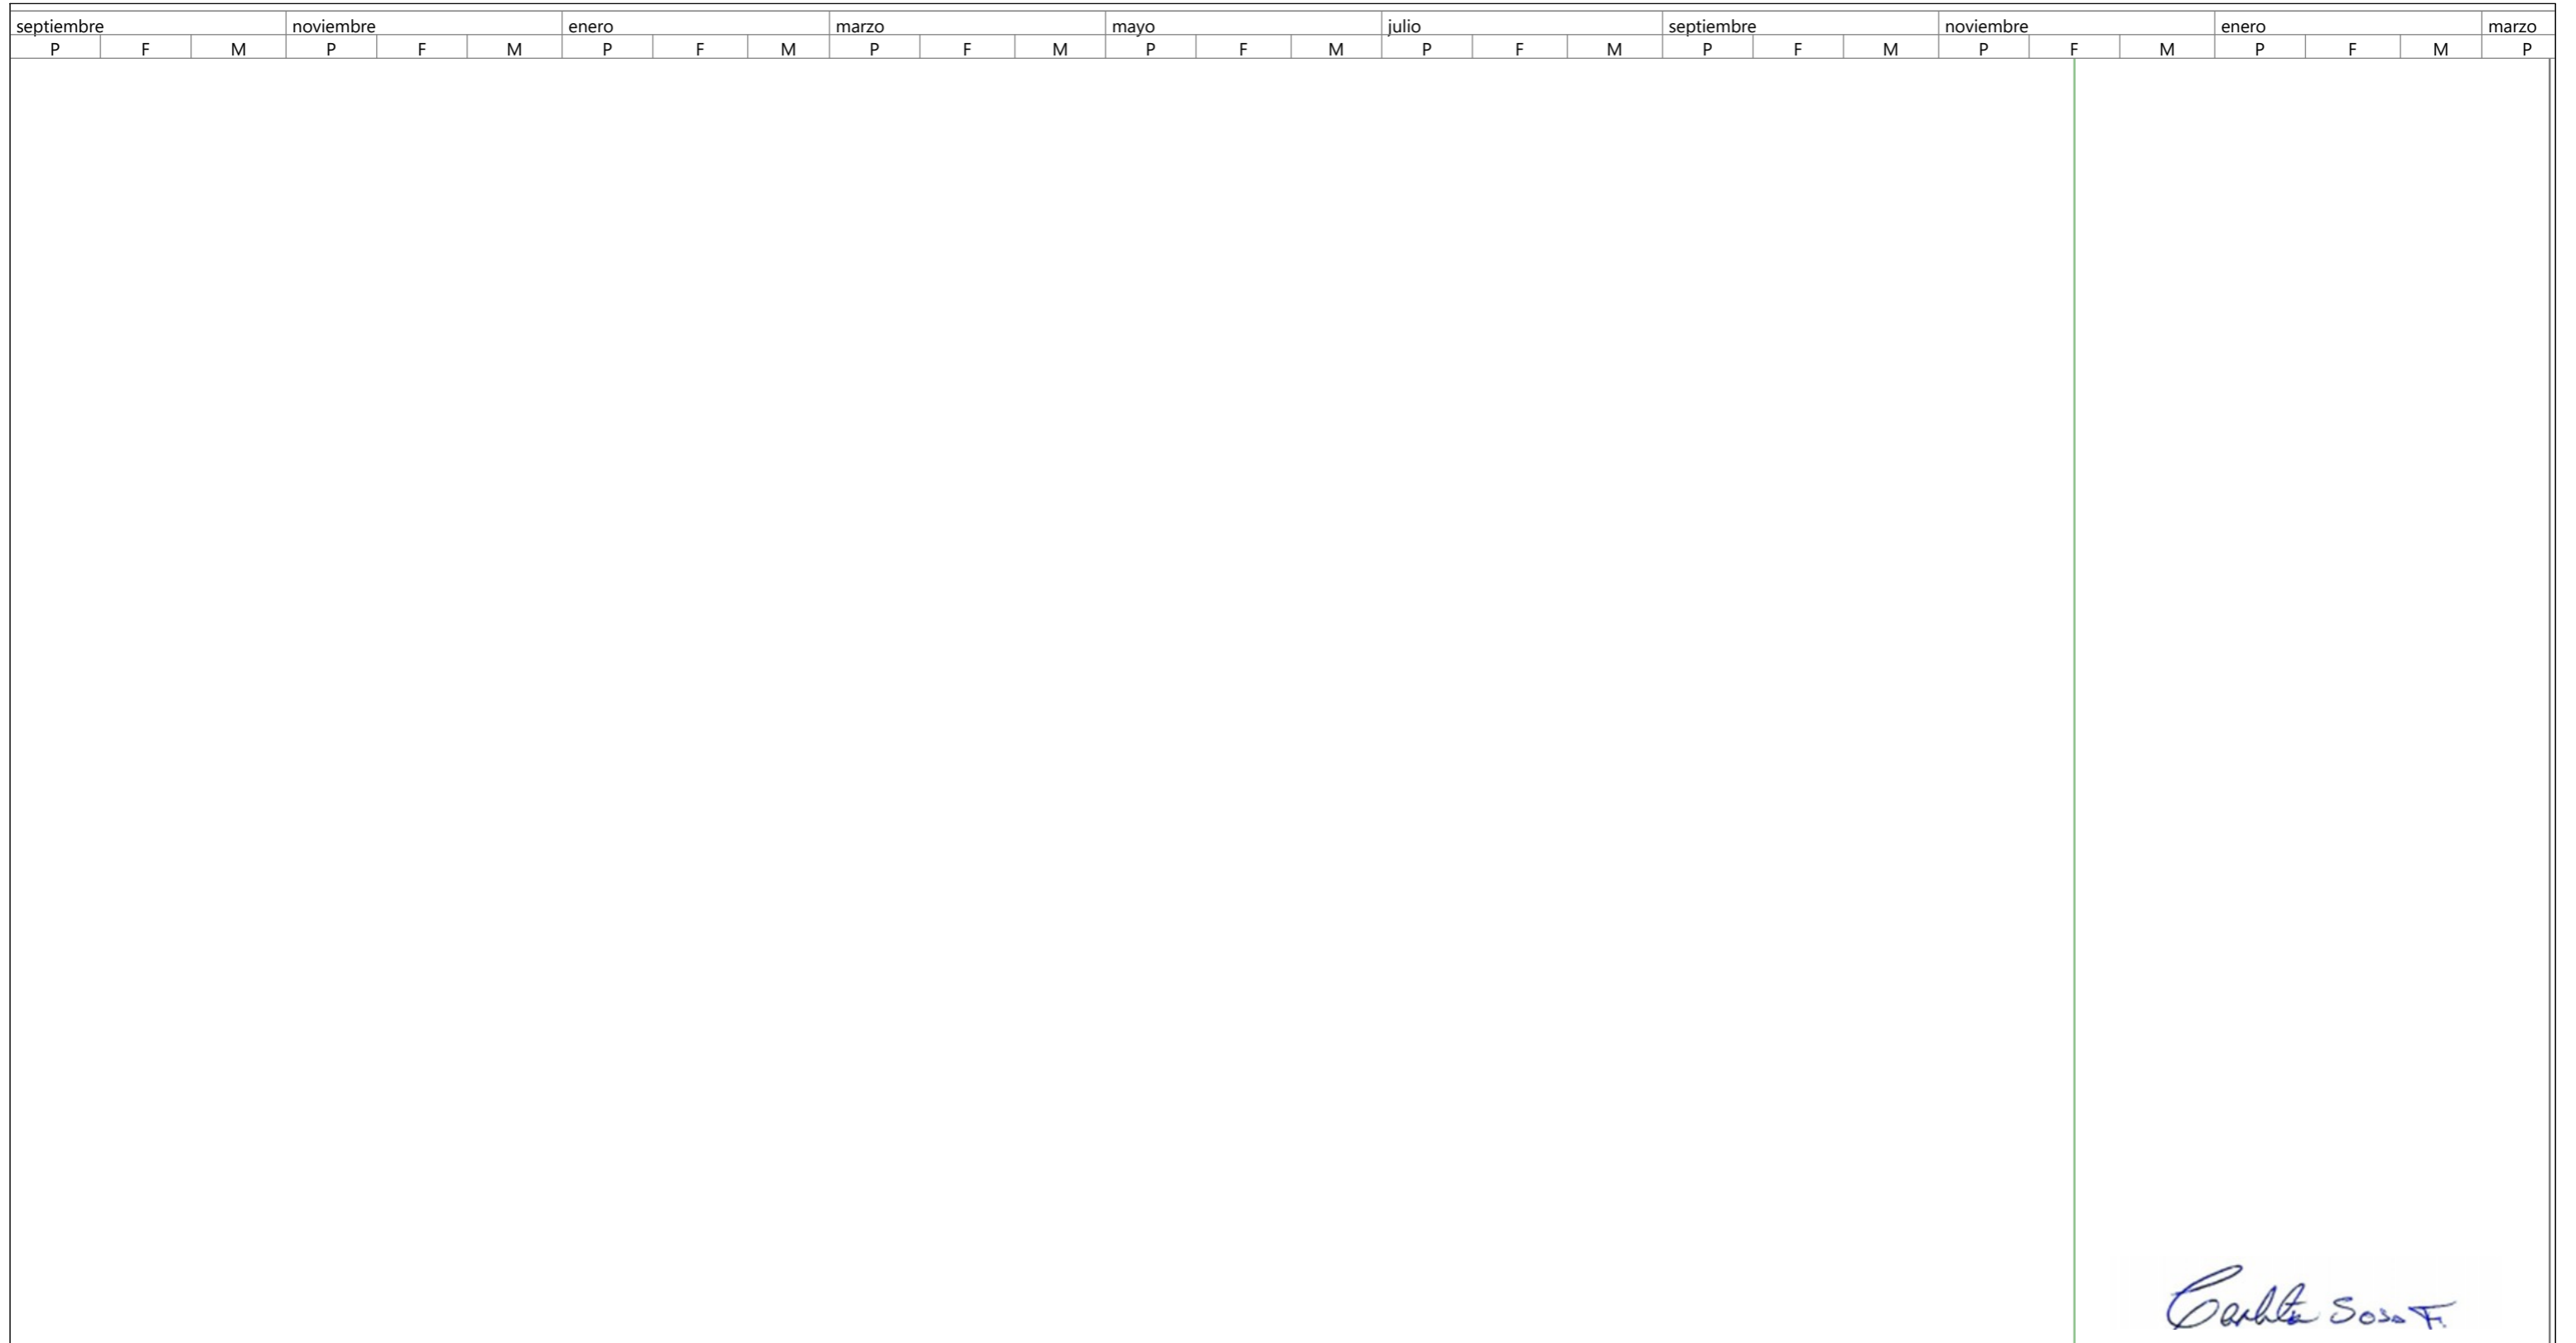
Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			




Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			









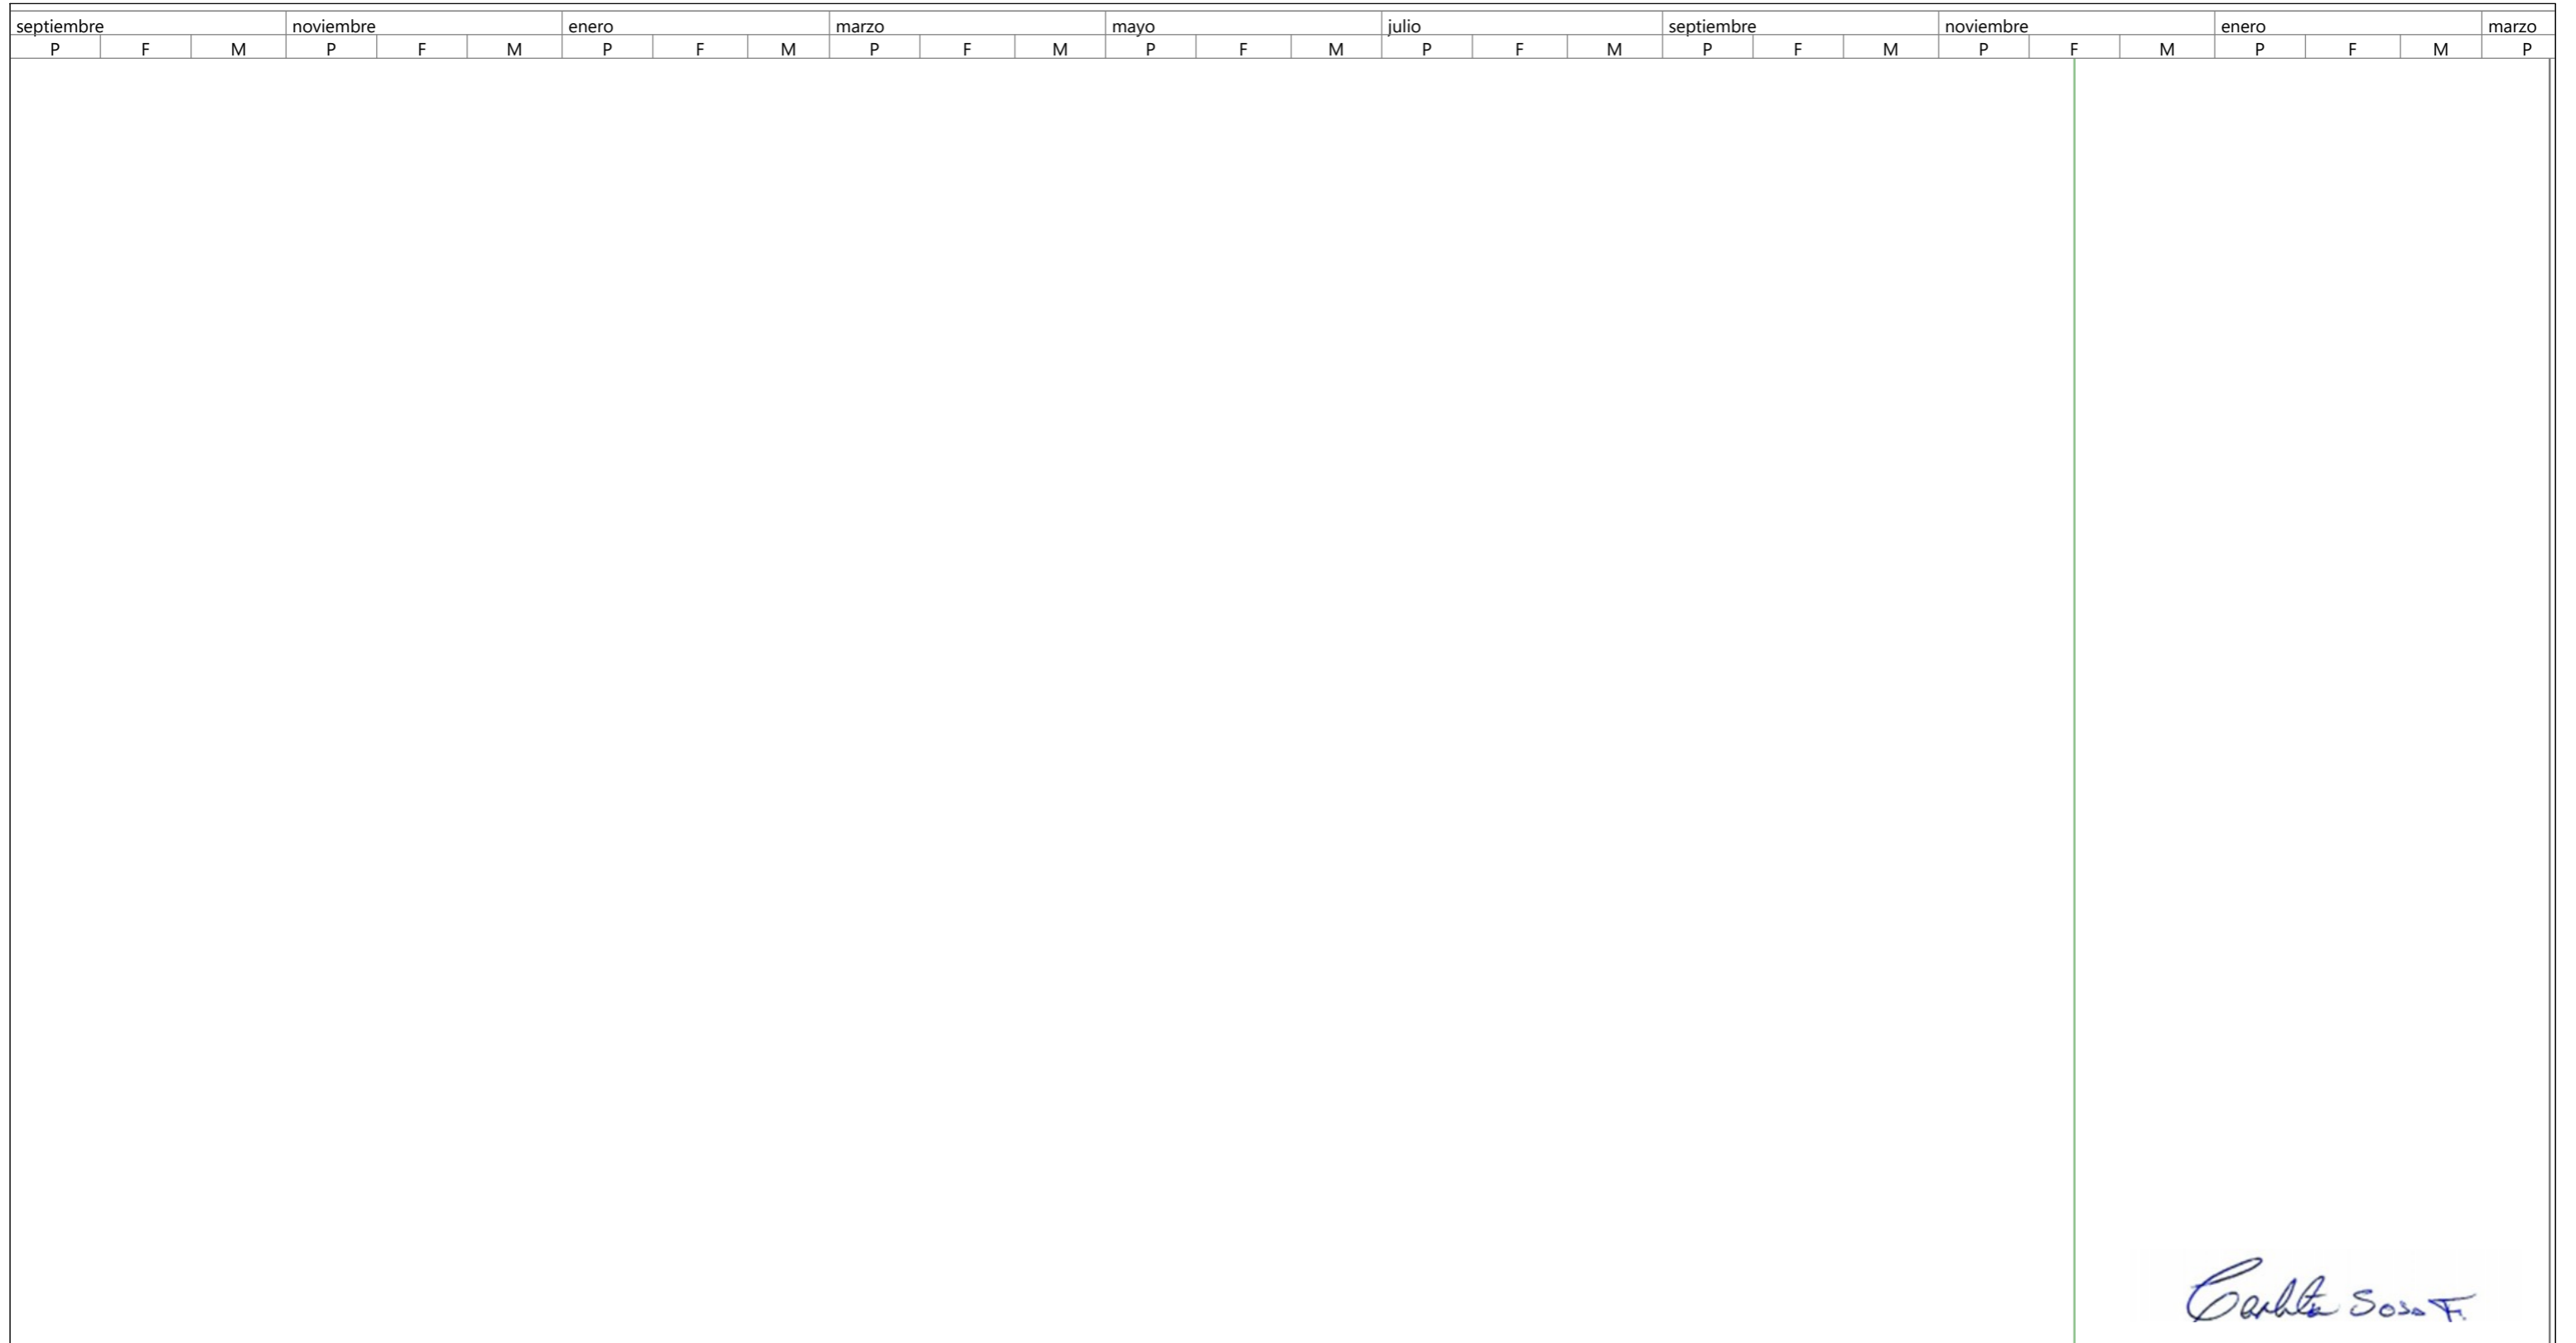












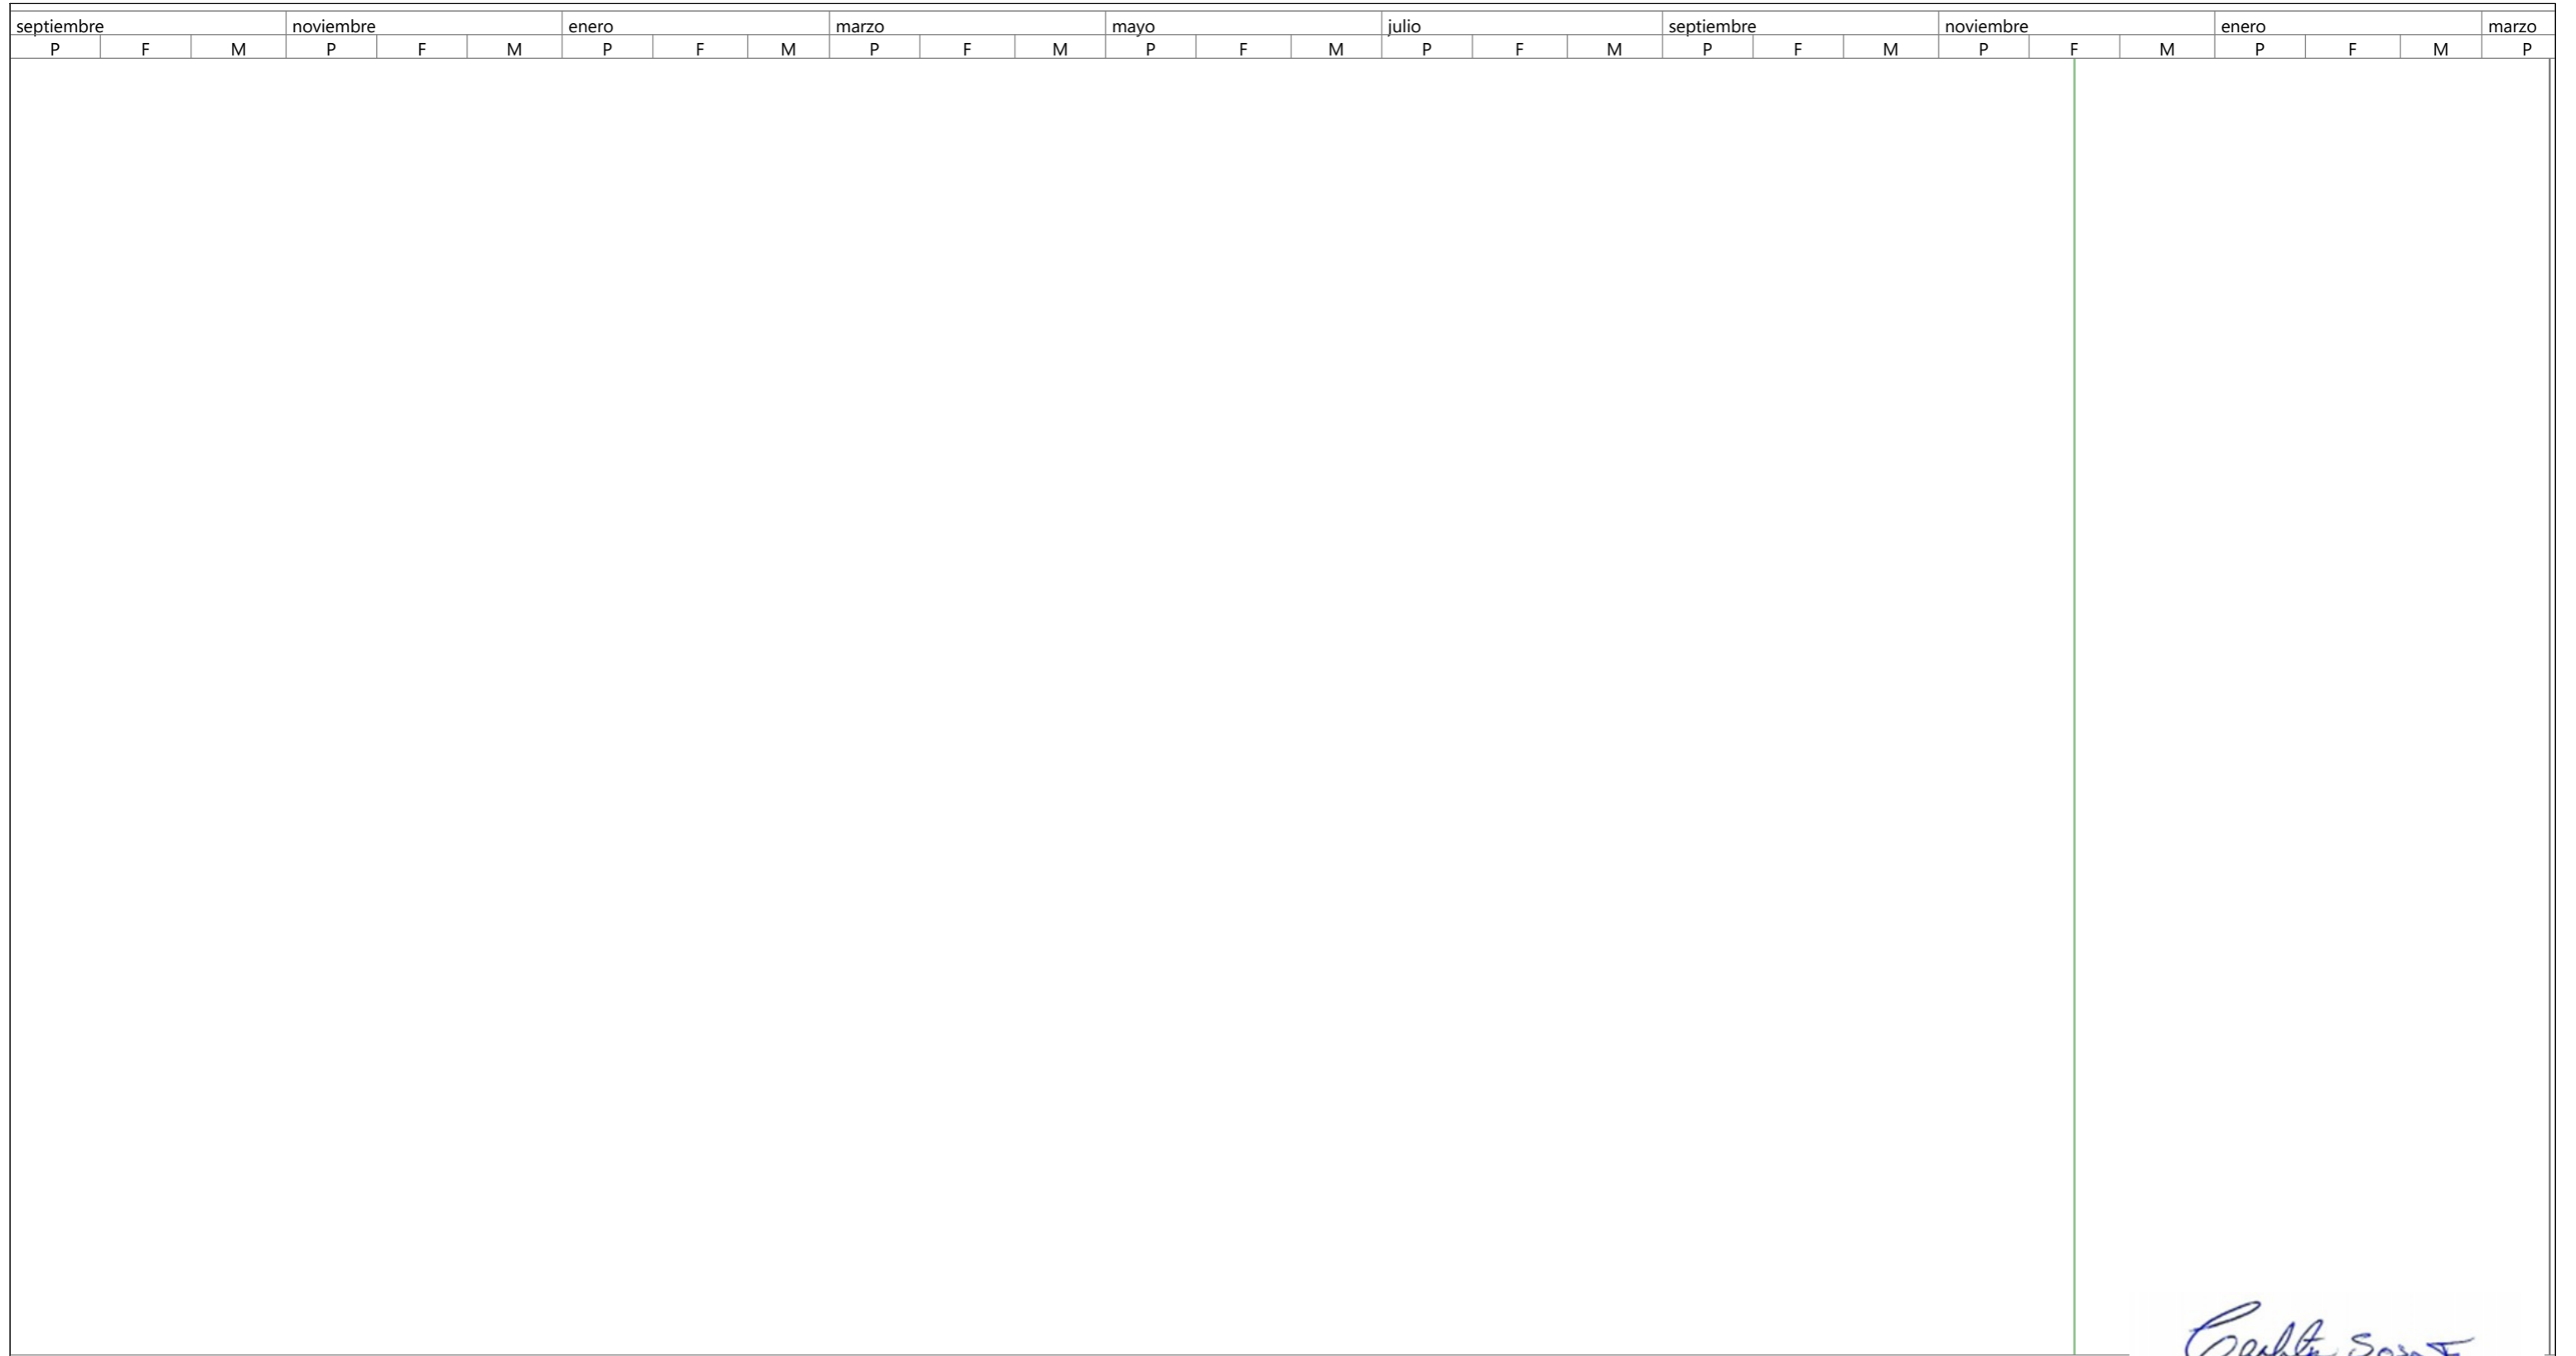
Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			




Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			









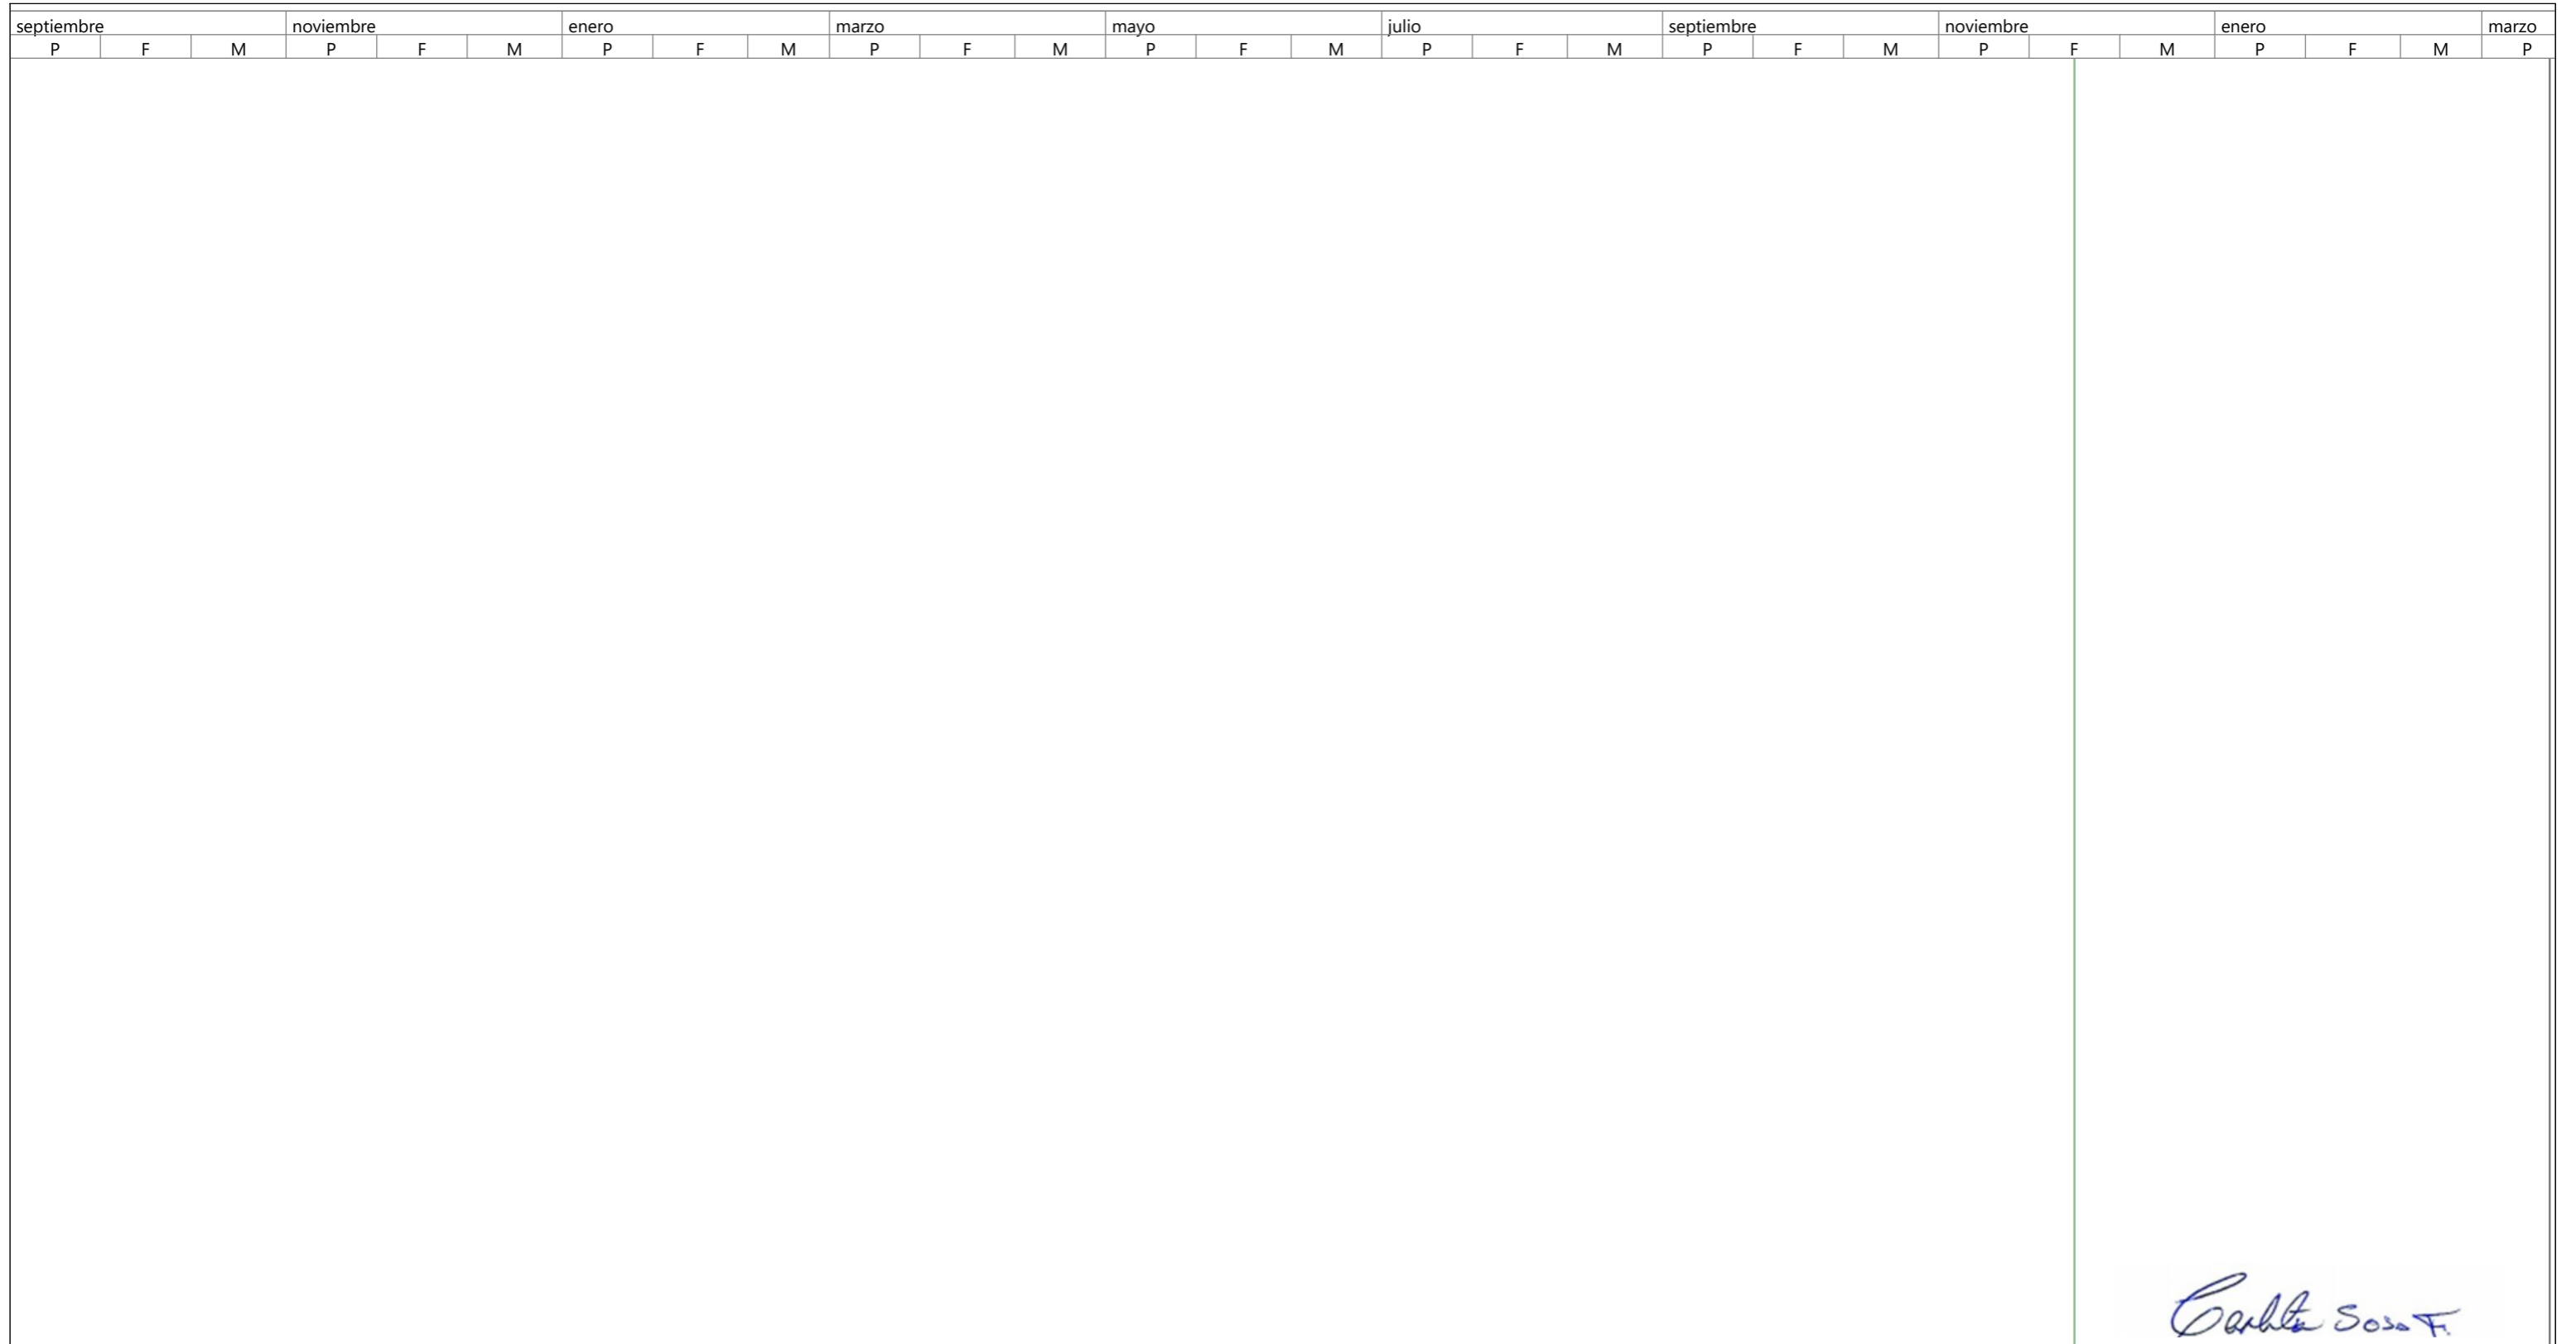












*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			









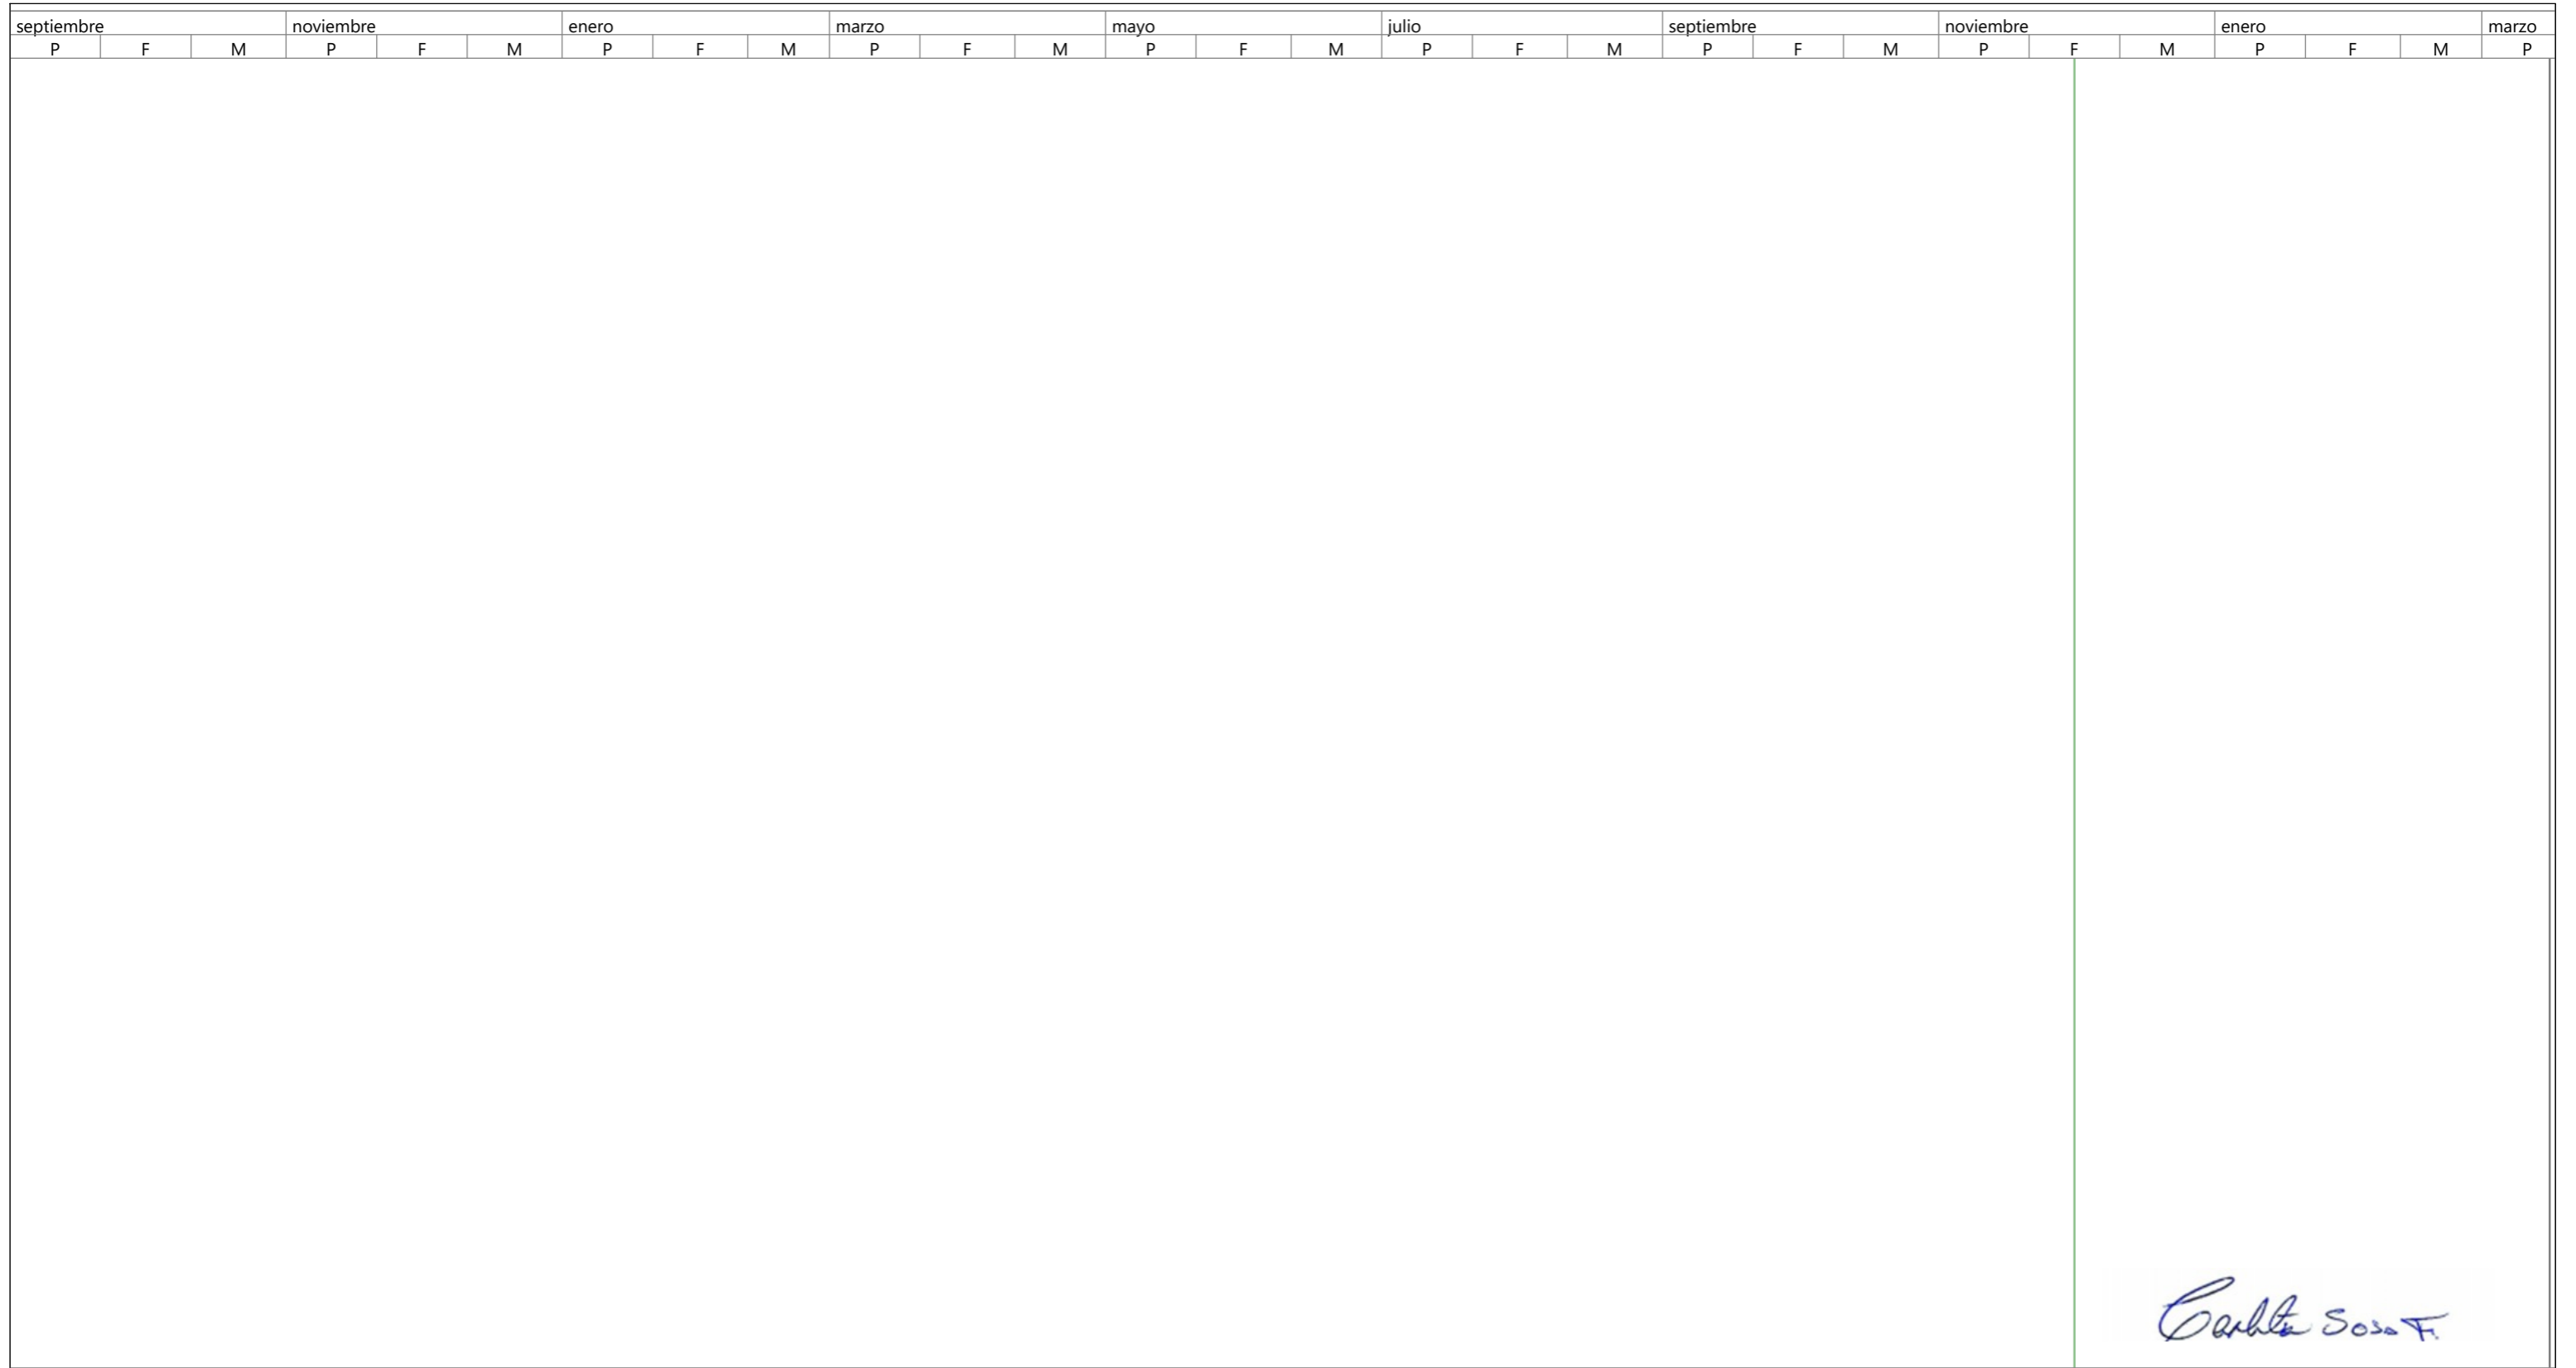












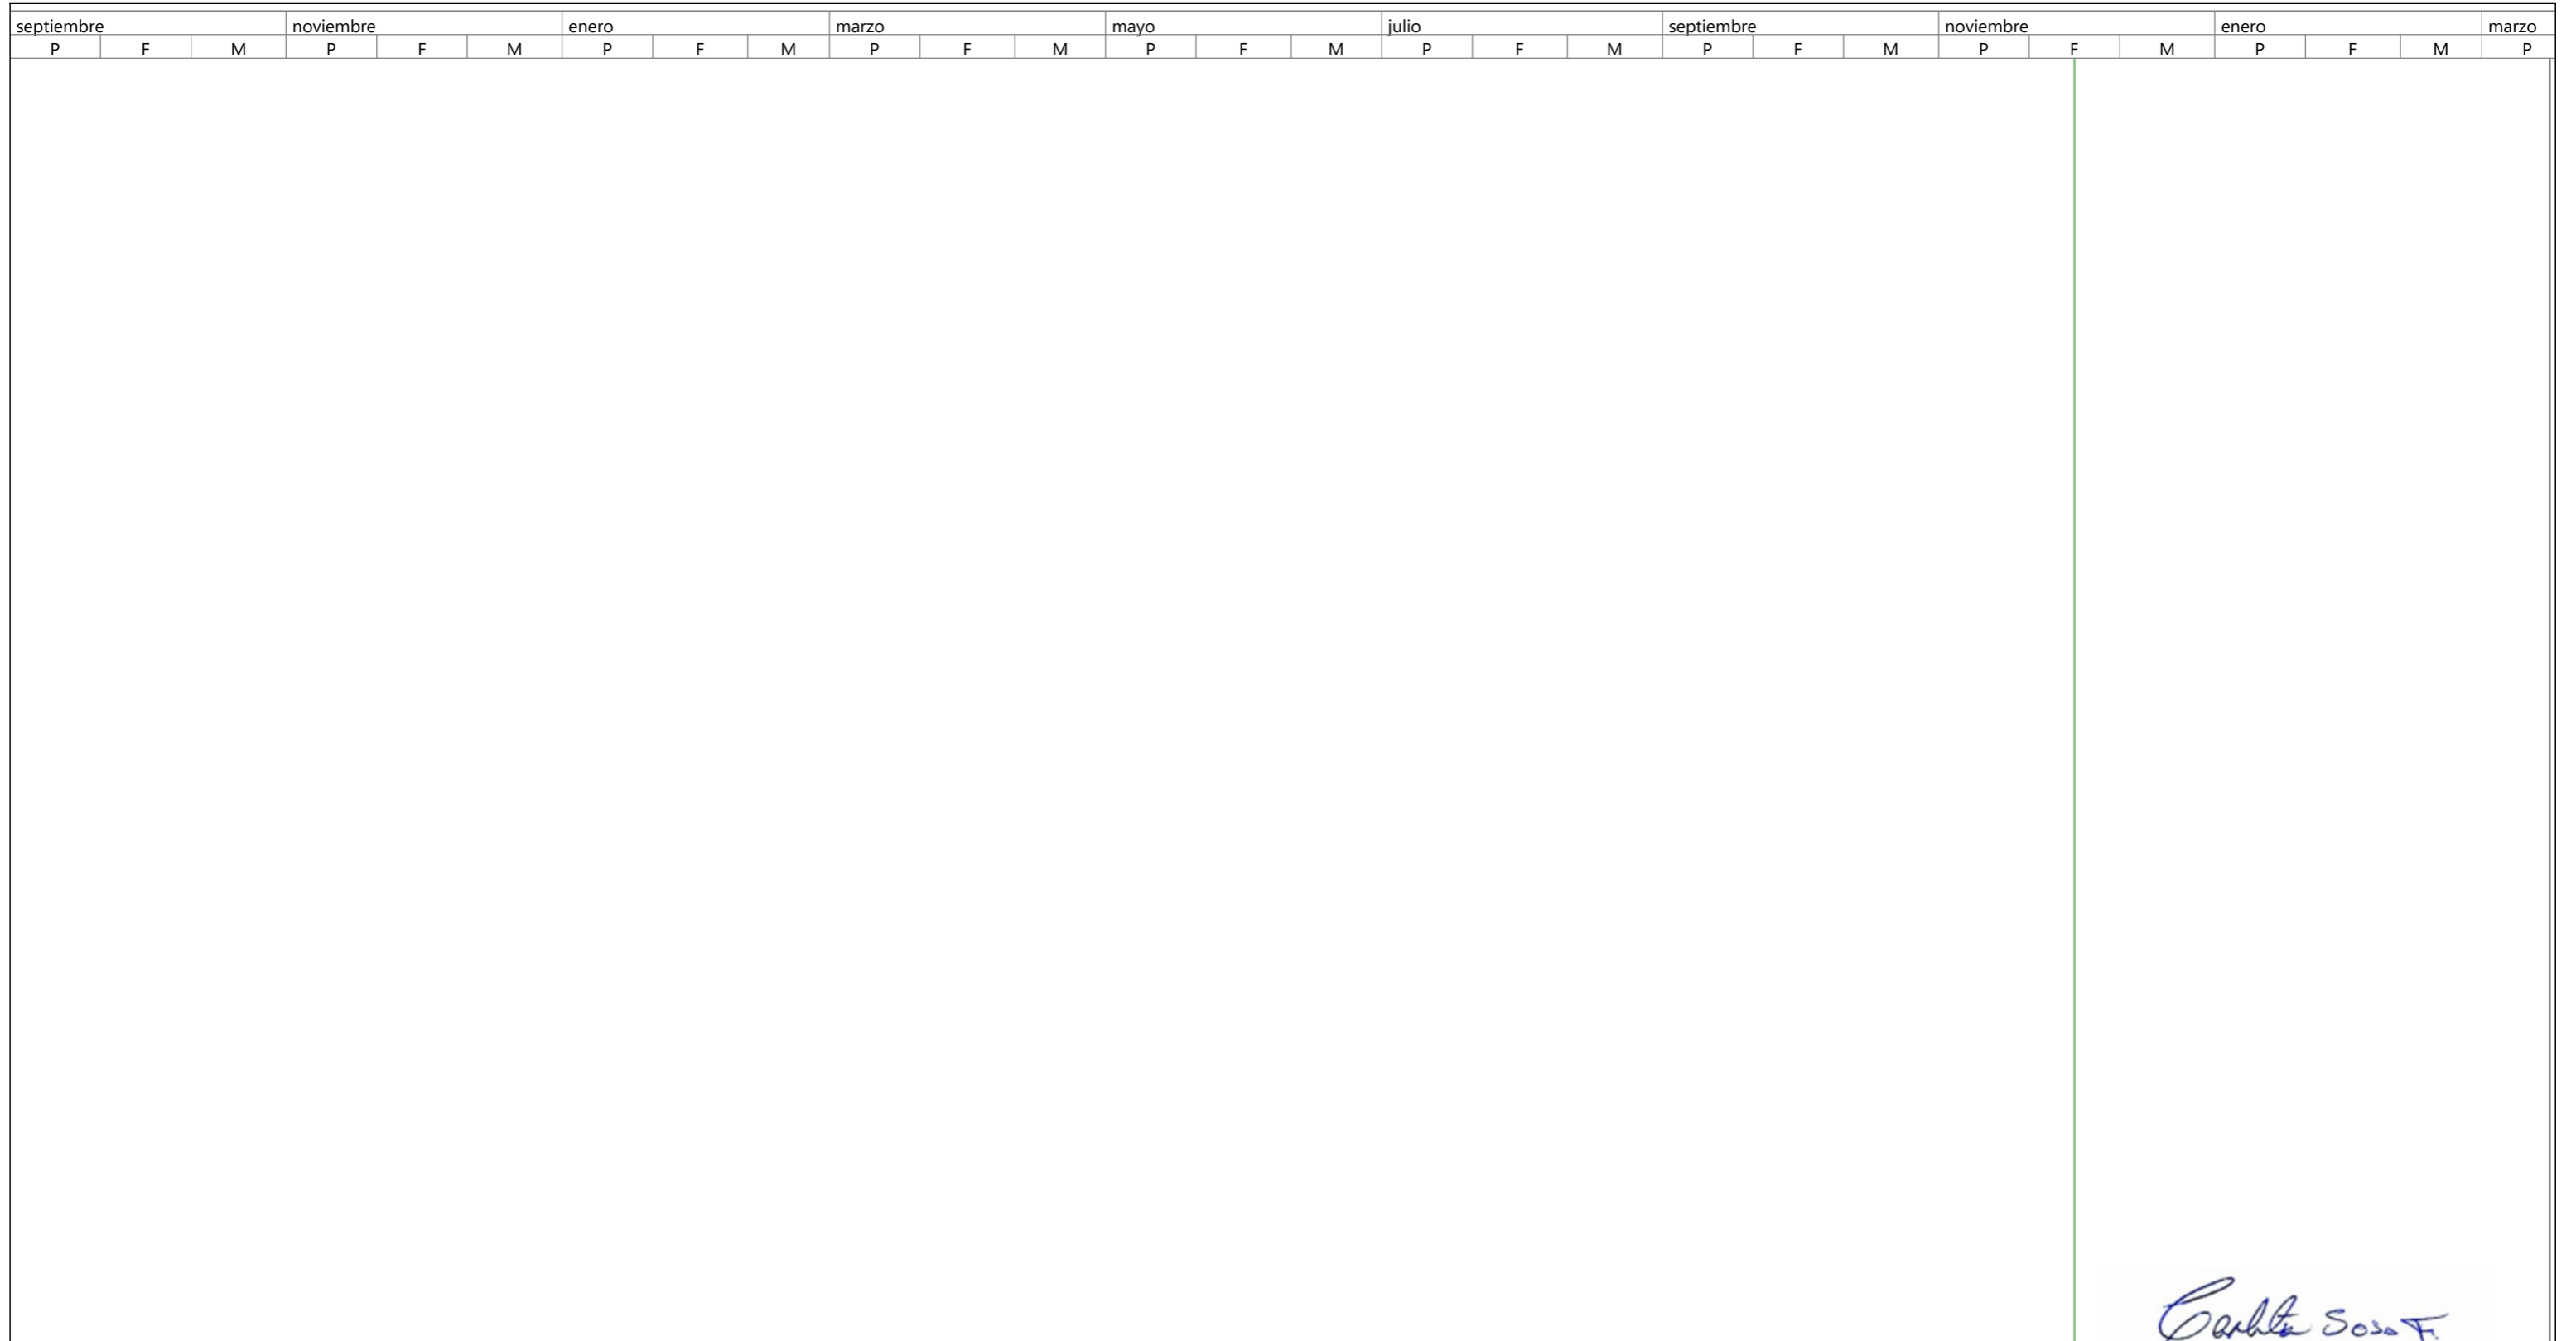


Project: Cronograma Contrato C  
Date: mié 1/12/21


Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			












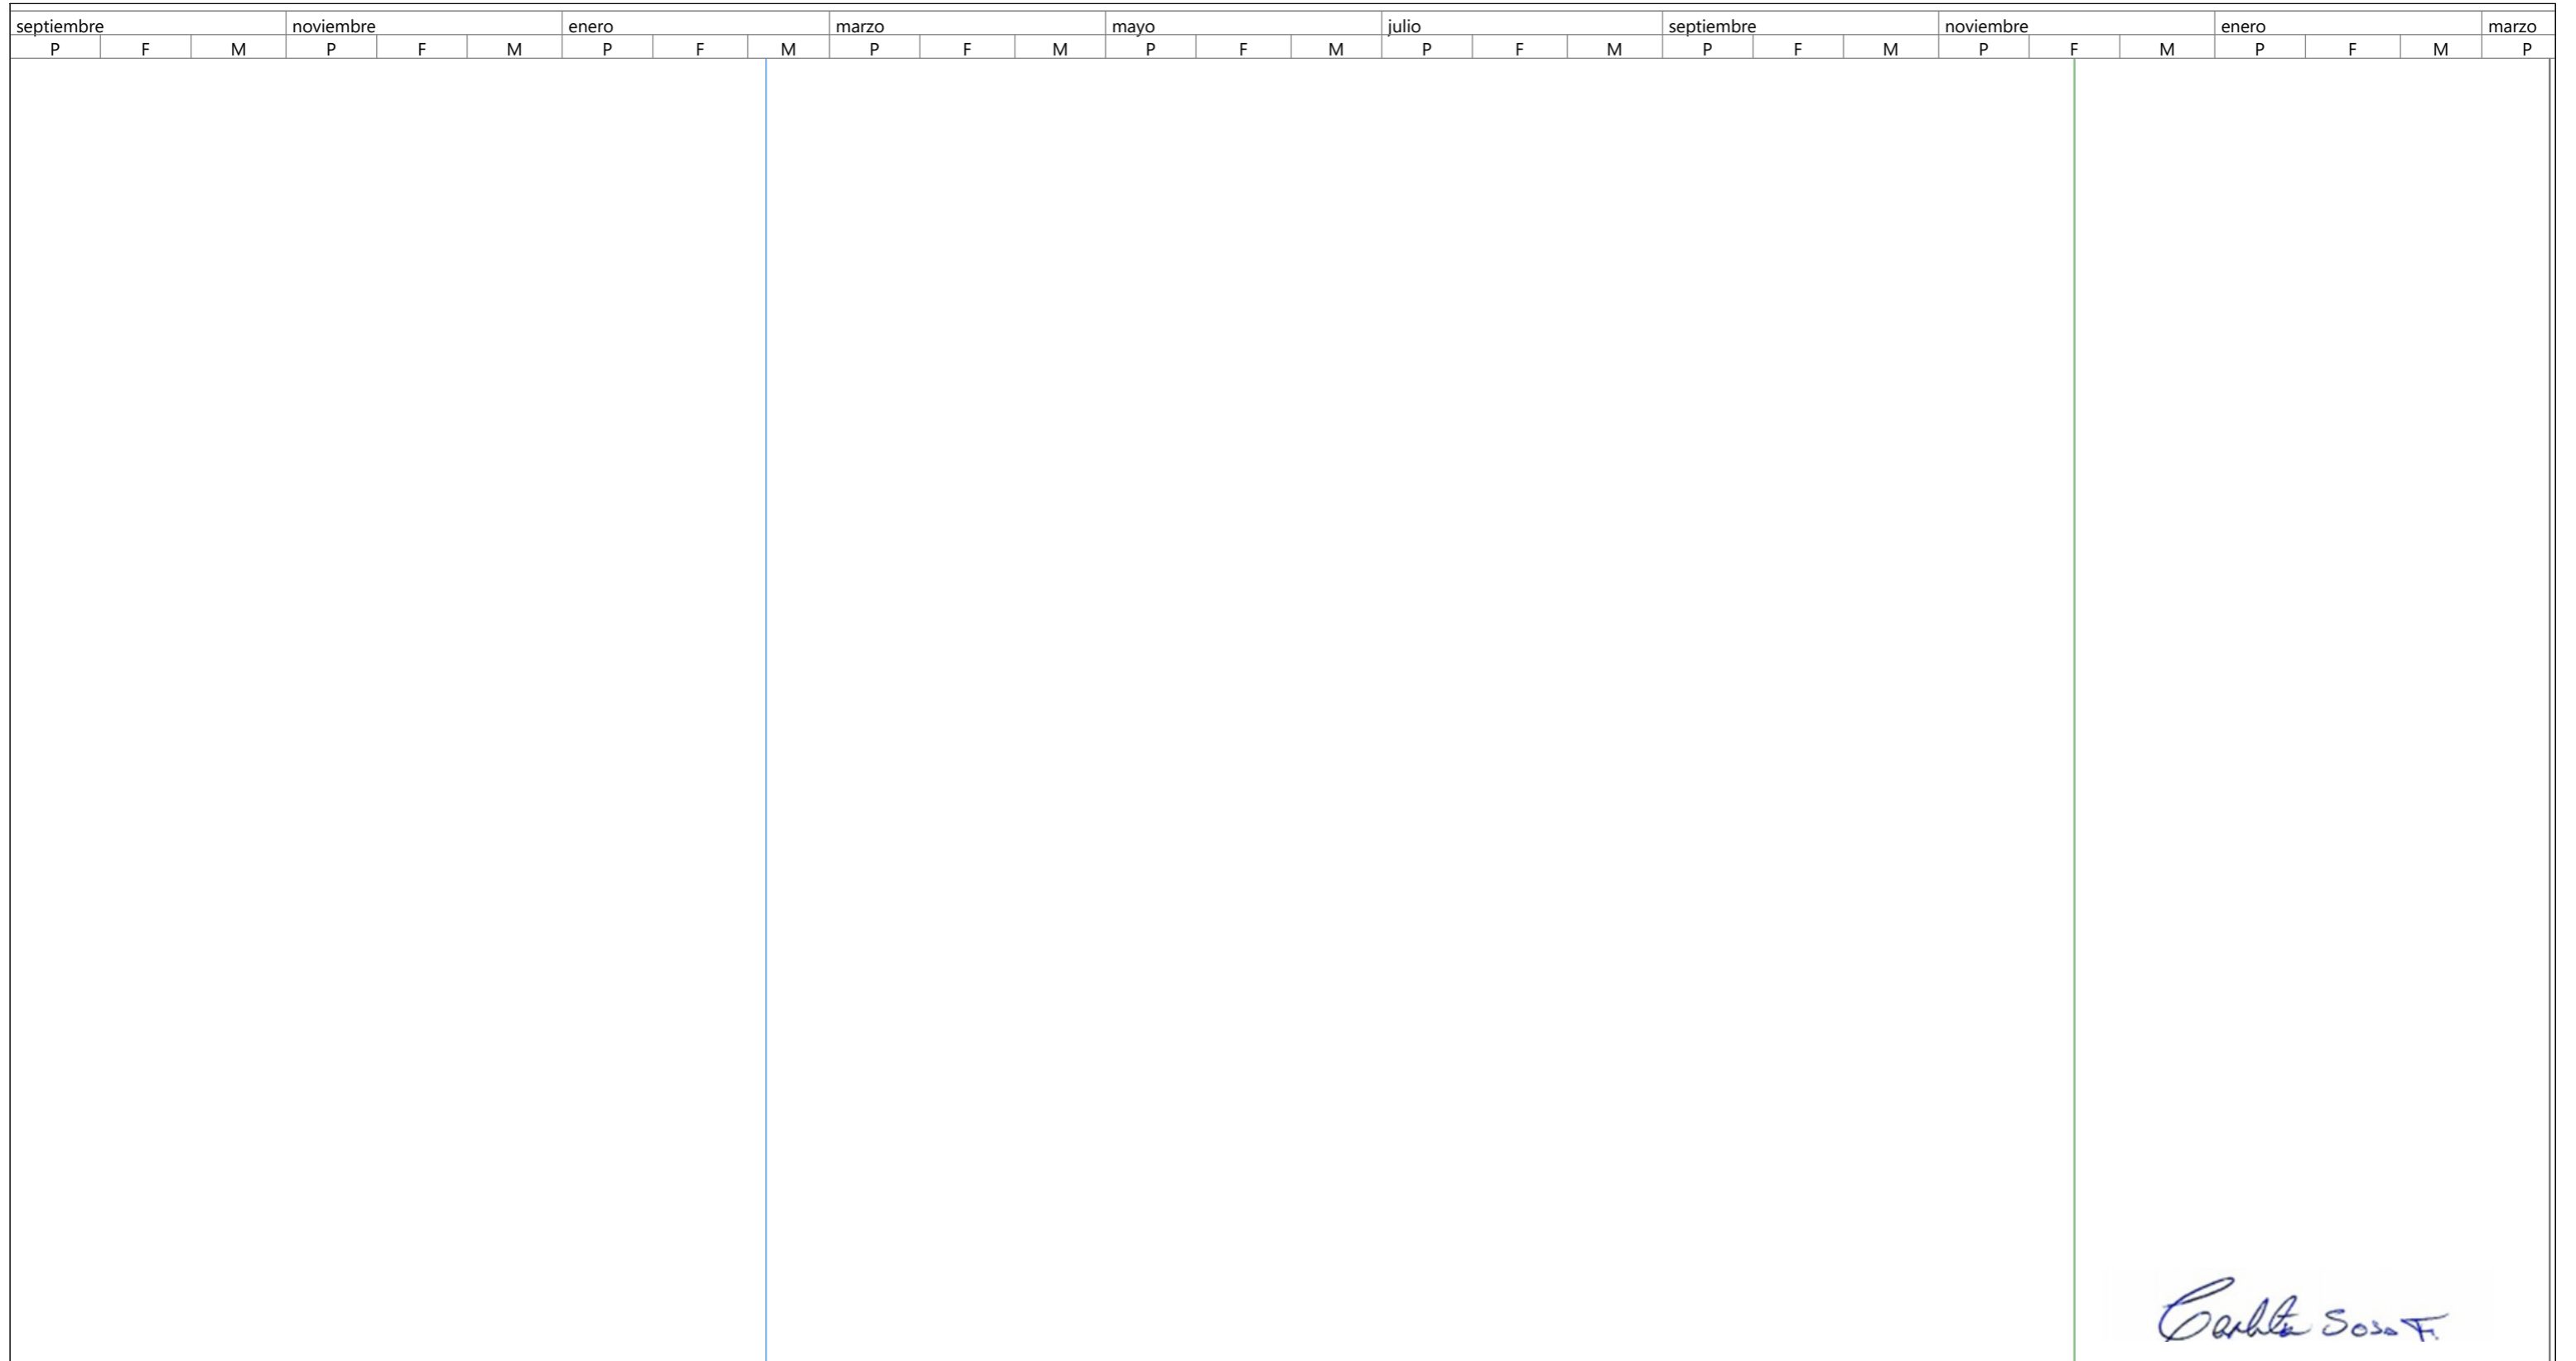










Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			




*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			




Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

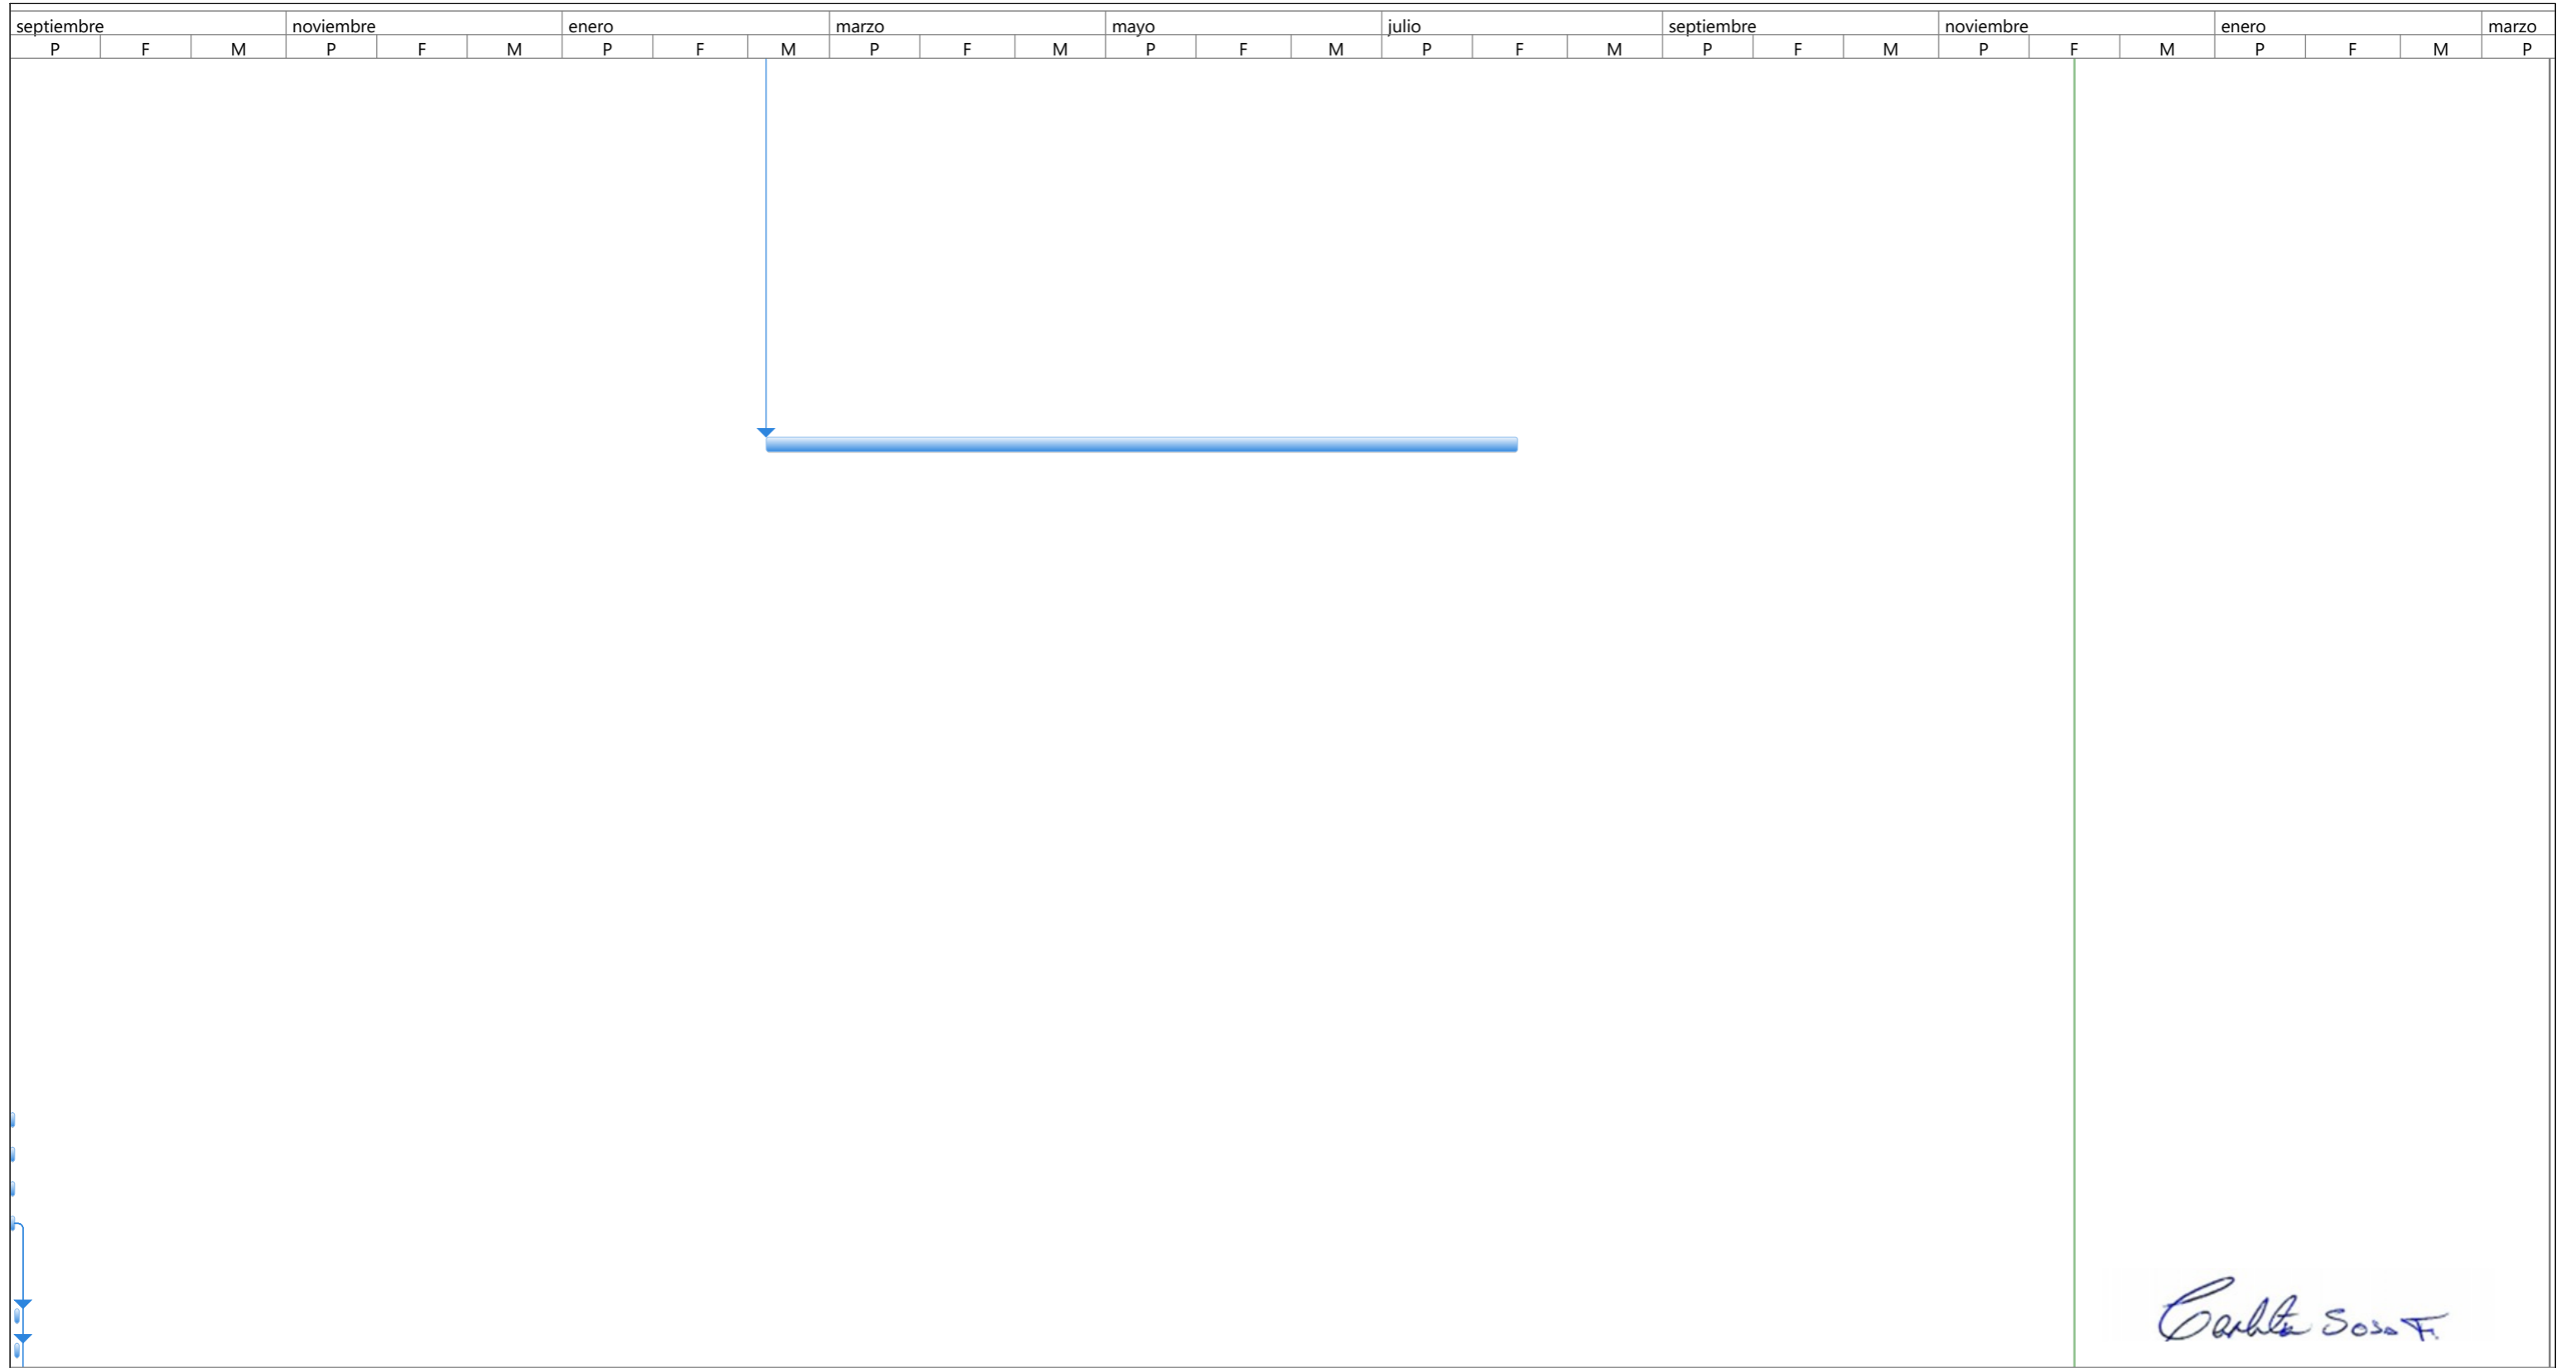


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

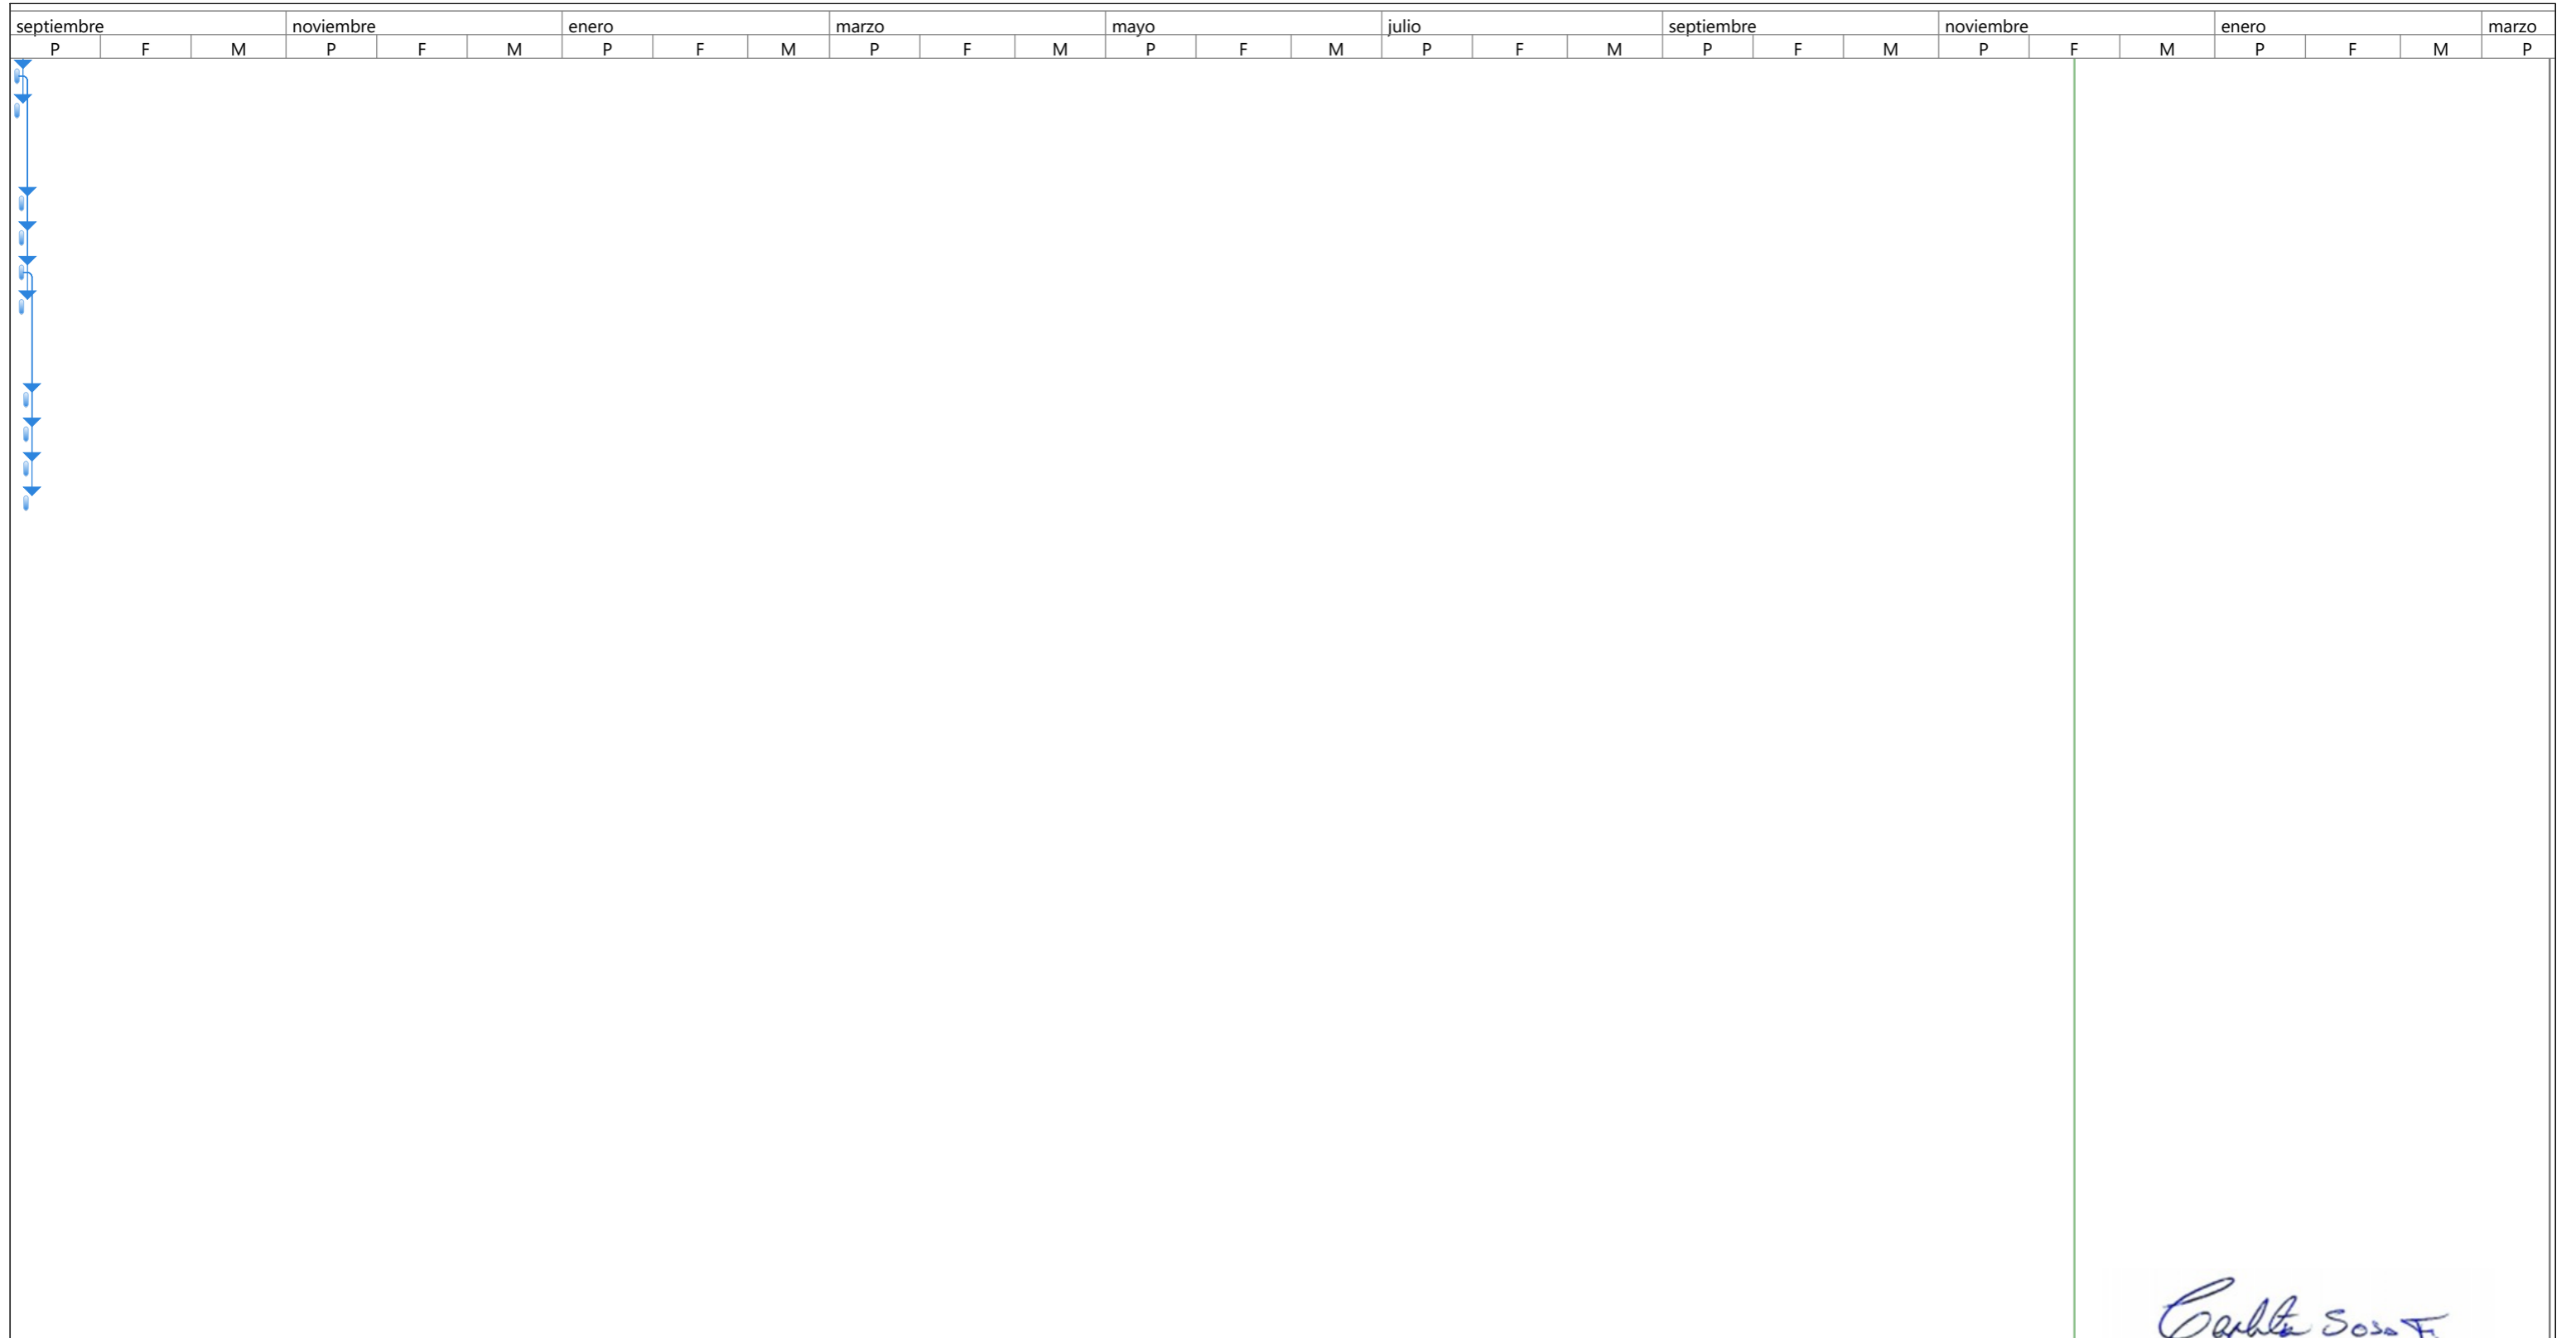


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

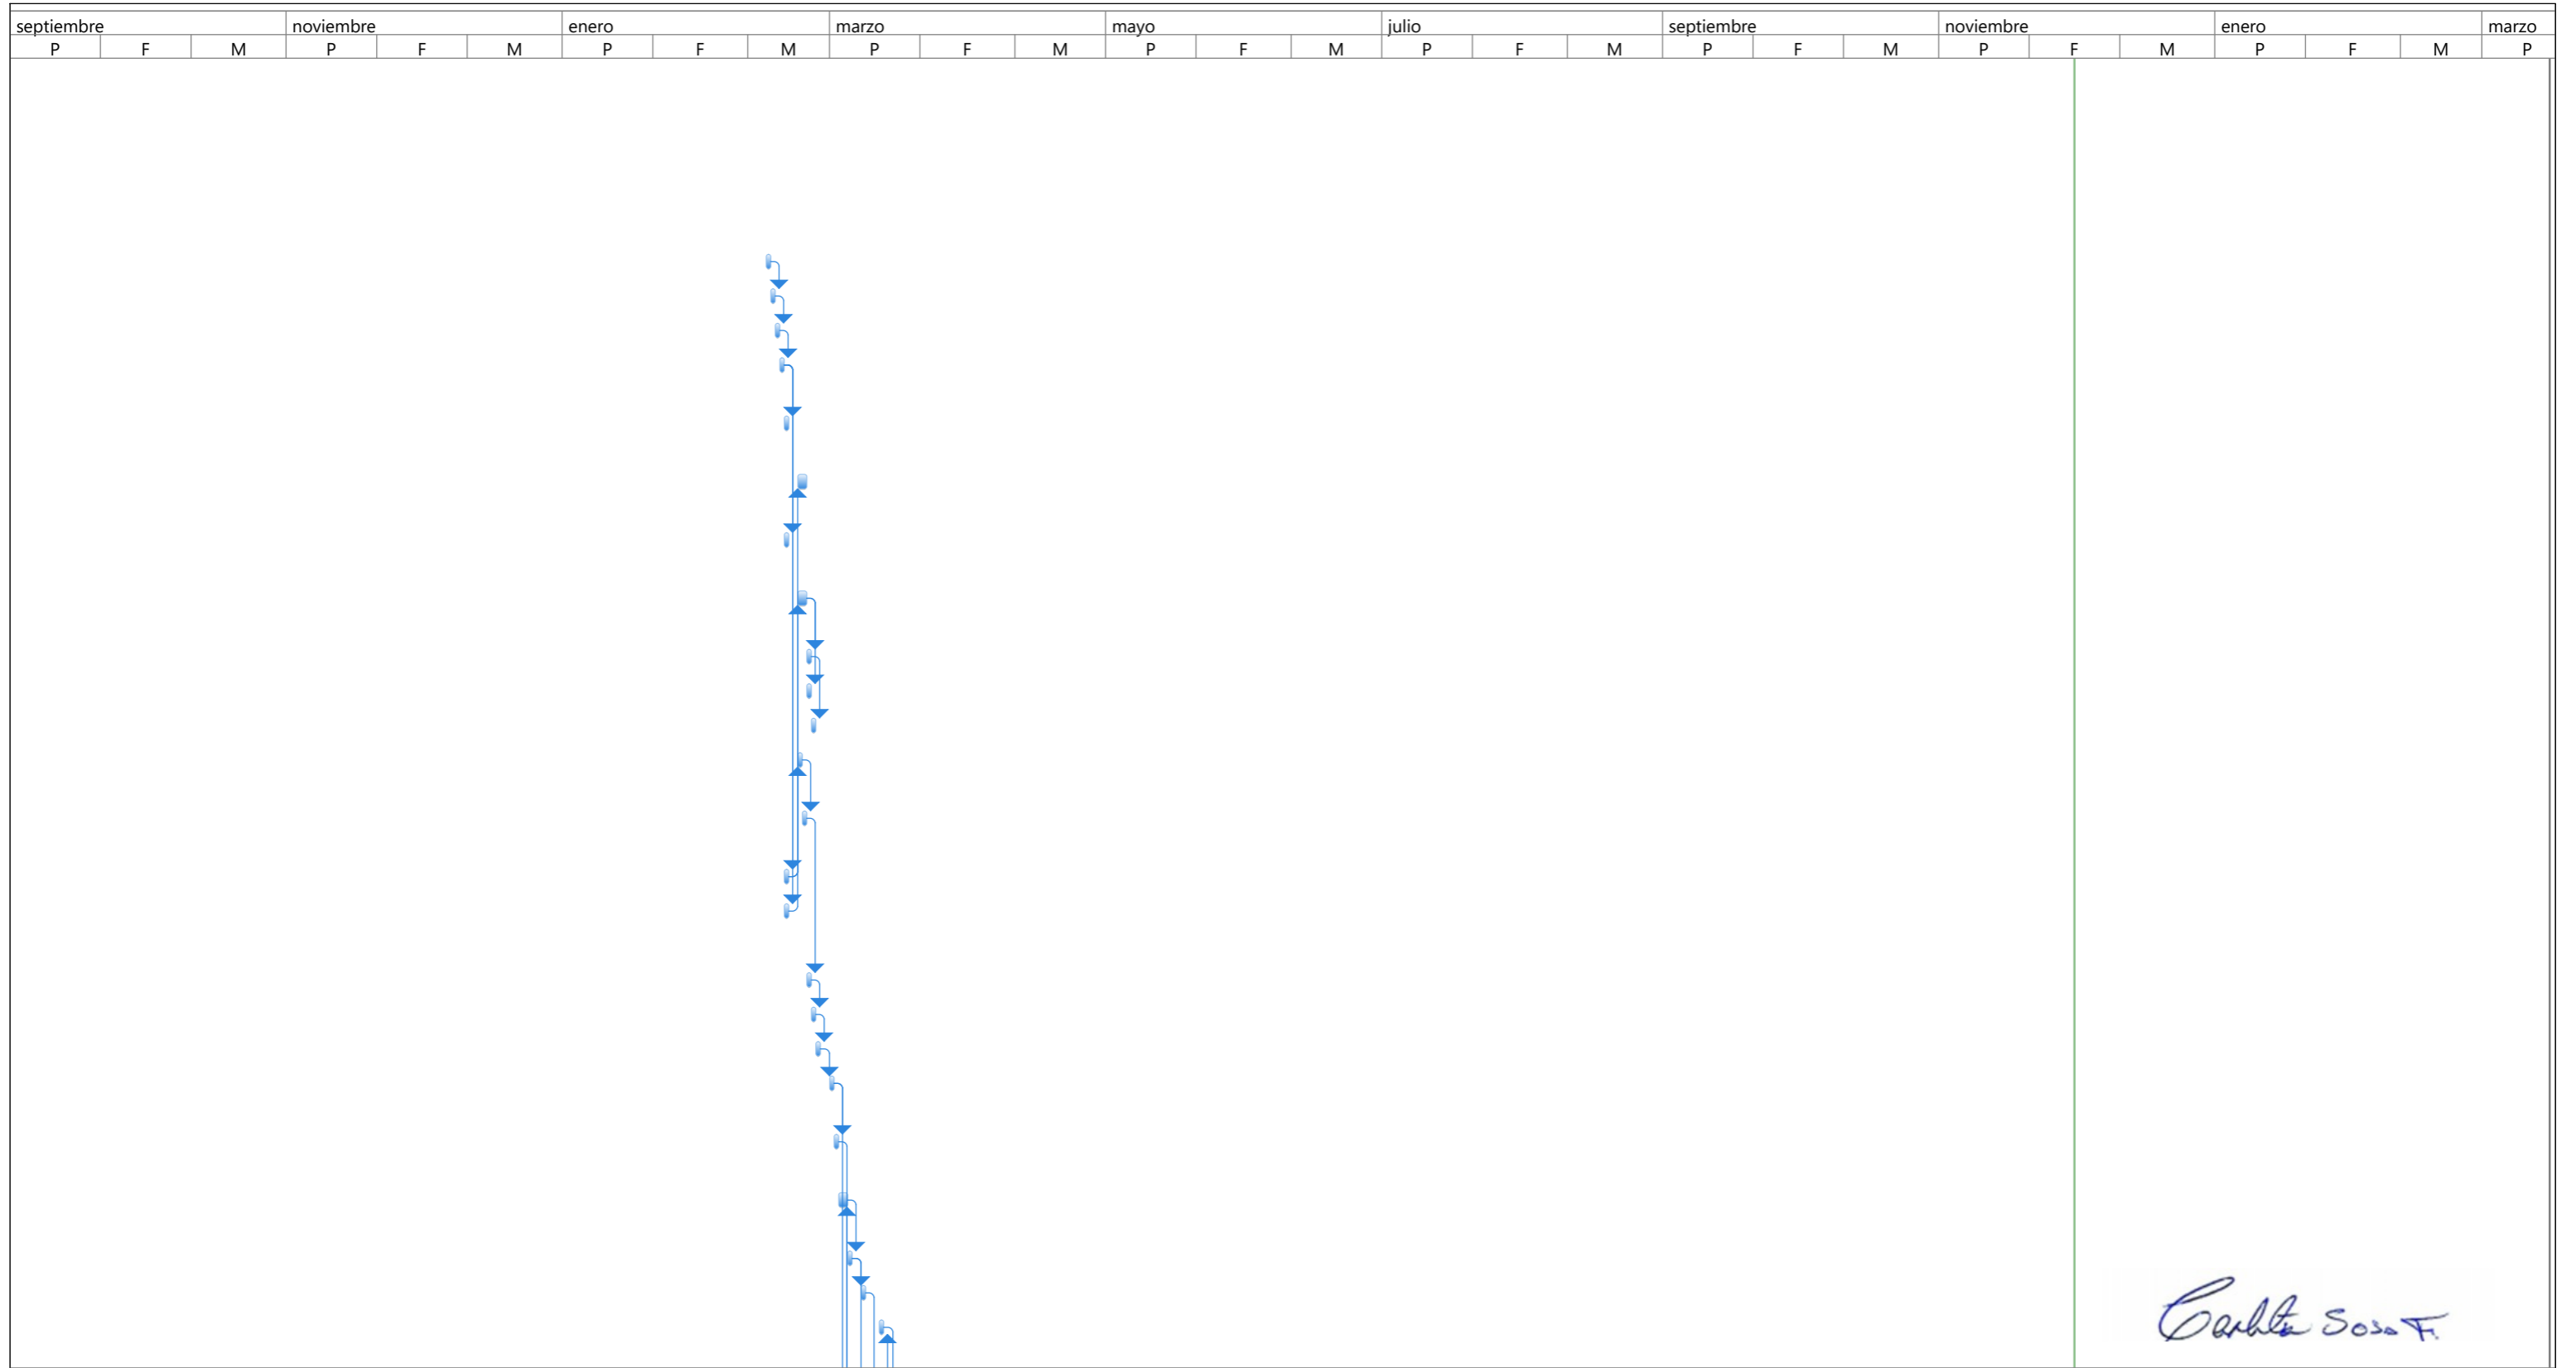


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



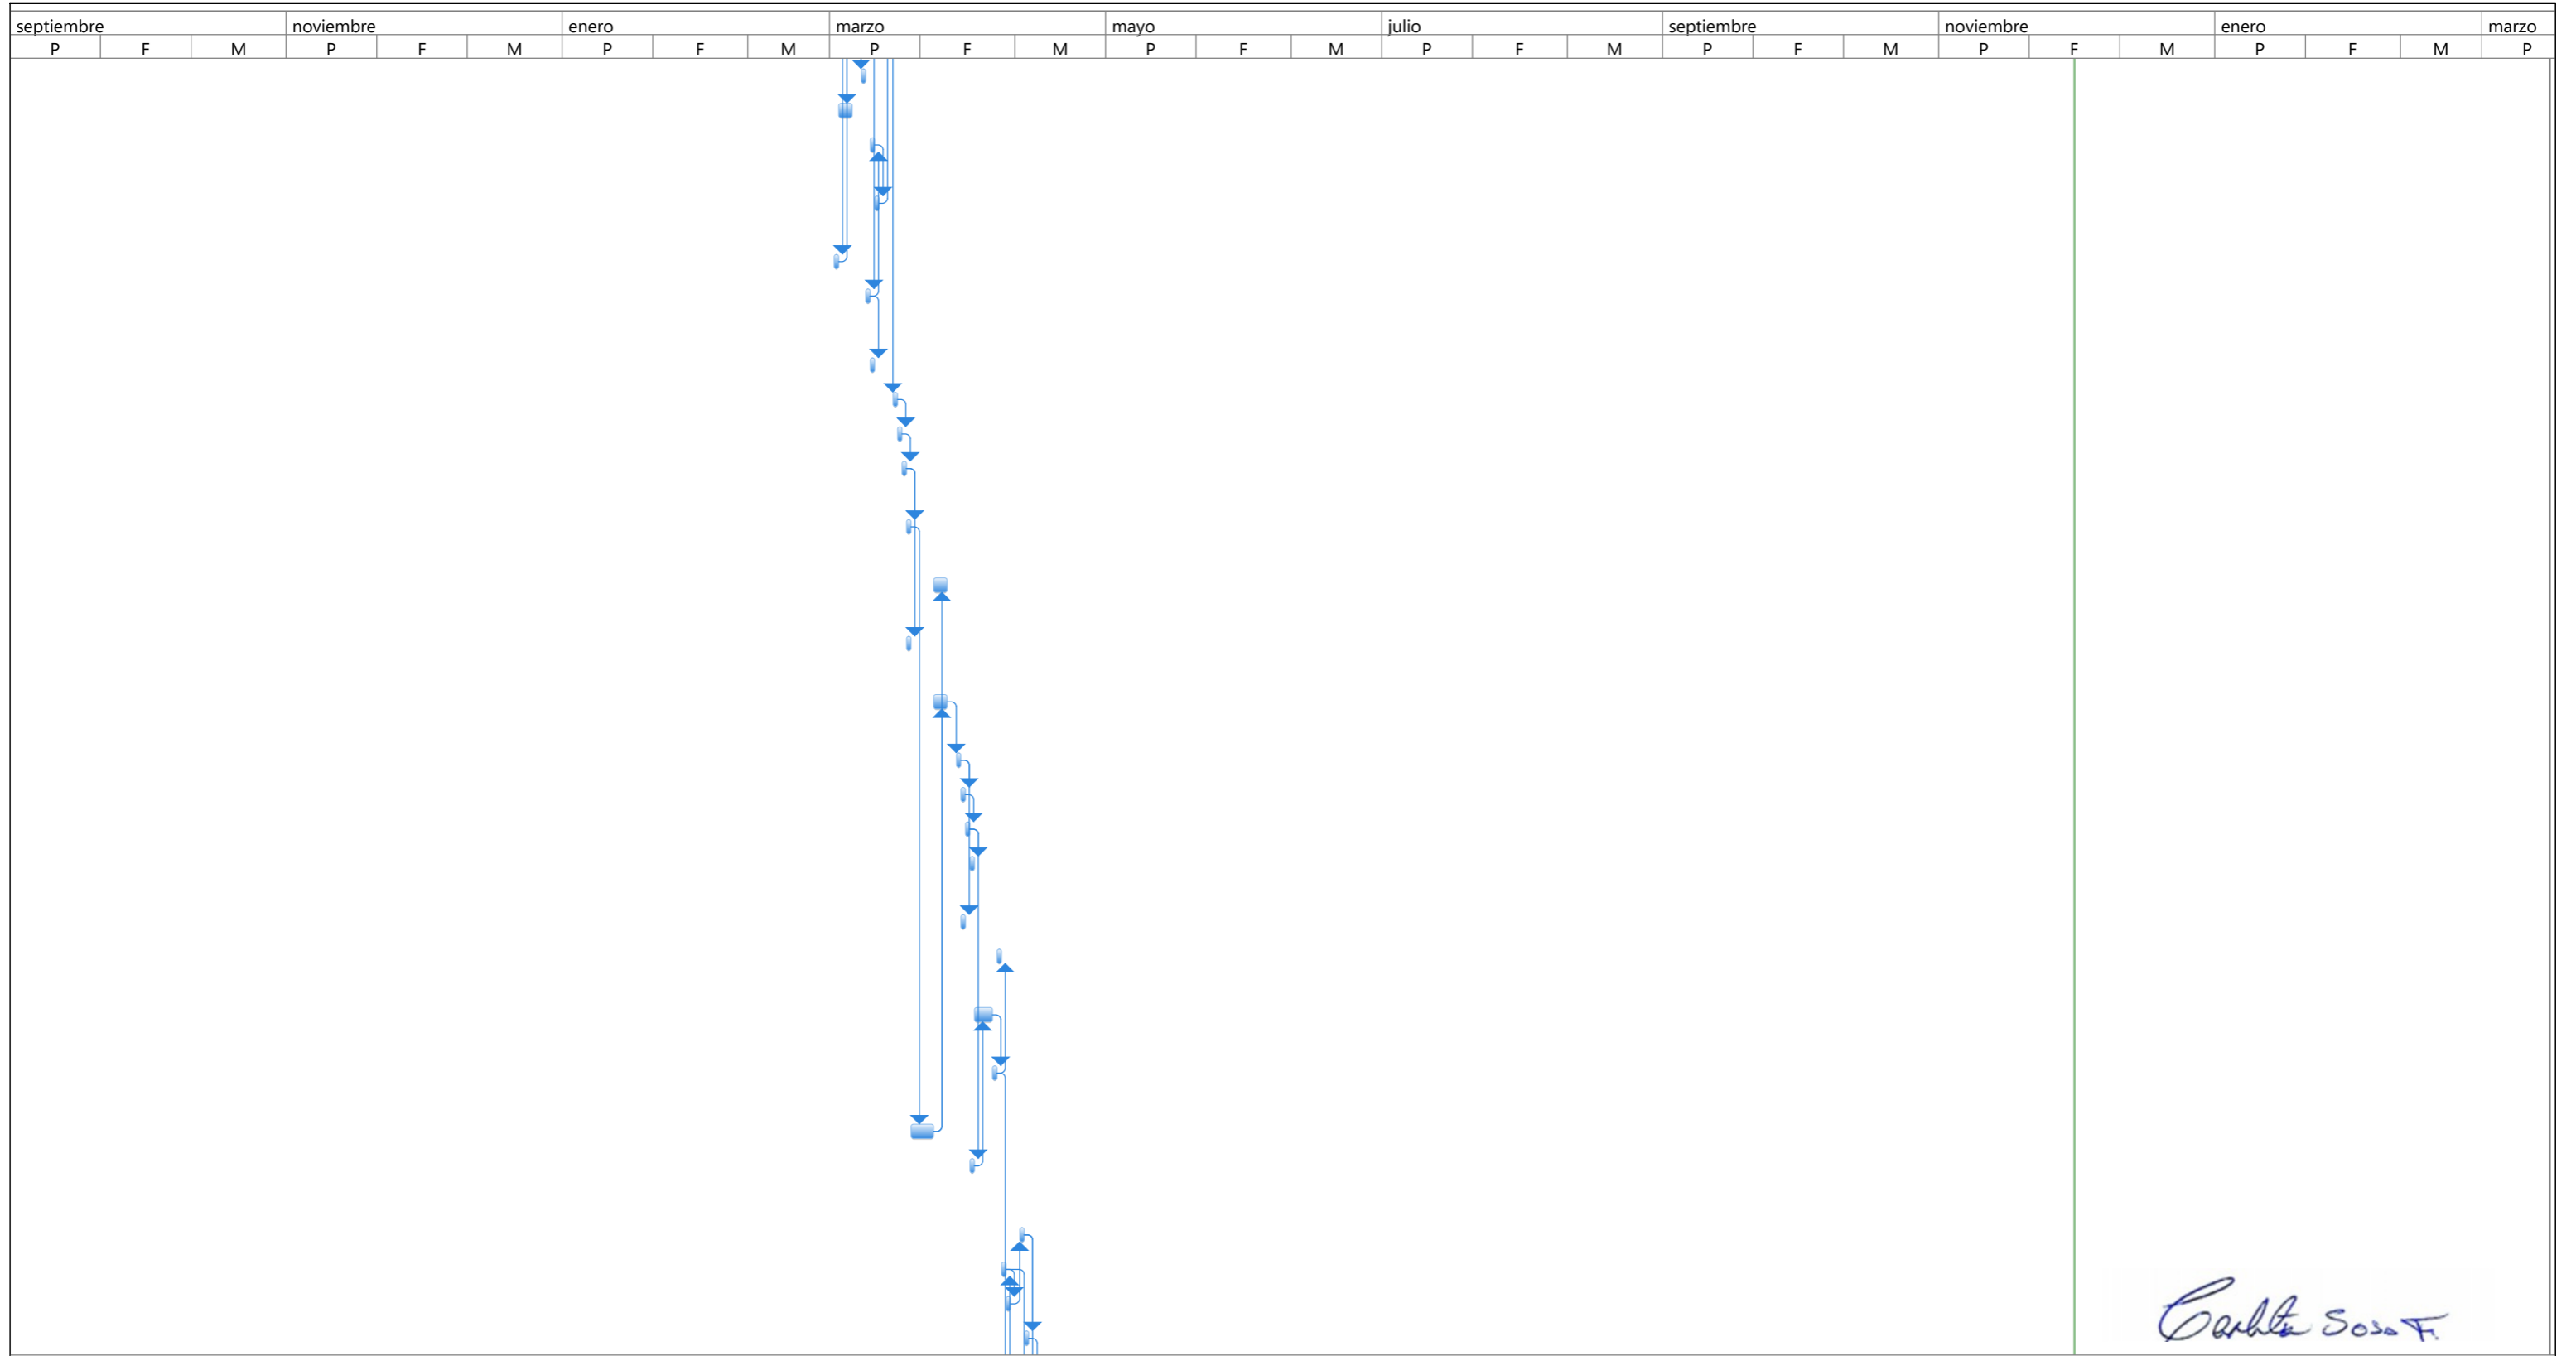


Project: Cronograma Contrato C  
 Date: mié 1/12/21

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

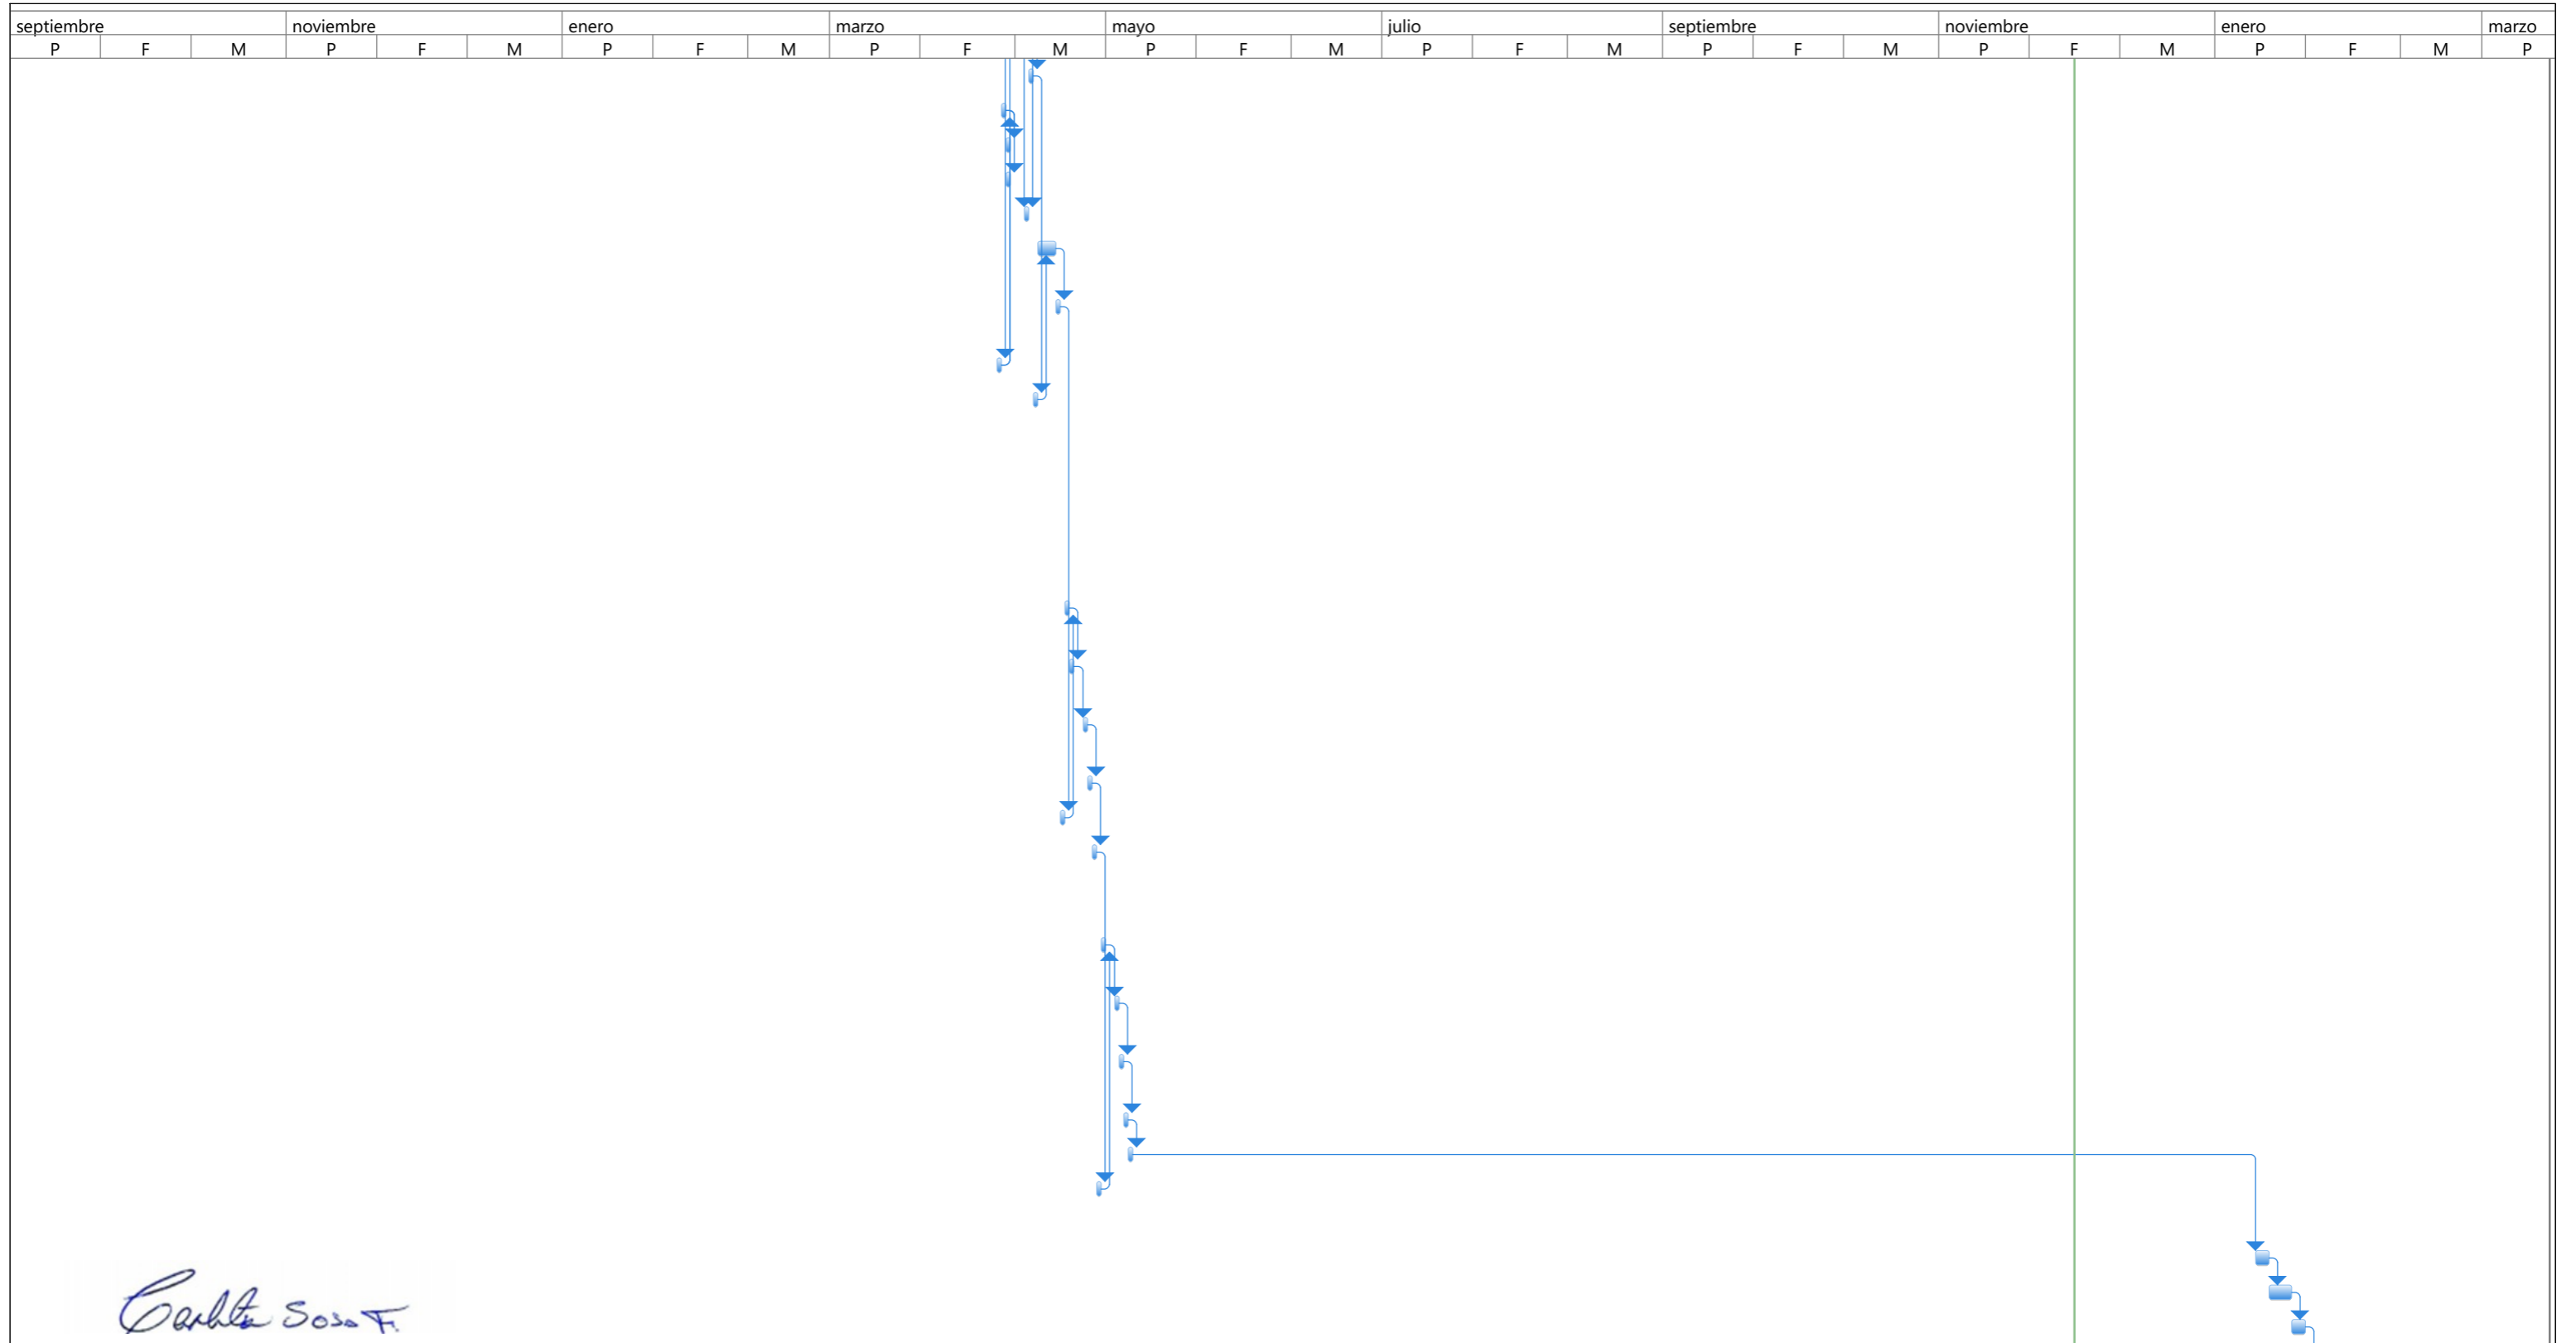

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

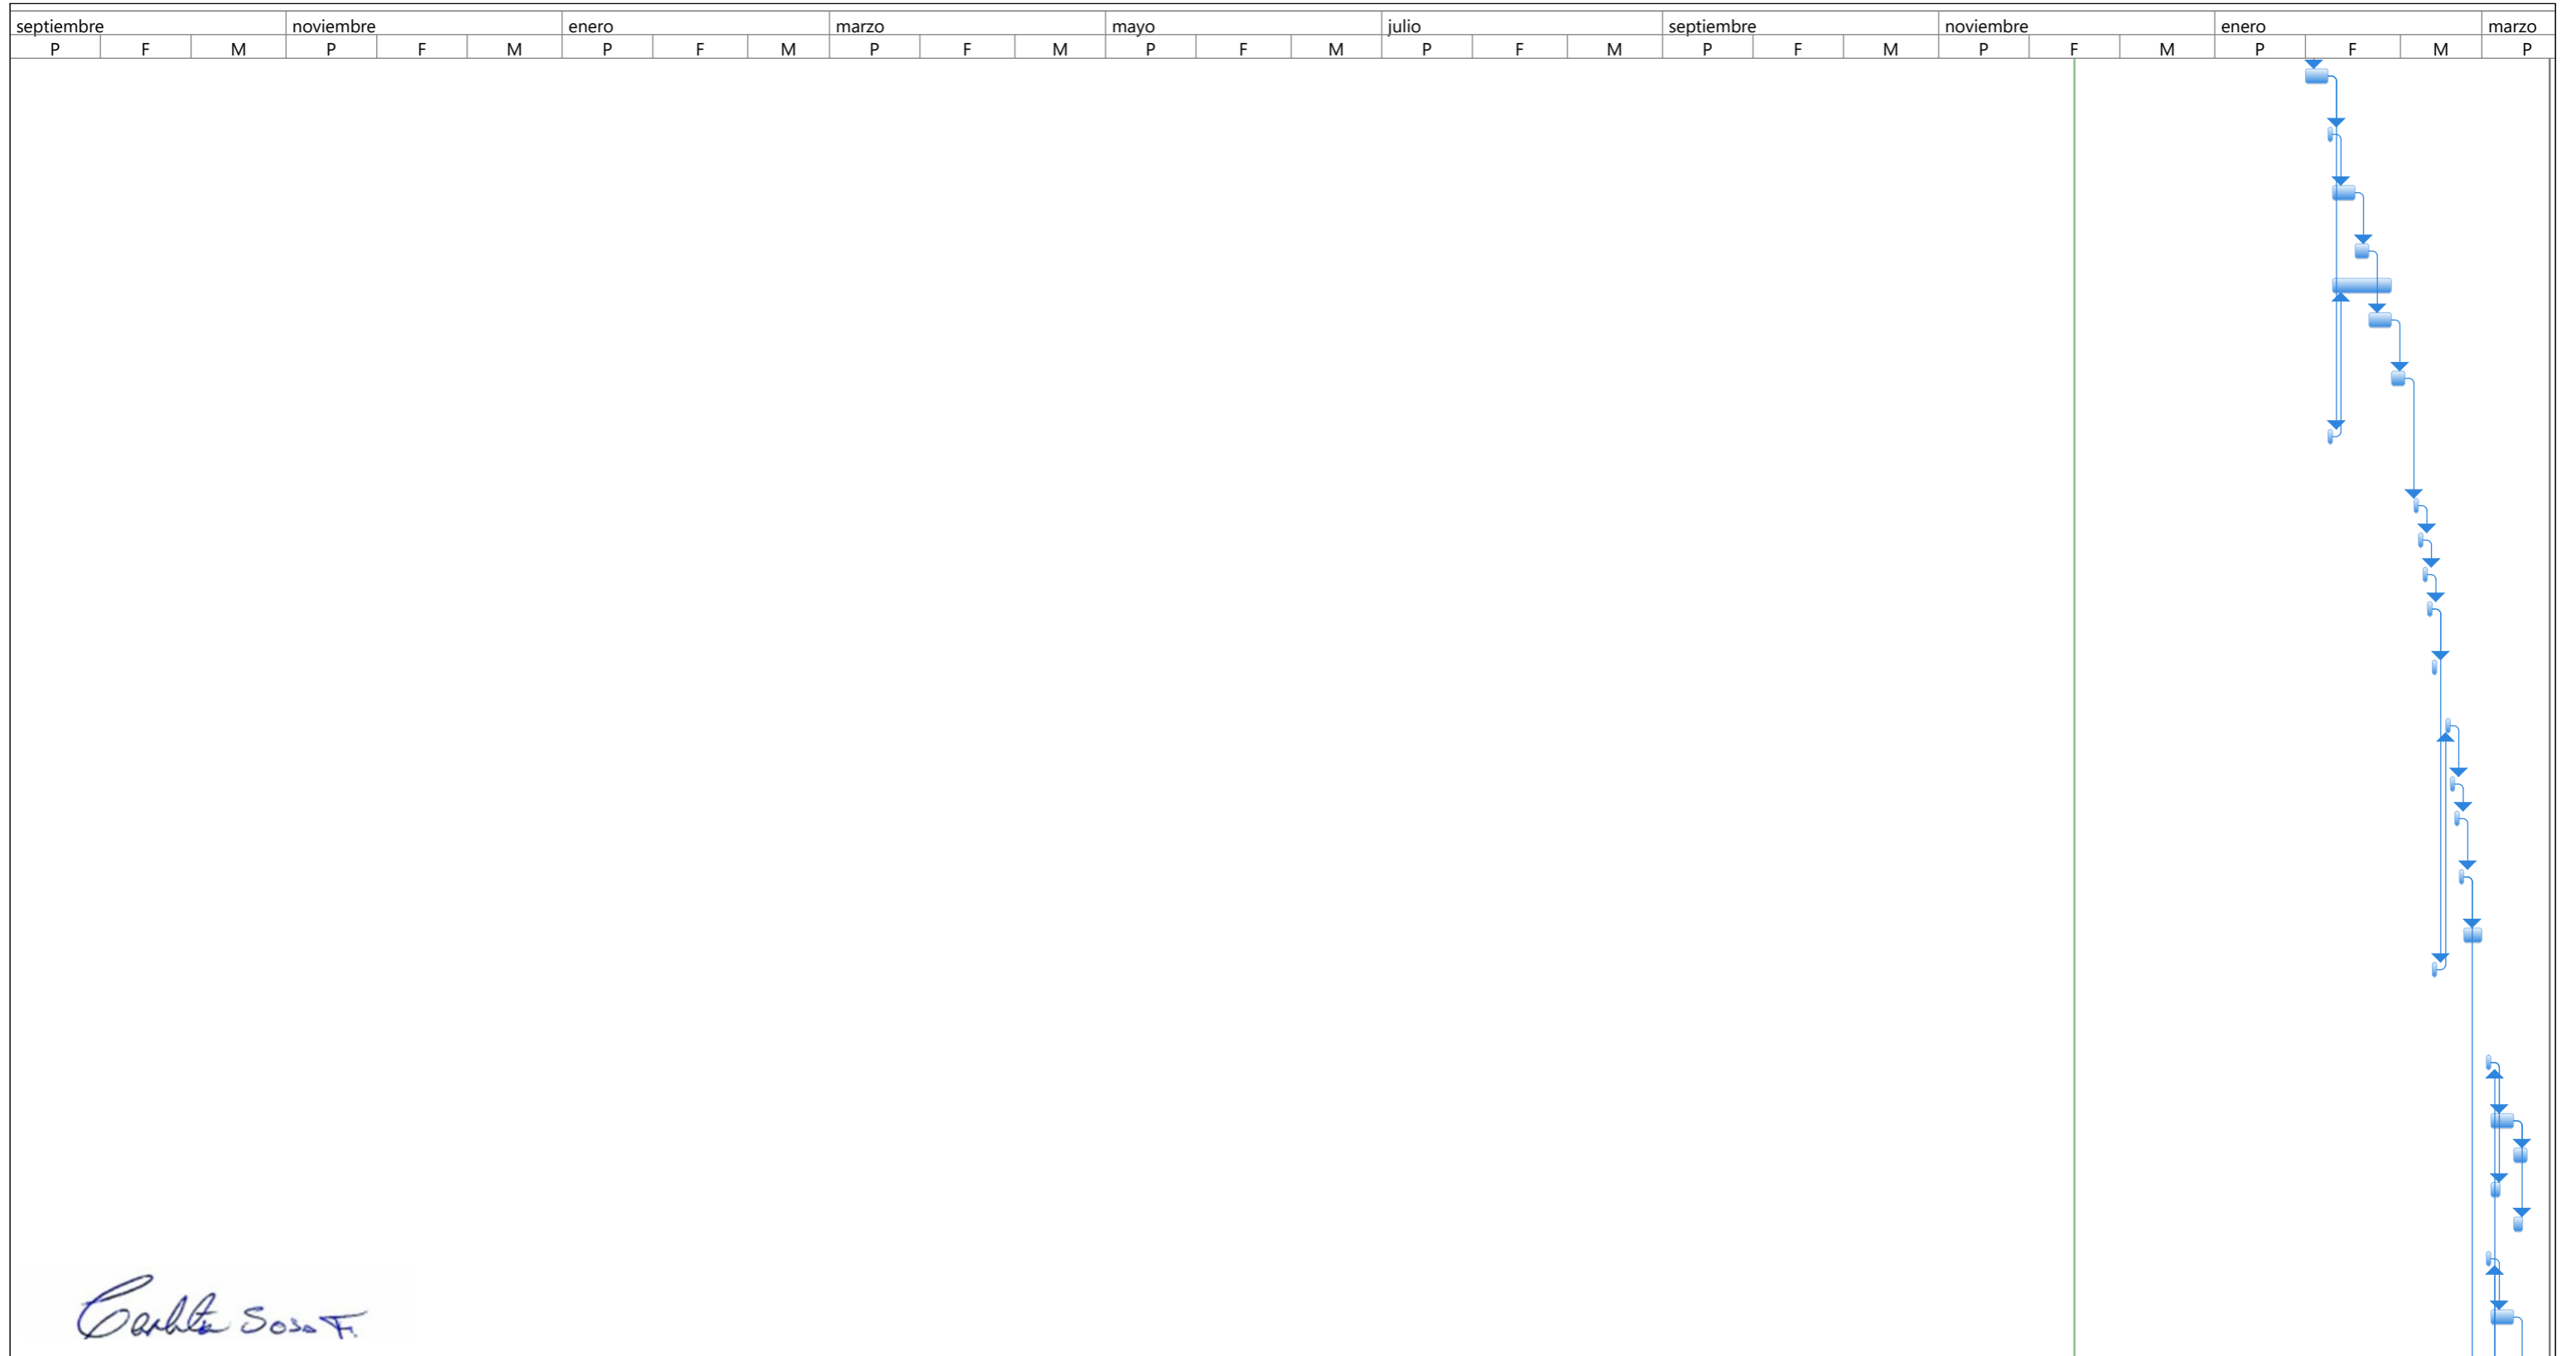


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			




*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

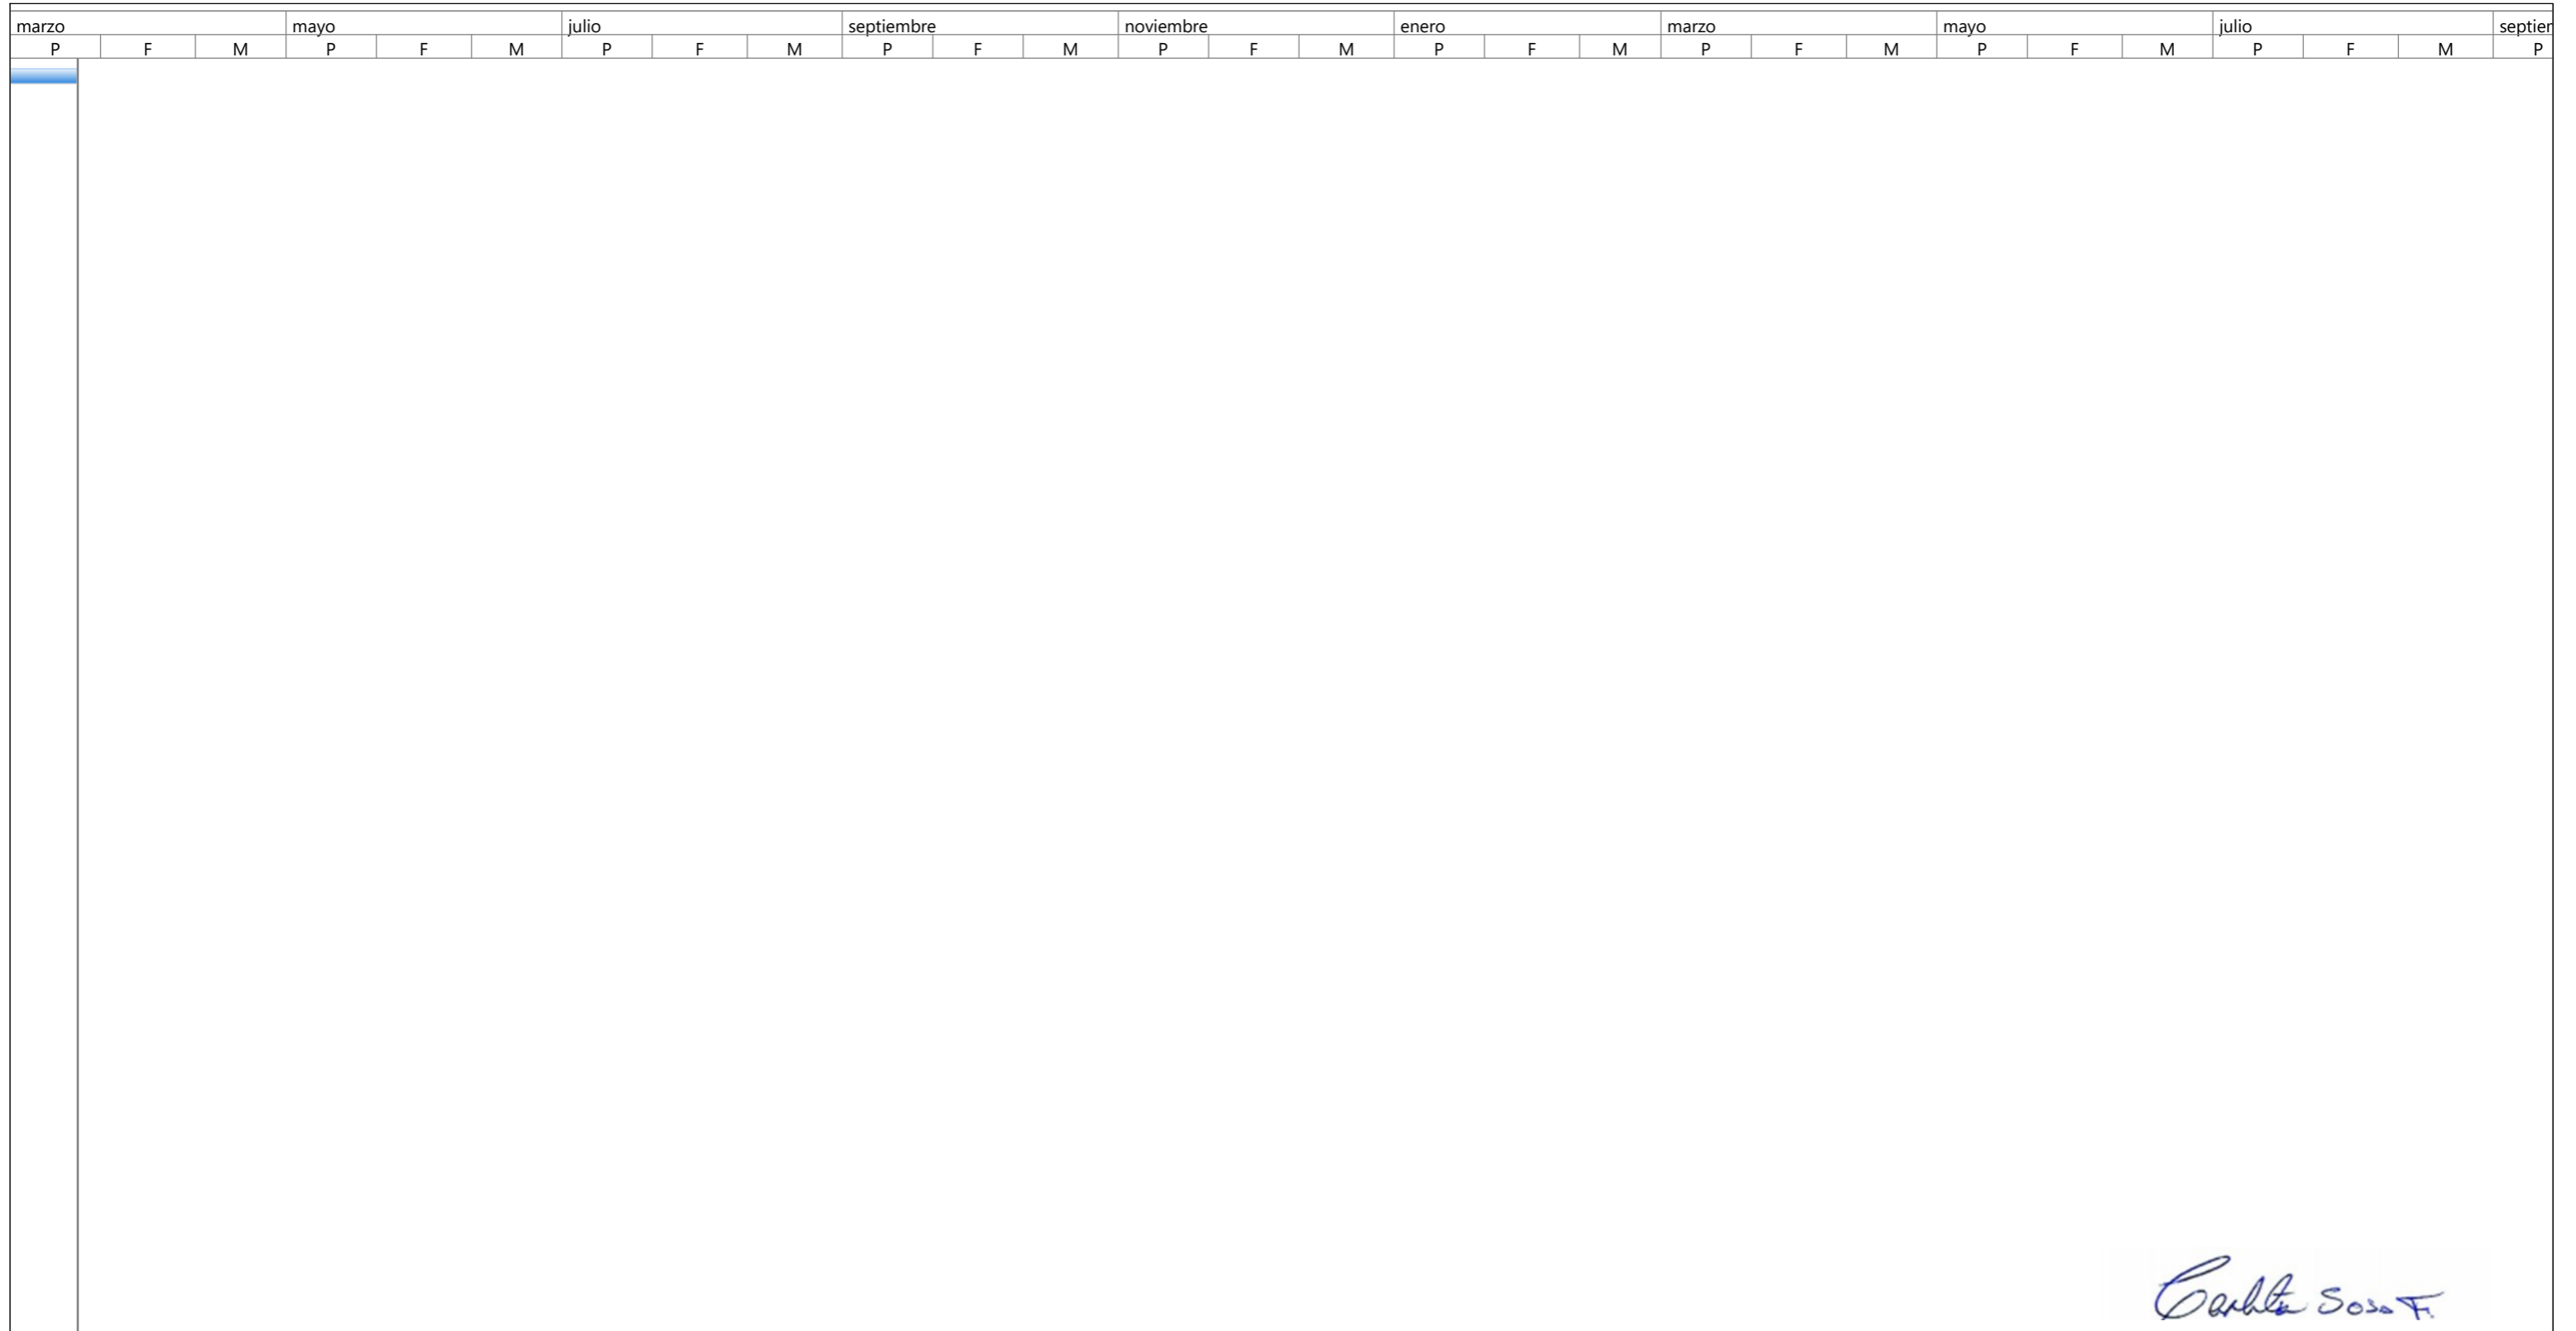


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

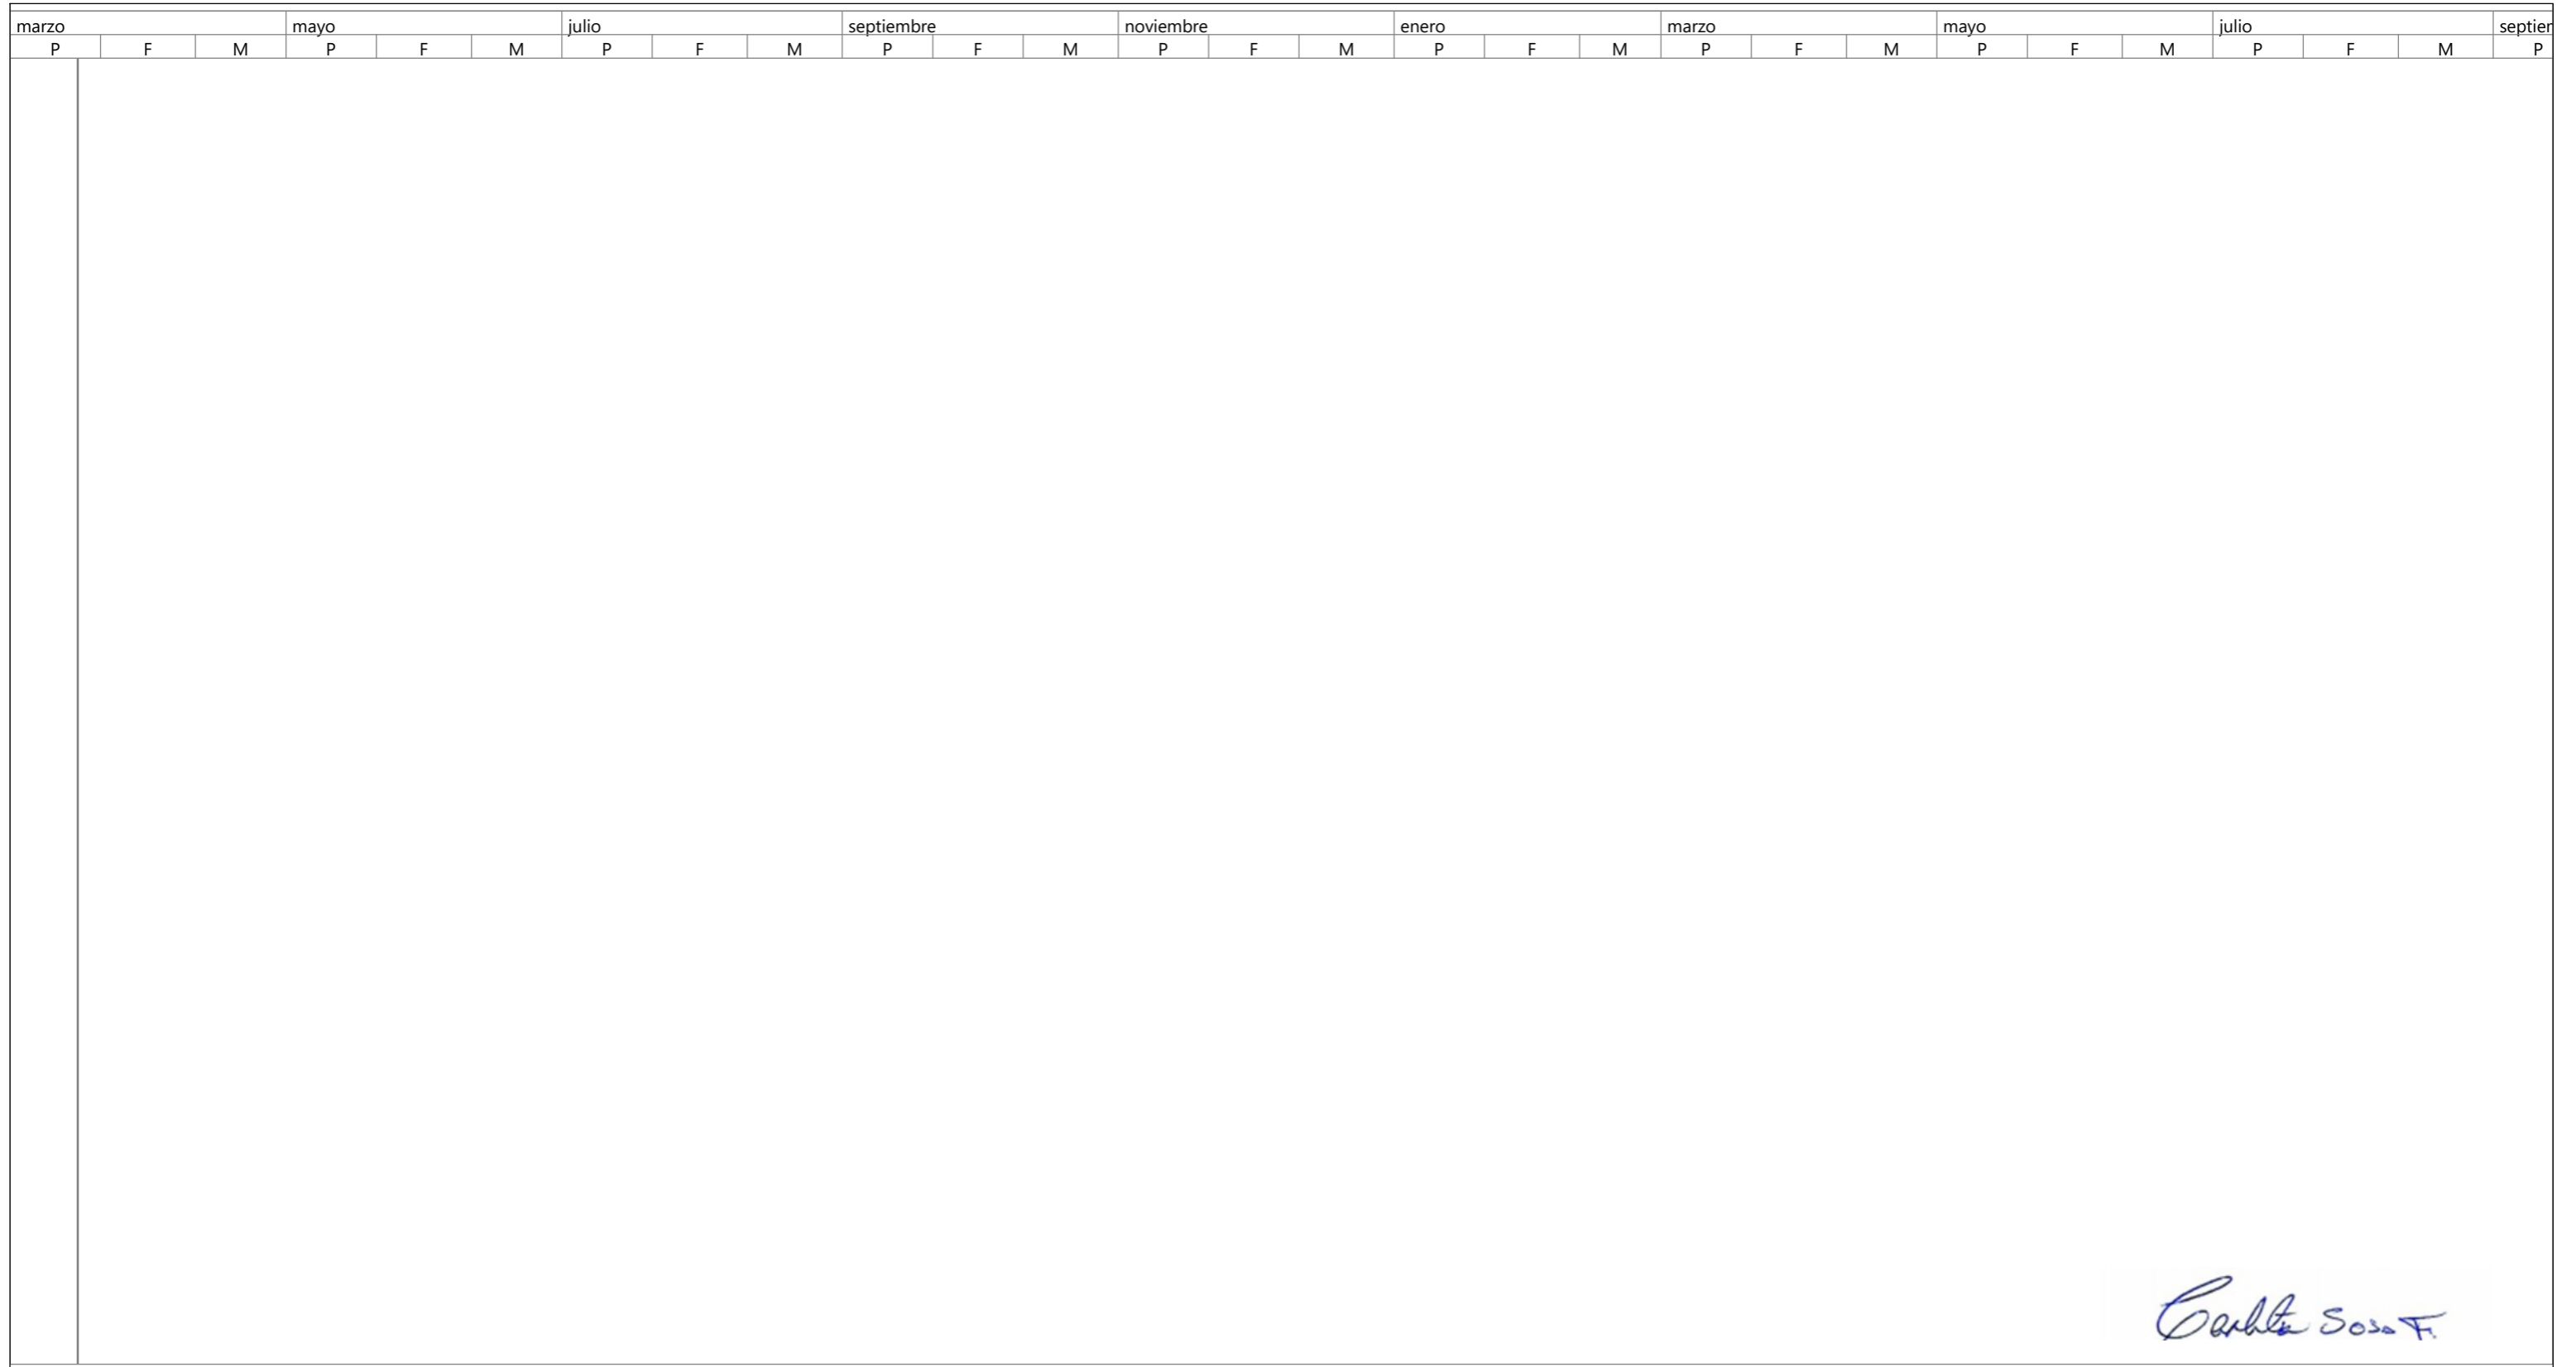


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

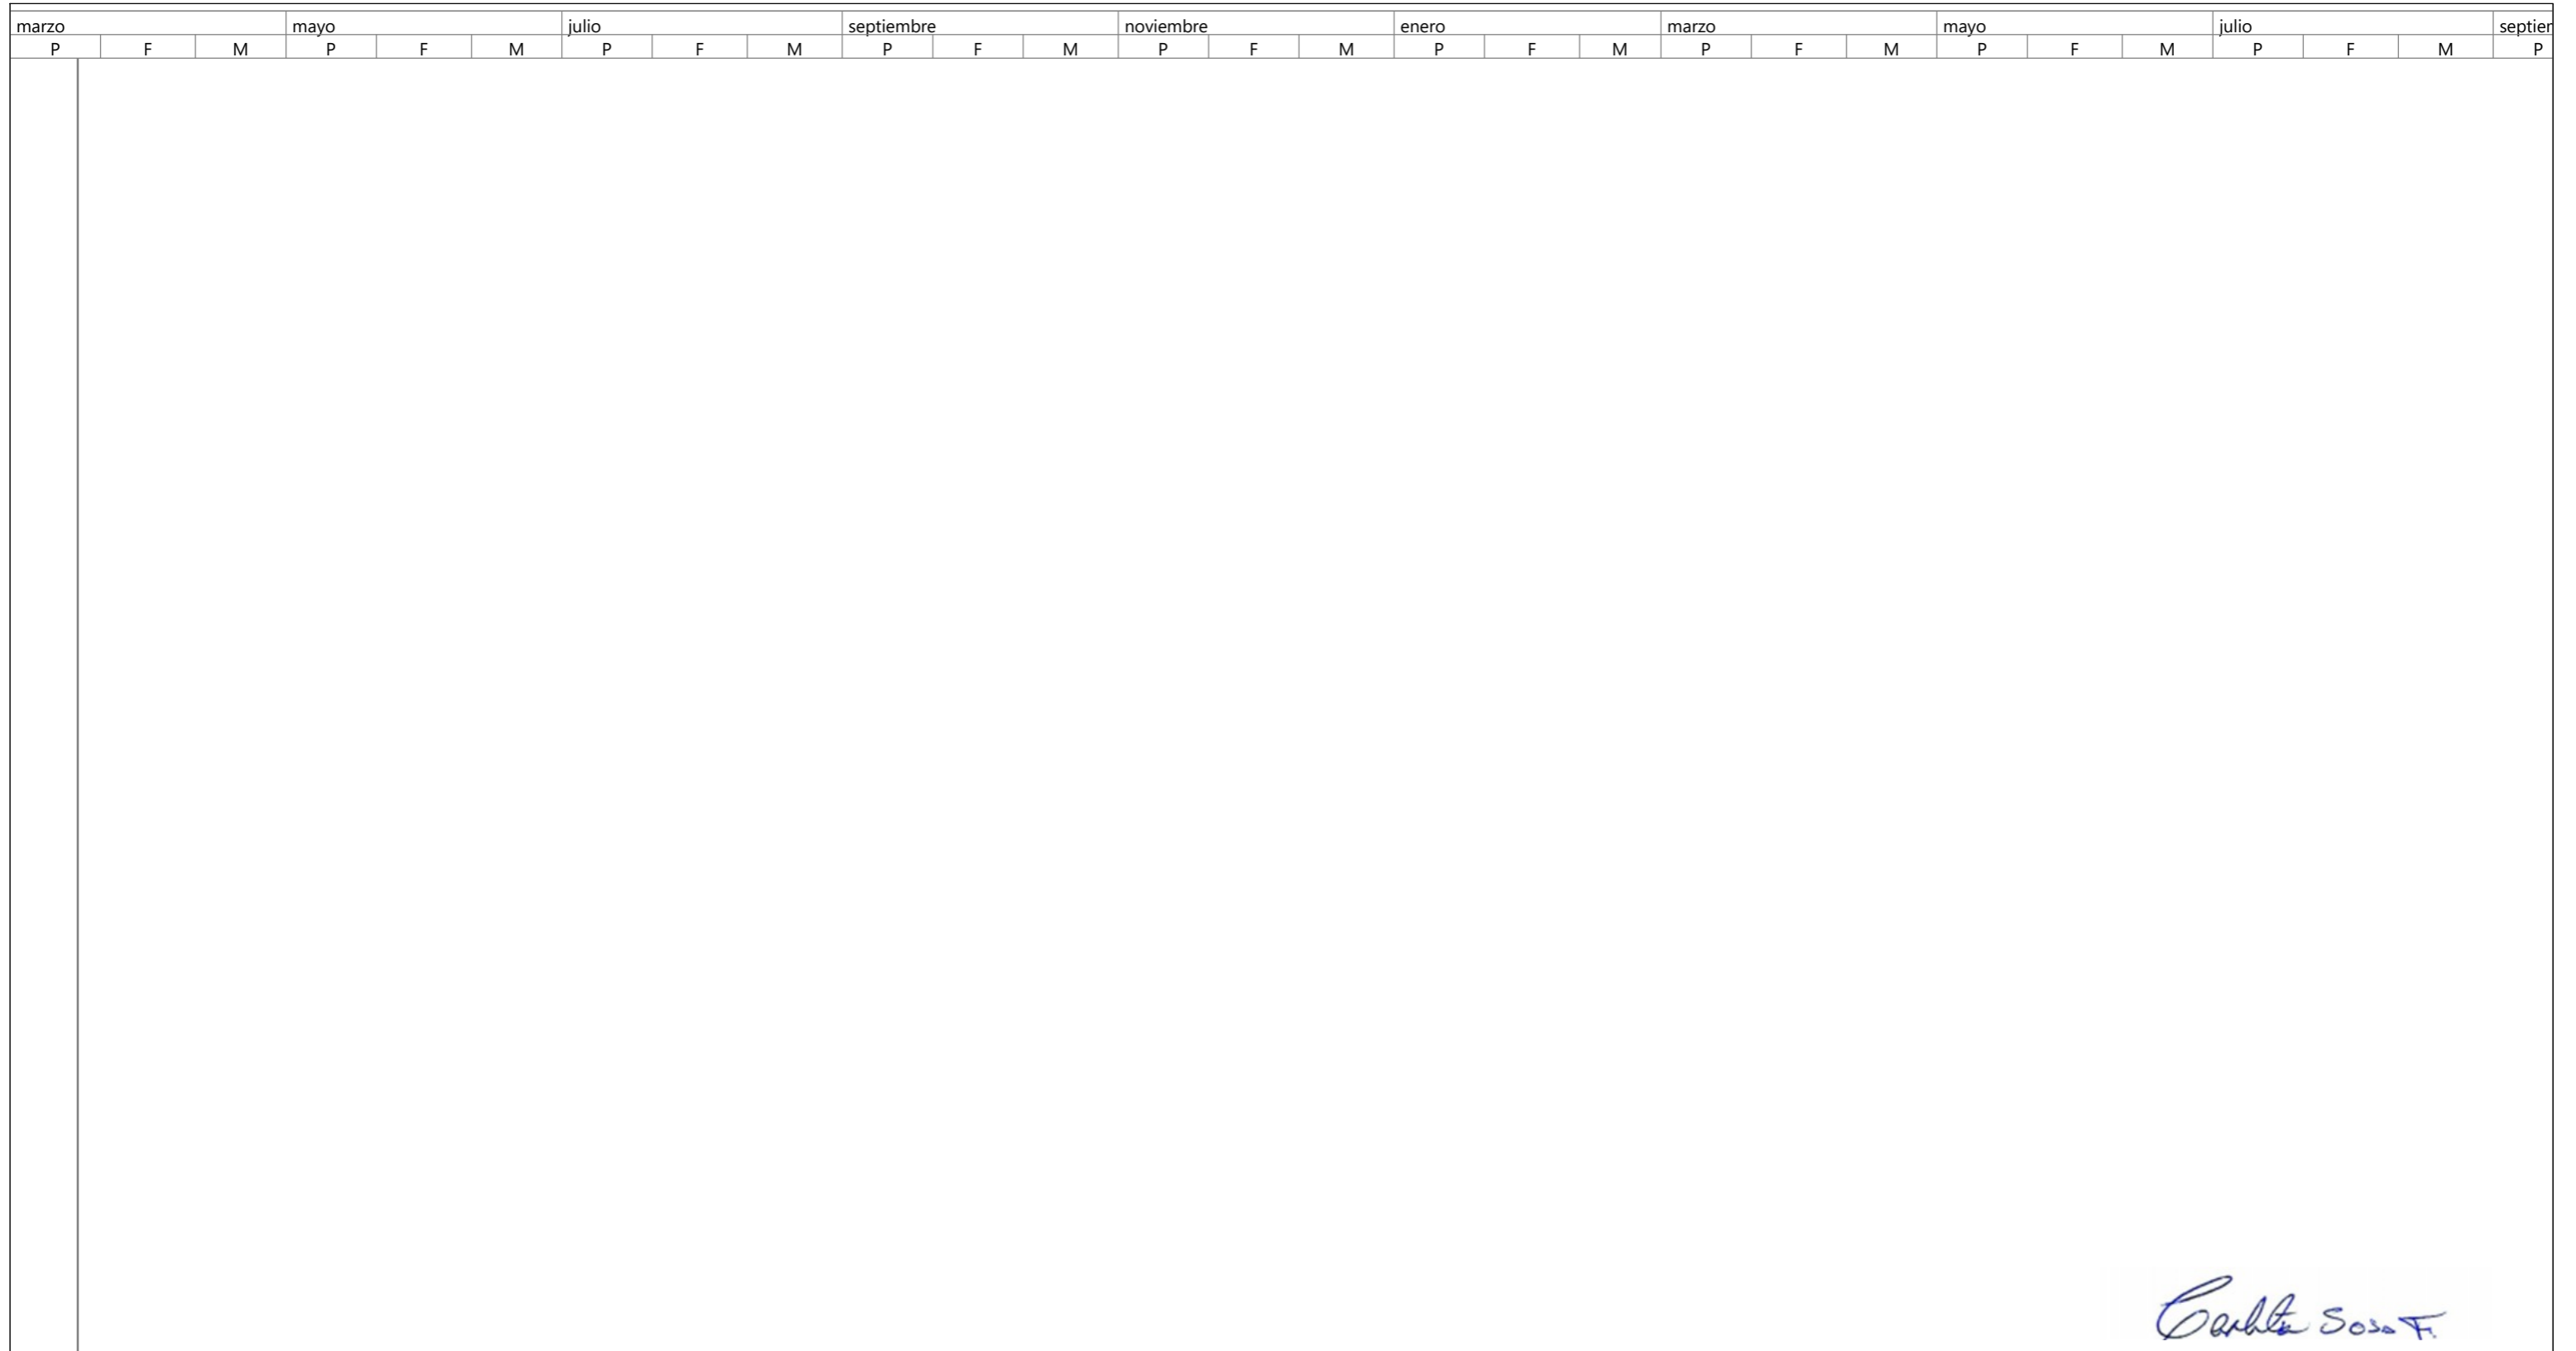

*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

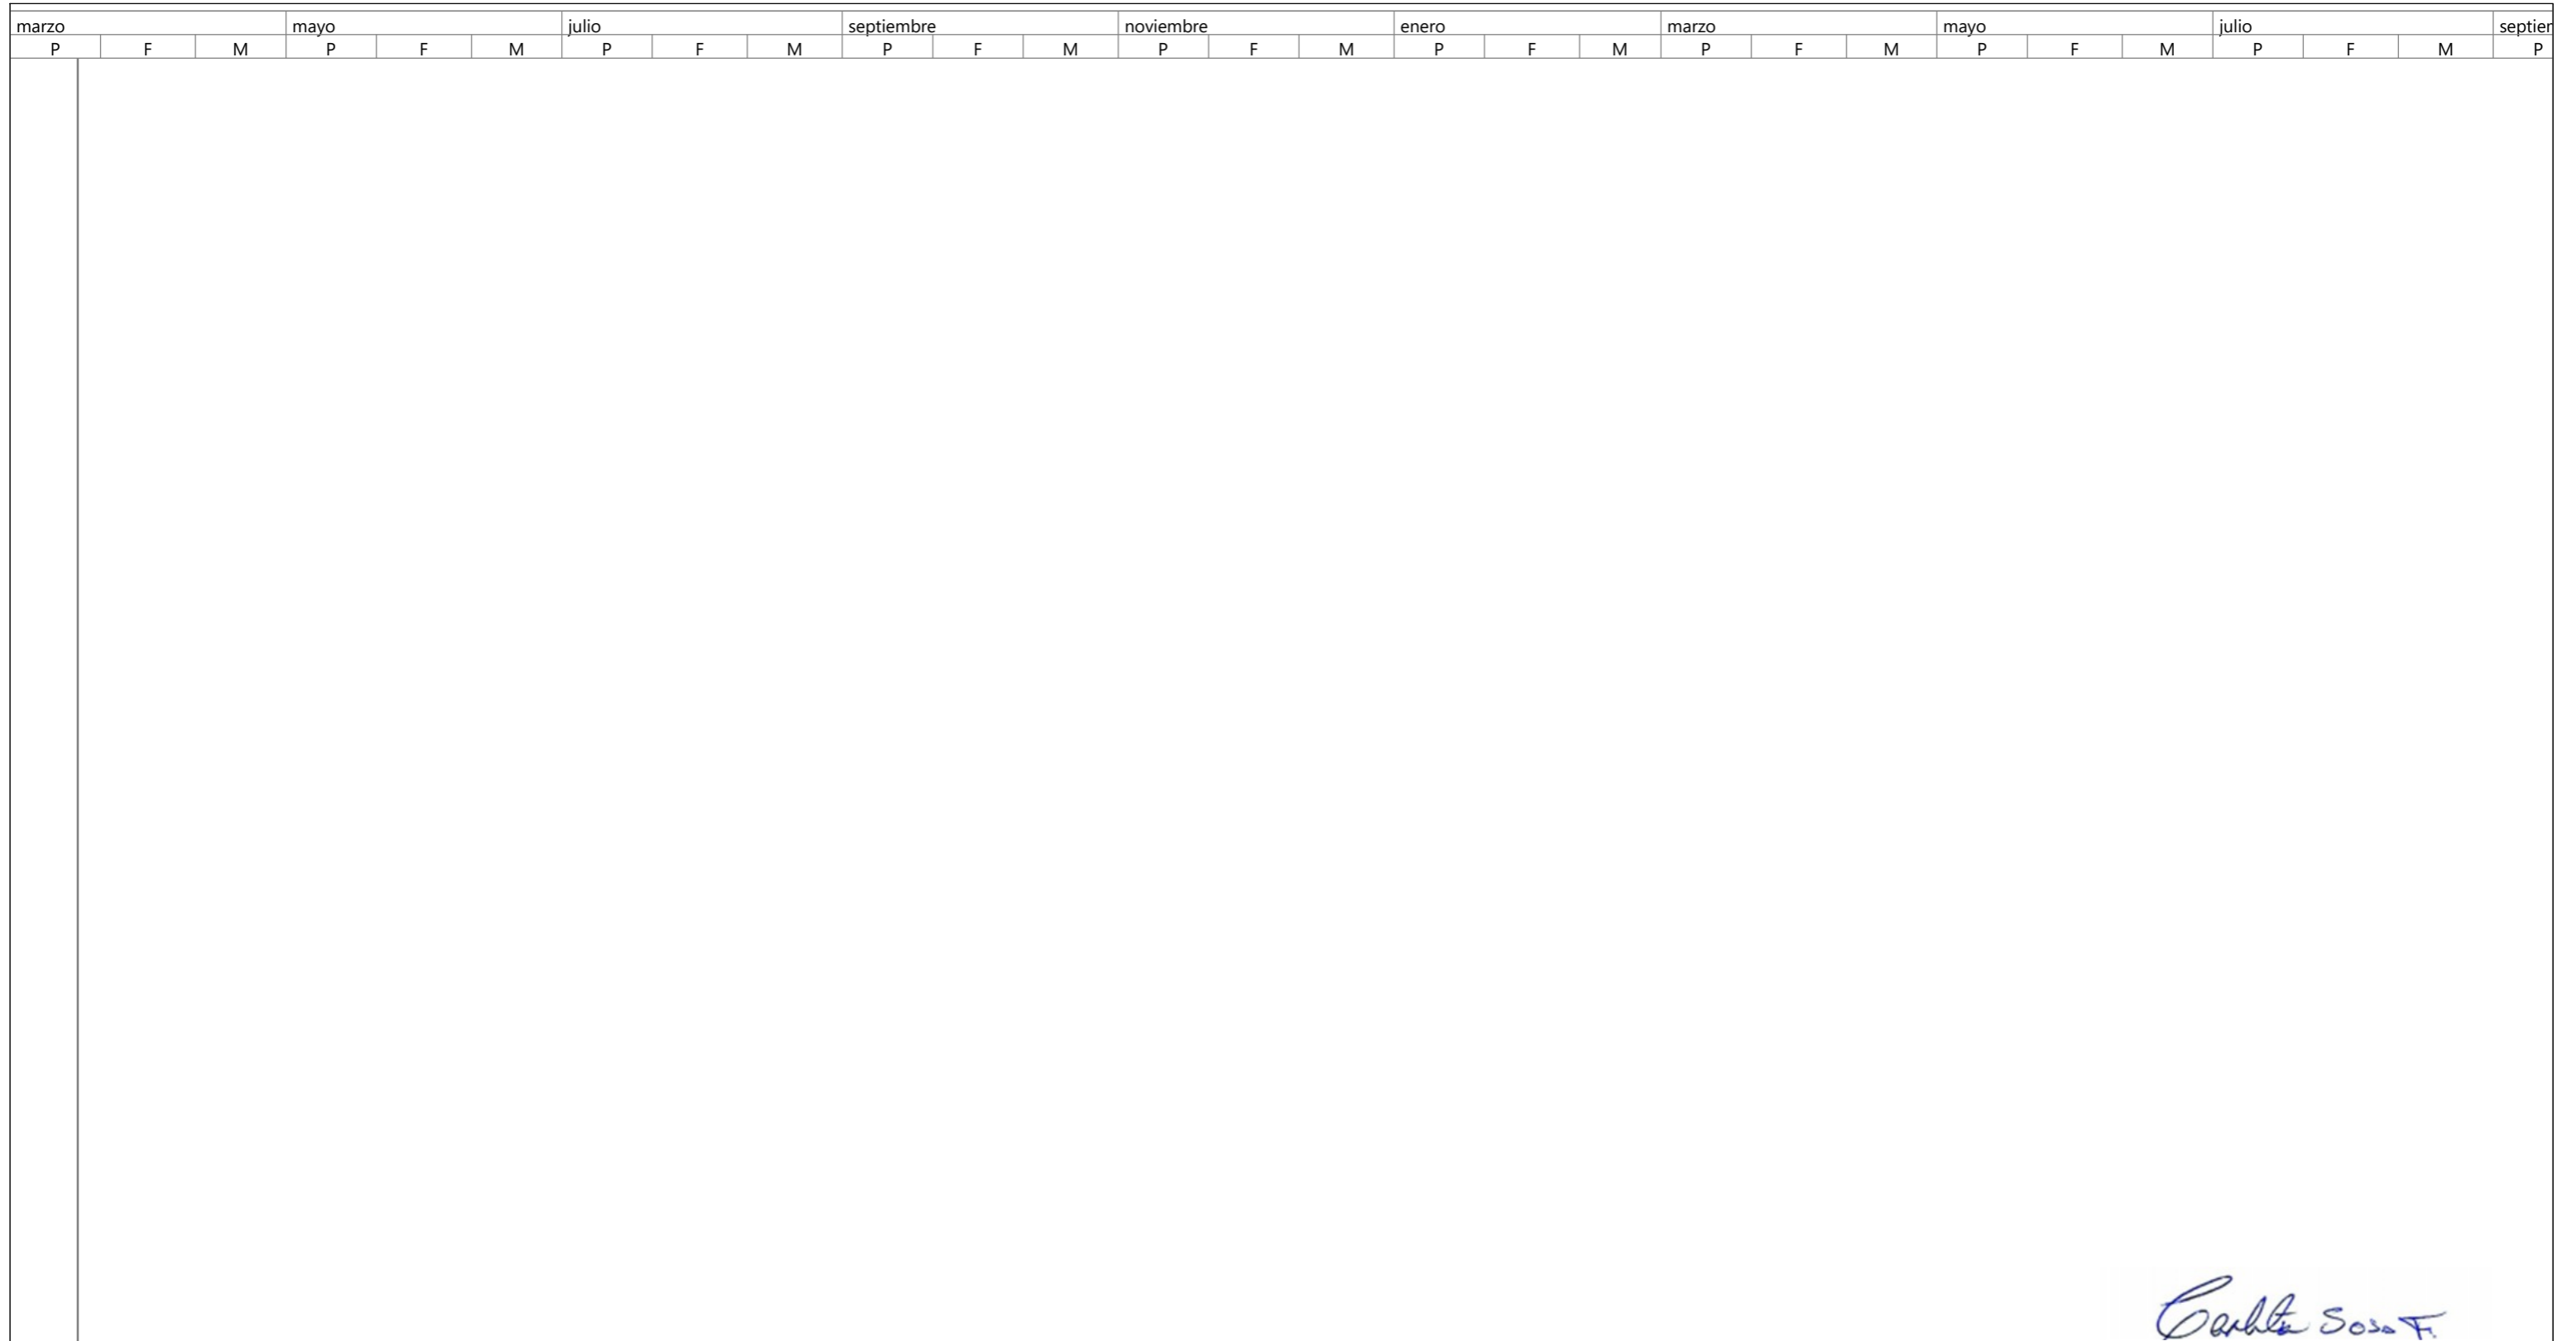

*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



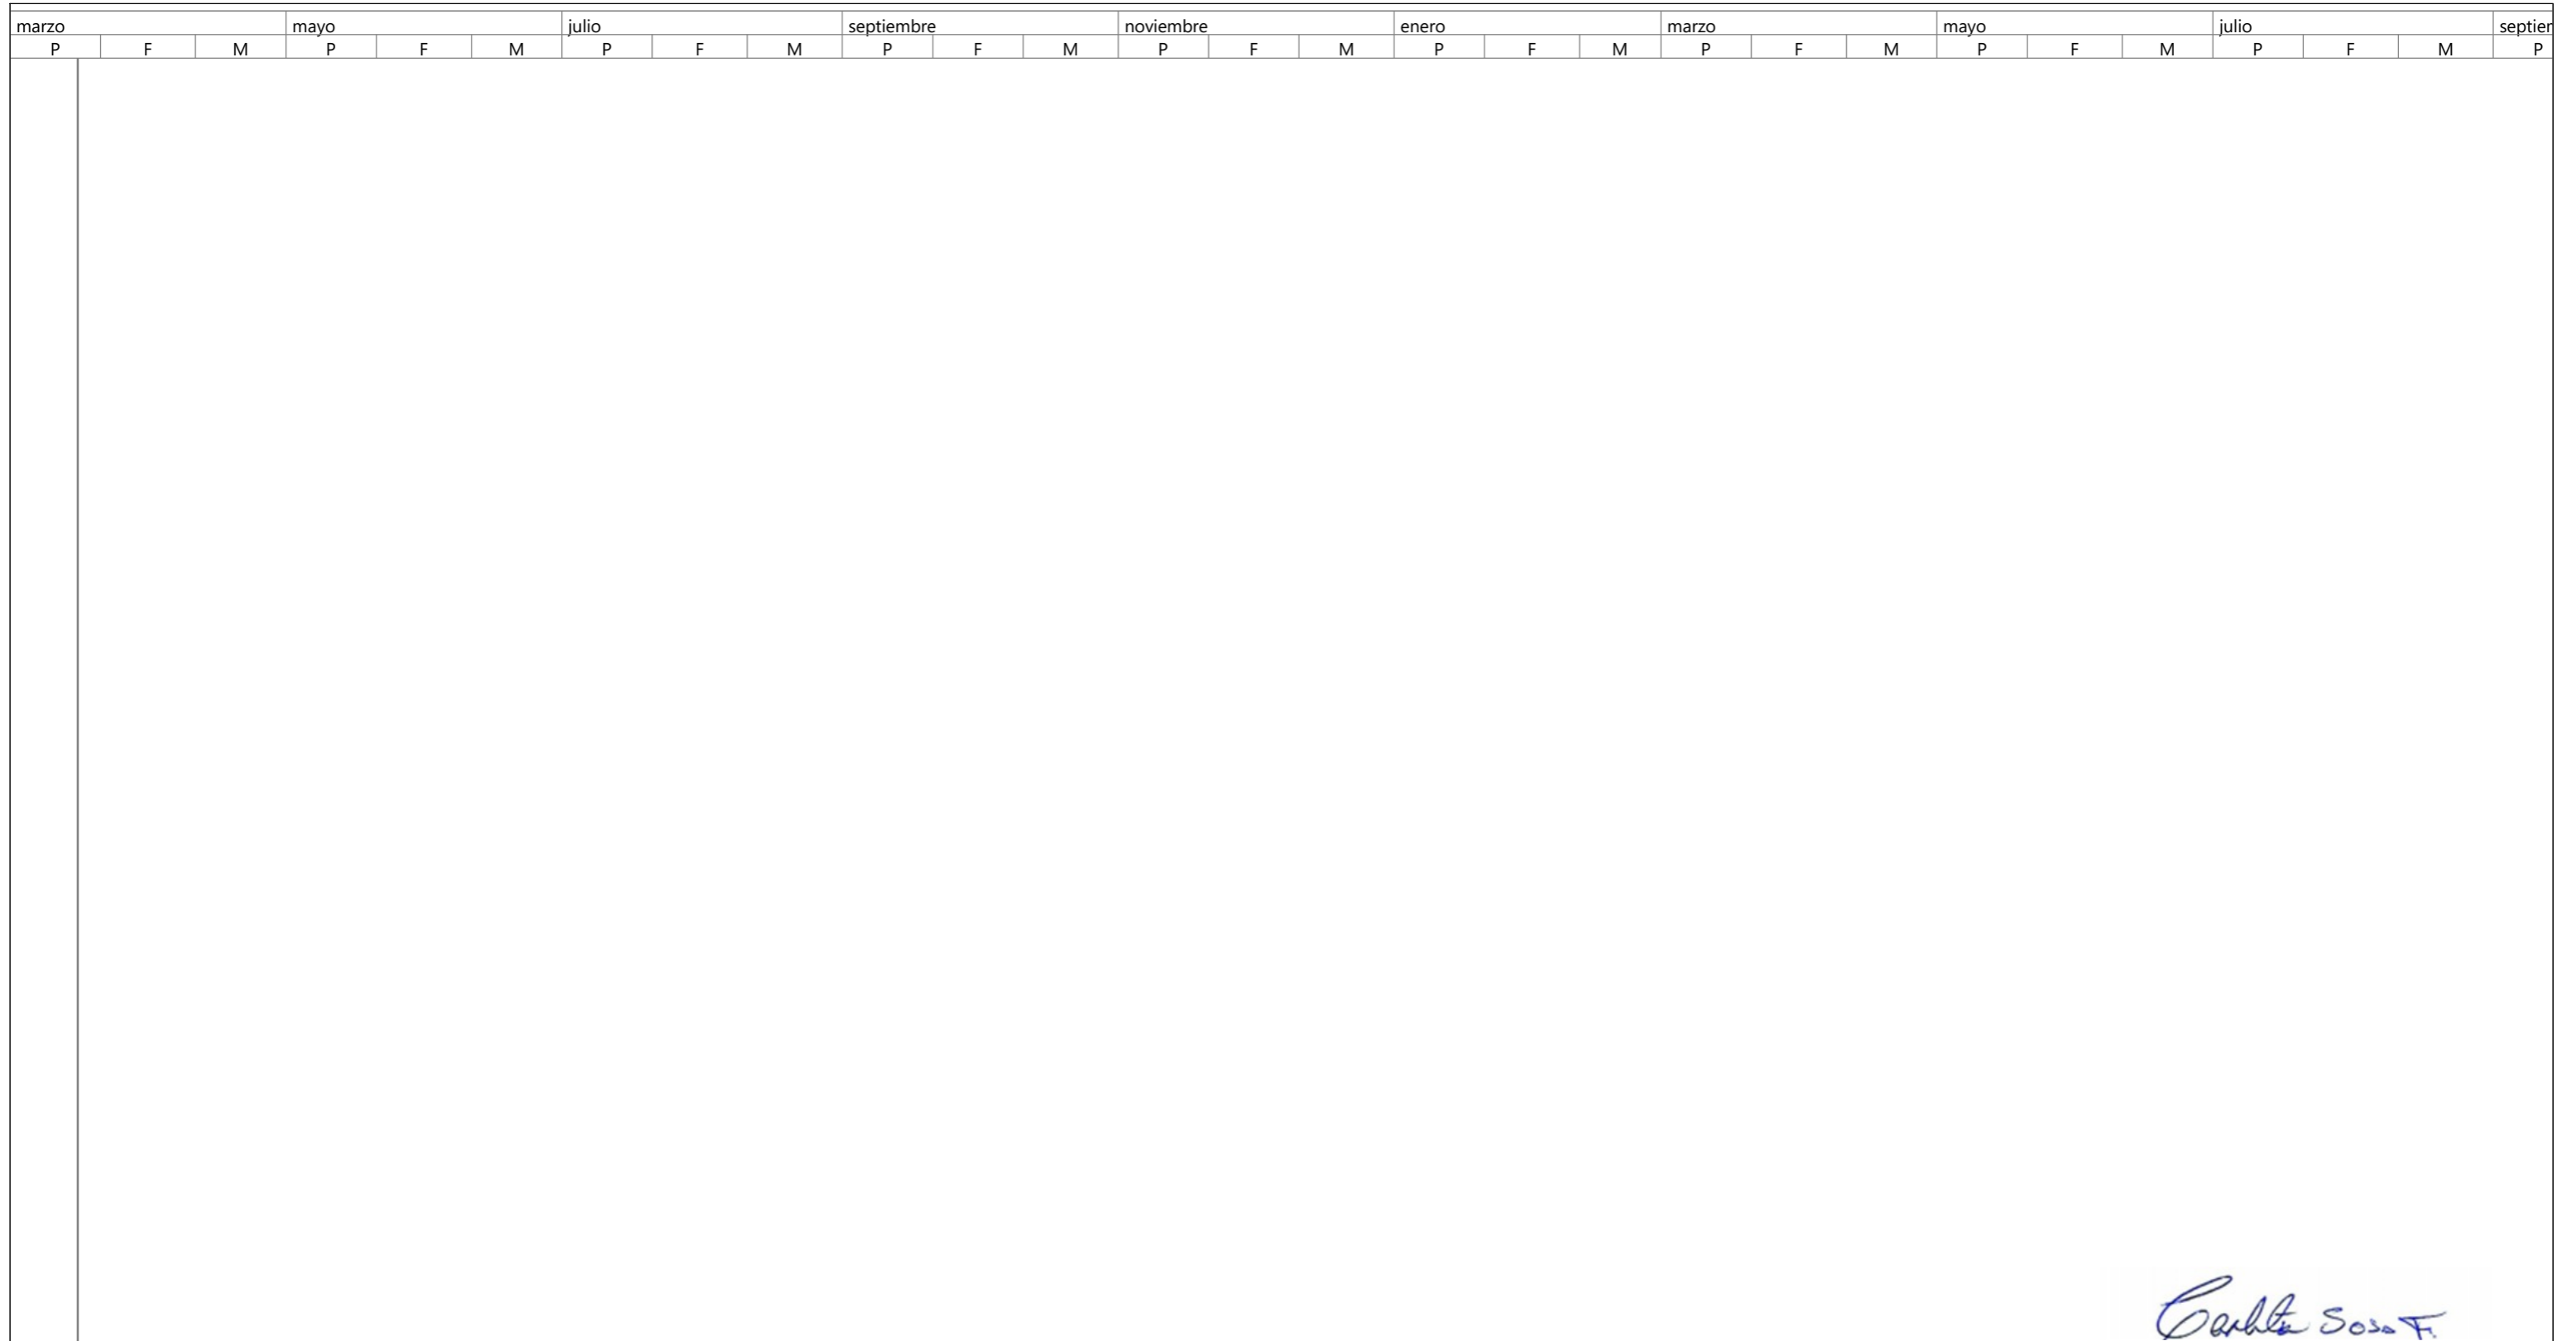


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

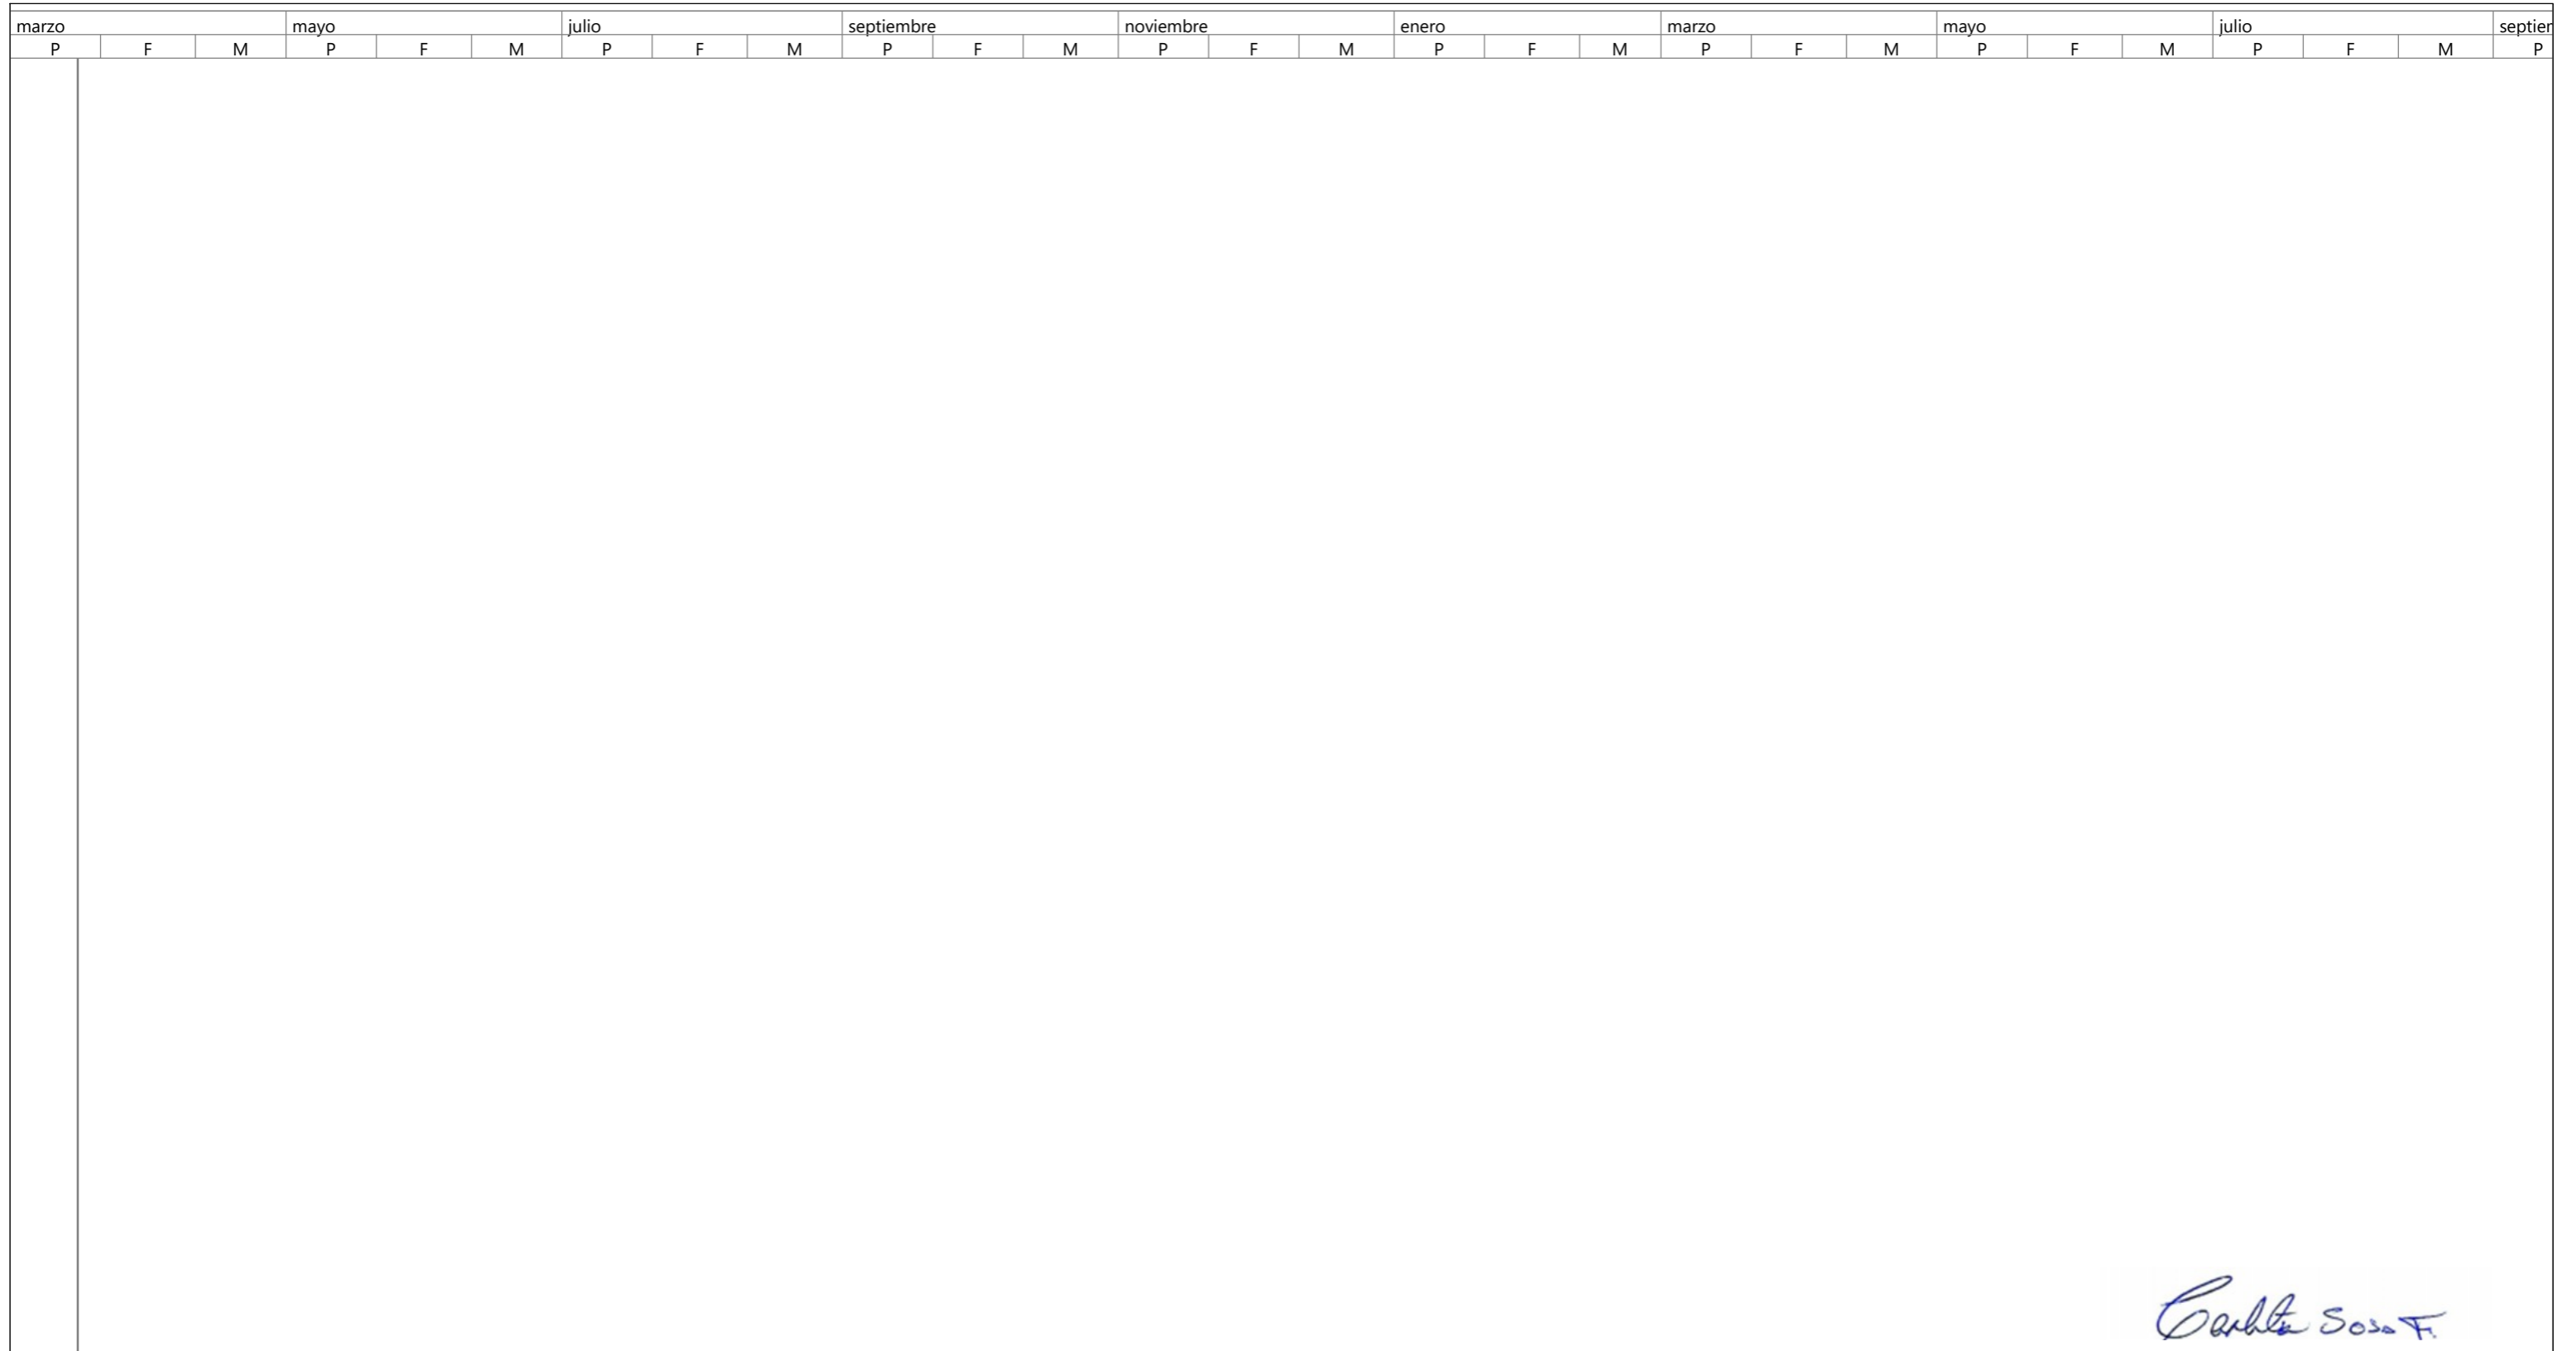


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

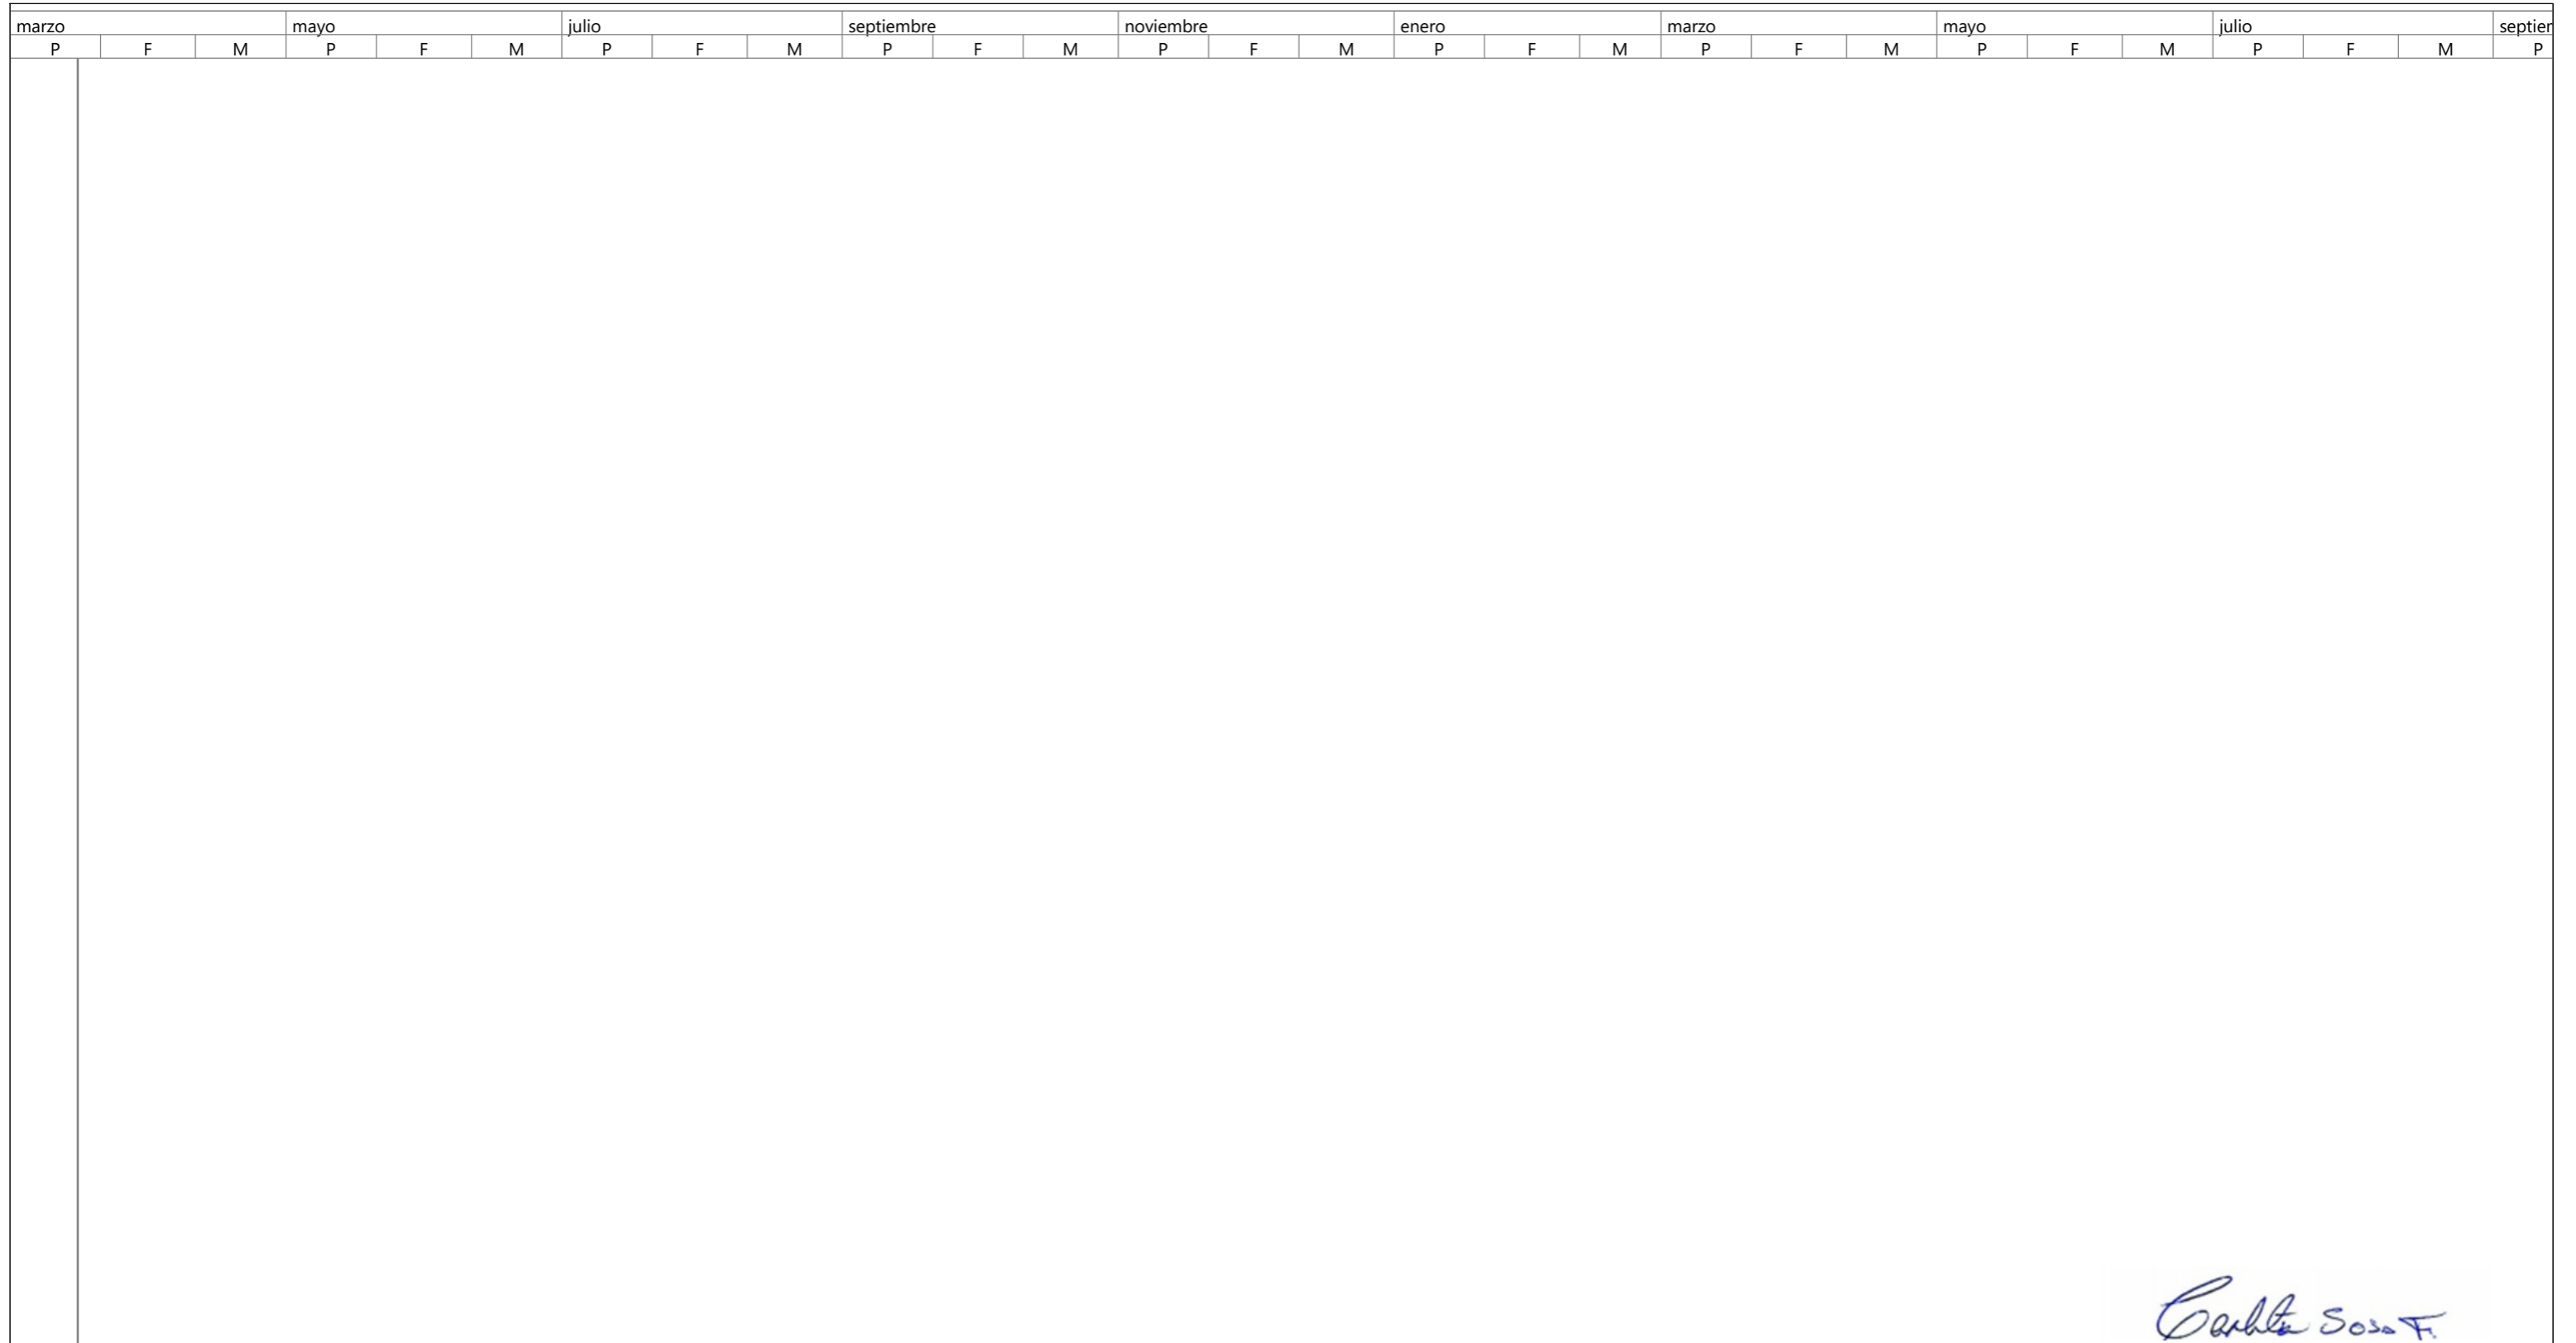


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

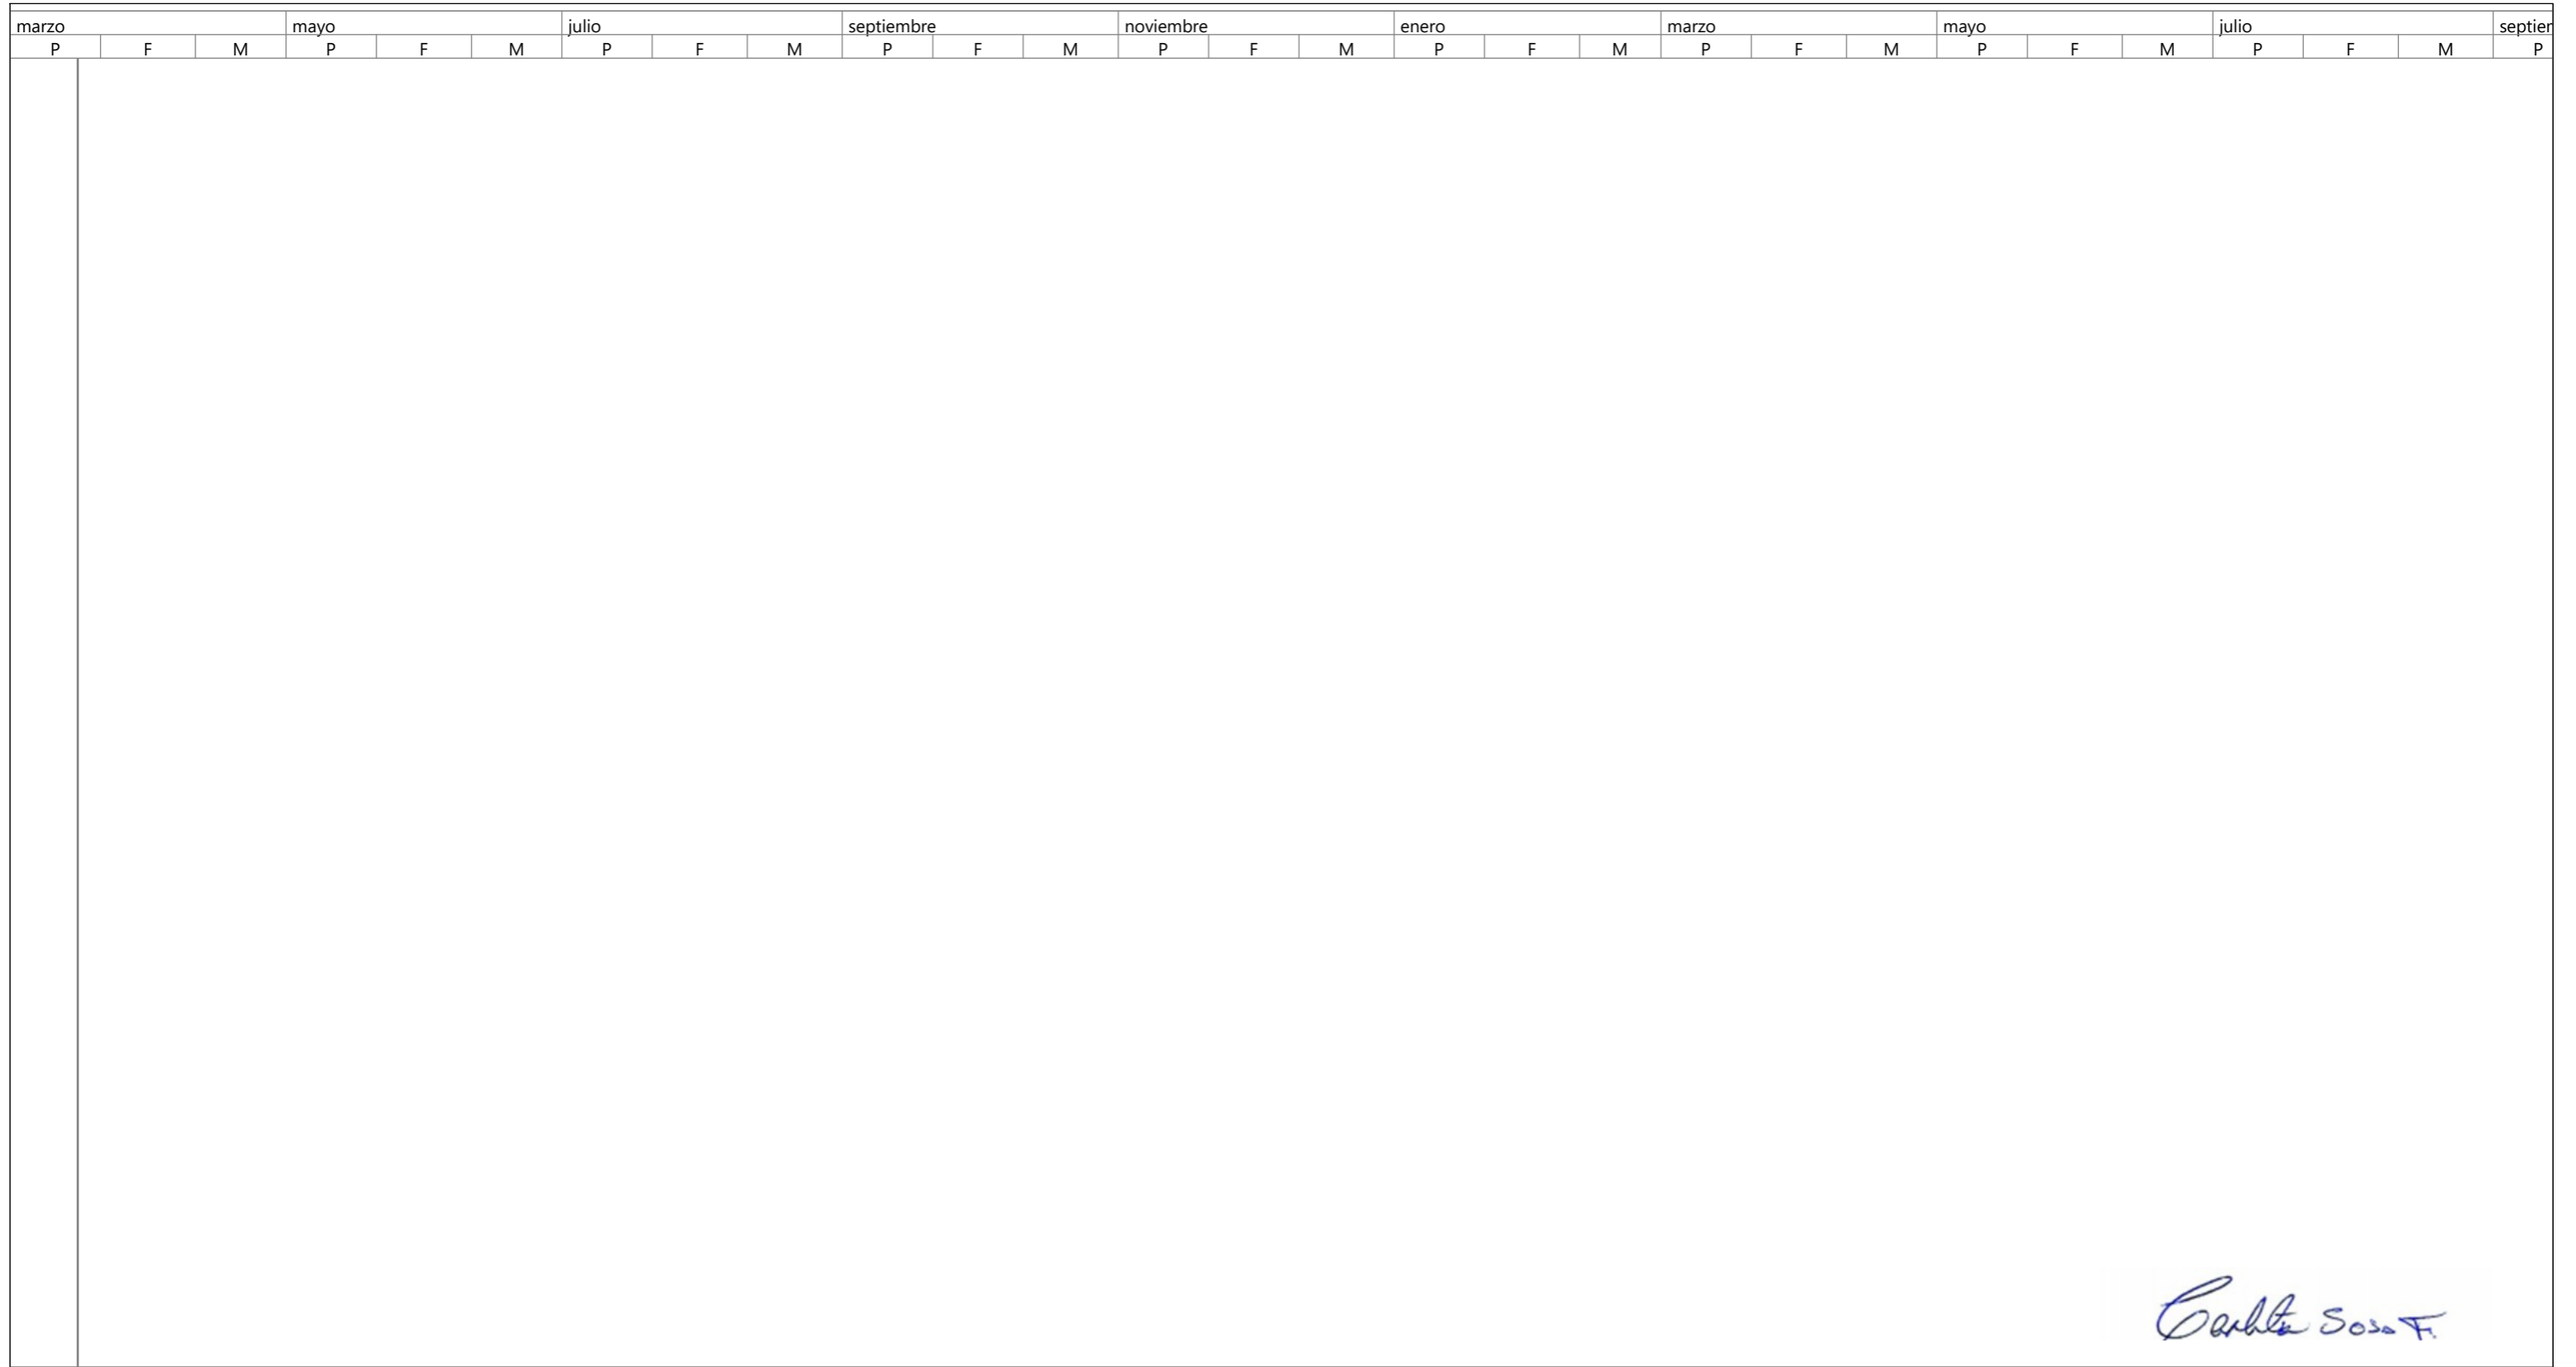


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

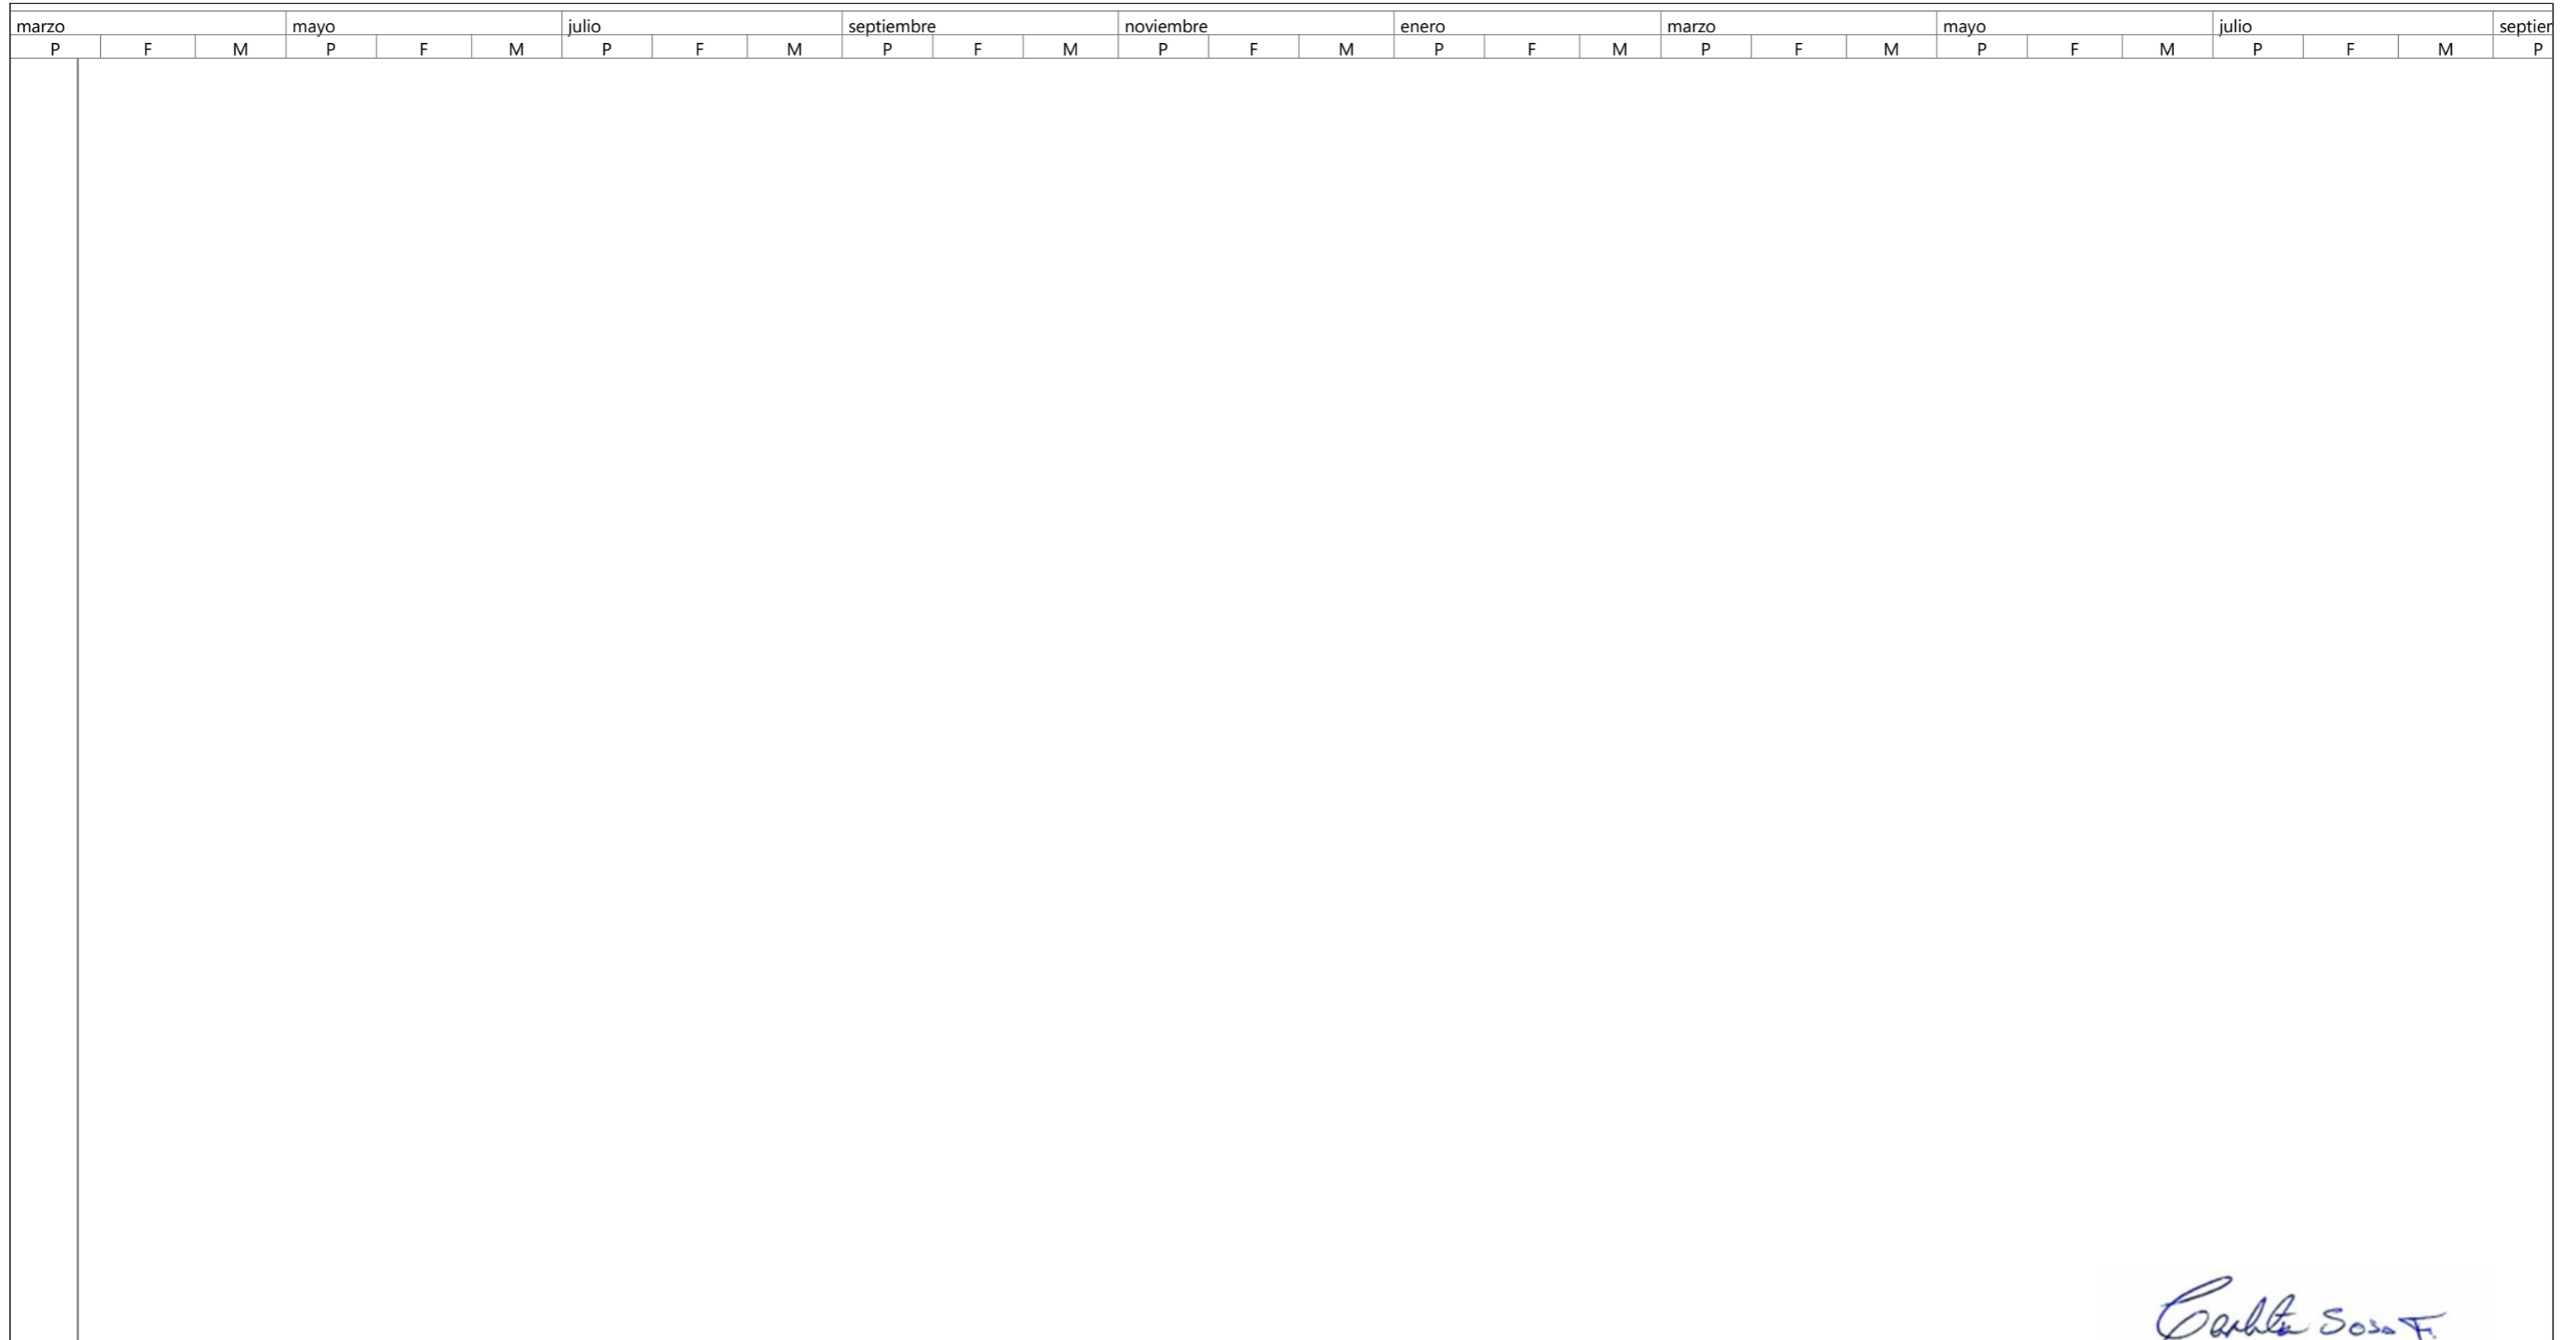


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

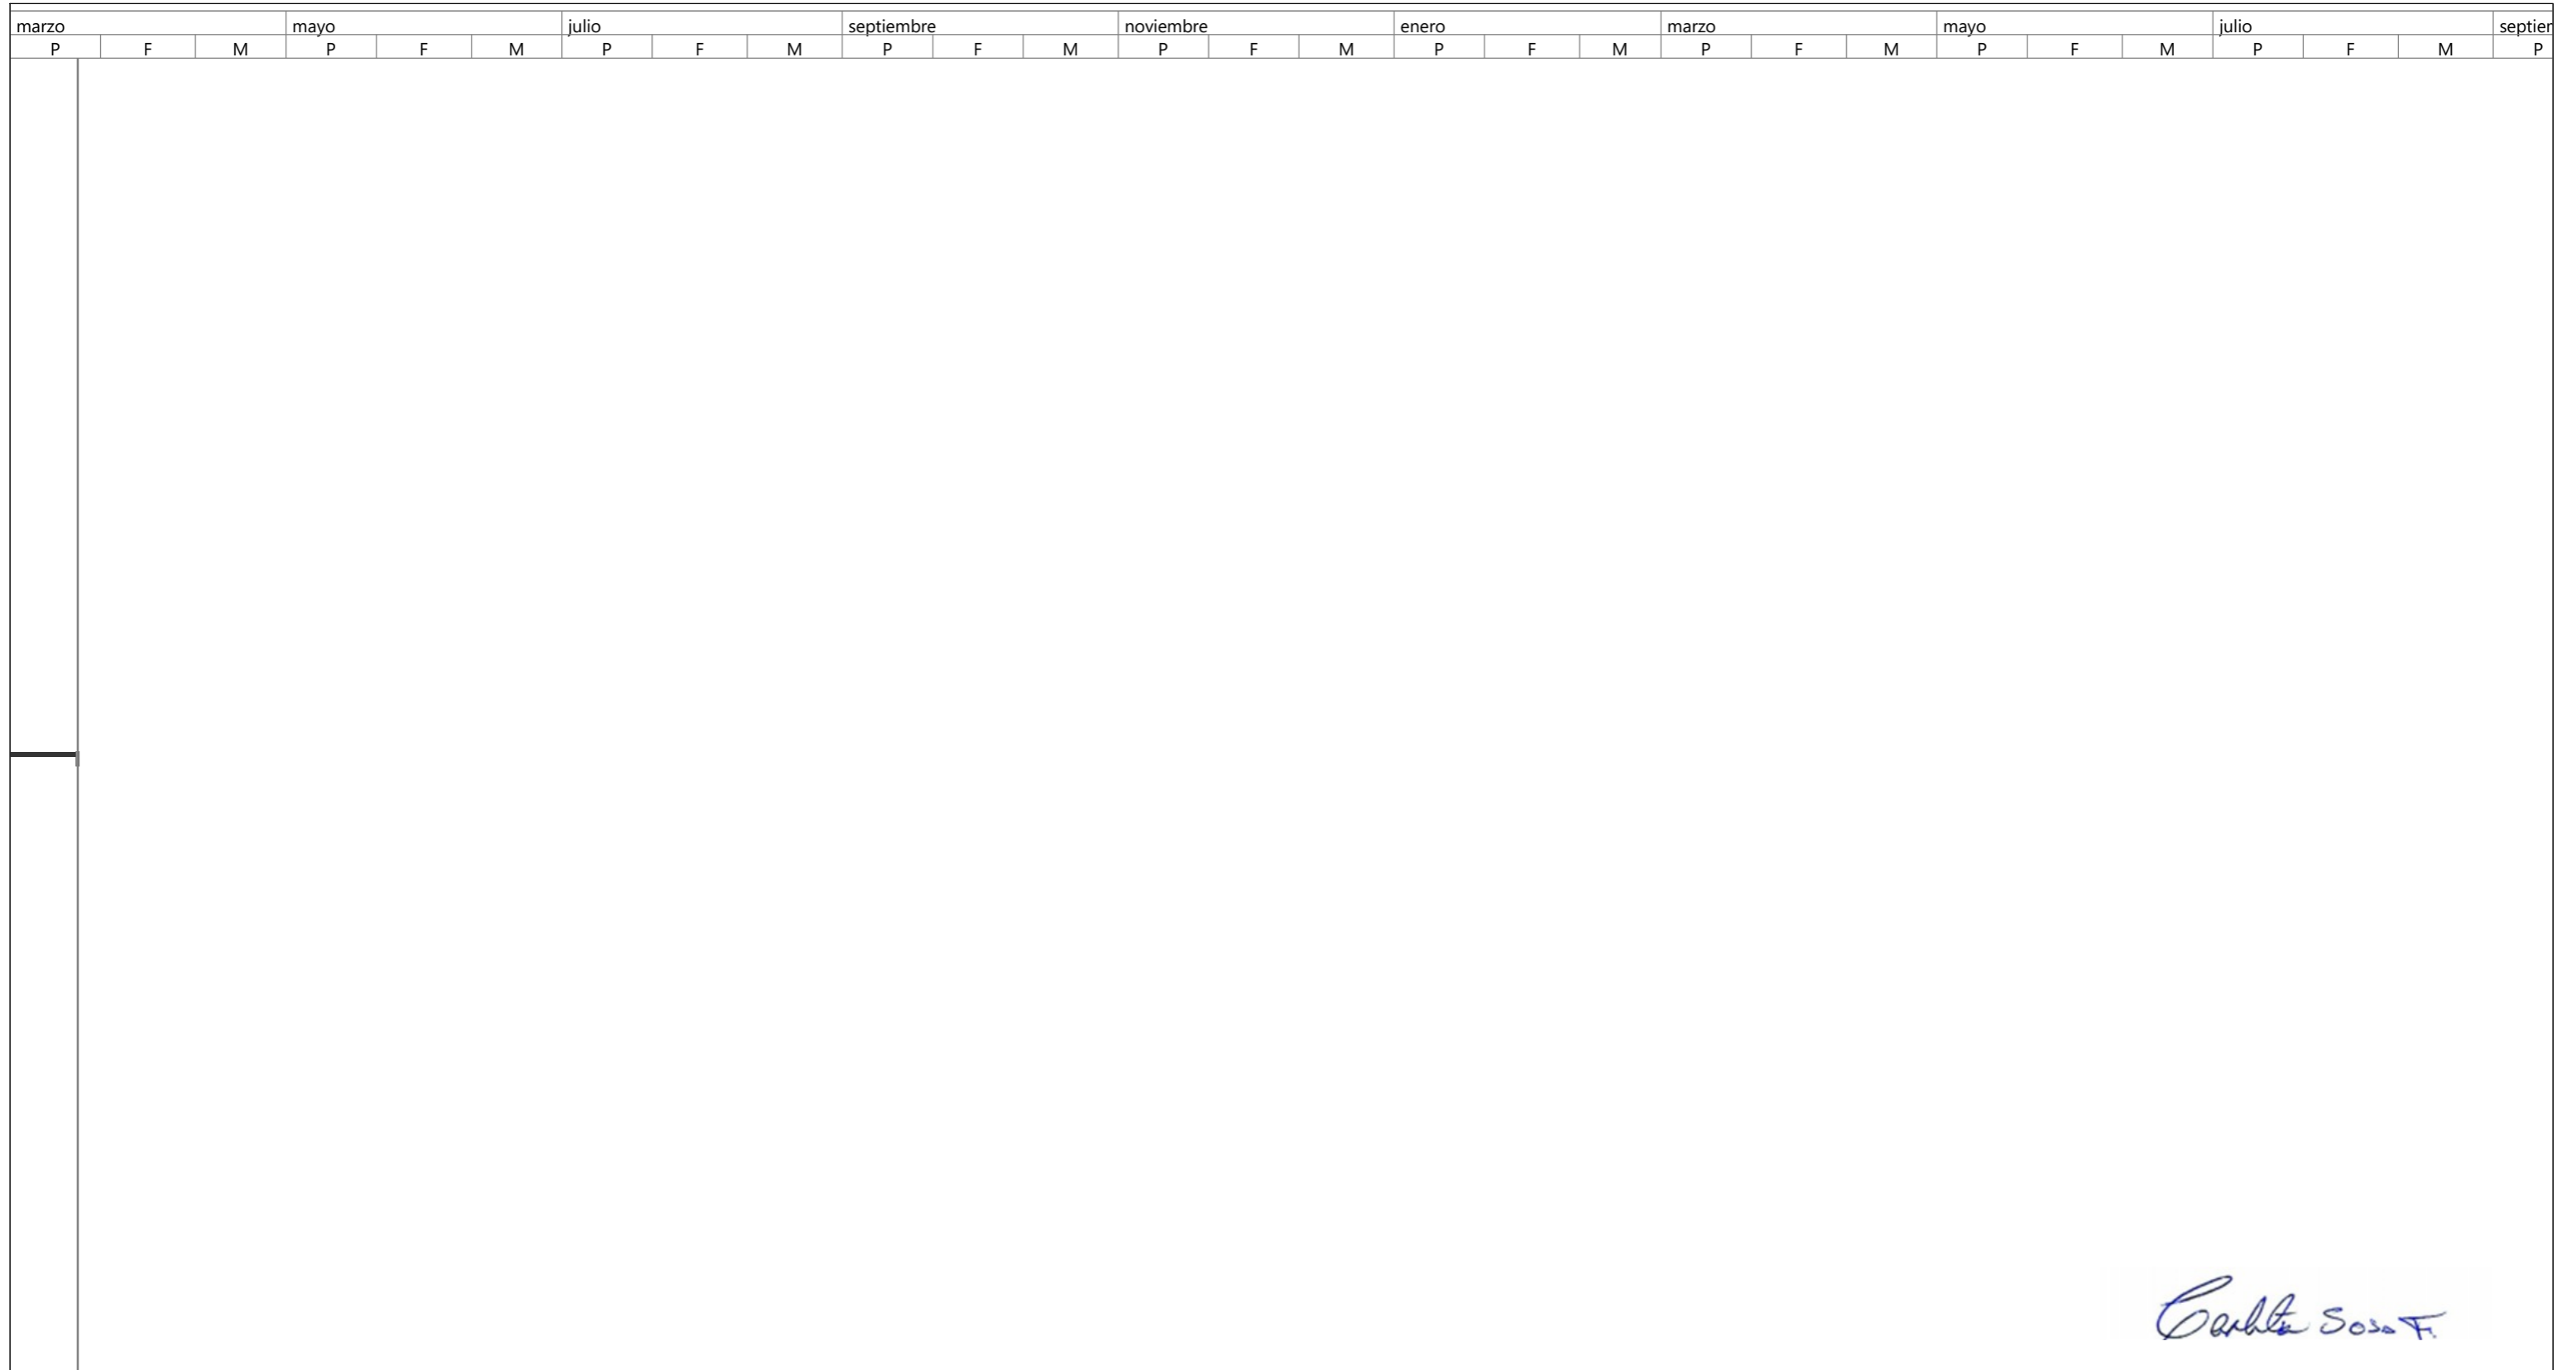


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

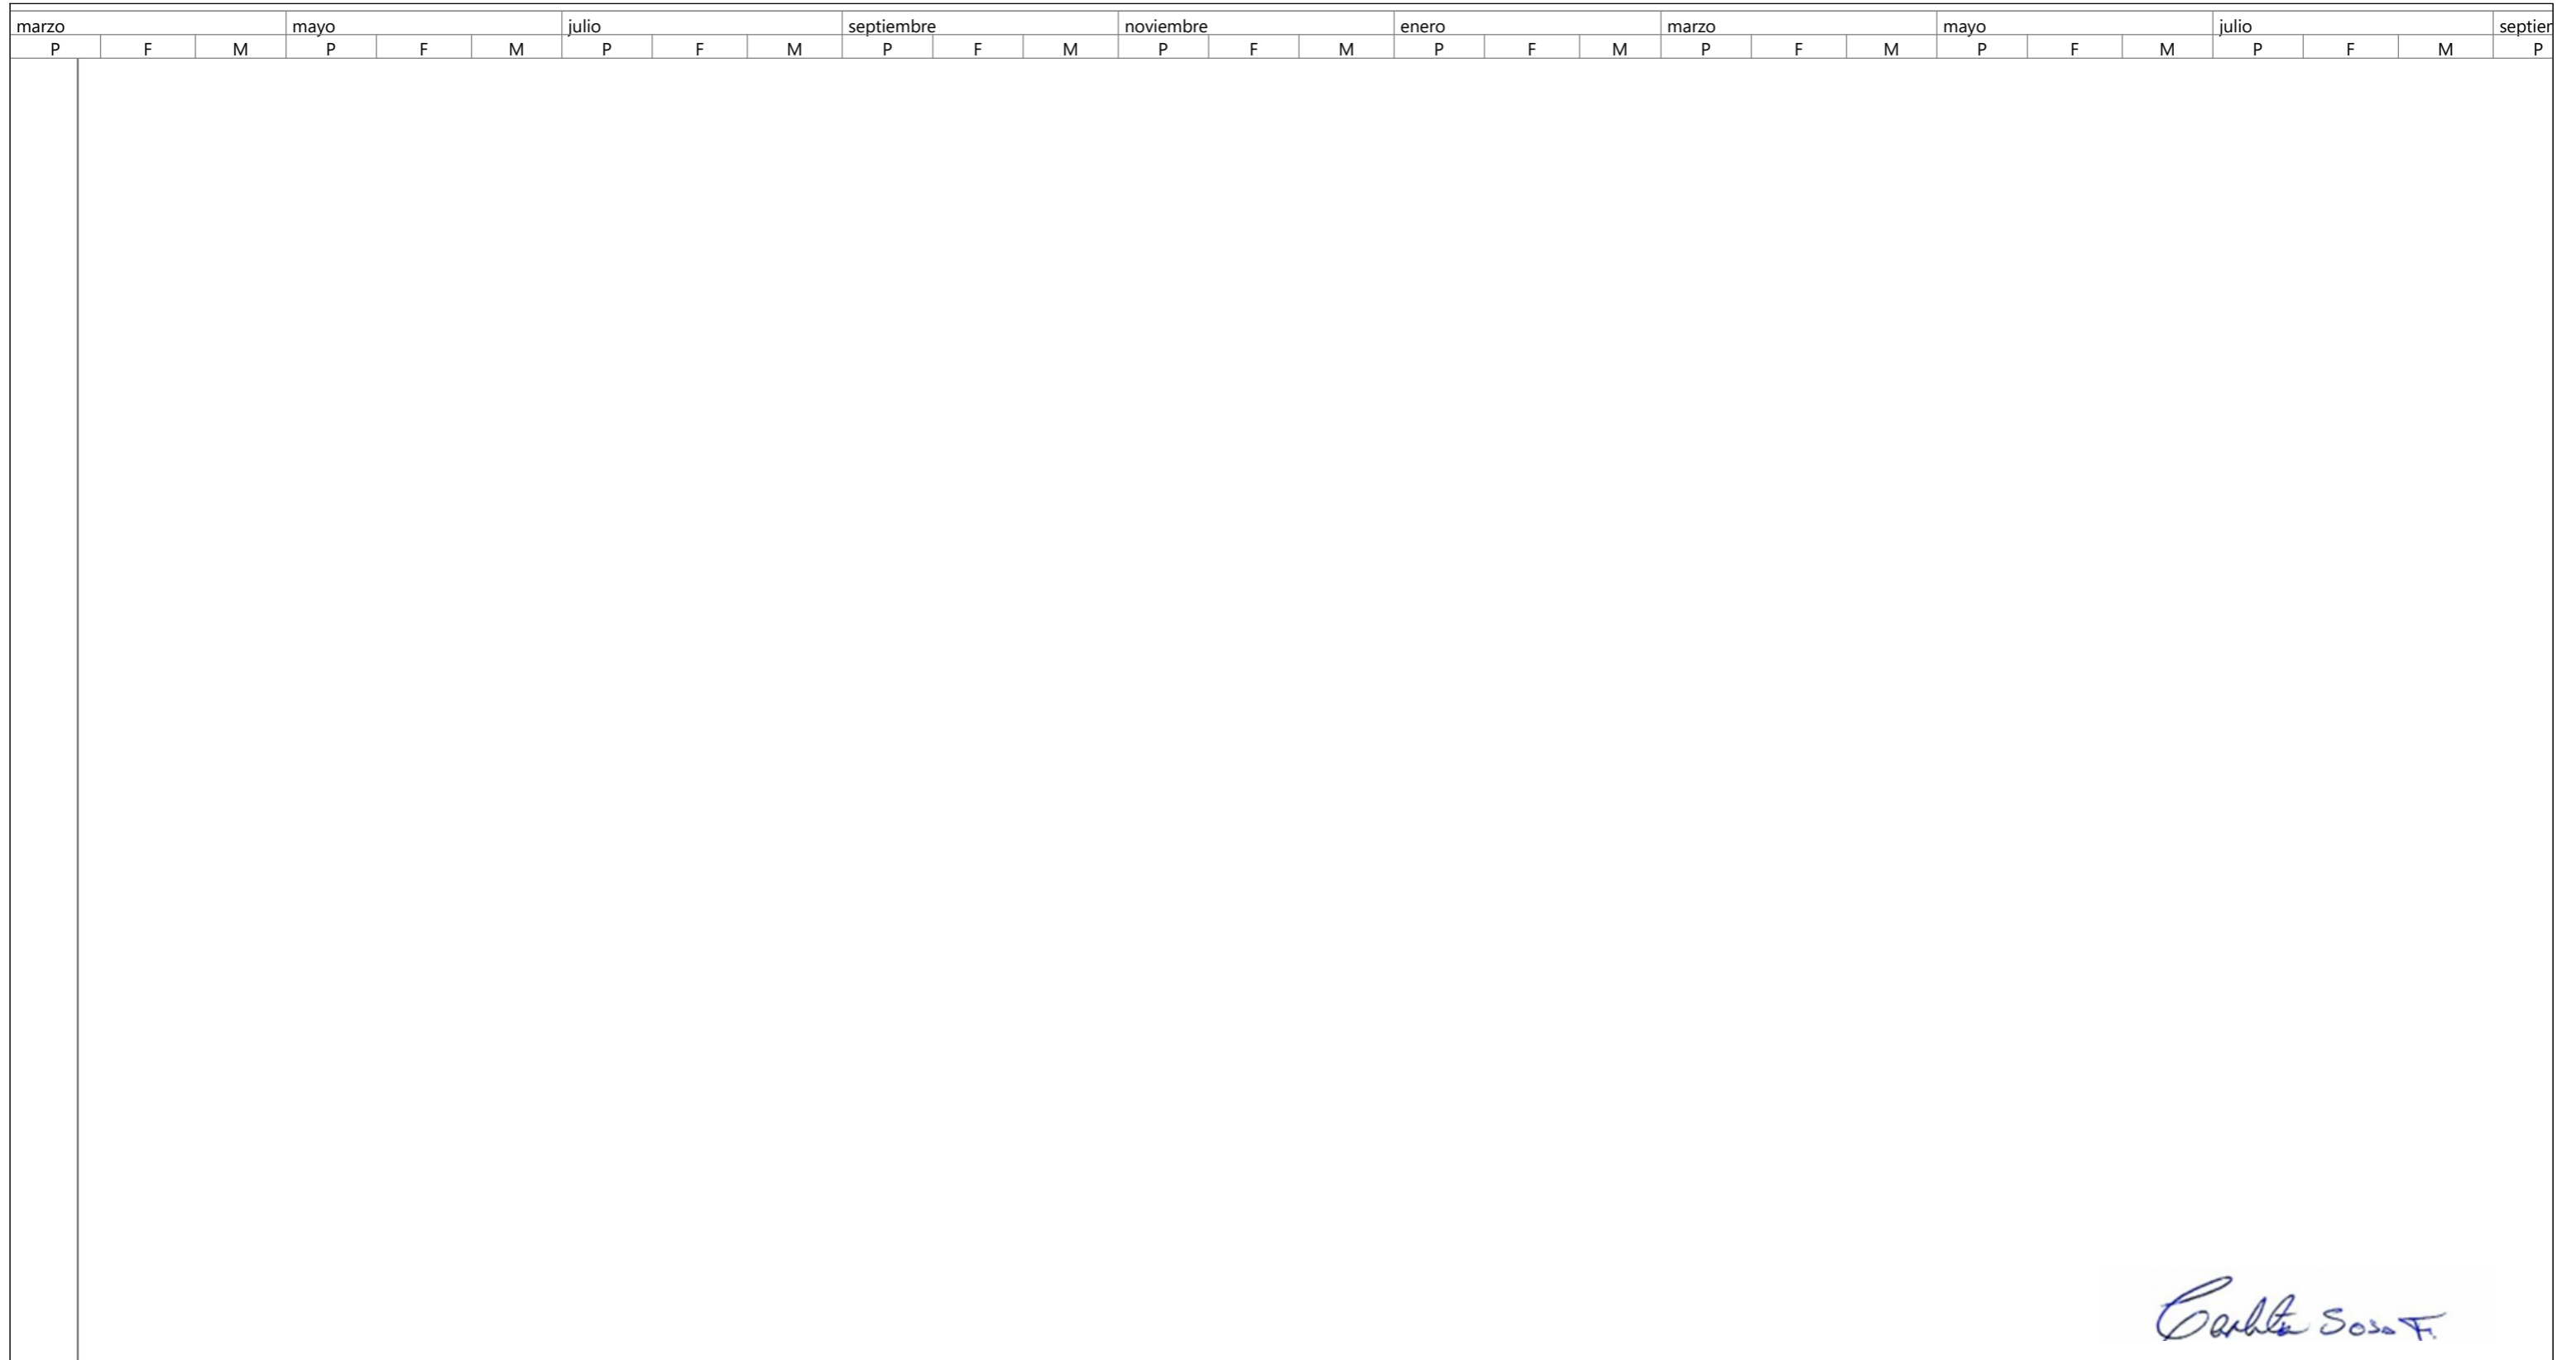

*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

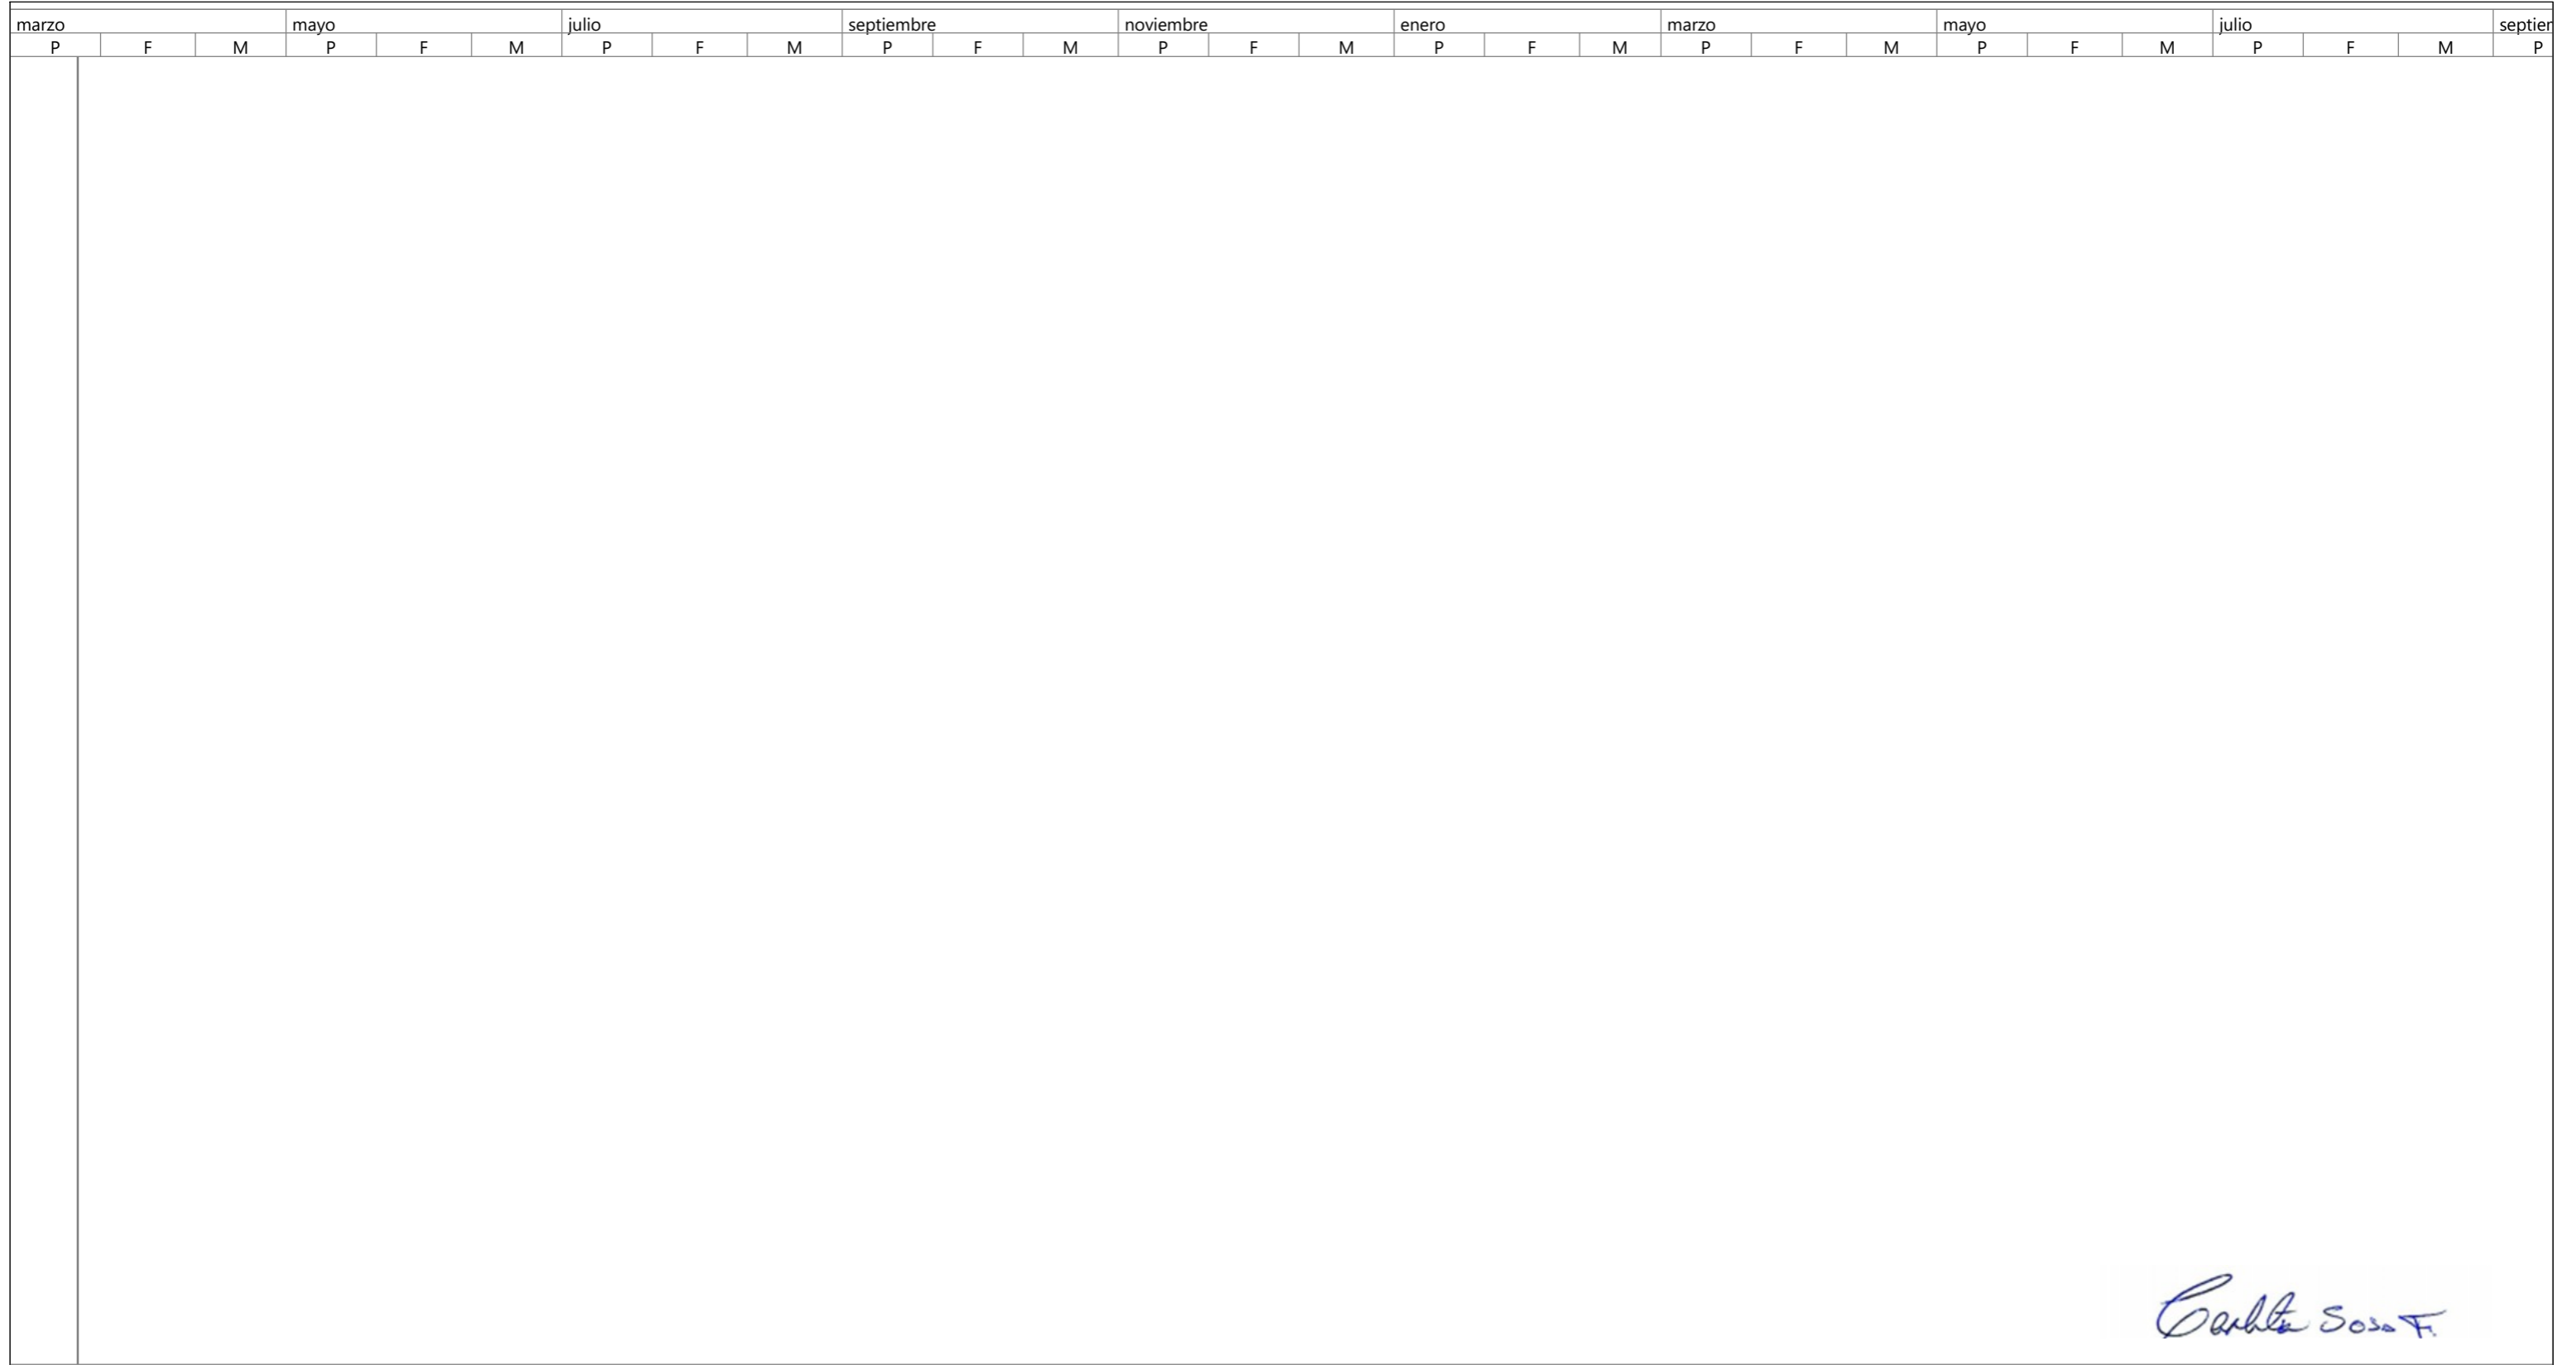

*Carla Sosa F.*


Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



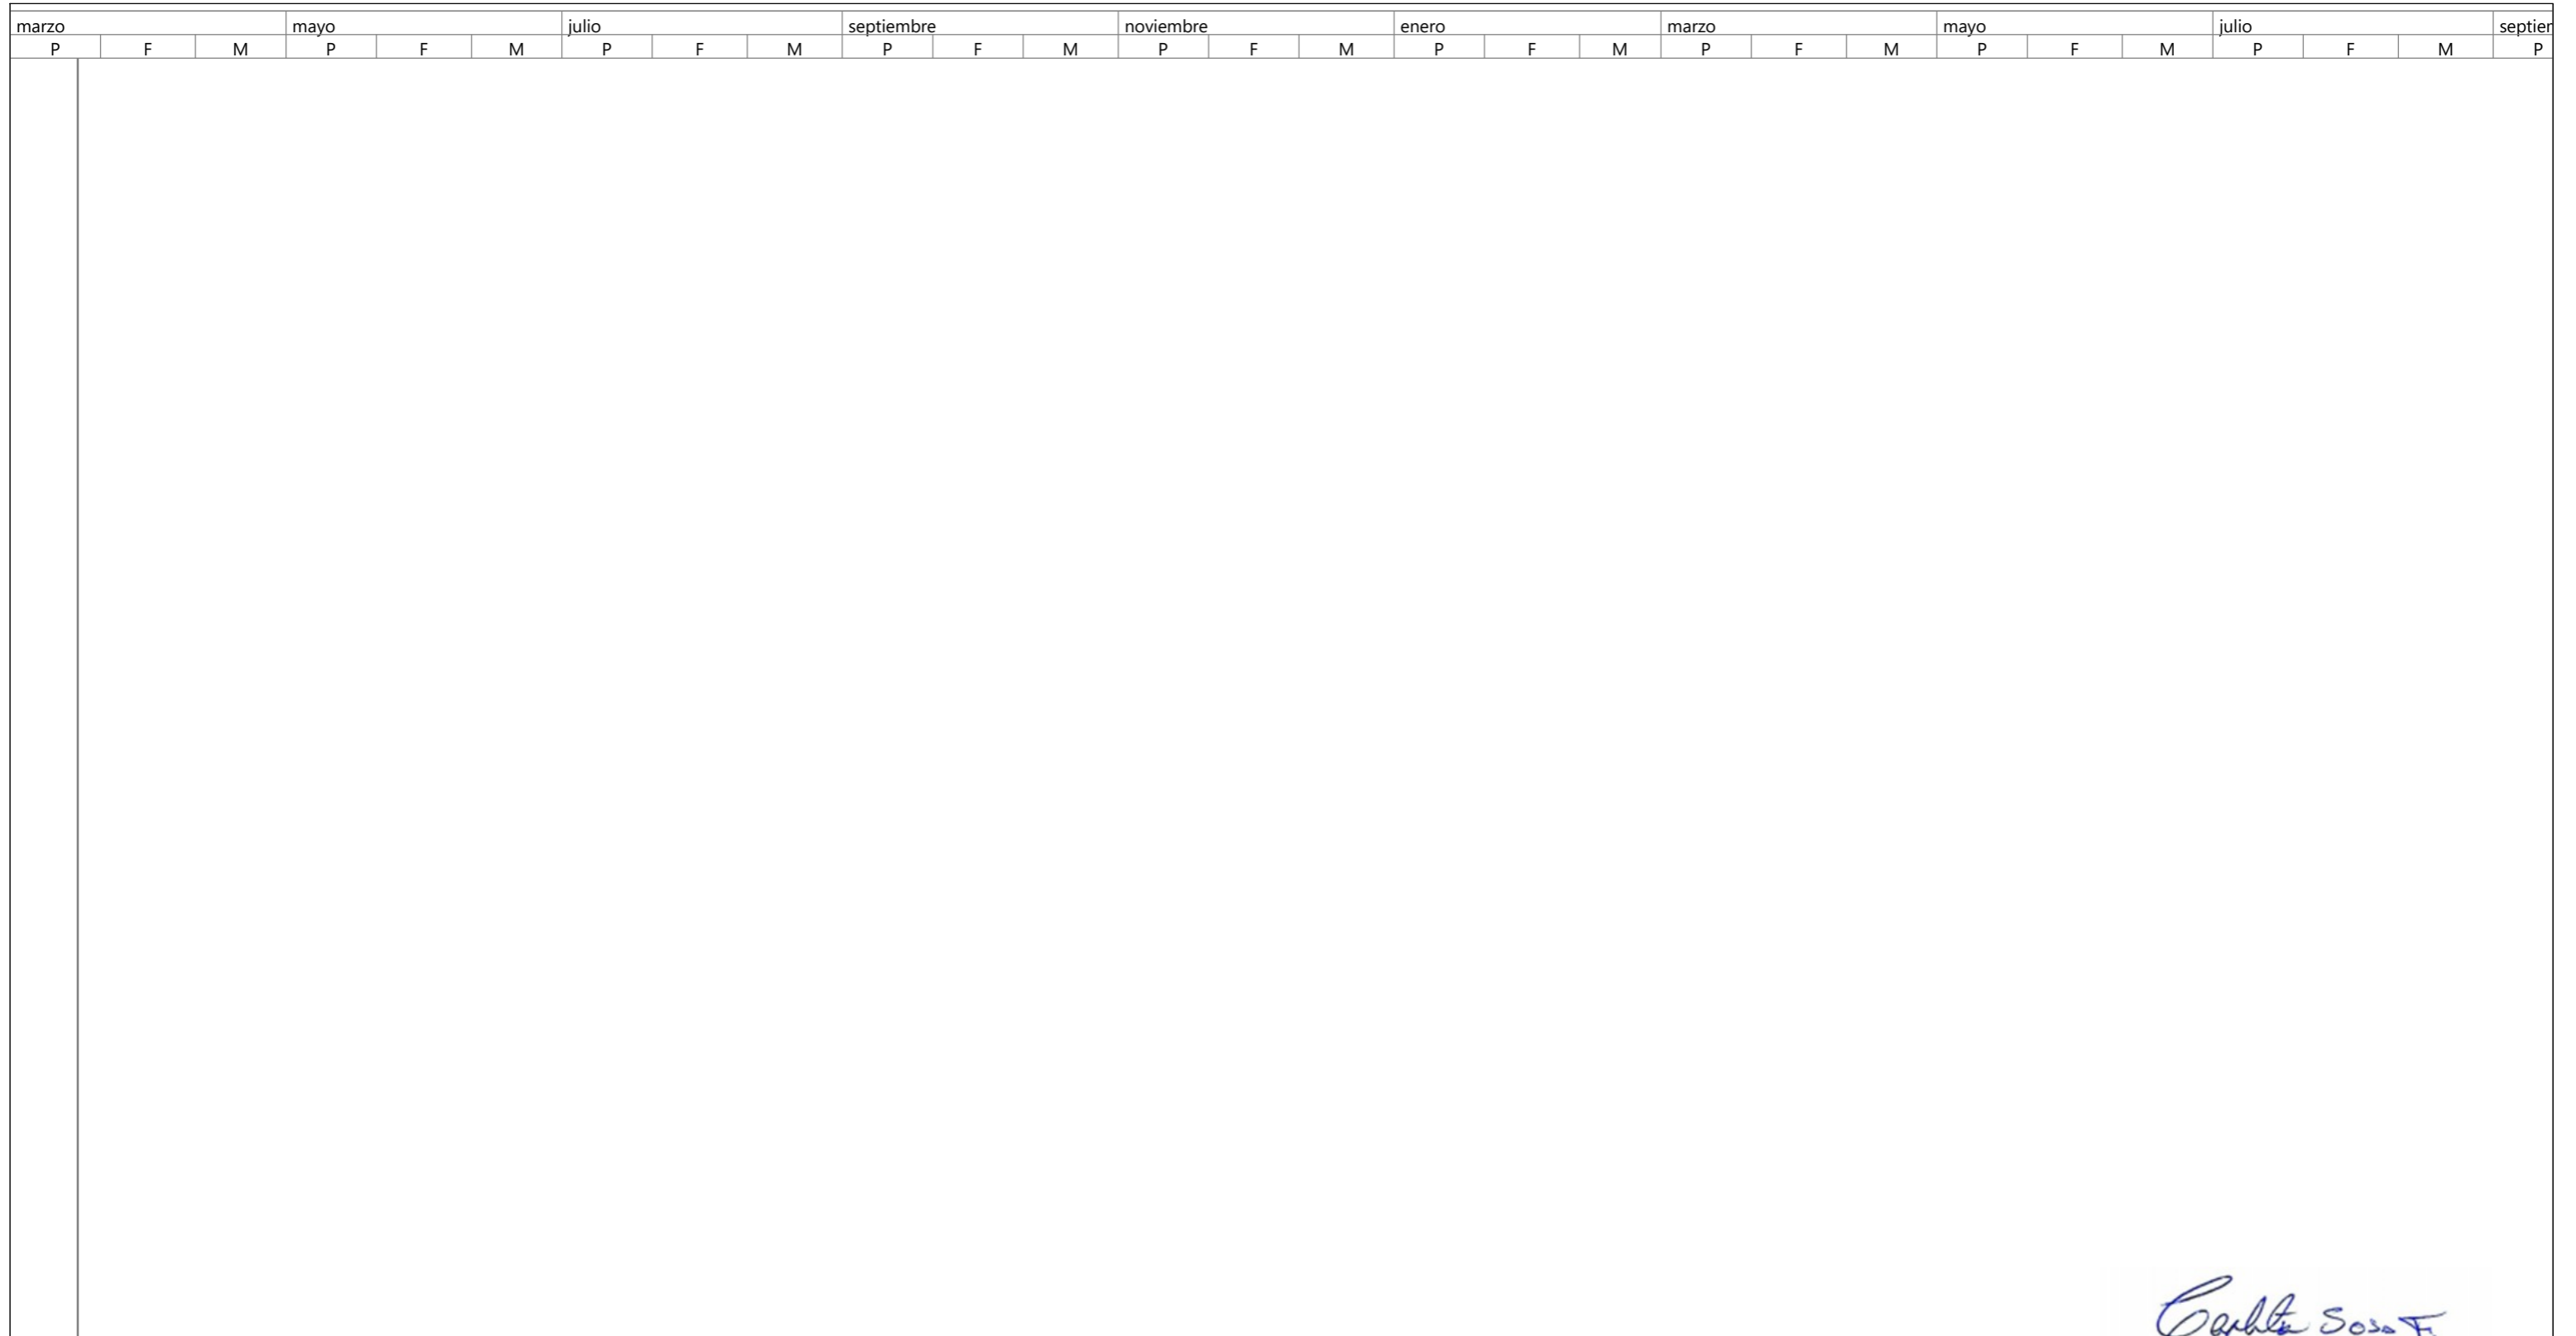


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

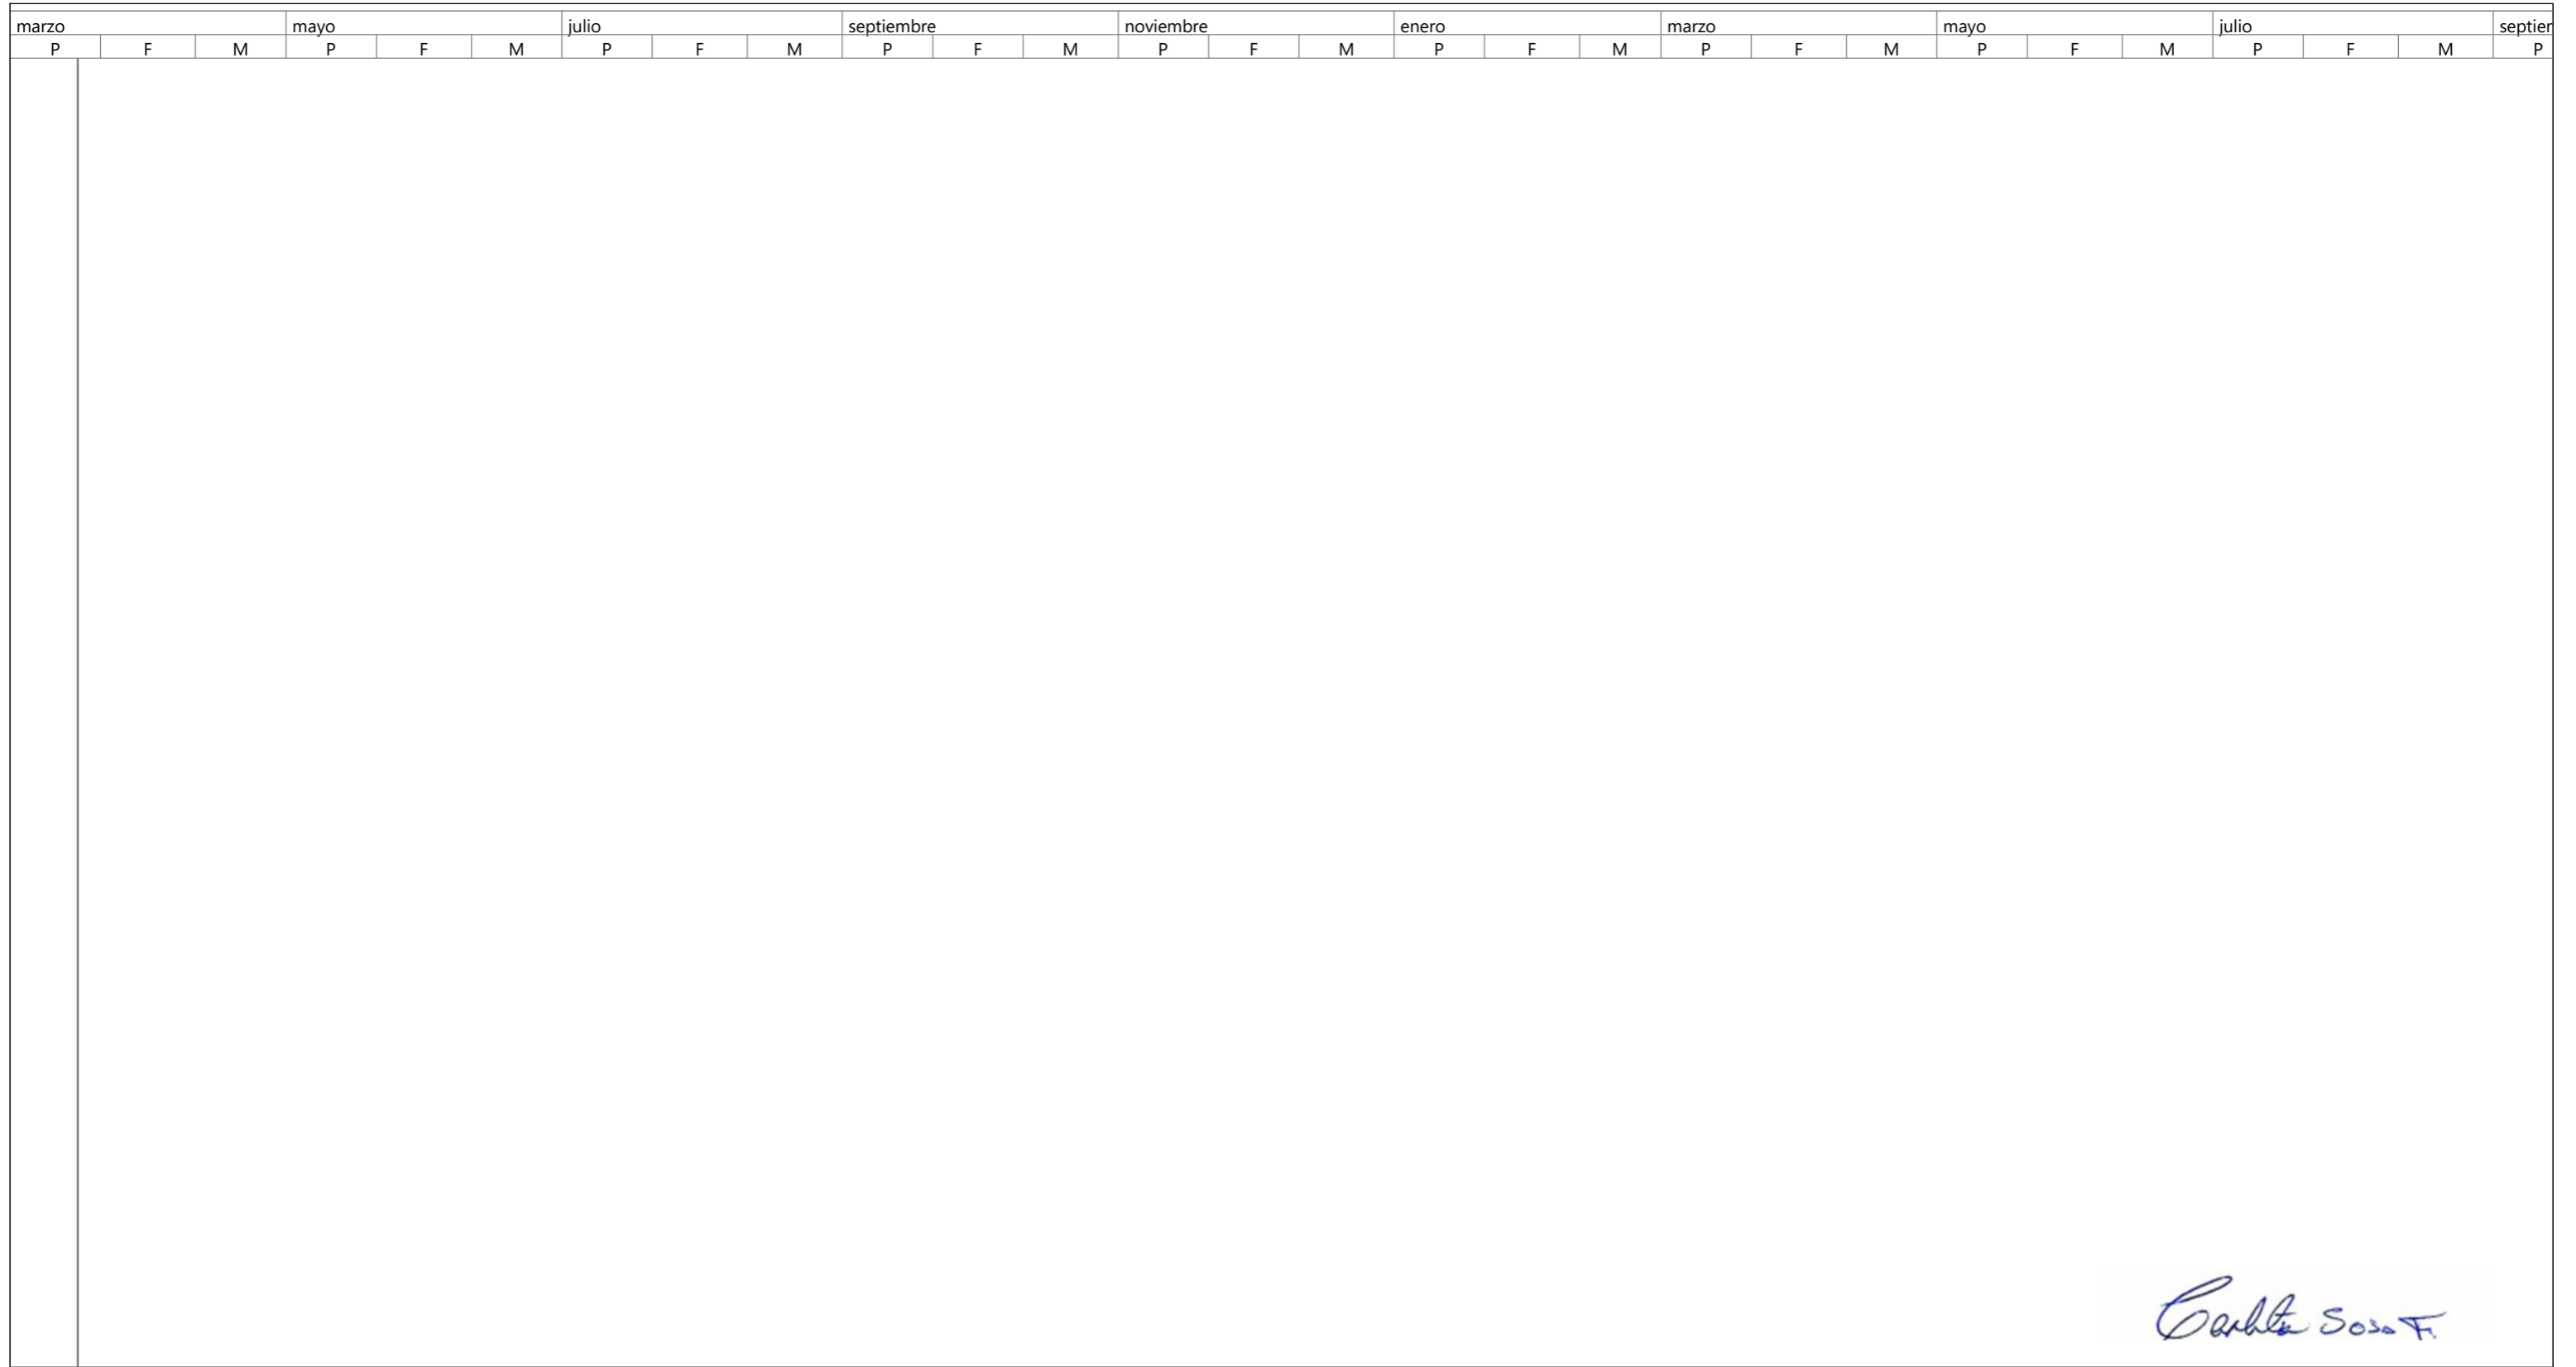


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

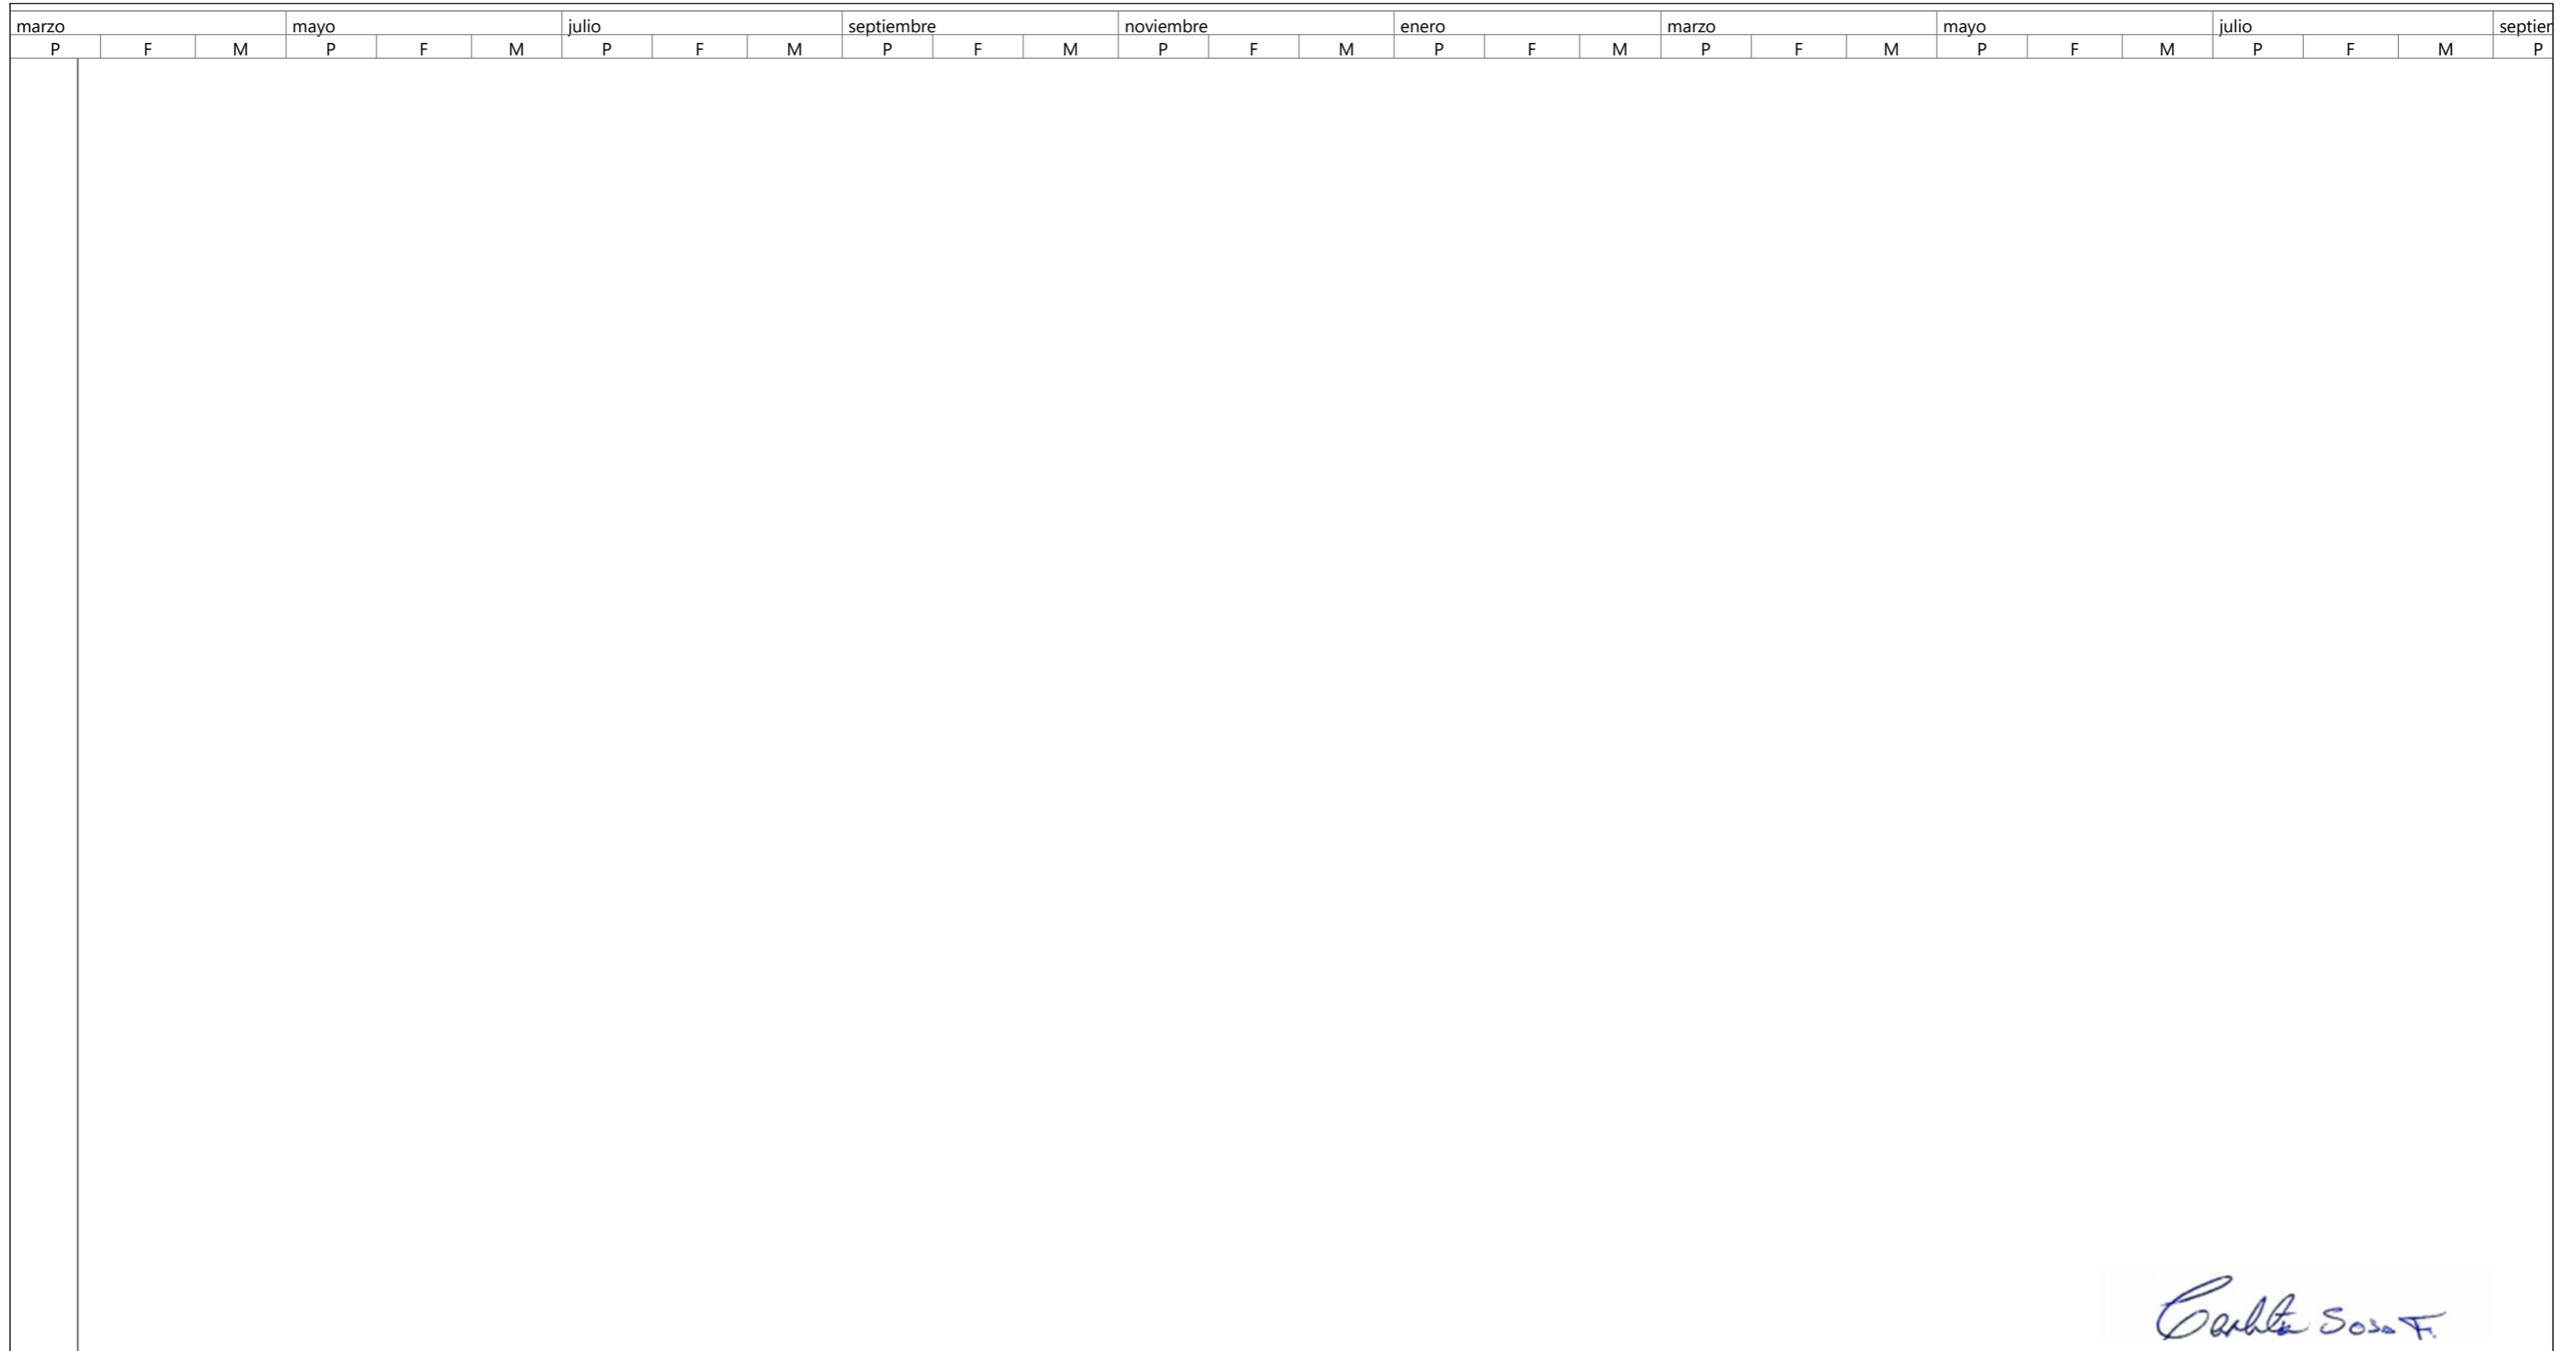


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

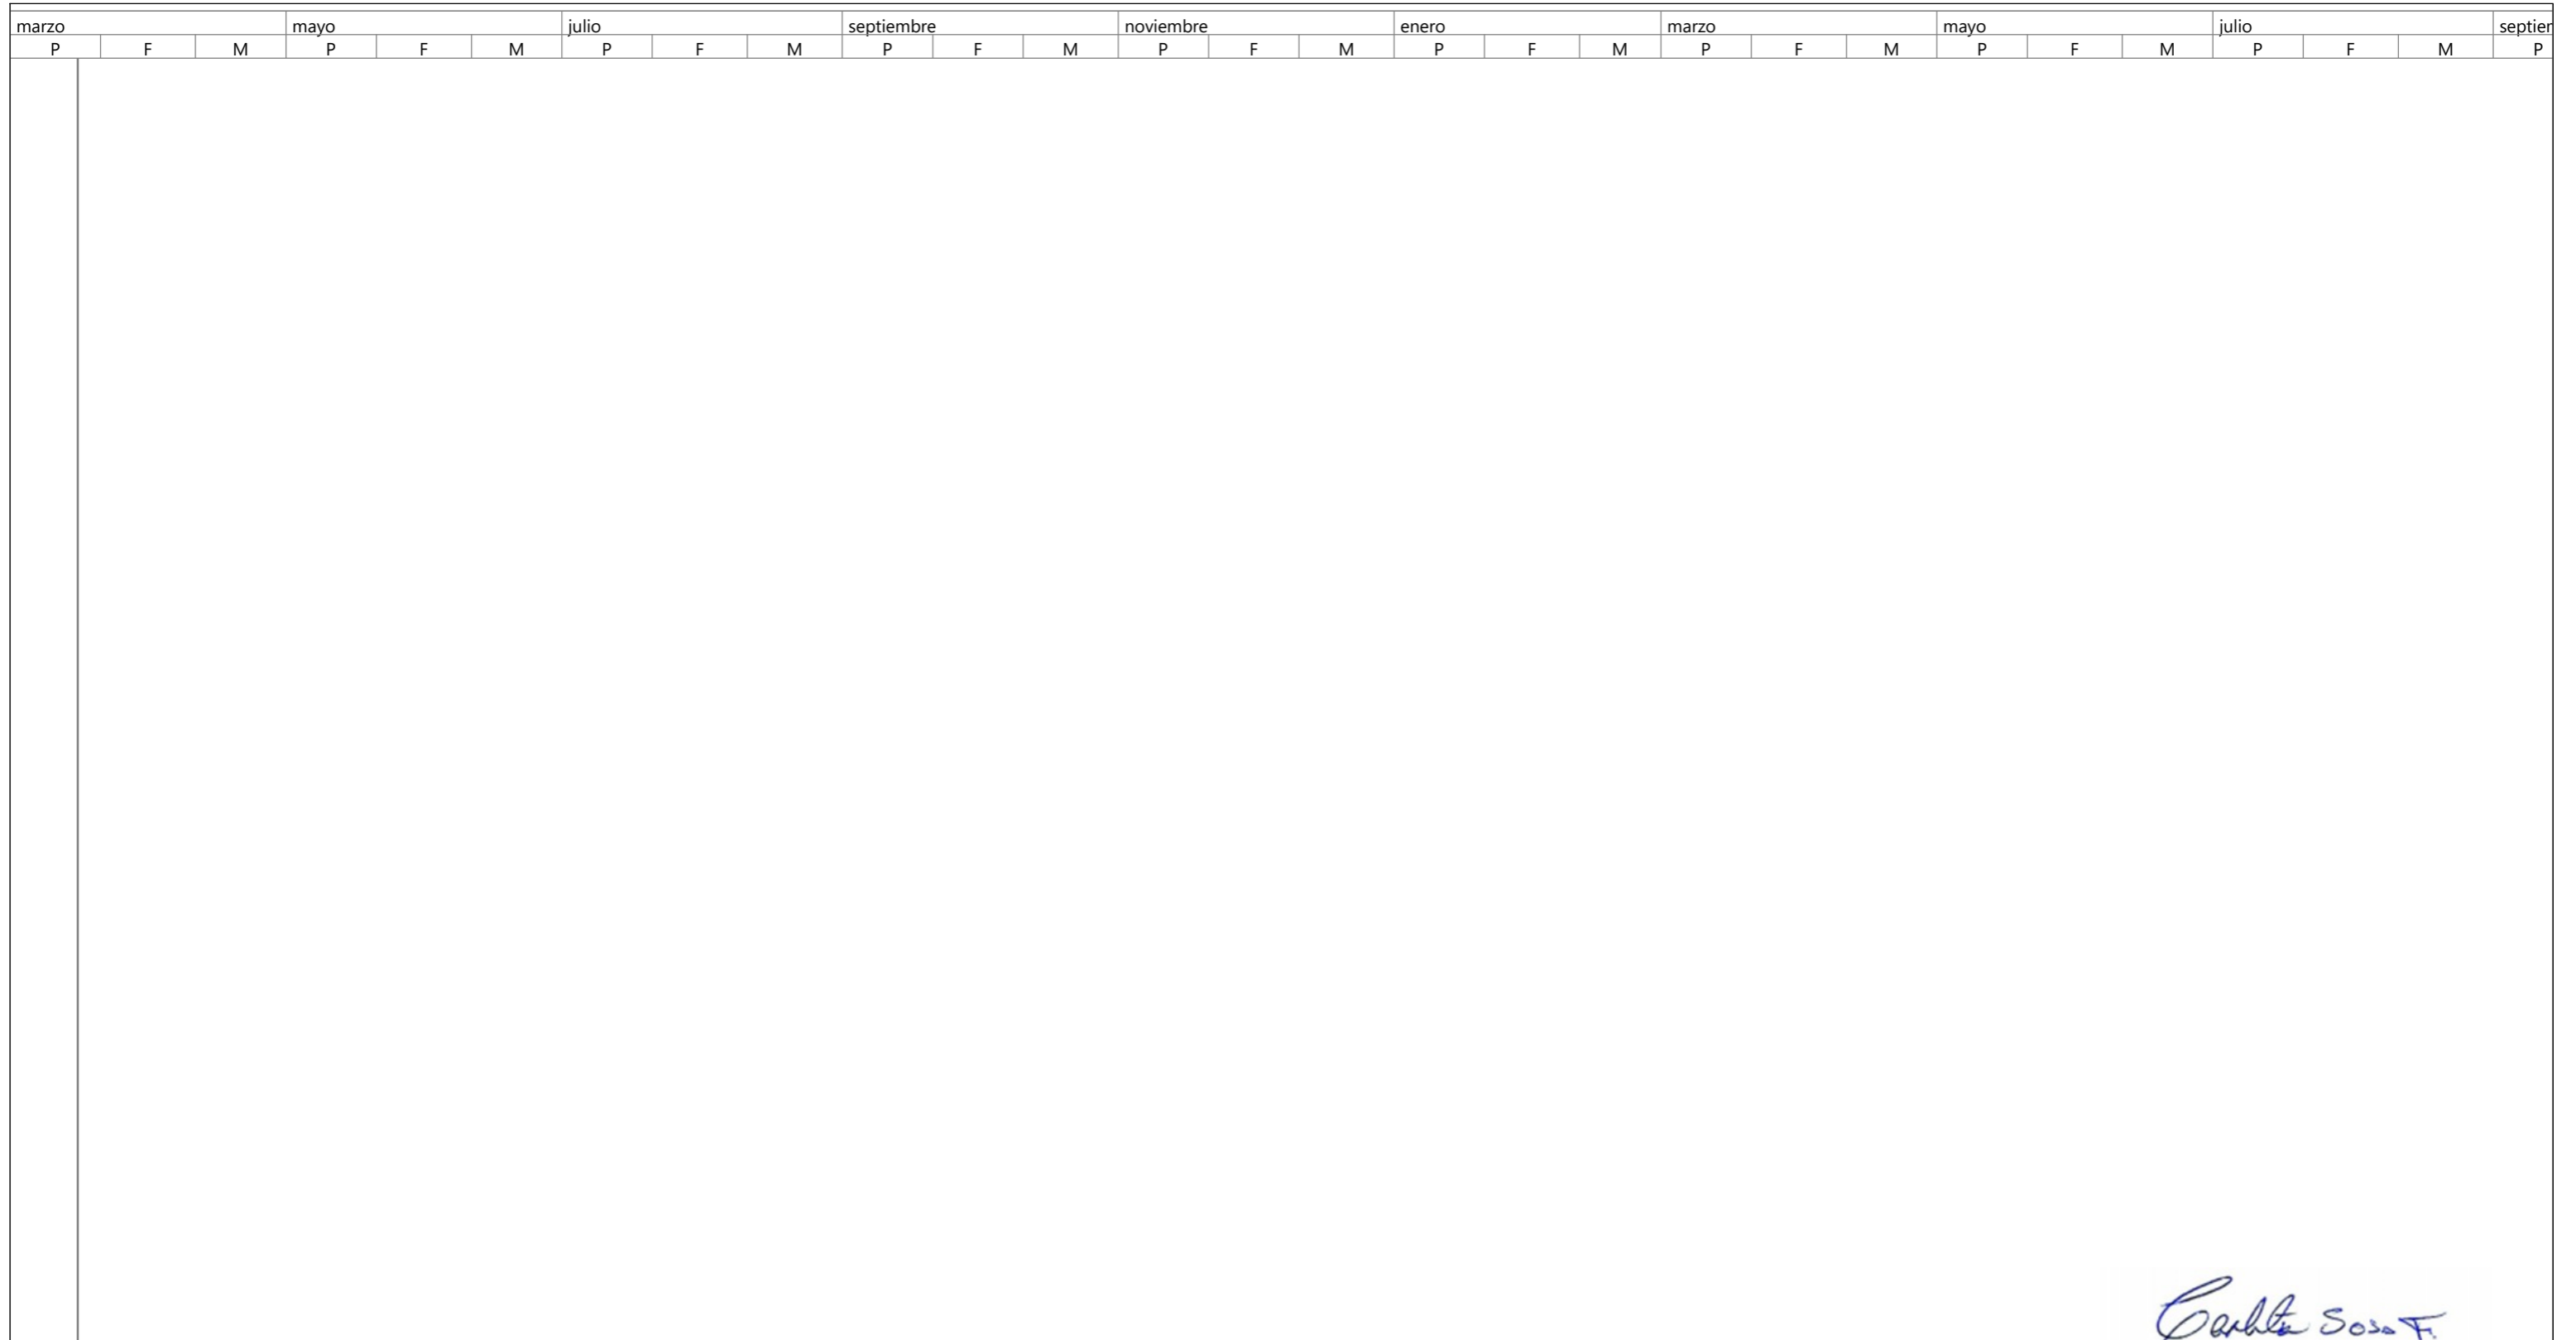


*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

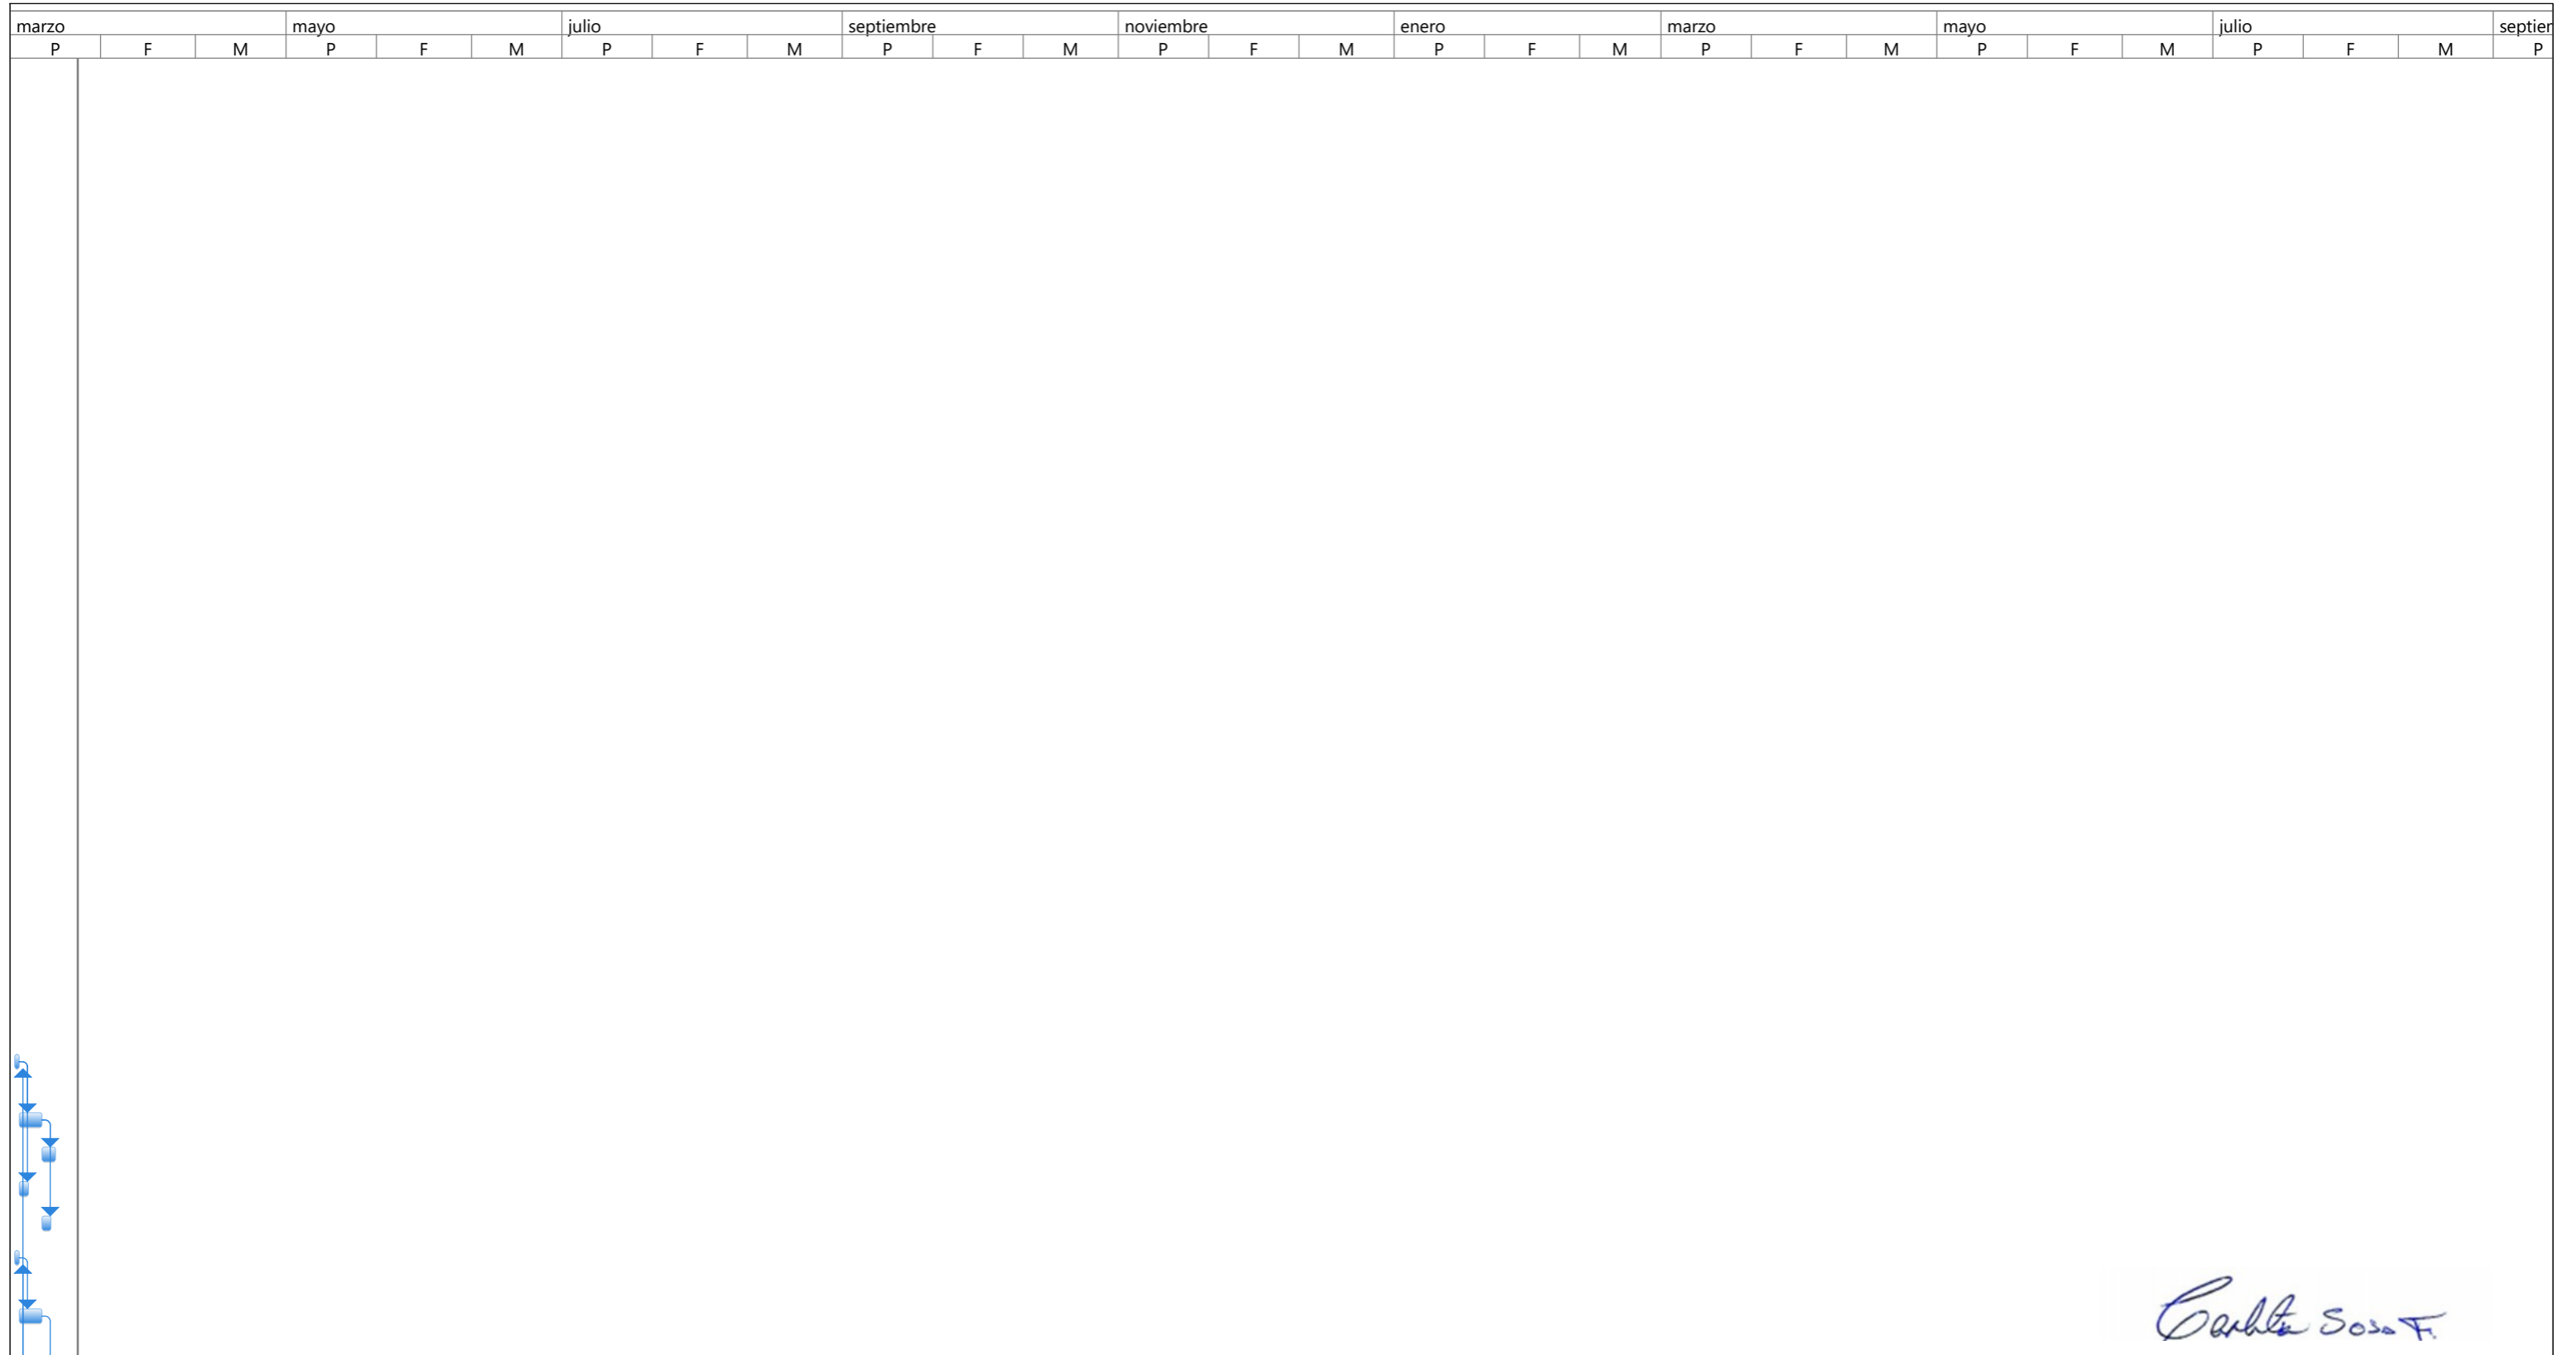

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

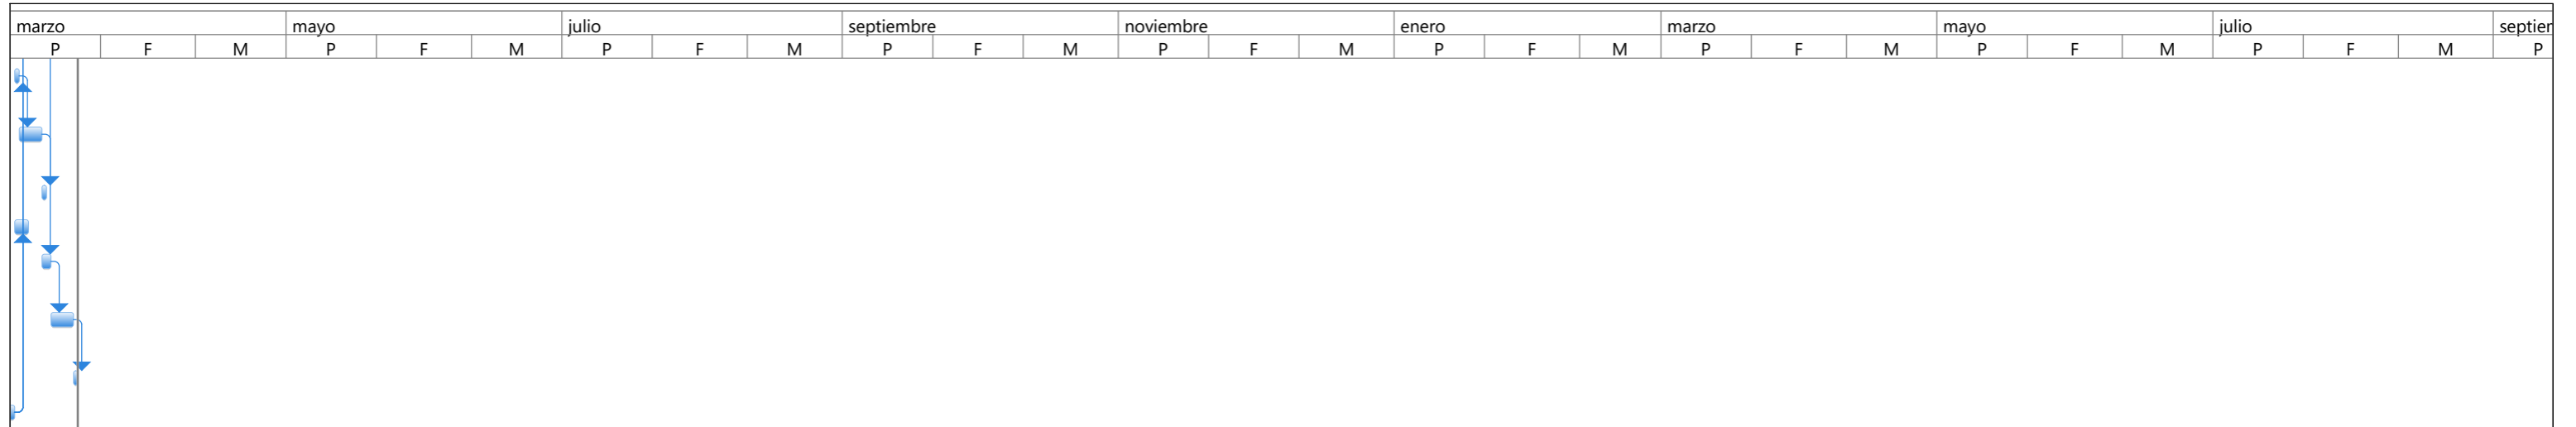

*Carla Sosa F.*

Project: Cronograma Contrato C Date: mié 1/12/21	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			
