





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart															
								dic	ene	feb	mar	tri 1, 2024	abr	may	jun	tri 2, 2024	jul	ago	sep	tri 3, 2024	oct	nov	dic
1			ACUEDUCTO	\$25,459,301.59	288 días	jue 11/1/24	vie 10/1/25																
2			REDES DE DISTRIBUCIÓN	\$24,841,199.91	267 días	jue 11/1/24	jue 12/12/24																
3			REPLANTEO	\$466,869.55	258 días	jue 11/1/24	vie 29/11/24																
4			CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=323.74 M	\$105,141.69	253 días	jue 11/1/24	vie 22/11/24																
5			Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado	\$75,149.17	199 días	jue 11/1/24	lun 9/9/24																
6			Extracción carpeta asfáltica 2"	\$17,194.52	208 días	mar 16/1/24	jue 26/9/24																
7			Bote de material con camión 0=15 km, (incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero)	\$12,798.00	198 días	mar 26/3/24	jue 5/12/24																
8			MOVIMIENTO DE TIERRA	\$11,094,759.68	241 días	jue 18/1/24	jue 14/11/24																
9			Excavación material compacto e/equipo	\$1,352,172.72	191 días	jue 18/1/24	jue 5/9/24																
10			Excavación en roca e/equipo, Inc. Extracción de material	\$3,555,789.44	183 días	lun 4/3/24	vie 18/10/24																
11			Asiento de arena suministro y colocacion	\$1,184,728.37	223 días	jue 18/1/24	lun 21/10/24																
12			Suministro de material de mina para relleno (caliche) 0=20 KM	\$2,532,690.36	223 días	mar 23/1/24	vie 25/10/24																
13			Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	\$1,549,921.65	179 días	mar 2/4/24	lun 18/11/24																
14			Bote de material con camión 0=15 km, (incluye carguio y esparcimiento en lugar de botadero)	\$919,457.14	177.88 días	sáb 20/4/24	dom 8/12/24																
15			SUMINISTRO DE TUBERÍAS:	\$7,747,748.55	228 días	jue 25/1/24	mar 5/11/24																
16			06" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por campana	\$2,052,870.84	185 días	mar 23/1/24	mar 3/9/24																
17			04" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana	\$2,150,110.15	179 días	lun 4/3/24	lun 14/10/24																
18			03" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por campana	\$3,544,767.56	173 días	dom 14/4/24	vie 22/11/24																
19			COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:	\$683,182.55	233 días	lun 29/1/24	vie 15/11/24																
20			06" PVC (SDR-26) C/J.G.	\$107,783.80	184 días	lun 29/1/24	lun 9/9/24																
21			04" PVC (SDR-26) C/J.G.	\$185,227.03	179 días	dom 10/3/24	lun 21/10/24																
22			03" PVC (SDR-26) C/J.G.	\$390,171.72	172 días	sáb 20/4/24	vie 29/11/24																
23			PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:	\$785,984.54	142 días	vie 31/5/24	vie 6/12/24																
24			06" PVC (SOR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	\$57,833.15	139 días	vie 31/5/24	mar 3/12/24																
25			04" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	\$122,684.79	141 días	dom 2/6/24	vie 6/12/24																

Proyecto: Proyecto Moreta_Mo Fecha: vie 16/2/24	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
73			Campamento, (Induye: Alquiler de casa con o sin solar, baños portatil y caseta para materiales)	\$539,309.25	287.88 días	vie 12/1/24	sáb 11/1/25															


Proyecto: Proyecto Moreta_Mo Fecha: vie 16/2/24	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		solo duración		Hito externo			
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			



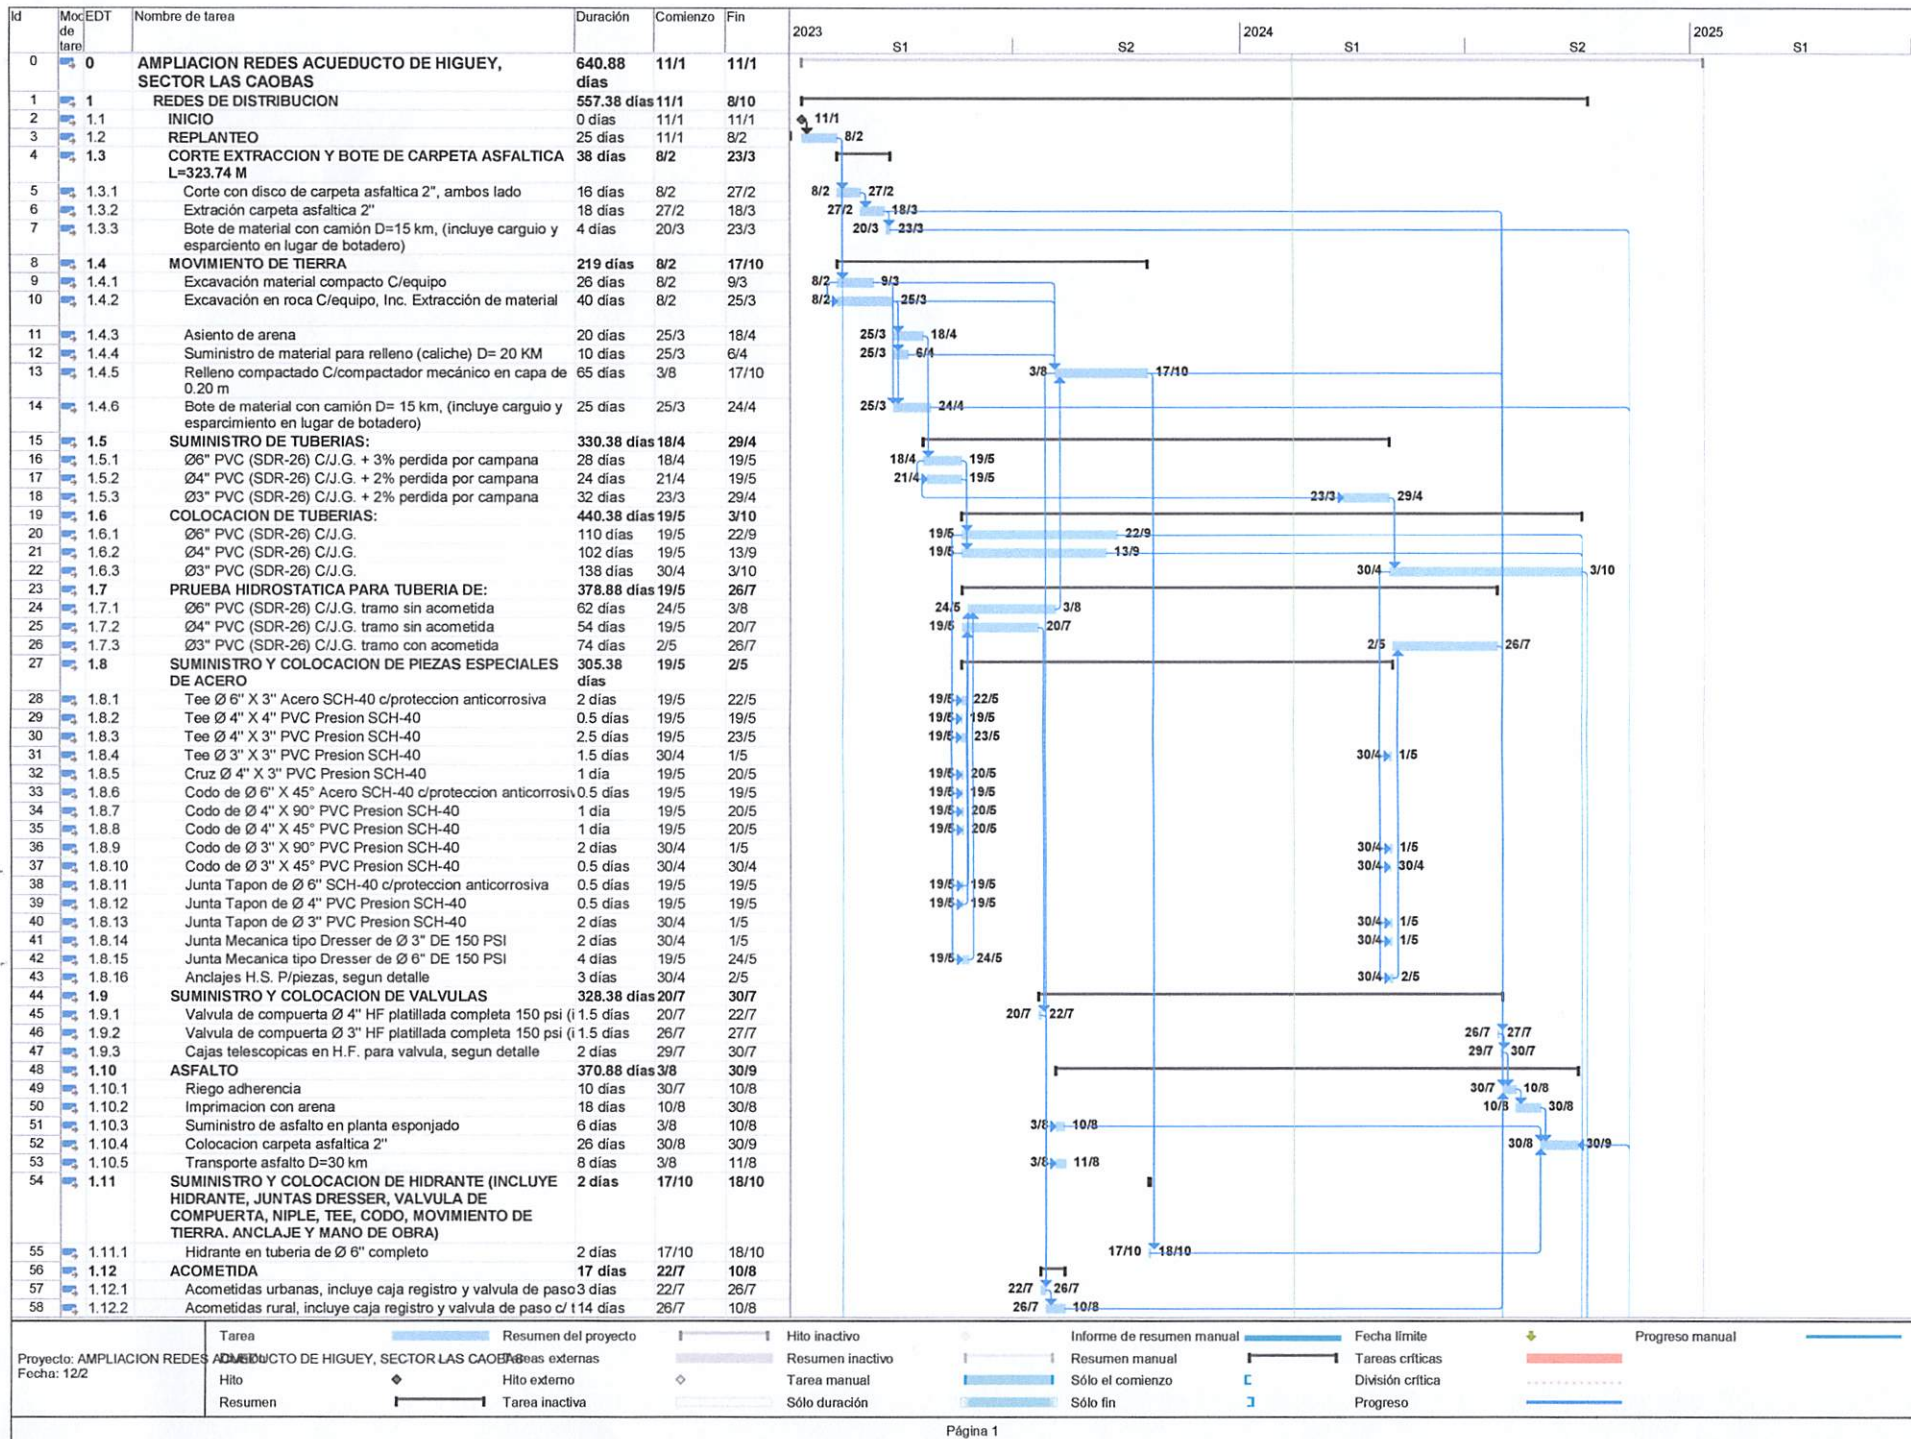

F. A. L. S.

Id	Módulo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2023	2024	2025
59	1.13	REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	26 días	8/2	9/3			
60	1.13.1	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS	26 días	8/2	9/3			
61	1.13.1.	DEMOLICION :	5.5 días	8/2	14/2			
62	1.13.1.	De contenes y aceras	4 días	8/2	13/2			
63	1.13.1.	Bote de material con camion D=15 km, (incluye carguio	1.5 días	13/2	14/2			
64	1.13.1.	REPOSICION DE:	22 días	13/2	9/3			
65	1.13.1.	Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cr	17 días	18/2	9/3			
66	1.13.1.	Contenes	10 días	13/2	23/2			
67	1.14	EMPALME A TUBERIA EXISTENTE	532.38 días	8/2	8/10			
68	1.14.1	Empalme, Inc. Movimiento de tierra, equipos y herramientas	4 días	3/10	8/10			
69	1.14.2	Señalización, control, manejo de transito y seguridad en la	270 días	8/2	13/12			
70	1.14.3	Limpieza continua y final (obreros, camion y herramientas	270 días	8/2	13/12			
71	2	VARIOS	565.25 días	8/2	14/11			
72	2.1	Valla anunciadora obra 16' x 8' impresion full color conteniend	1 día	8/2	9/2			
73	2.2	Campamento, (incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños	270 días	8/2	13/12			
74	2.3	FIN	0 días	14/11	14/11			
75								
76								
77								
78	A	REDES DE DISTRIBUCIÓN	343.88 días	17/12	11/1			
79								
80	3	MOVIMIENTO DE TIERRA	305.25 días	18/12	29/11			
81	3.1	Excavación material compacto C/equipo	130 días	18/12	14/5			
82	3.1	Excavación material compacto C/equipo	130 días	18/12	14/5			
83	3.5	Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m	11.75 días	21/10	2/11			
84	3.5	Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m	11.75 días	4/11	15/11			
85	3.5	Relleno compactado C/compactador mecánico en capa de 0.20 m	11.75 días	16/11	29/11			
86								
87	5	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:	140 días	14/5	21/10			
88	5.1	Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.	140 días	14/5	21/10			
89	5.1	Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.	140 días	14/5	21/10			
90	5.2	Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	24 días	14/5	10/6			
91	5.2	Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	24 días	14/5	10/6			
92	5.4	Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	74 días	14/5	6/8			
93	5.4	Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	74 días	14/5	6/8			
94	5.4	Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	74 días	14/5	6/8			
95								
96	6	PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:	62 días	21/10	31/12			
97	6.1	Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	62 días	21/10	31/12			
98	6.1	Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	62 días	21/10	31/12			
99	6.2	Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	54 días	21/10	20/12			
100								
101								
102	7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO	5 días	31/12	6/1			
103	7.1	Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	5 días	31/12	6/1			
104	7.1	Tee Ø 6" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	5 días	31/12	6/1			
105	7.5	Cruz Ø 4" X 3" PVC Presión SCH-40	1 día	31/12	31/12			
106	7.15	Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" DE 150 PSI	4 días	31/12	3/1			
107	7.15	Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" DE 150 PSI	4 días	31/12	3/1			
108	7.15	Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" DE 150 PSI	4 días	31/12	3/1			
109								
110	10.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULA DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ANCLAJE Y MANO DE OBRA)	6 días	6/1	11/1			
111	10.1	Hidrante en tubería de ø 6" completo	6 días	6/1	11/1			

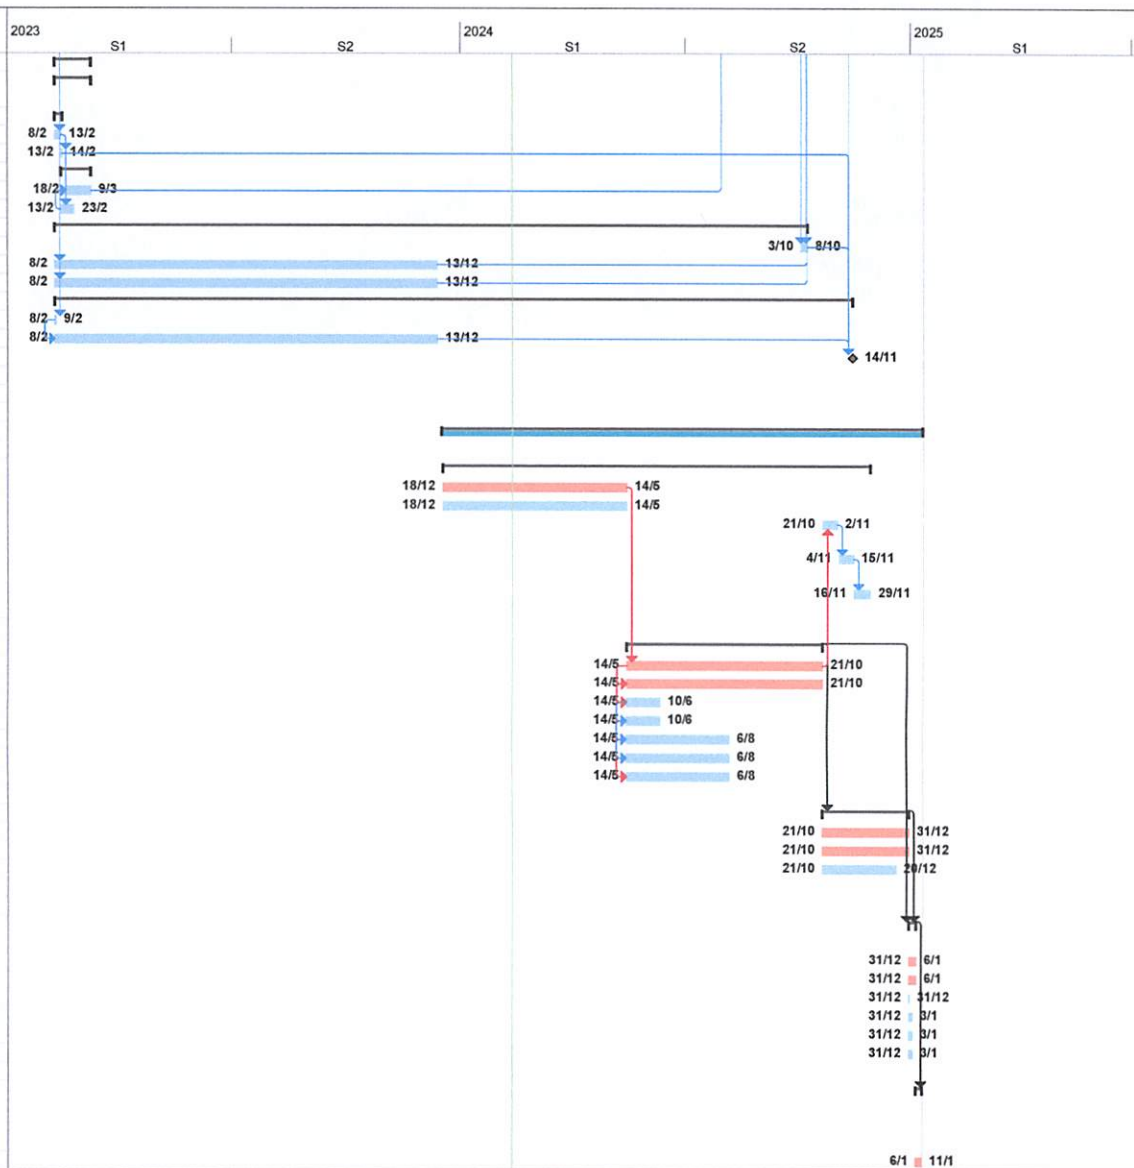

Fernando Jara

Proyecto: AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS	Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	Progreso manual
Fecha: 12/2	Hito	Resumen inactivo	Hito externo	Resumen manual	Tareas críticas	División crítica
	Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	Progreso	

F.A.L.S.
