

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022		
							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
0		AC. SABANA DE LA MAR, Sector La Aviacion, Prov. Hato Mayor	609 días	vie 14/1/22	mié 15/5/24										
1		REPLANTEO	7 días	vie 14/1/22	lun 24/1/22										
2		Replanteo	7 días	vie 14/1/22	lun 24/1/22										
3		CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO	109 días	mar 25/1/22	vie 24/6/22										
4		Corte de Asfalto	52 días	mar 25/1/22	mié 6/4/22										
5		Rotura y Extraccion de Asfalto	33 días	jue 7/4/22	lun 23/5/22										
6		Bote de Materiales Con Camion	24 días	mar 24/5/22	vie 24/6/22										
7		MOVIMIENTO DE TIERRA	339 días	lun 27/6/22	jue 12/10/23										
8		Excavacion en Roca	61 días	lun 27/6/22	lun 19/9/22										
9		Excavacion Material compactado	59 días	mar 20/9/22	vie 9/12/22										

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

[Handwritten signature]

ERF

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin									
							dic	tri 1, 2022 ene	feb	mar	tri 2, 2022 abr	may	jun	tri 3, 2022 jul	ago
10			Suministro material de mina	51 días	lun 12/12/22	jue 17/8/23									
11			Relleno compactado con compactador	23 días	vie 18/8/23	mar 19/9/23									
12			Suministro y colocacion asiento de arena	17 días	mié 20/9/23	jue 12/10/23									
13			Bote de material con	15 días	vie 18/8/23	jue 7/9/23									
14			SUMINISTRO DE TUBERIA	45 días	vie 13/10/23	jue 14/12/23									
15			De 6 PVCSDR-26	15 días	vie 13/10/23	jue 2/11/23									
16			De 4 PVC SDR-26	15 días	vie 3/11/23	jue 23/11/23									
17			De 3 PVC SDR-26	15 días	vie 24/11/23	jue 14/12/23									
18			COLOCACION DE TUBERIA	25 días	vie 15/12/23	jue 18/1/24									
19			De 6 PVC SDR-26	10 días	vie 15/12/23	jue 28/12/23									


Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			







Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2022												tri 2, 2022				tri 3, 2022		
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep									
20		De 4 PVC SDR-26	8 días	vie 29/12/23	mar 9/1/24																			
21		De 3 PVCSDR-26	7 días	mié 10/1/24	jue 18/1/24																			
22		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	84 días	vie 19/1/24	mié 15/5/24																			
23		Tee de 3 x 3 PVC	9 días	vie 19/1/24	mié 31/1/24																			
24		Tee de 4 x 4 PVC	9 días	jue 1/2/24	mar 13/2/24																			
25		Tee de 6 x 3 PVC	6 días	mié 14/2/24	mié 21/2/24																			
26		Tee 6 x 4 PVC	6 días	jue 22/2/24	jue 29/2/24																			
27		Tee 6 x 6 PVC	4 días	vie 1/3/24	mié 6/3/24																			
28		Tee 8 x 6 PVC	4 días	jue 7/3/24	mar 12/3/24																			
29		Codo de 3 x 45 PVC	14 días	mié 13/3/24	lun 18/3/24																			
30		Codo de 4 x 45 PVC	2 días	mar 19/3/24	mié 20/3/24																			
31		Codo 4 x 30 PVC	2 días	jue 21/3/24	vie 22/3/24																			
32		Codo 6 x 20 PVC	2 días	lun 25/3/24	mar 26/3/24																			
33		Cruz de 3 x 3 PVC	8 días	mié 27/3/24	vie 5/4/24																			

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			







Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2022				tri 2, 2022			tri 3, 2022		
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
34			Reduccion 4@3 6 días PVC		lun 8/4/24	lun 15/4/24										
35			Junta Mecanica 3 días Tipo Dresser 3		mar 16/4/24	jue 18/4/24										
36			Junta Mecanica 3 días Tipo Dresser 4		vie 19/4/24	mar 23/4/24										
37			Junta Mecanica 8 días Tipo Dresser 6		mié 24/4/24	vie 3/5/24										
38			Junta Mecanica 2 días Tipo Dresser 8		lun 6/5/24	mar 7/5/24										
39			Junta Tapon de 3 PVC 1 día		mié 8/5/24	mié 8/5/24										
40			tapon de 4 PVC 1 día		jue 9/5/24	jue 9/5/24										
41			Tapon de 6 Acero 1 día		vie 10/5/24	vie 10/5/24										
42			Anclaje 3 días		lun 13/5/24	mié 15/5/24										
43			SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 5 días		lun 6/5/24	vie 10/5/24										
44			Valvula de Compuerta 4HF.	2 días	lun 6/5/24	mar 7/5/24										
45			Valvula de Compuerta 6	2 días	mié 8/5/24	jue 9/5/24										
46			Caja Telescopica 1 día		vie 10/5/24	vie 10/5/24										

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022		
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
47			PRUEBA HIDROSTATICA	6 días	vie 3/2/23	vie 10/2/23									
48			Tuberia 3 PVC	2 días	vie 3/2/23	vie 19/1/24									
49			Tuberia 4 PVC	2 días	vie 19/1/24	lun 22/1/24									
50			Tuberia de 6 PV	2 días	vie 19/1/24	lun 22/1/24									
51			CRUCE DE ALCANTARILLA 6 ACERO	23 días	mar 30/1/24	jue 29/2/24									
52			Suministro de tuberia 6 Acero	6 días	jue 1/2/24	jue 8/2/24									
53			Codo 6 x 45 Acero	2 días	mar 30/1/24	jue 1/2/24									
54			Junta mecanica tipo Dresser 6	2 días	jue 1/2/24	vie 2/2/24									
55			Anclaje H.S.	4 días	lun 5/2/24	jue 8/2/24									
56			Excavacion material no clasificado	6 días	vie 9/2/24	vie 16/2/24									
57			Relleno compactado	4 días	lun 19/2/24	jue 22/2/24									
58			Bote de material	3 días	vie 23/2/24	mar 27/2/24									
59			Mano de obra plomero y soldador	2 días	mié 28/2/24	jue 29/2/24									

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022				
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
60			CRUCE DE ALCANTARILLA 4 ACERO	50 días	jue 28/7/22	mié 5/10/22											
61			Suministro de tubería 4	9 días	vie 1/3/24	mié 13/3/24											
62			Codo 4 x 45 Acero	4 días	vie 1/3/24	mié 6/3/24											
63			Junta mecanica tipo dresser	4 días	vie 1/3/24	mié 6/3/24											
64			Anclajes H.S.	7 días	vie 1/3/24	lun 11/3/24											
65			Excavacion material no	10 días	vie 1/3/24	jue 14/3/24											
66			Relleno compac	10 días	vie 1/3/24	jue 14/3/24											
67			Bote de materia	4 días	vie 1/3/24	mié 6/3/24											
68			Mano de obra plmero y	2 días	vie 1/3/24	lun 4/3/24											
69			CRUCE CAÑADA 4 ACERO	42 días	mié 24/8/22	jue 20/10/22											
70			Sunministro de tubería 4 acero	6 días	jue 6/10/22	jue 13/10/22											
71			Codo 4 x 45 ace	4 días	jue 6/10/22	mar 11/10/22											
72			Junta mecanica tipo Dresser 4	4 días	jue 6/10/22	mar 11/10/22											
73			Anclaje H.S.	7 días	jue 6/10/22	vie 14/10/22											

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022		
							ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
74		Relleno compactado a mano	10 días	jue 6/10/22	mié 19/10/22										
75		Bote de materia	6 días	jue 6/10/22	jue 13/10/22										
76		Alquiler de equi	3 días	jue 6/10/22	lun 10/10/22										
77		Mano de Obra	2 días	jue 6/10/22	vie 7/10/22										
78		ACOMETIDAS URBANAS	24 días	vie 15/12/23	mié 17/1/24										
79		Acometidas urbanas	24 días	vie 15/12/23	mié 17/1/24										
80		SEÑALIZACION	5 días	mar 25/1/22	lun 31/1/22										
81		Control, Manejo de	5 días	mar 25/1/22	lun 31/1/22										
82		PAVIMENTACION EN LA CALLE	85 días	lun 7/11/22	vie 3/3/23										
83		Extracion de material	10 días	jue 18/1/24	mié 31/1/24										
84		Bote de material	9 días	jue 18/1/24	mar 30/1/24										
85		Suministro material base	10 días	jue 18/1/24	mié 31/1/24										
86		Relleno compactado	15 días	jue 18/1/24	mié 7/2/24										
87		Riego adherente	7 días	jue 18/1/24	vie 26/1/24										
88		Imprimacion de arena	12 días	jue 18/1/24	vie 2/2/24										


Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2022				tri 2, 2022			tri 3, 2022			
							dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
89			Reposicion de asfalto	15 días	jue 18/1/24	mié 7/2/24											
90			Transporte asfa	7 días	jue 18/1/24	vie 26/1/24											
91			LIMPIEZA	2 días	lun 13/5/24	mar 14/5/24											
92			Continua y Final	2 días	lun 13/5/24	mar 14/5/24											
93			VARIOS	2 días	mar 25/1/22	mié 26/1/22											
94			Valla anunciando	2 días	mar 25/1/22	mié 26/1/22											
95			CAMPAMENTO	2 días	mar 25/1/22	mié 26/1/22											
96			Alquiler de casa, baños portatil y caseta para	2 días	mar 25/1/22	mié 26/1/22											

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

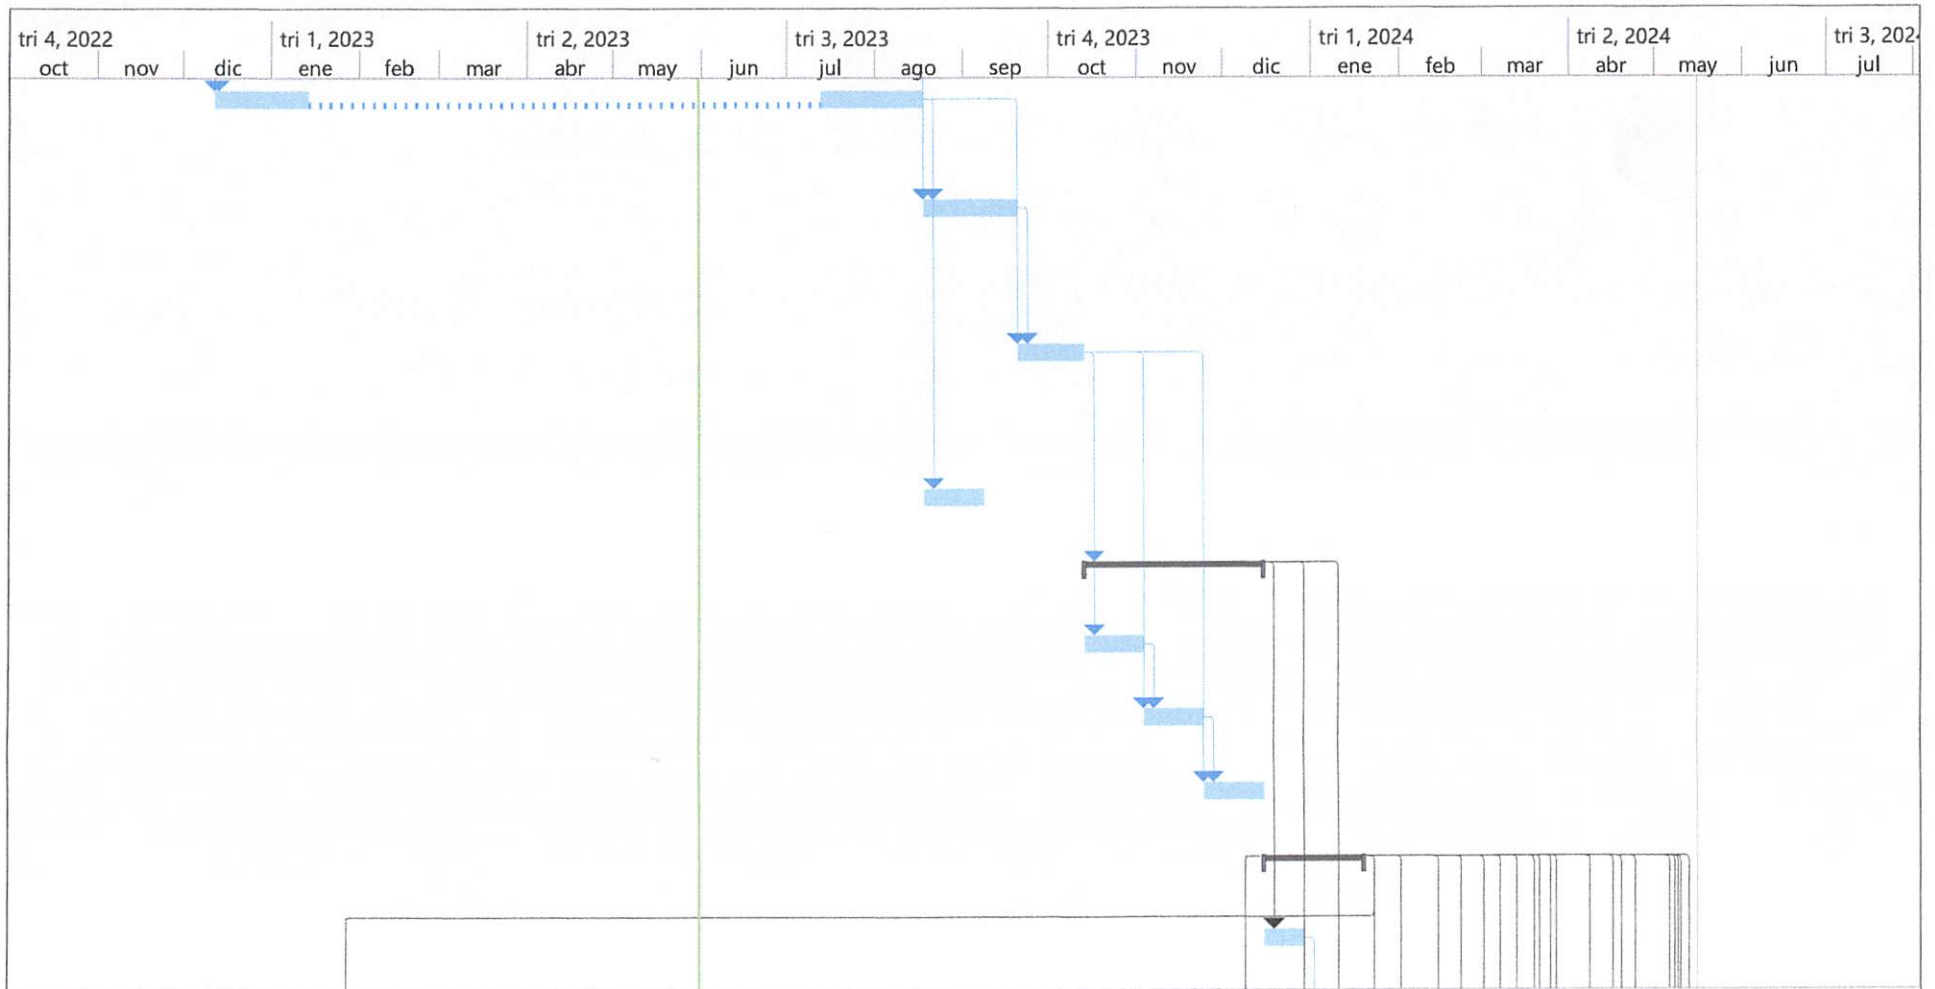



Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

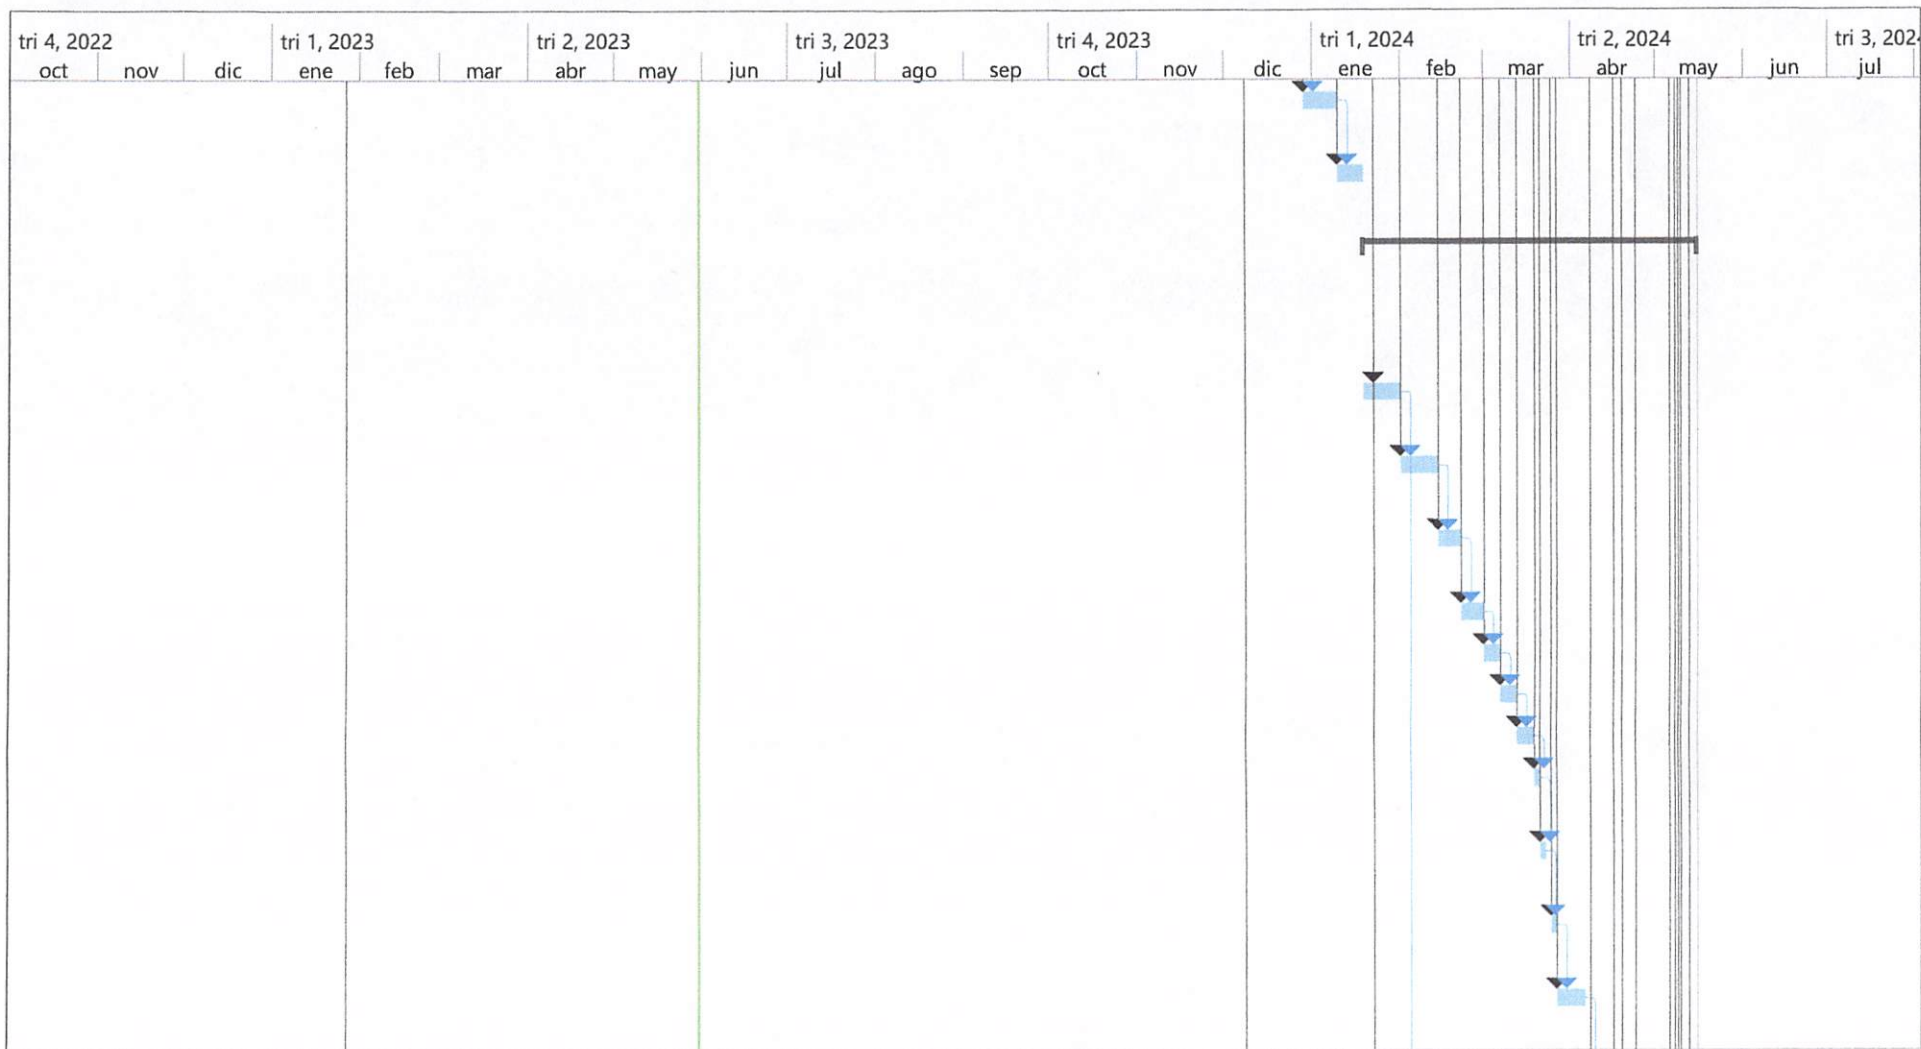


Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

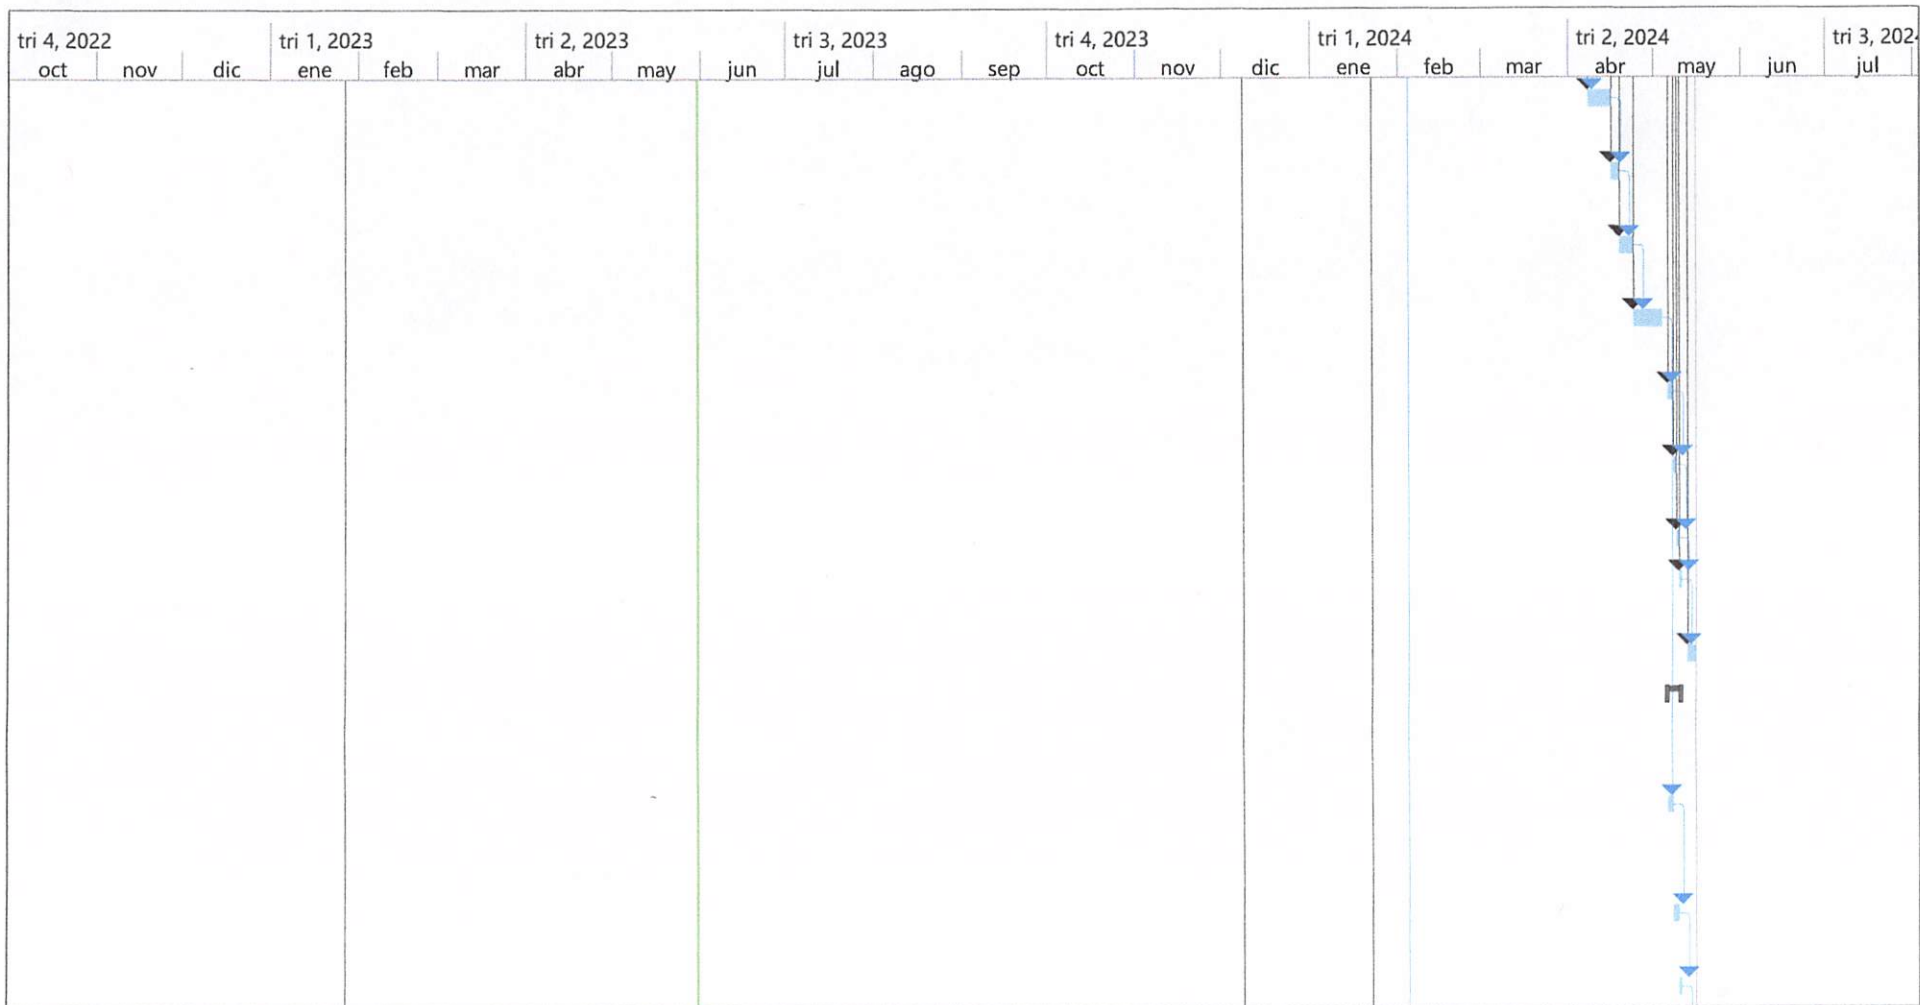

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

[Handwritten signature]


ERF

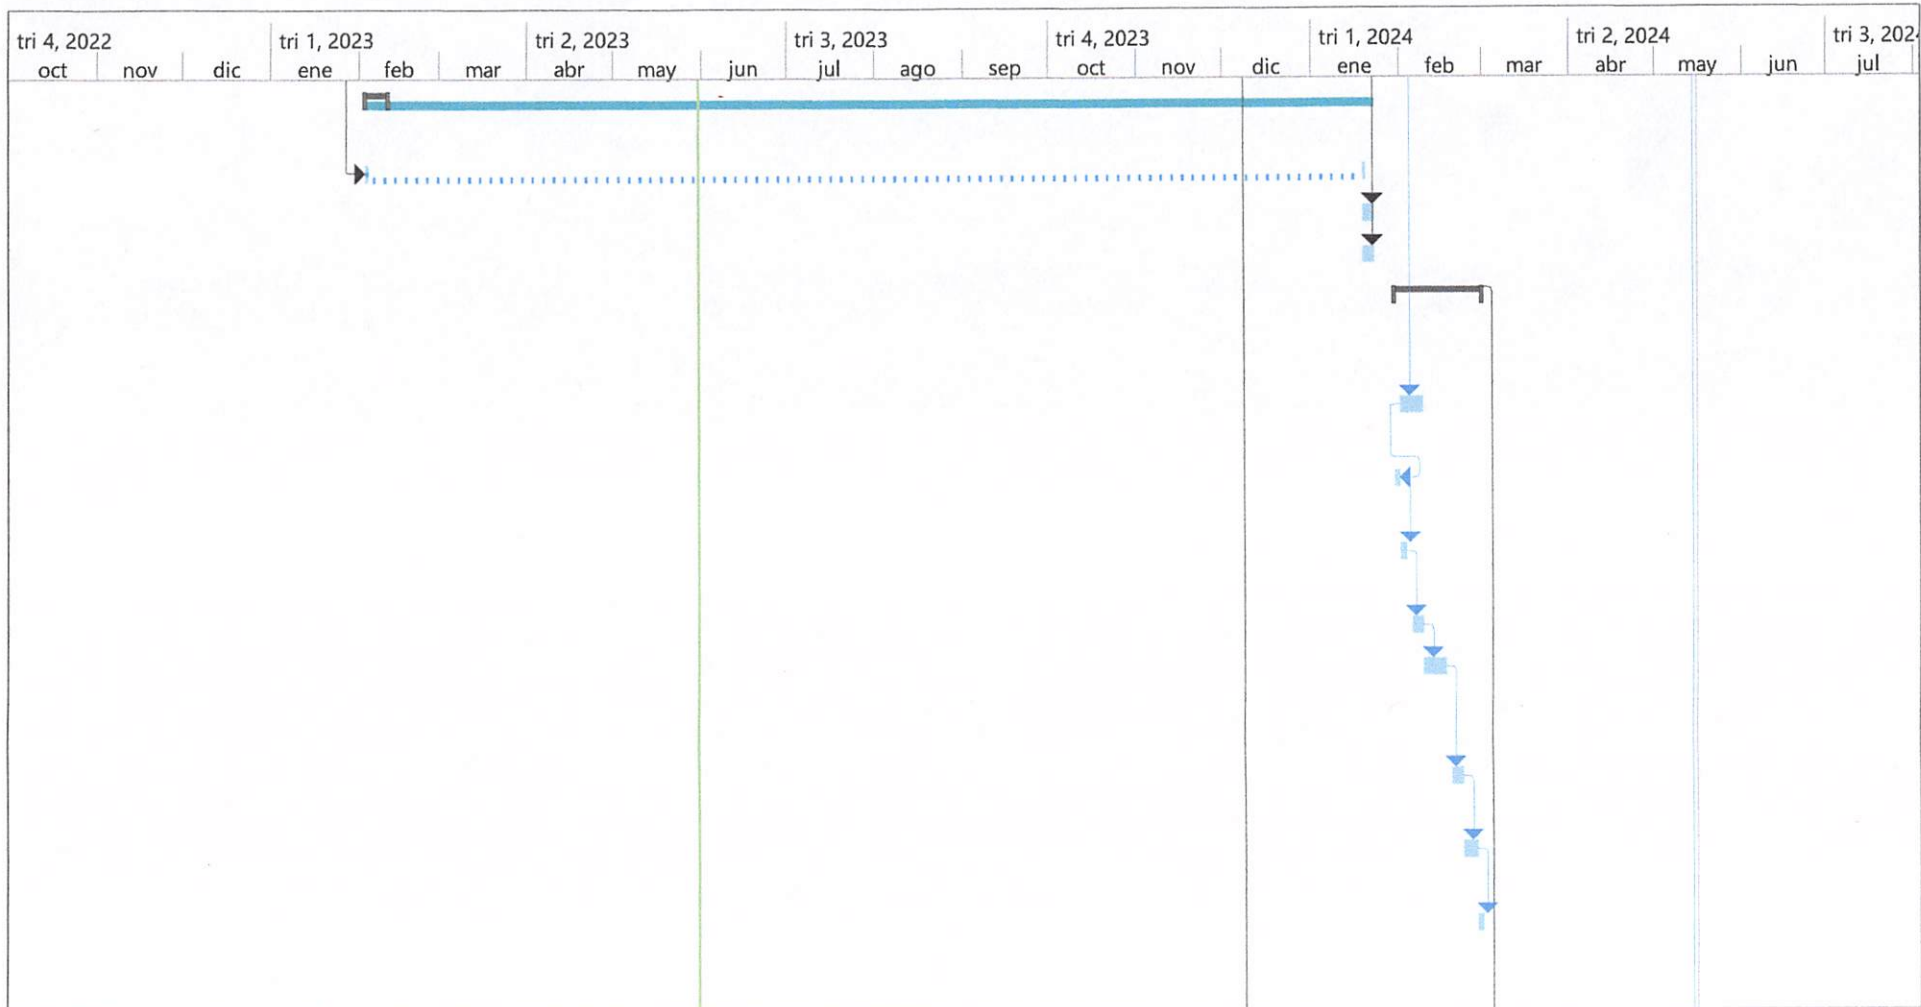

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
Fecha: mié 31/5/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


ERF

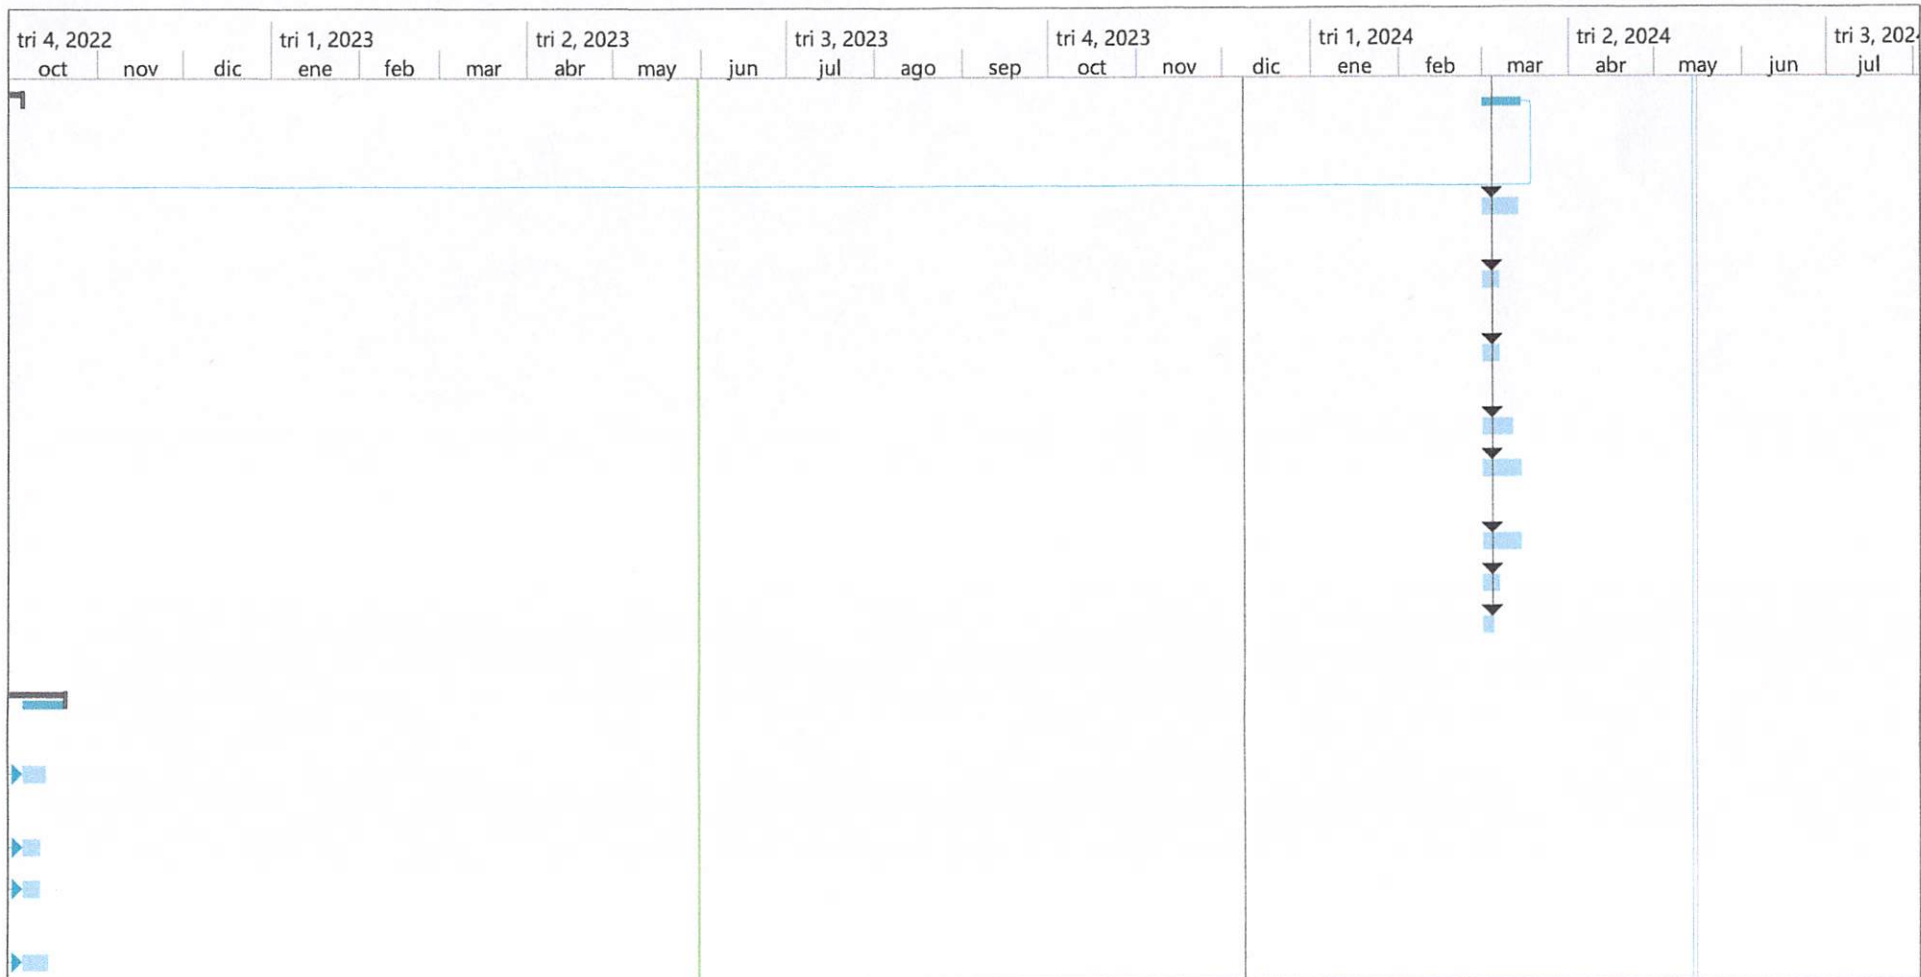

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

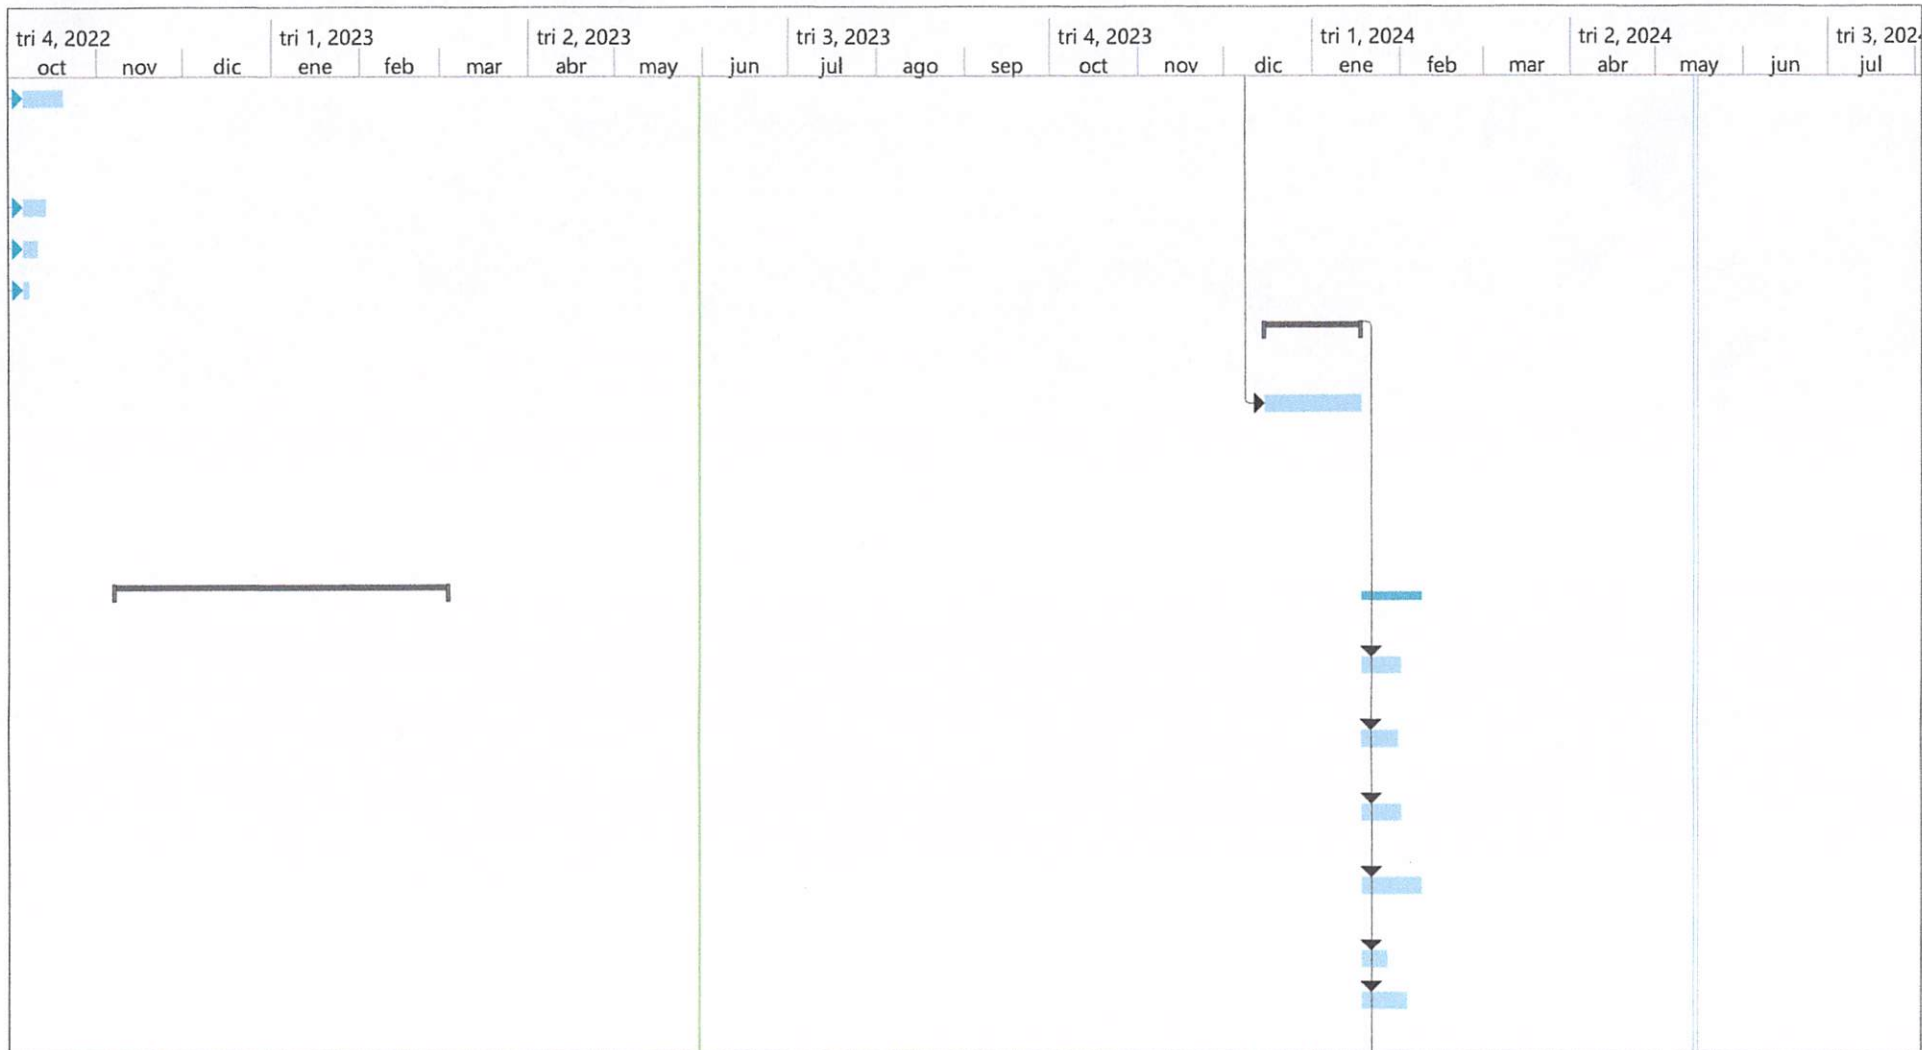

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

[Handwritten signature]

ERF

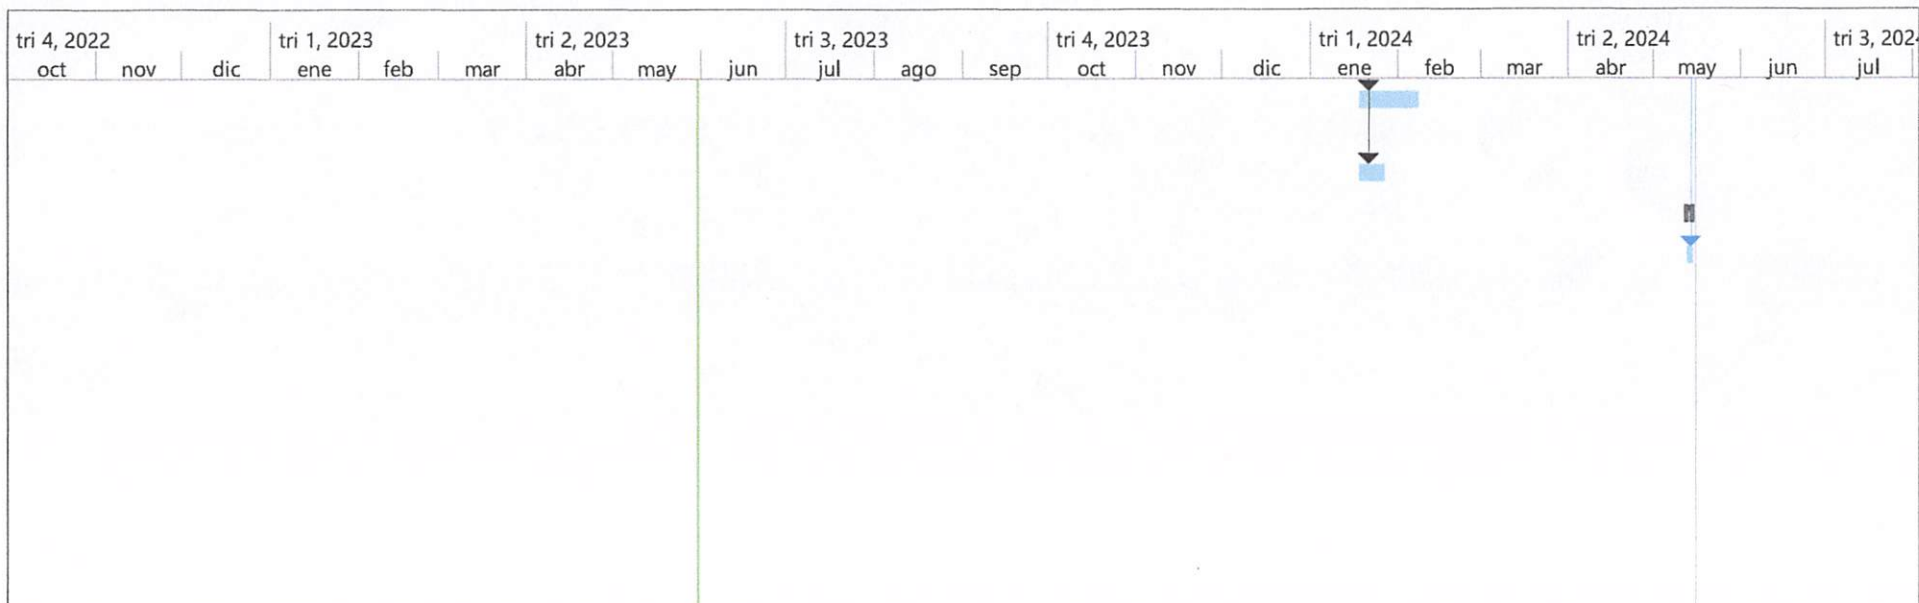

Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
