

ID	Activ. Base	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
168	168	Conformación de talud 50% Sur	2 días	jun 17/11/22	jun 19/11/22
170	170	Hormigón F'c = 240 kg/cm2 50% Sur	2 días	vie 18/11/22	vie 18/11/22
171	171	Grana tipo bermuda 50% Sur	3 días	mar 22/11/22	mar 24/11/22
172	172	DESDE EST-2+420 HASTA EST-0+480	474 días	jun 16/5/22	jun 16/5/22
173	173	PRELIMINARES	46 días	jun 16/5/22	jun 16/5/22
174	174	Corte de árboles y acondicionamiento de área de trabajo	3 días	jun 16/5/22	jun 16/5/22
175	175	Replanteo topográfico	3 días	mié 18/5/22	mié 18/5/22
176	176	Excavaciones en acera sur para acceso camiones de bote	30 días	jun 26/5/22	jun 26/5/22
177	177	Saneamiento de acera sur para camino de acceso camiones de bote	6 días	mar 28/6/22	mar 28/6/22
178	178	TRAMO DESDE EST-2+420 HASTA EST-2+500	23 días	mar 22/11/22	mar 22/11/22
179	179	Atagula en EST-2+500	1 día	mar 22/11/22	mar 22/11/22
180	180	Desvío Sur para manejo de agua en tubería provisional de 36"	1 día	mar 22/11/22	mar 22/11/22
181	181	Excavaciones de material no clasificado	4 días	mié 23/11/22	mié 23/11/22
182	182	Bote	4 días	jun 28/11/22	jun 28/11/22
183	183	Releño compactado 50% Norte	5 días	jun 28/11/22	jun 28/11/22
184	184	Conformación de talud 50% Norte	2 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22
185	185	Hormigón F'c = 240 kg/cm2 50% Norte	2 días	jun 5/12/22	jun 5/12/22
186	186	Grana tipo bermuda 50% Norte	3 días	mié 7/12/22	mié 7/12/22
187	187	Desvío Norte para manejo de agua en tubería provisional de 36"	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22
188	188	Releño compactado 50% Sur	5 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22
189	189	Conformación de talud 50% Sur	2 días	jun 8/12/22	jun 8/12/22
190	190	Hormigón F'c = 240 kg/cm2 50% Sur	2 días	vie 9/12/22	vie 9/12/22
191	191	Grana tipo bermuda 50% Sur	3 días	jun 12/12/22	jun 12/12/22
192	192	TRAMO DESDE EST-2+500 HASTA EST-2+400	19 días	jun 12/12/22	jun 12/12/22
193	193	Atagula en EST-2+400	1 día	jun 12/12/22	jun 12/12/22
194	194	Desvío Sur para manejo de agua en tubería provisional de 36"	1 día	mar 13/12/22	mar 13/12/22
195	195	Excavaciones de material no clasificado	3 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22
196	196	Bote	3 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22
197	197	Releño compactado 50% Norte	4 días	vie 16/12/22	vie 16/12/22
198	198	Conformación de talud 50% Norte	2 días	mié 22/12/22	mié 22/12/22
199	199	Hormigón F'c = 240 kg/cm2 50% Norte	2 días	vie 23/12/22	vie 23/12/22
200	200	Grana tipo bermuda 50% Norte	2 días	jun 26/12/22	jun 26/12/22
201	201	Desvío Norte para manejo de agua en tubería provisional de 36"	1 día	jun 26/12/22	jun 26/12/22
202	202	Releño compactado 50% Sur	4 días	mié 22/12/22	mié 22/12/22
203	203	Conformación de talud 50% Sur	2 días	jun 26/12/22	jun 26/12/22
204	204	Hormigón F'c = 240 kg/cm2 50% Sur	2 días	mié 28/12/22	mié 28/12/22
205	205	Grana tipo bermuda 50% Sur	2 días	jun 29/12/22	jun 29/12/22
206	206	TRAMO DESDE EST-2+400 HASTA EST-2+300	19 días	jun 29/12/22	jun 29/12/22
207	207	Atagula en EST-2+300	1 día	jun 29/12/22	jun 29/12/22
208	208	Desvío Sur para manejo de agua en tubería provisional de 36"	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22
209	209	Excavaciones de material no clasificado	3 días	sáb 31/12/22	sáb 31/12/22
210	210	Bote	3 días	mié 4/1/23	mié 4/1/23

Proyecto: CRONOGRAMA EDR

Fecha: jue 4/8/22

■ Resumen
■ Resumen del proyecto
■ Tarea inactiva

■ Hitos inactivos
■ Resumen inactivos
■ Tareas manuales

■ solo duración
■ Informe de resumen manual
■ Resumen manual

■ solo el comienzo
■ Tareas externas
■ Tareas manuales

■ Hitos externos
■ Fecha límite
■ Progreso

■ Progreso manual
■ Tareas críticas
■ Tareas desviadas

Página 5



RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
 Fecha: jue 4/8/22


Tarea		Resumen		Fila inactiva		Auto dirección		Auto de comercio		Auto externo		Programa nuevo
División		Resumen del proyecto		Resumen nacional		Informe de recursos manual		Auto fin		Ficha límite		Tareas críticas
Hito		Tarea inactiva		Tareas manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso		Tareas divididas

Here

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
 Fecha: jue 4/6/22

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Tareas críticas	
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso		Tareas divididas	

Página 7



Proyecto: CRONOGRAMA EDIF	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito activo	Progreso manual
Fecha: jue 4/6/22	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha inicio	Tareas críticas
	Hito	Tarea inactiva	Tareas manuales	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	Tareas divididas


RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

Hein




matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

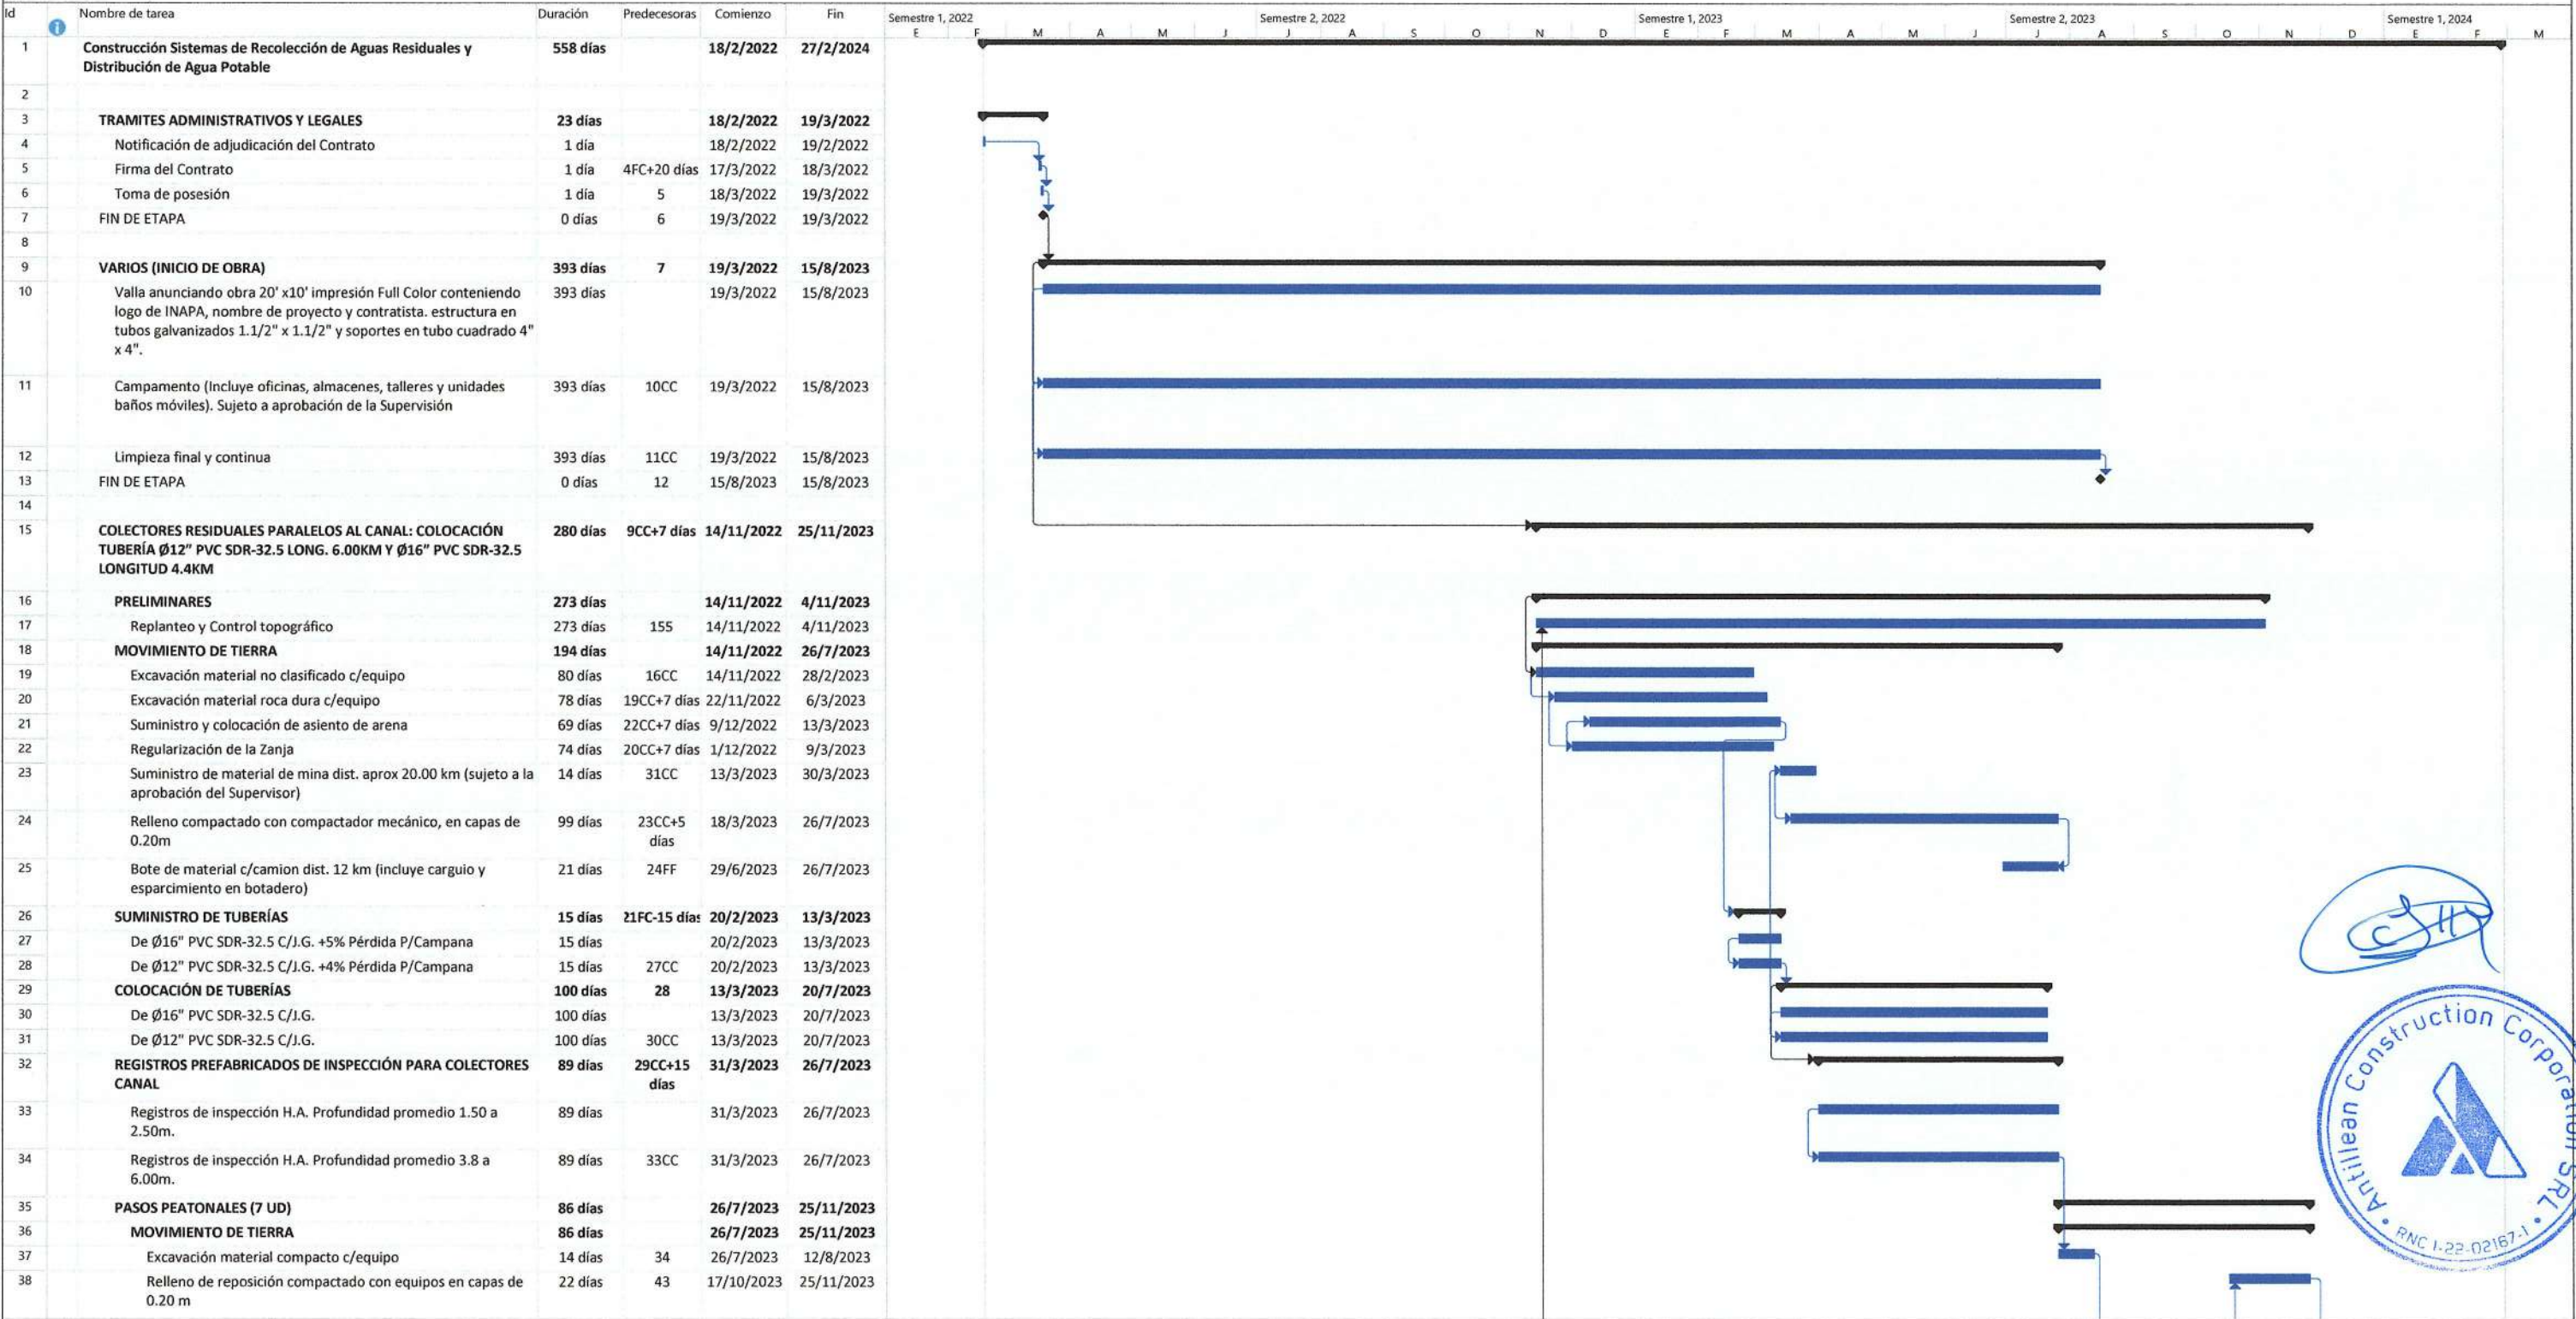


Tarea	Resumen	Tarea resumida	Progreso resumido	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite
División	Resumen del proyecto	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Tarea crítica
Hito	Agrupar por síntesis	Hito resumido	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Progreso

CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

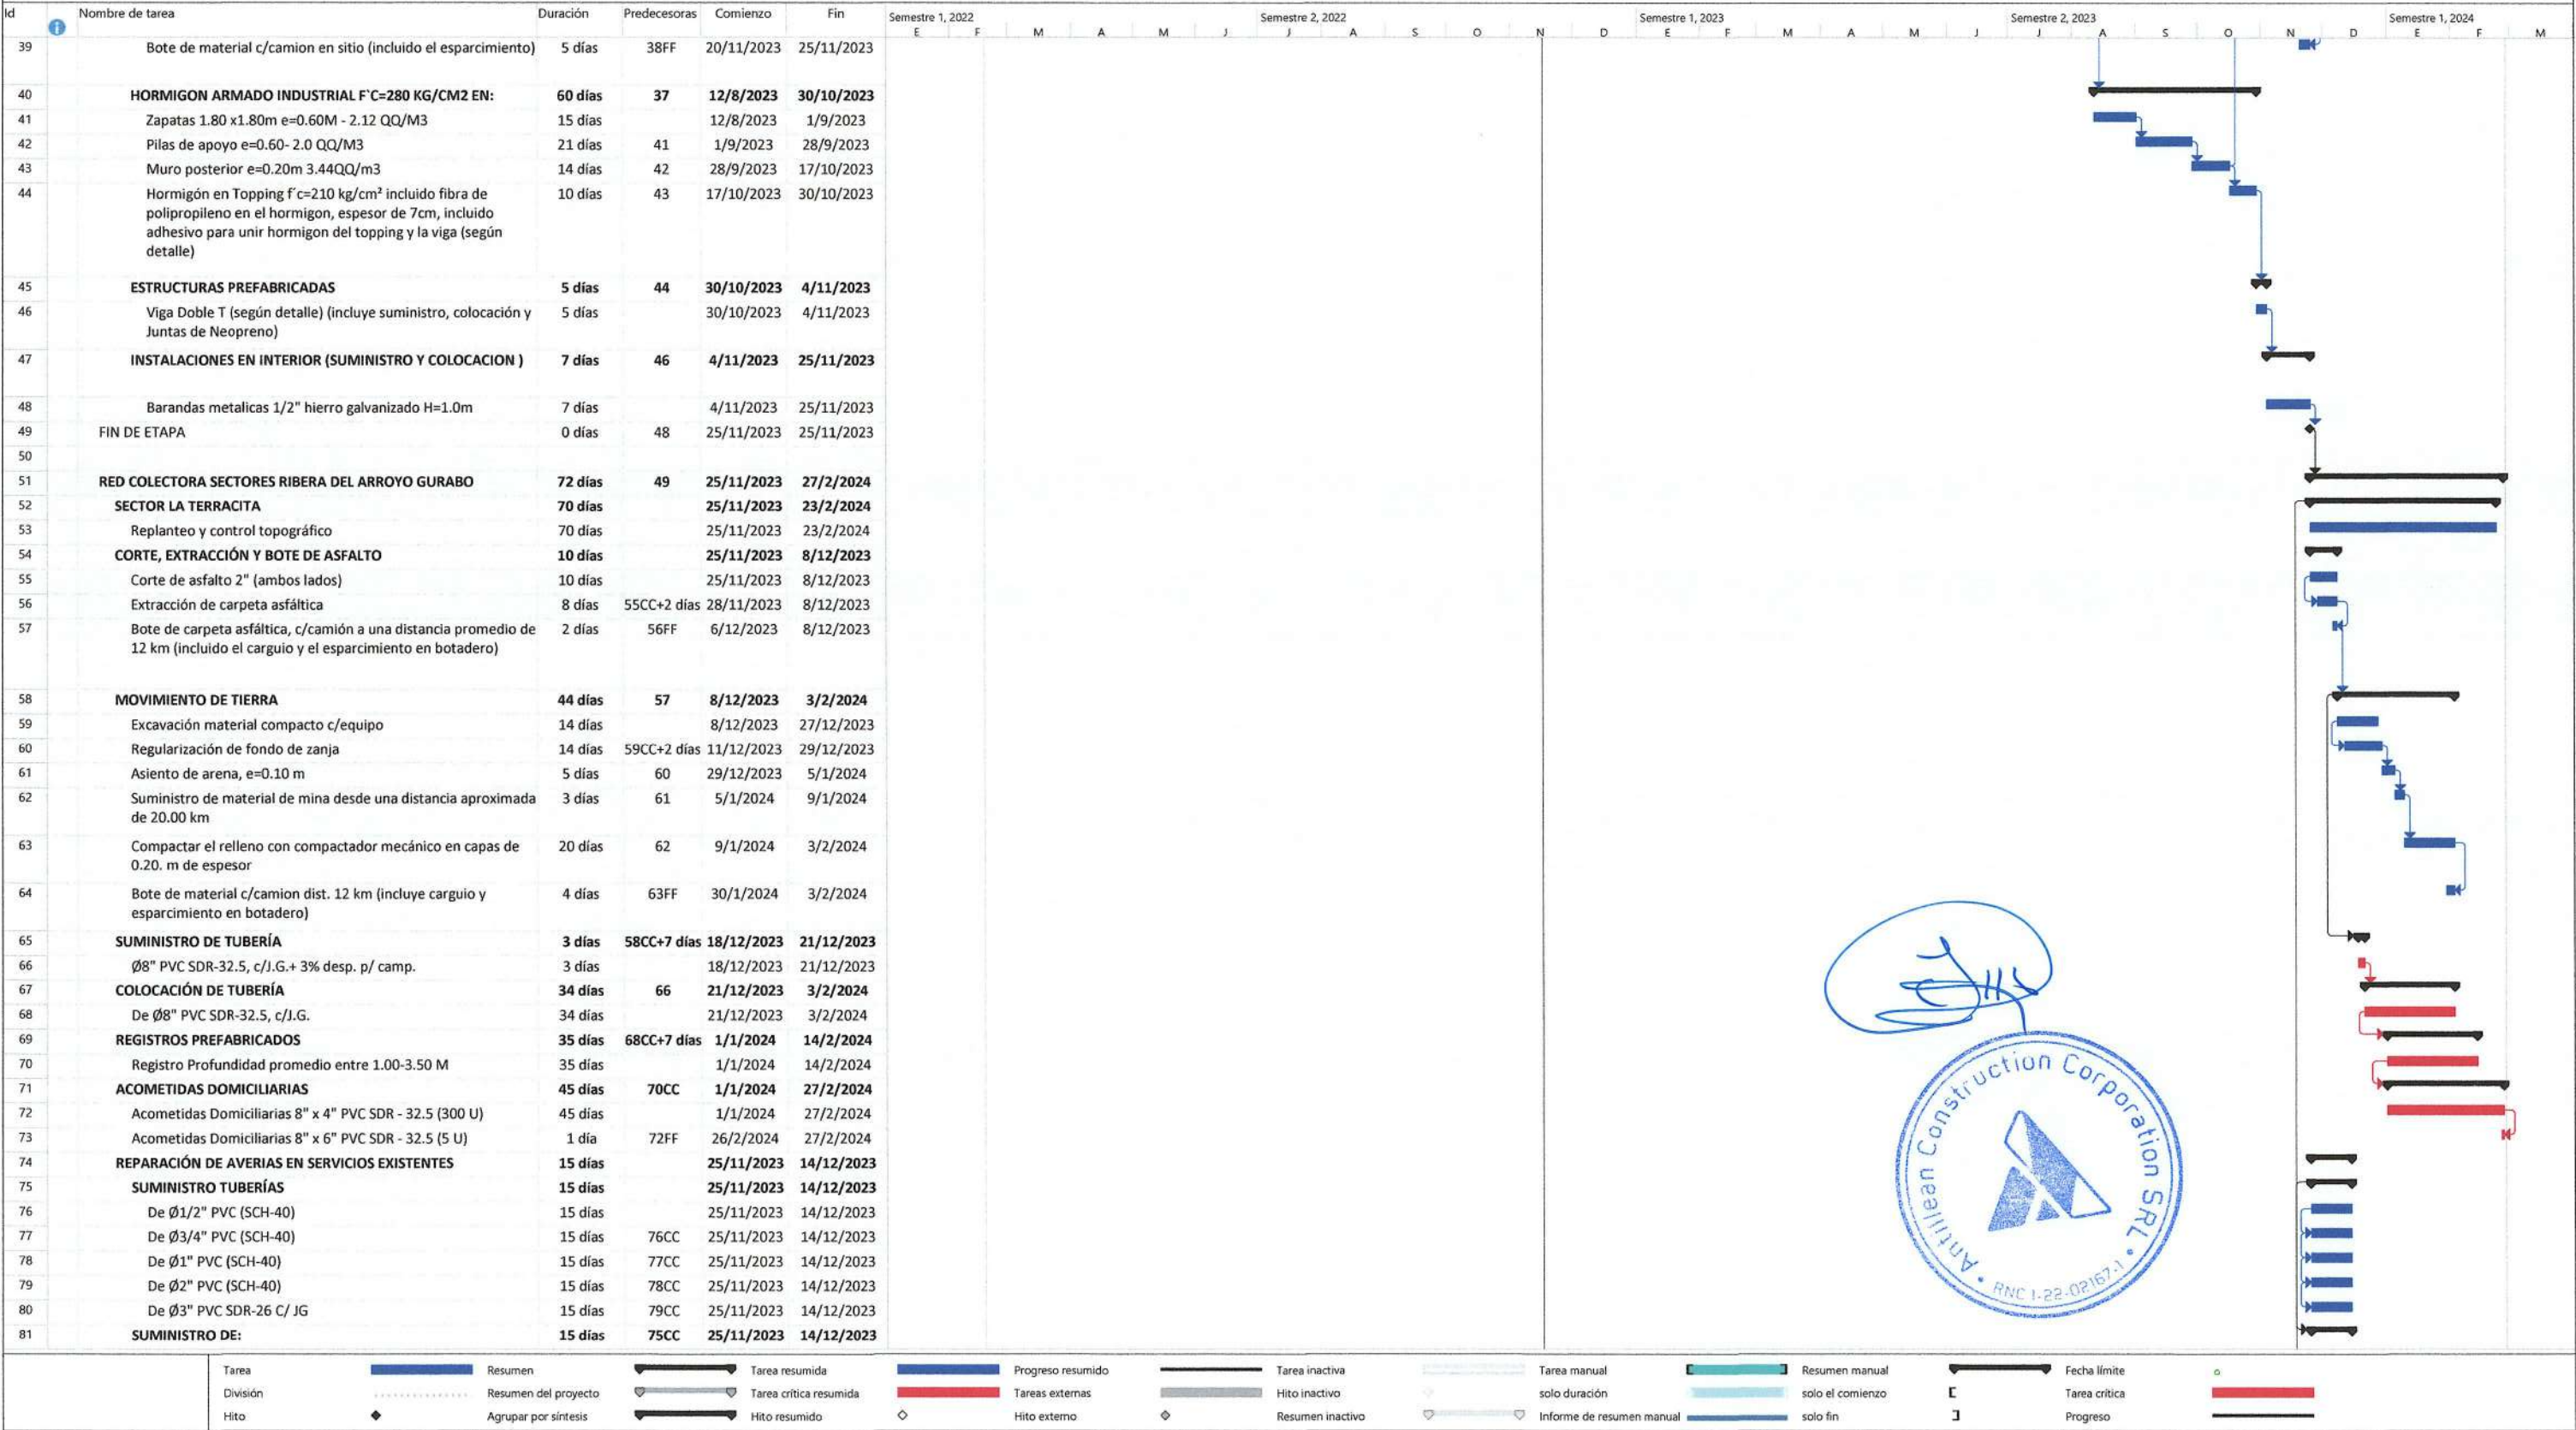


The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be "S. H.", enclosed within a large, loopy oval. Below the signature is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "Antillean Construction Corporation SRL" around the top inner edge and "RNC 1-22-02167-1" around the bottom inner edge. In the center of the stamp is a stylized logo consisting of three triangles forming a larger triangular shape.


CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

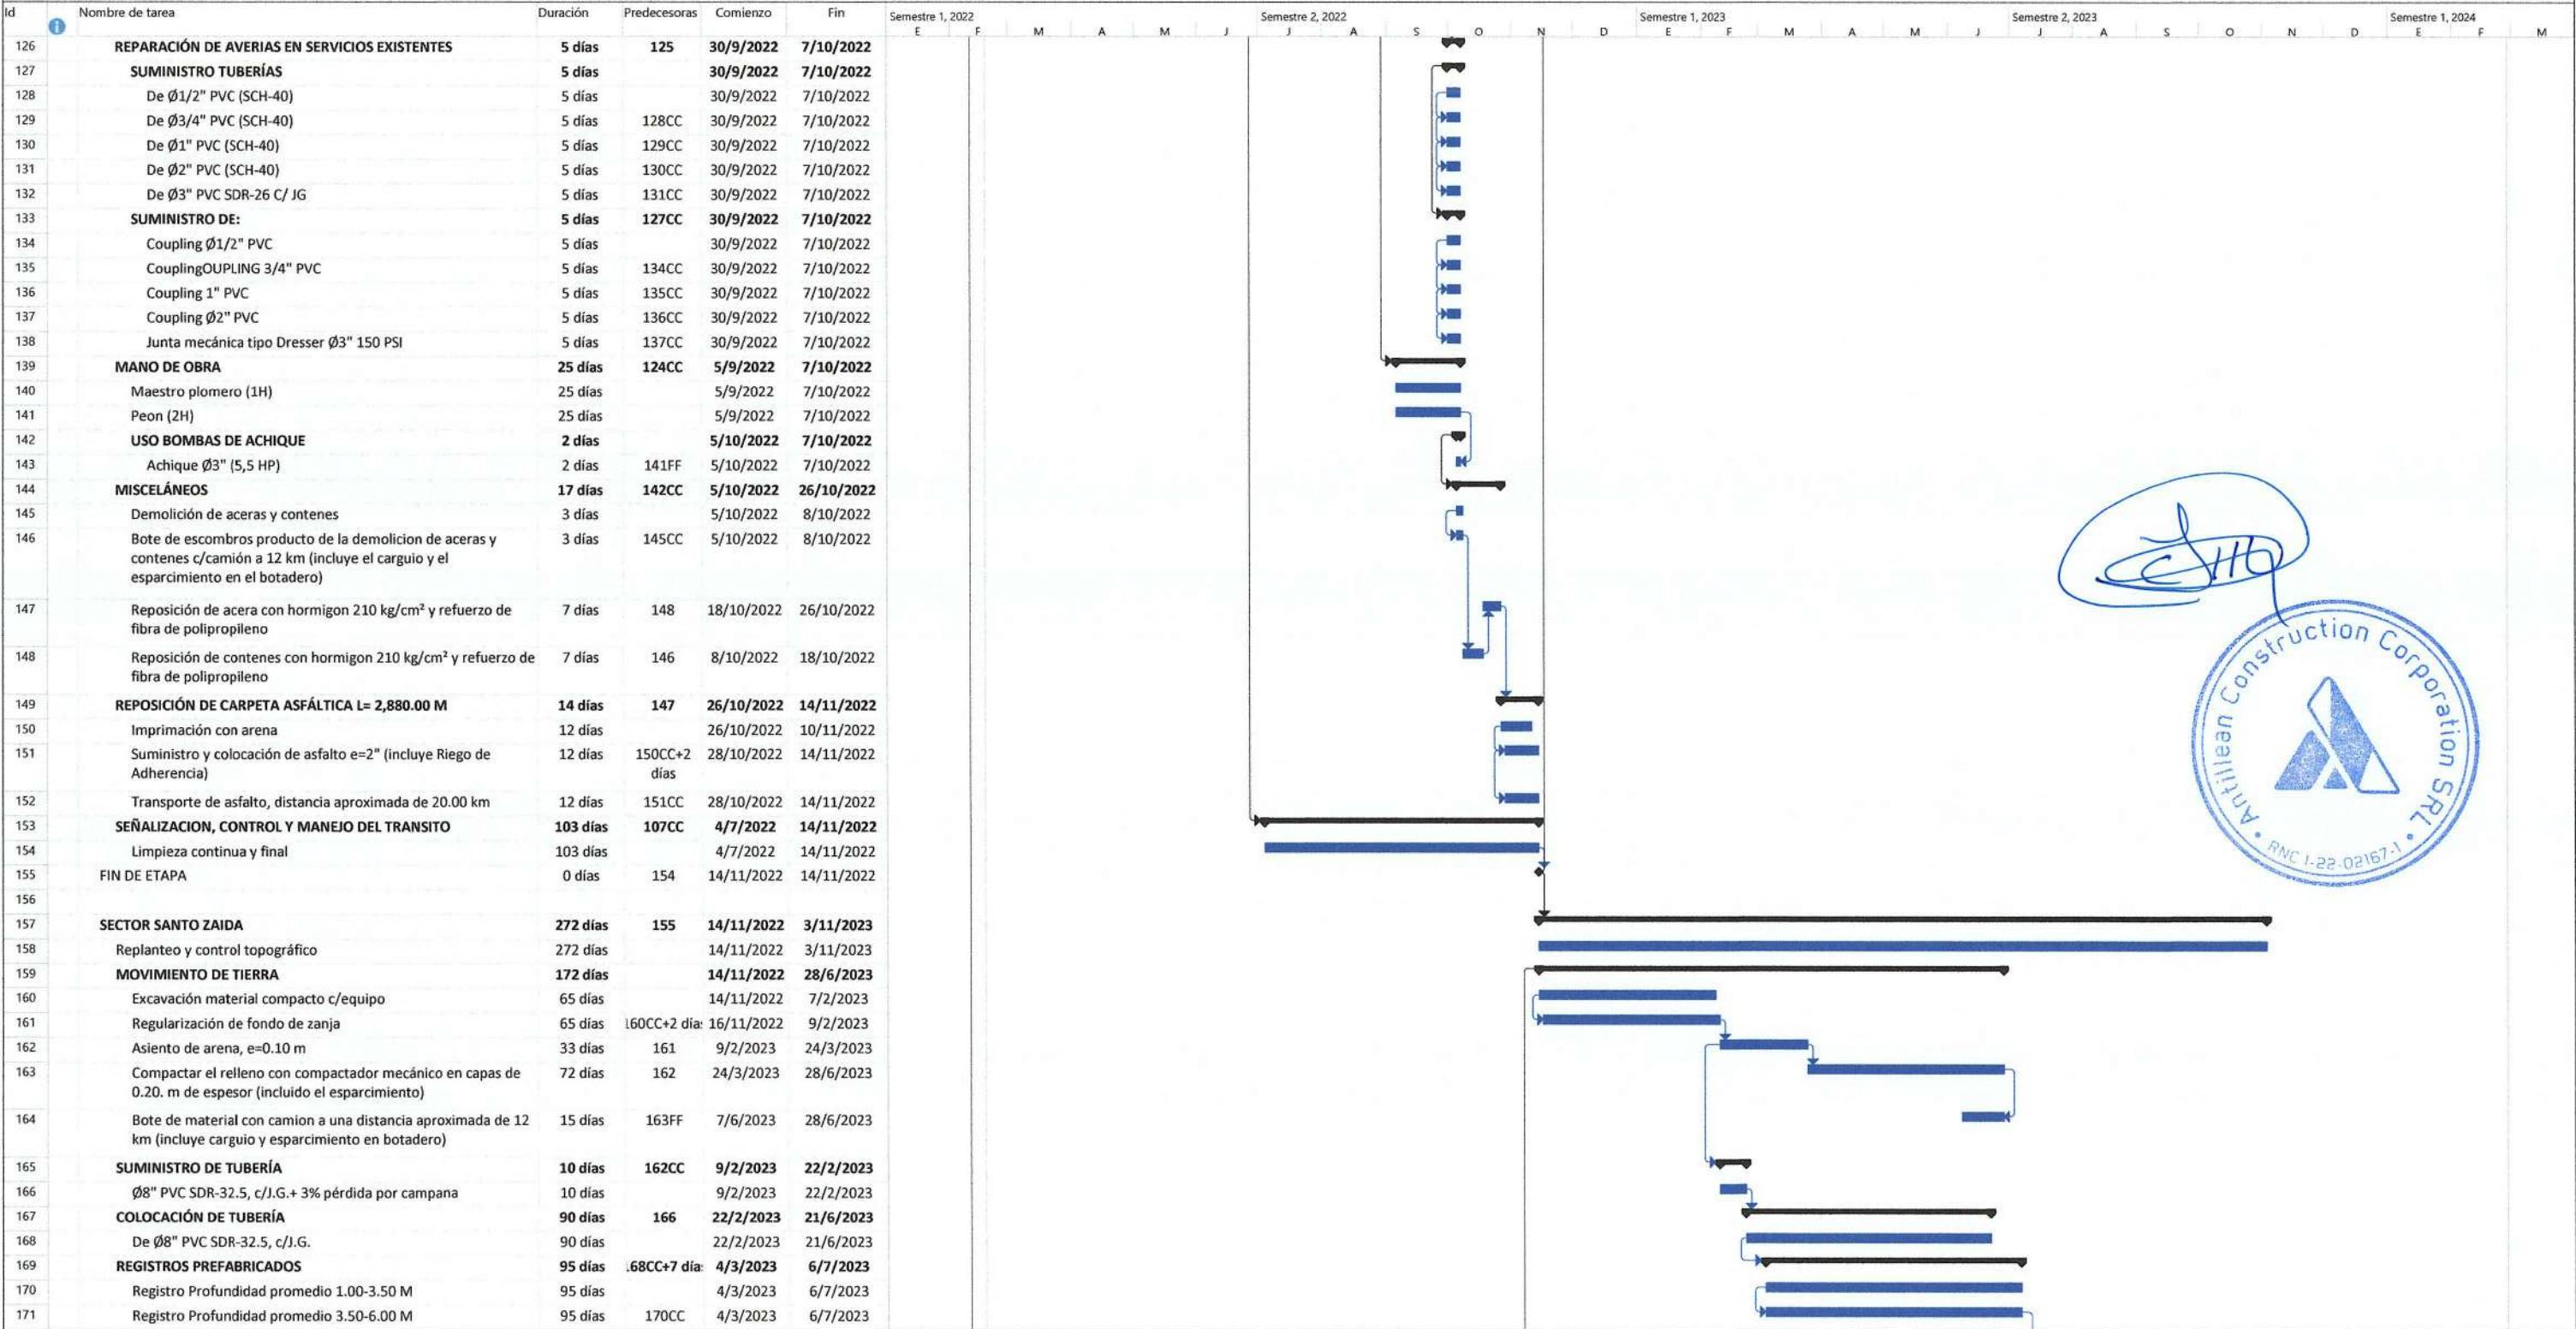

**CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO**

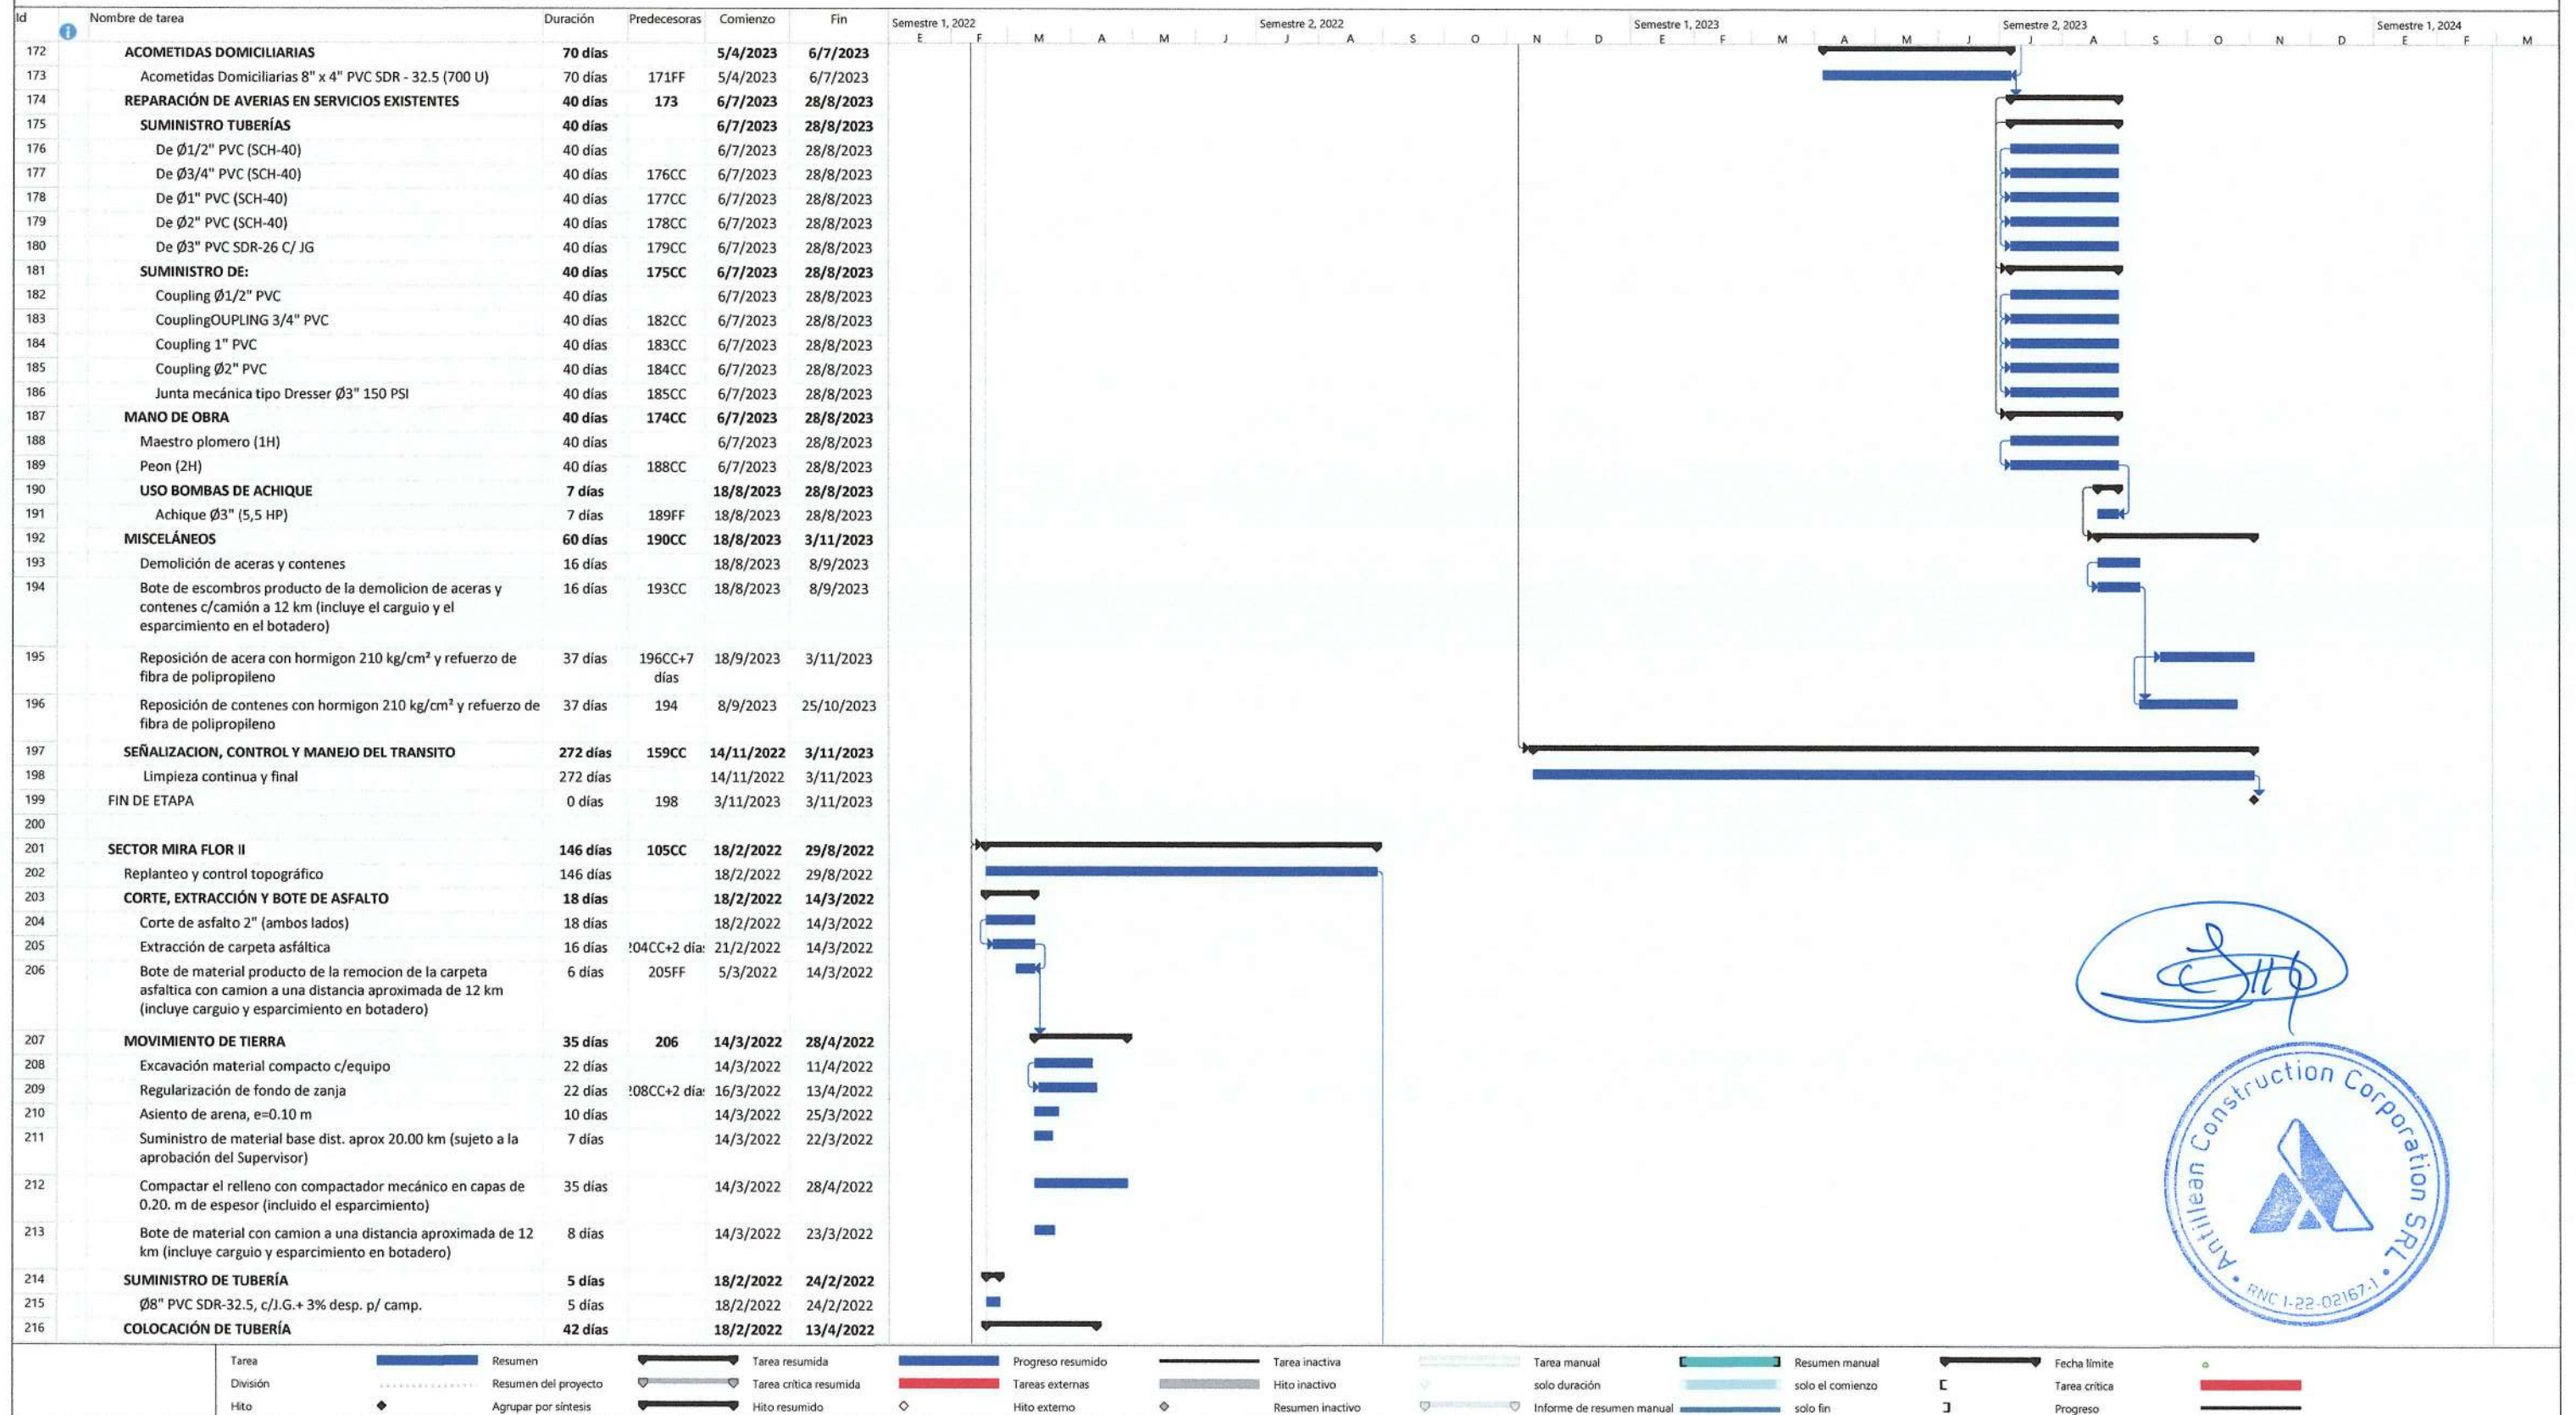


**CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO**

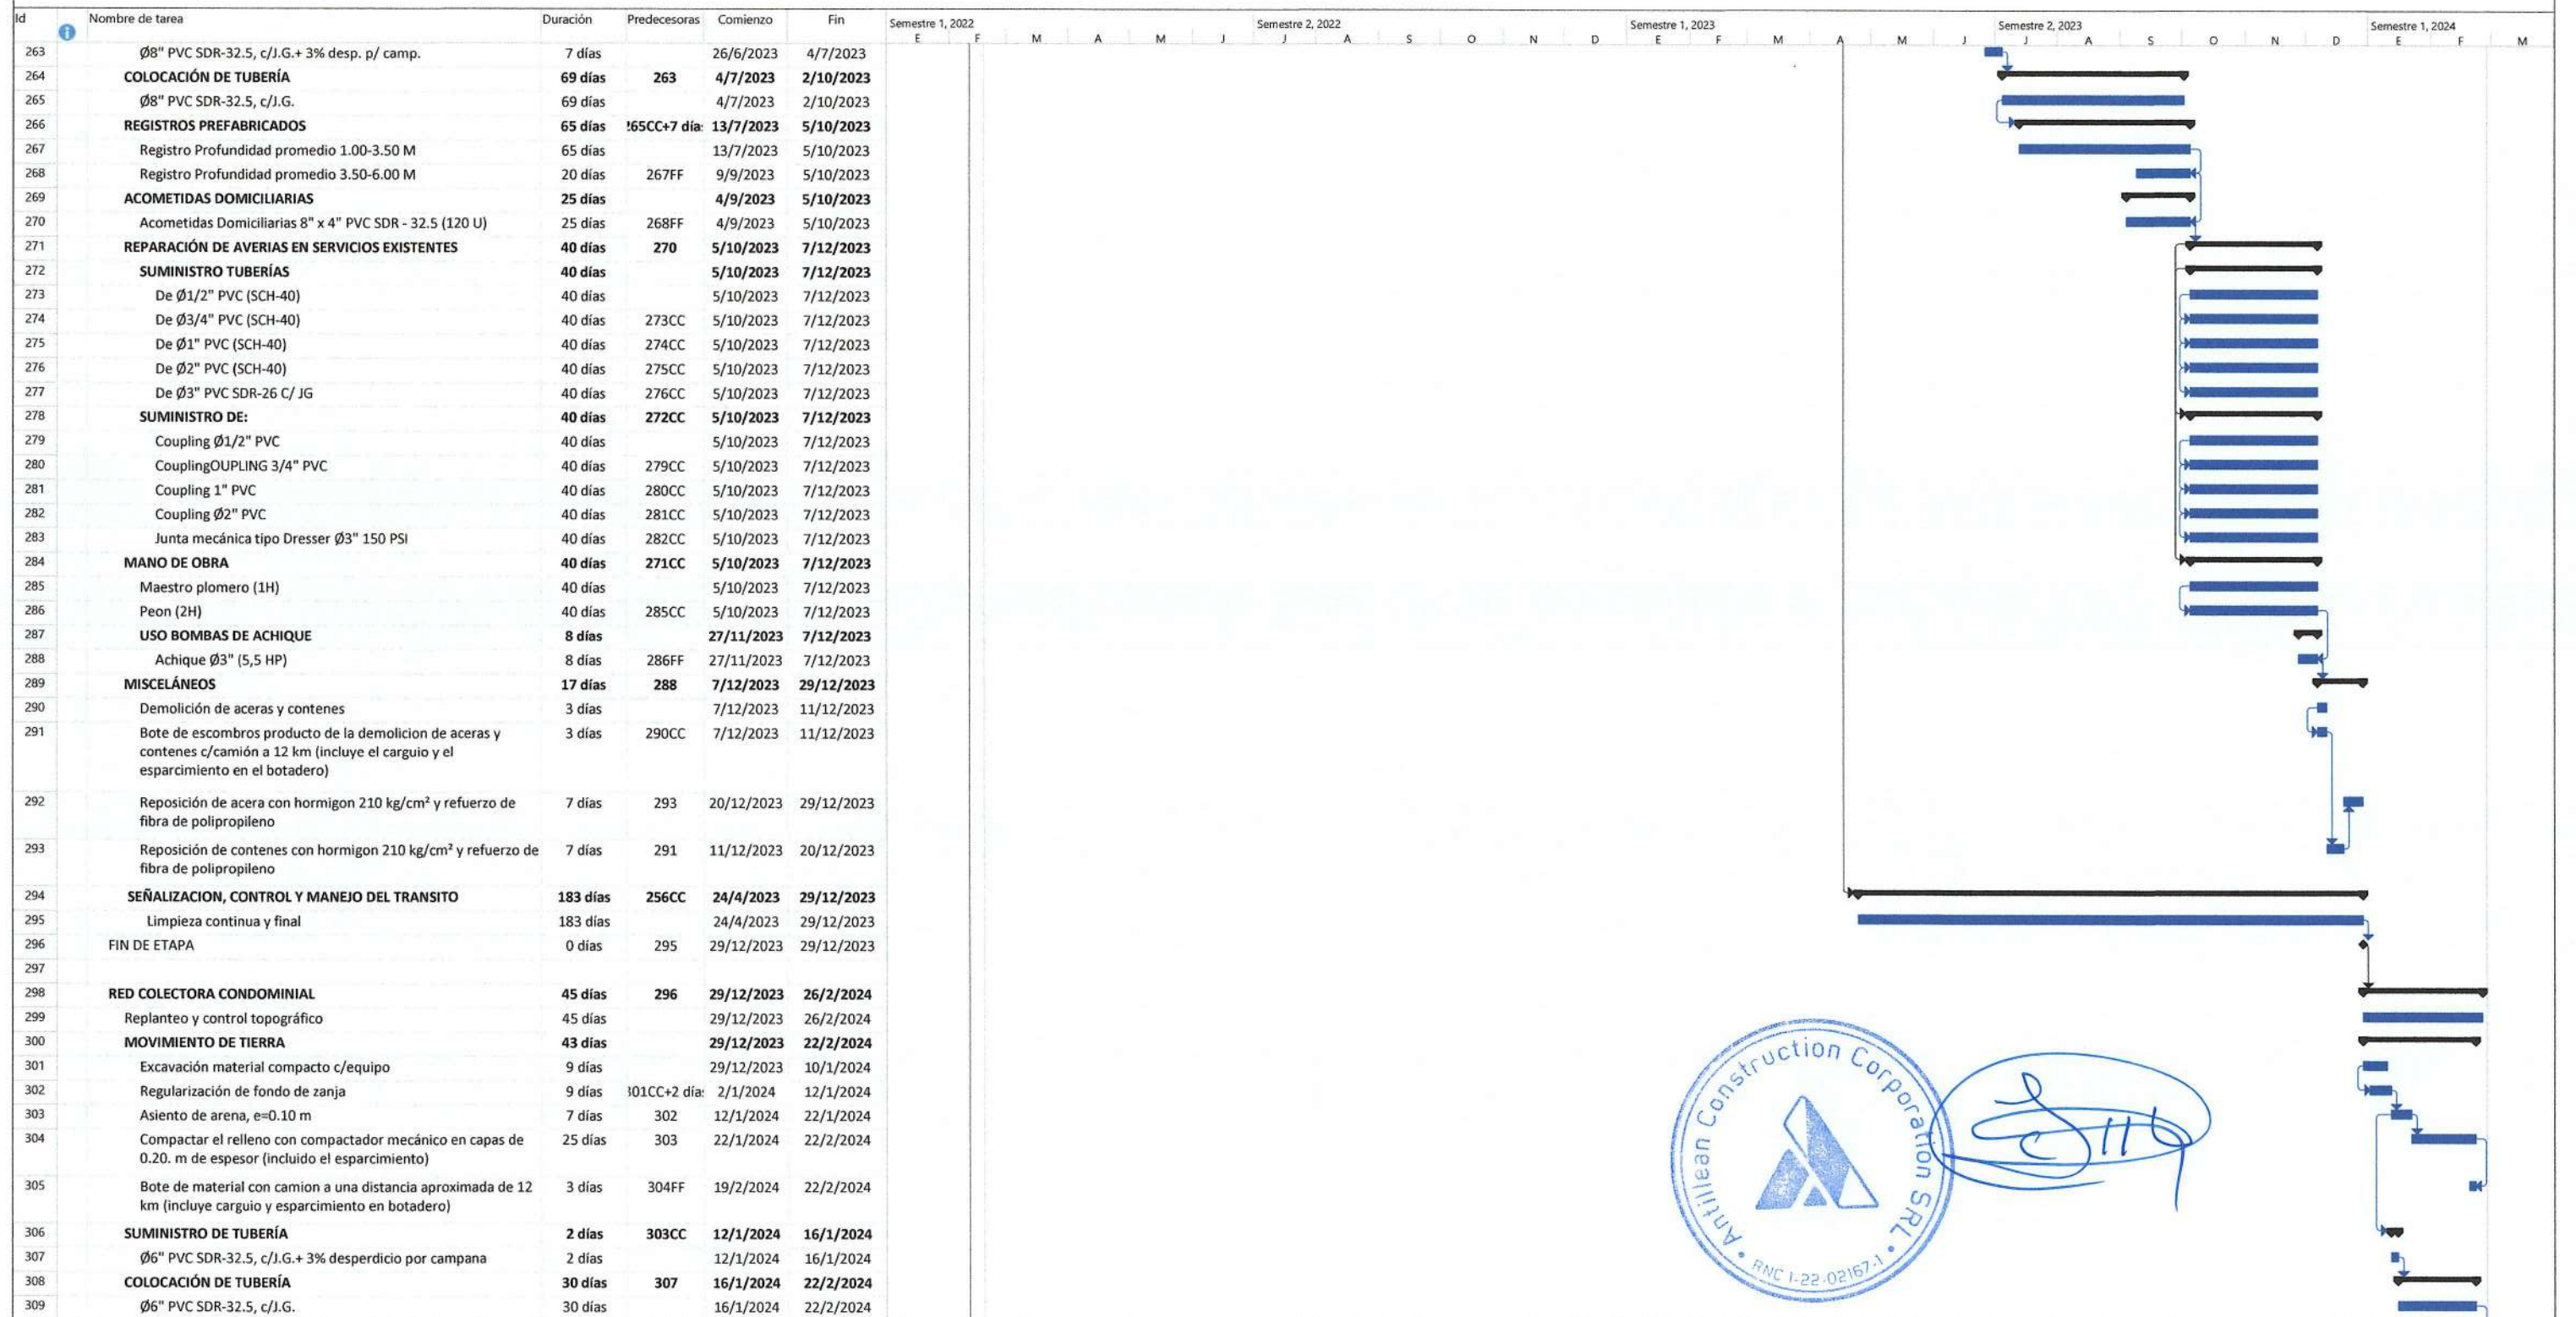

Tarea	Resumen	Tarea resumida	Progreso resumido	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite
División	Resumen del proyecto	Tarea crítica resumida	Tareas externas	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Tarea crítica
Hito	Agrupar por síntesis	Hito resumido	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Progreso

INAPA-CCC-LPN-2021-0044

CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

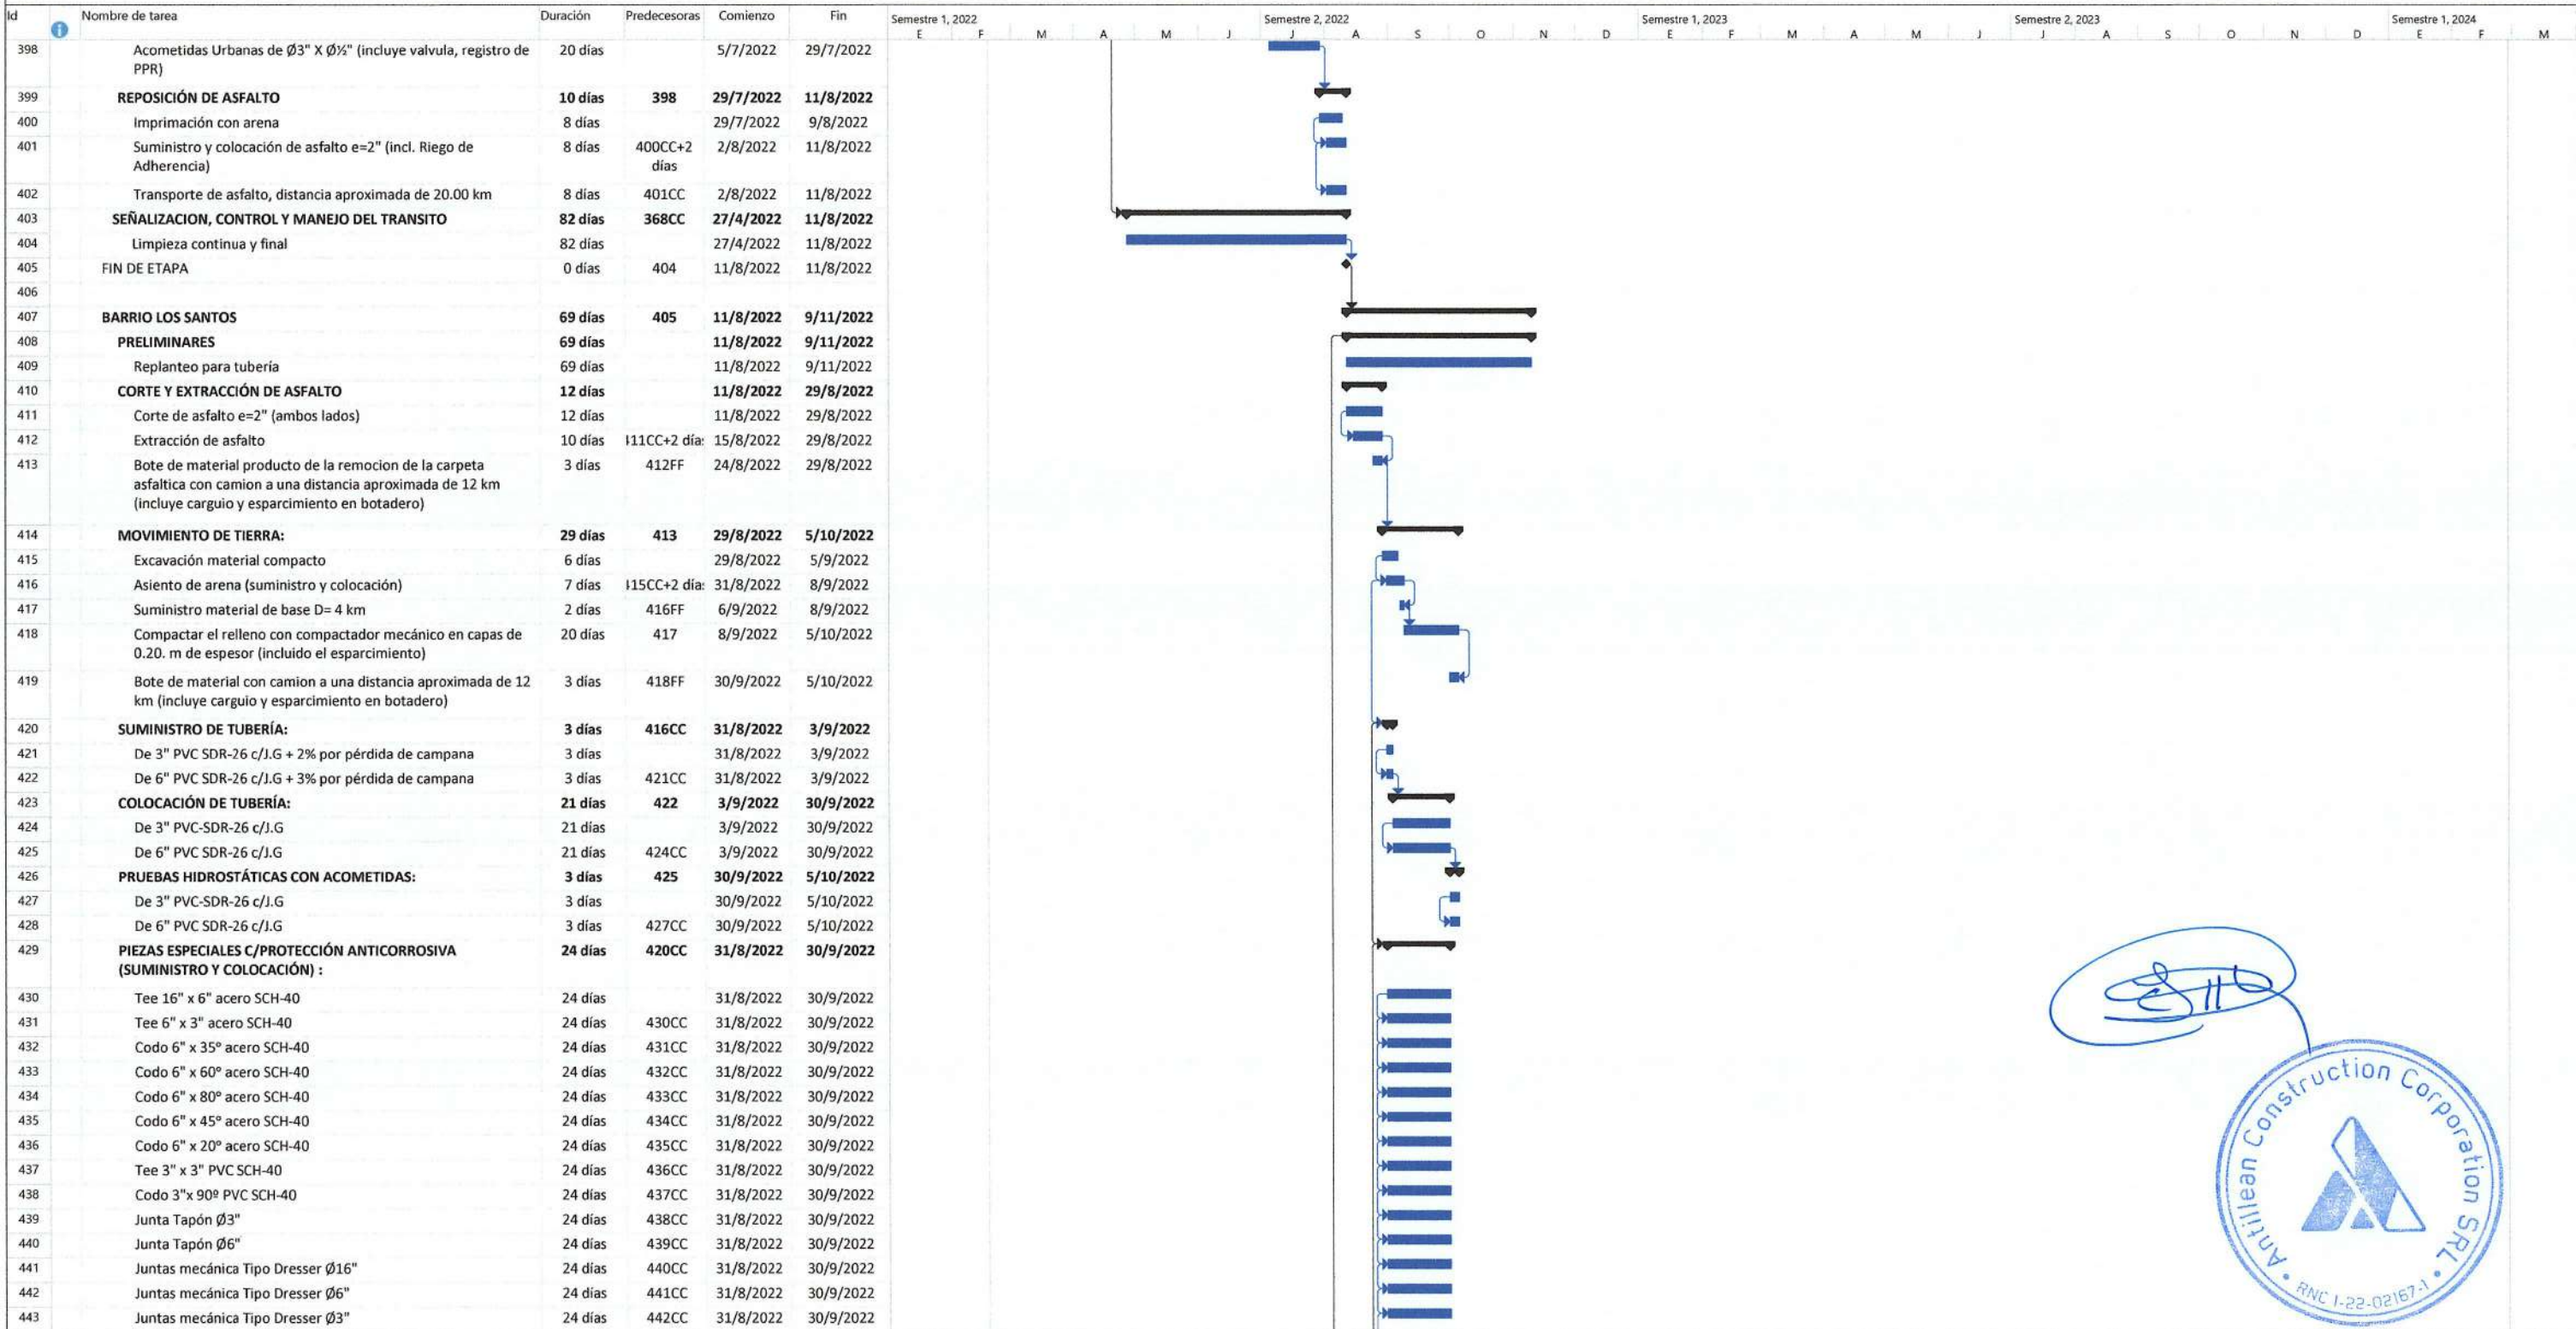


Tarea: [Barra azul] Resumen, [Barra gris] Tarea resumida, [Barra roja] Progreso resumido, [Barra blanca] Tarea inactiva, [Barra verde] Tarea manual, [Barra naranja] Resumen manual, [Barra negra] Fecha límite


División: [Barra punteada] Resumen del proyecto, [Barra gris con flecha] Tarea crítica resumida, [Barra roja con flecha] Tareas externas, [Barra gris con flecha] Hito inactivo, [Barra verde con flecha] solo duración, [Barra naranja con flecha] solo el comienzo, [Barra negra con flecha] Tarea crítica

Hito: [Barra con diamante] Agrupar por síntesis, [Barra con flecha] Hito resumido, [Barra con diamante] Hito externo, [Barra con flecha] Resumen inactivo, [Barra con flecha] Informe de resumen manual, [Barra con flecha] solo fin, [Barra con flecha] Progreso

CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

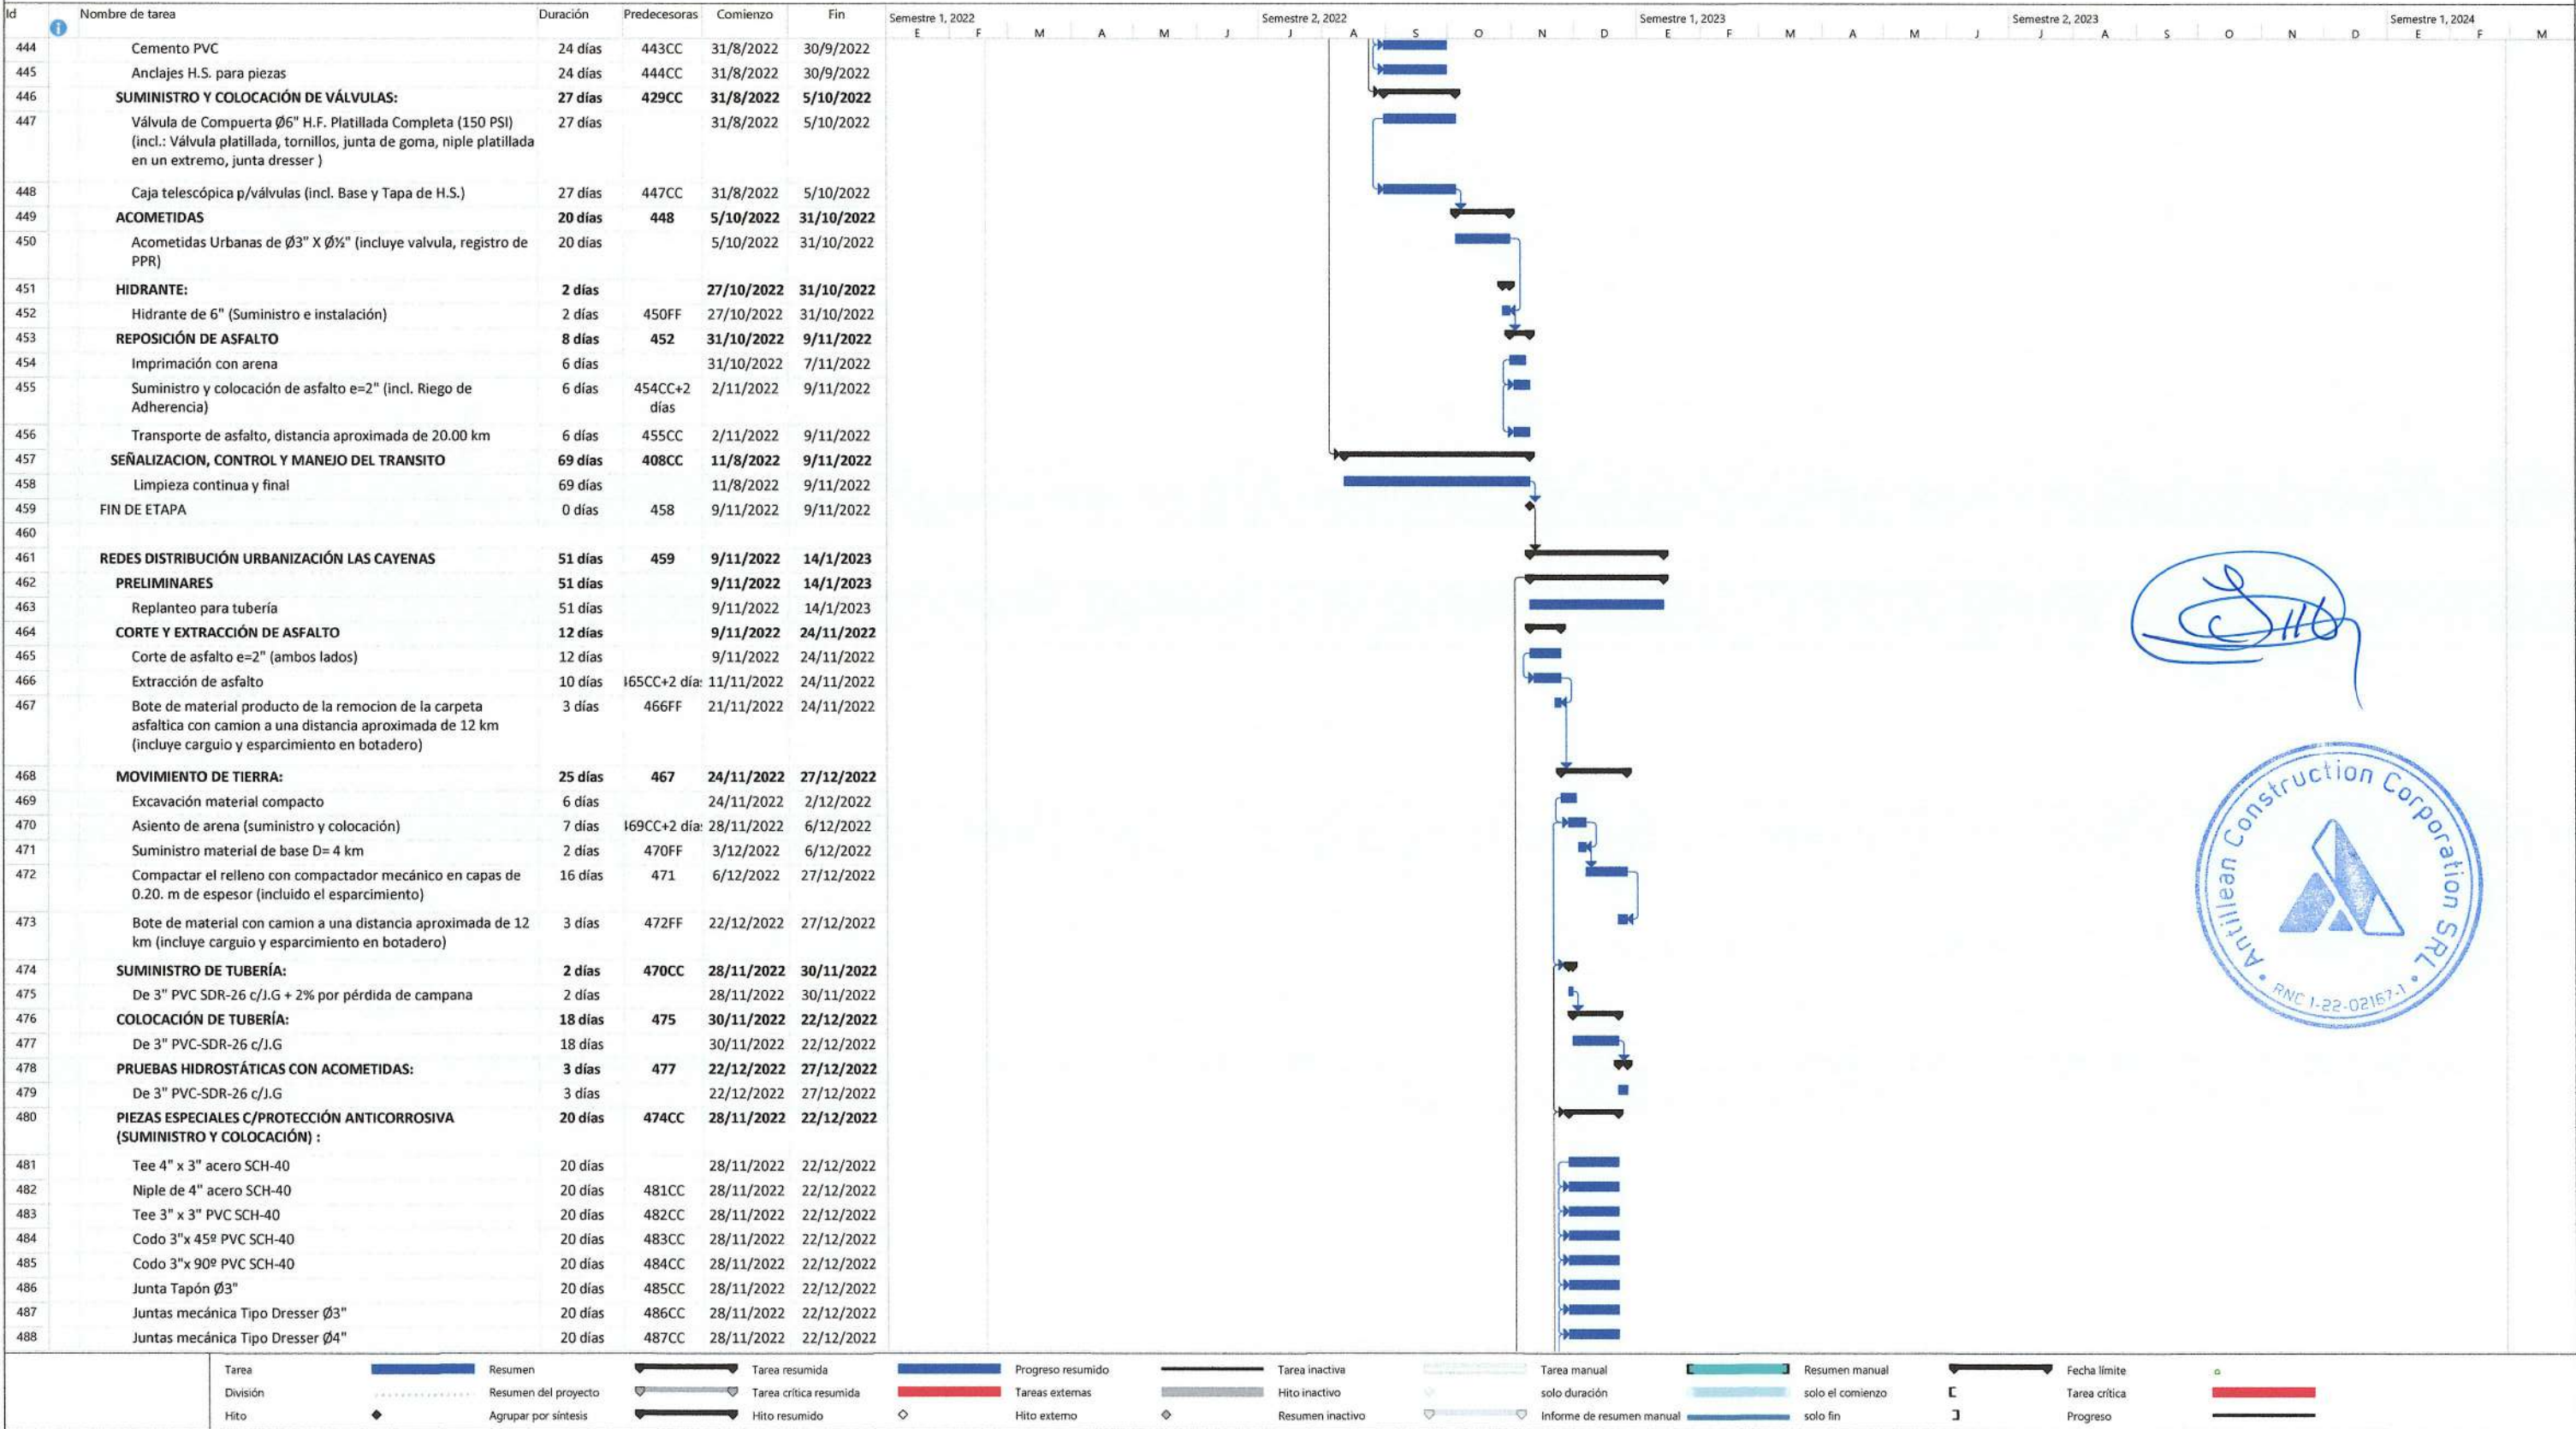

CRONOGRAMA DE
CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO
SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

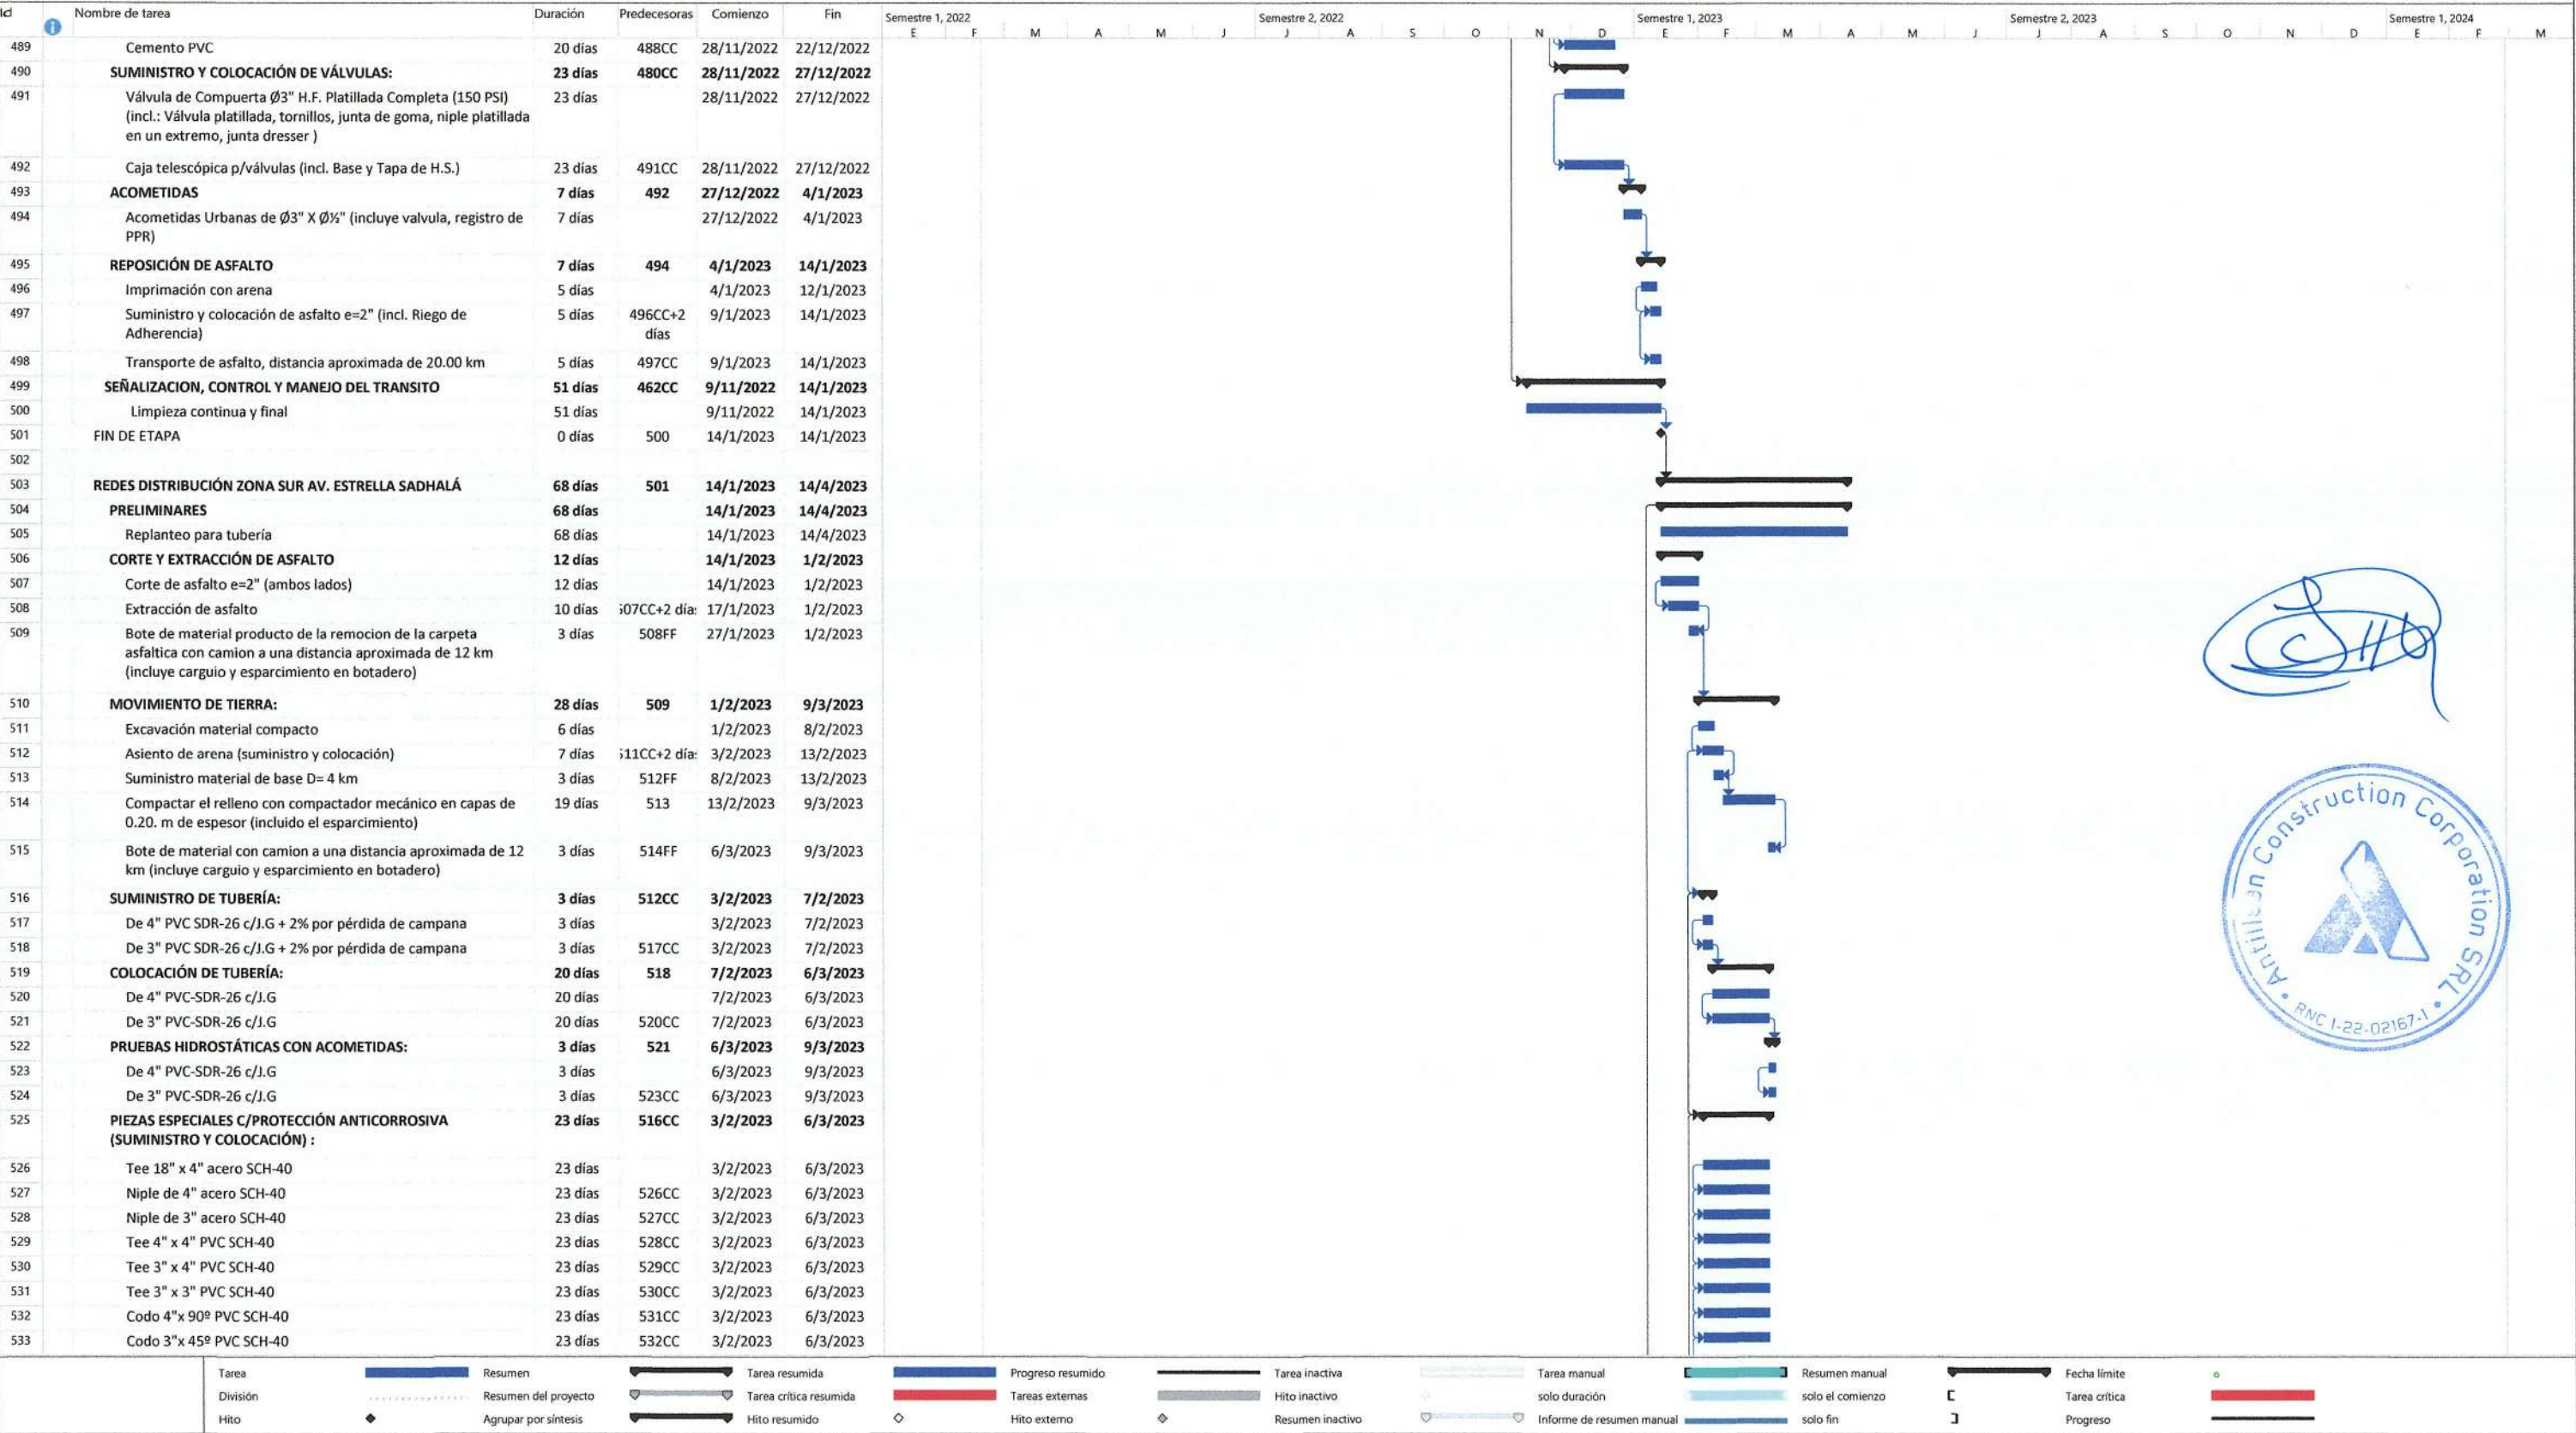


A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular blue ink stamp. The stamp features a stylized triangular logo in the center, composed of three smaller triangles. The text "Antillean Construction Corporation SRL" is written in a circular path around the logo. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code "RNC 1-22-02167-1" is printed.



Tarea		Resumen		Tarea resumida		Progreso resumido		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Fecha límite	
División		Resumen del proyecto		Tarea crítica resumida		Tareas externas		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Tarea crítica	
Hito		Agrupar por síntesis		Hito resumido		Hito externo		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Progreso	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	Feb	Mar	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	1st Quarter	2nd Quarter									
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
0	msproj11	335.75 days	Mon 04-04-22	Thu 22-06-23			RD\$401,123,724.49																
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO)	335.75 days?	Mon 04-04-22	Thu 22-06-23			RD\$401,123,724.49																
2	Inicio de Obra	0 days	Mon 04-04-22	Mon 04-04-22			RD\$0.00																
3																							
4	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS (3,8 KM)	49 days	Fri 08-04-22	Tue 14-06-22			RD\$246,843,440.62																
5																							
6	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	3 days	Fri 08-04-22	Tue 12-04-22	56	Brigada Topografica,Capataz	RD\$1,416,476.46																
7																							
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	45 days	Tue 12-04-22	Mon 13-06-22			RD\$82,335,020.81																
9	Corte material no clasificado c/equipo	7 days	Tue 12-04-22	Sat 23-04-22	6	Ayudante de Equipos,Chofer de Camión	RD\$966,232.35																
10	Bote de material c/camion dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	7 days	Tue 12-04-22	Sat 23-04-22	9FF	Camión Volteo 16 m3,Chofer de m3,Chofer de	RD\$4,469,820.82																
11	Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km	10 days	Thu 28-04-22	Wed 11-05-22	9FS+3 days	Camión Volteo 16 m3,Chofer de m3,Chofer de	RD\$12,330,635.44																
12	Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km	10 days	Thu 12-05-22	Tue 24-05-22	11	Camión Volteo 16 m3,Chofer de m3,Chofer de	RD\$8,720,866.20																
13	Imprimación simple	15 days	Wed 25-05-22	Mon 13-06-22	12	Bandolero,Barredora de Asfalto	RD\$7,640,988.13																
14	Suministro y colocación de asfalto e=3" (incl. Riego de Adherencia)	15 days	Wed 25-05-22	Mon 13-06-22	13SS	Ayudante de Equipos,Barredora de Asfalto	RD\$46,936,123.65																
15	Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km	15 days	Wed 25-05-22	Mon 13-06-22	14SS	Camión Distribuidor de Asfalto,Ayudante de Equipos	RD\$1,270,354.22																
16																							
17	ACERAS Y CONTENES	26 days	Thu 12-05-22	Tue 14-06-22			RD\$88,378,281.11																
18	Construcción de aceras	20 days	Thu 12-05-22	Mon 06-06-22	11	Albañil de 1era,Capataz	RD\$25,460,680.58																
19	Construcción de contenes	20 days	Thu 12-05-22	Mon 06-06-22	18FF	Albañil de 1era,Capataz	RD\$16,838,005.73																
20	Barandas de protección	1 day	Mon 13-06-22	Tue 14-06-22	15	Ayudante de Herreri	RD\$46,079,594.80																
21																							
22	CICLOVÍA	46 days	Tue 12-04-22	Tue 14-06-22			RD\$74,713,662.24																
23	Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km	5 days	Thu 28-04-22	Thu 05-05-22	9FS+3 days	Camión Volteo 16 m3,Chofer de m3,Chofer de	RD\$6,207,791.65																
24	Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km	23 days	Thu 28-04-22	Fri 27-05-22	9FS+3 days	Camión Volteo 16 m3,Chofer de m3,Chofer de	RD\$9,311,687.48																
25	Imprimación simple	10 days	Sat 28-05-22	Thu 09-06-22	24	Bandolero,Barredora de Asfalto	RD\$3,318,962.02																
26	Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia)	10 days	Sat 28-05-22	Thu 09-06-22	25FF	Ayudante de Equipos,Barredora de Asfalto	RD\$15,573,655.35																
27	Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km	10 days	Sat 28-05-22	Thu 09-06-22	26FF	Camión Distribuidor de Asfalto,Ayudante de Equipos	RD\$367,863.19																
28	Construcción de acera	15 days	Thu 12-05-22	Tue 31-05-22	18SS	Albañil de 1era,Capataz	RD\$22,649,938.55																
29	Construcción de contenes	15 days	Thu 12-05-22	Tue 31-05-22	28FF	Albañil de 1era,Capataz	RD\$15,603,307.35																
30																							
31	Control y Manejo de Tránsito (incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con banderolas)	45 days	Tue 12-04-22	Mon 13-06-22	9SS	Bandolero,Capataz	RD\$558,916.72																
32																							
33	Señalización, Manejo de Tránsito y Seguridad en la Vía	30 days	Tue 12-04-22	Tue 24-05-22	31SS	Bandolero,Capataz	RD\$764,833.40																
34																							
35	Limpieza continua y final	45 days	Wed 13-04-22	Tue 14-06-22	20FF	Capataz,Peon	RD\$356,706.53																
36																							
37	ILUMINACION VÍAS Y AREA DE RECREACIÓN (3,680 M, AMBOS LADOS)	21 days	Mon 22-08-22	Fri 16-09-22			RD\$27,649,808.80																
38	ILUMINACIÓN EXTERNA	21 days	Mon 22-08-22	Fri 16-09-22			RD\$27,649,808.80																
39	Postes de aluminio, 35' 500 dam (para tráf)	3 days	Fri 02-09-22	Tue 06-09-22	321	Ayudante Electricista,Brigada de Electricidad EDEENORTE	RD\$724,377.74																
40	Postes de aluminio, 30' 300 dam	12 days	Mon 22-08-22	Tue 06-09-22	39FF	Ayudante Electricista	RD\$7,833,972.69																
41	Alambre AAAC No. 1/0	5 days	Tue 06-09-22	Mon 12-09-22	40	Ayudante Electricista	RD\$1,055,052.07																
42	Estructura MT-105	5 days	Tue 06-09-22	Mon 12-09-22	41FF	Ayudante Electricista	RD\$137,793.87																
43	Estructura F1-BT	5 days	Tue 06-09-22	Mon 12-09-22	42FF	Ayudante Electricista	RD\$727,675.50																



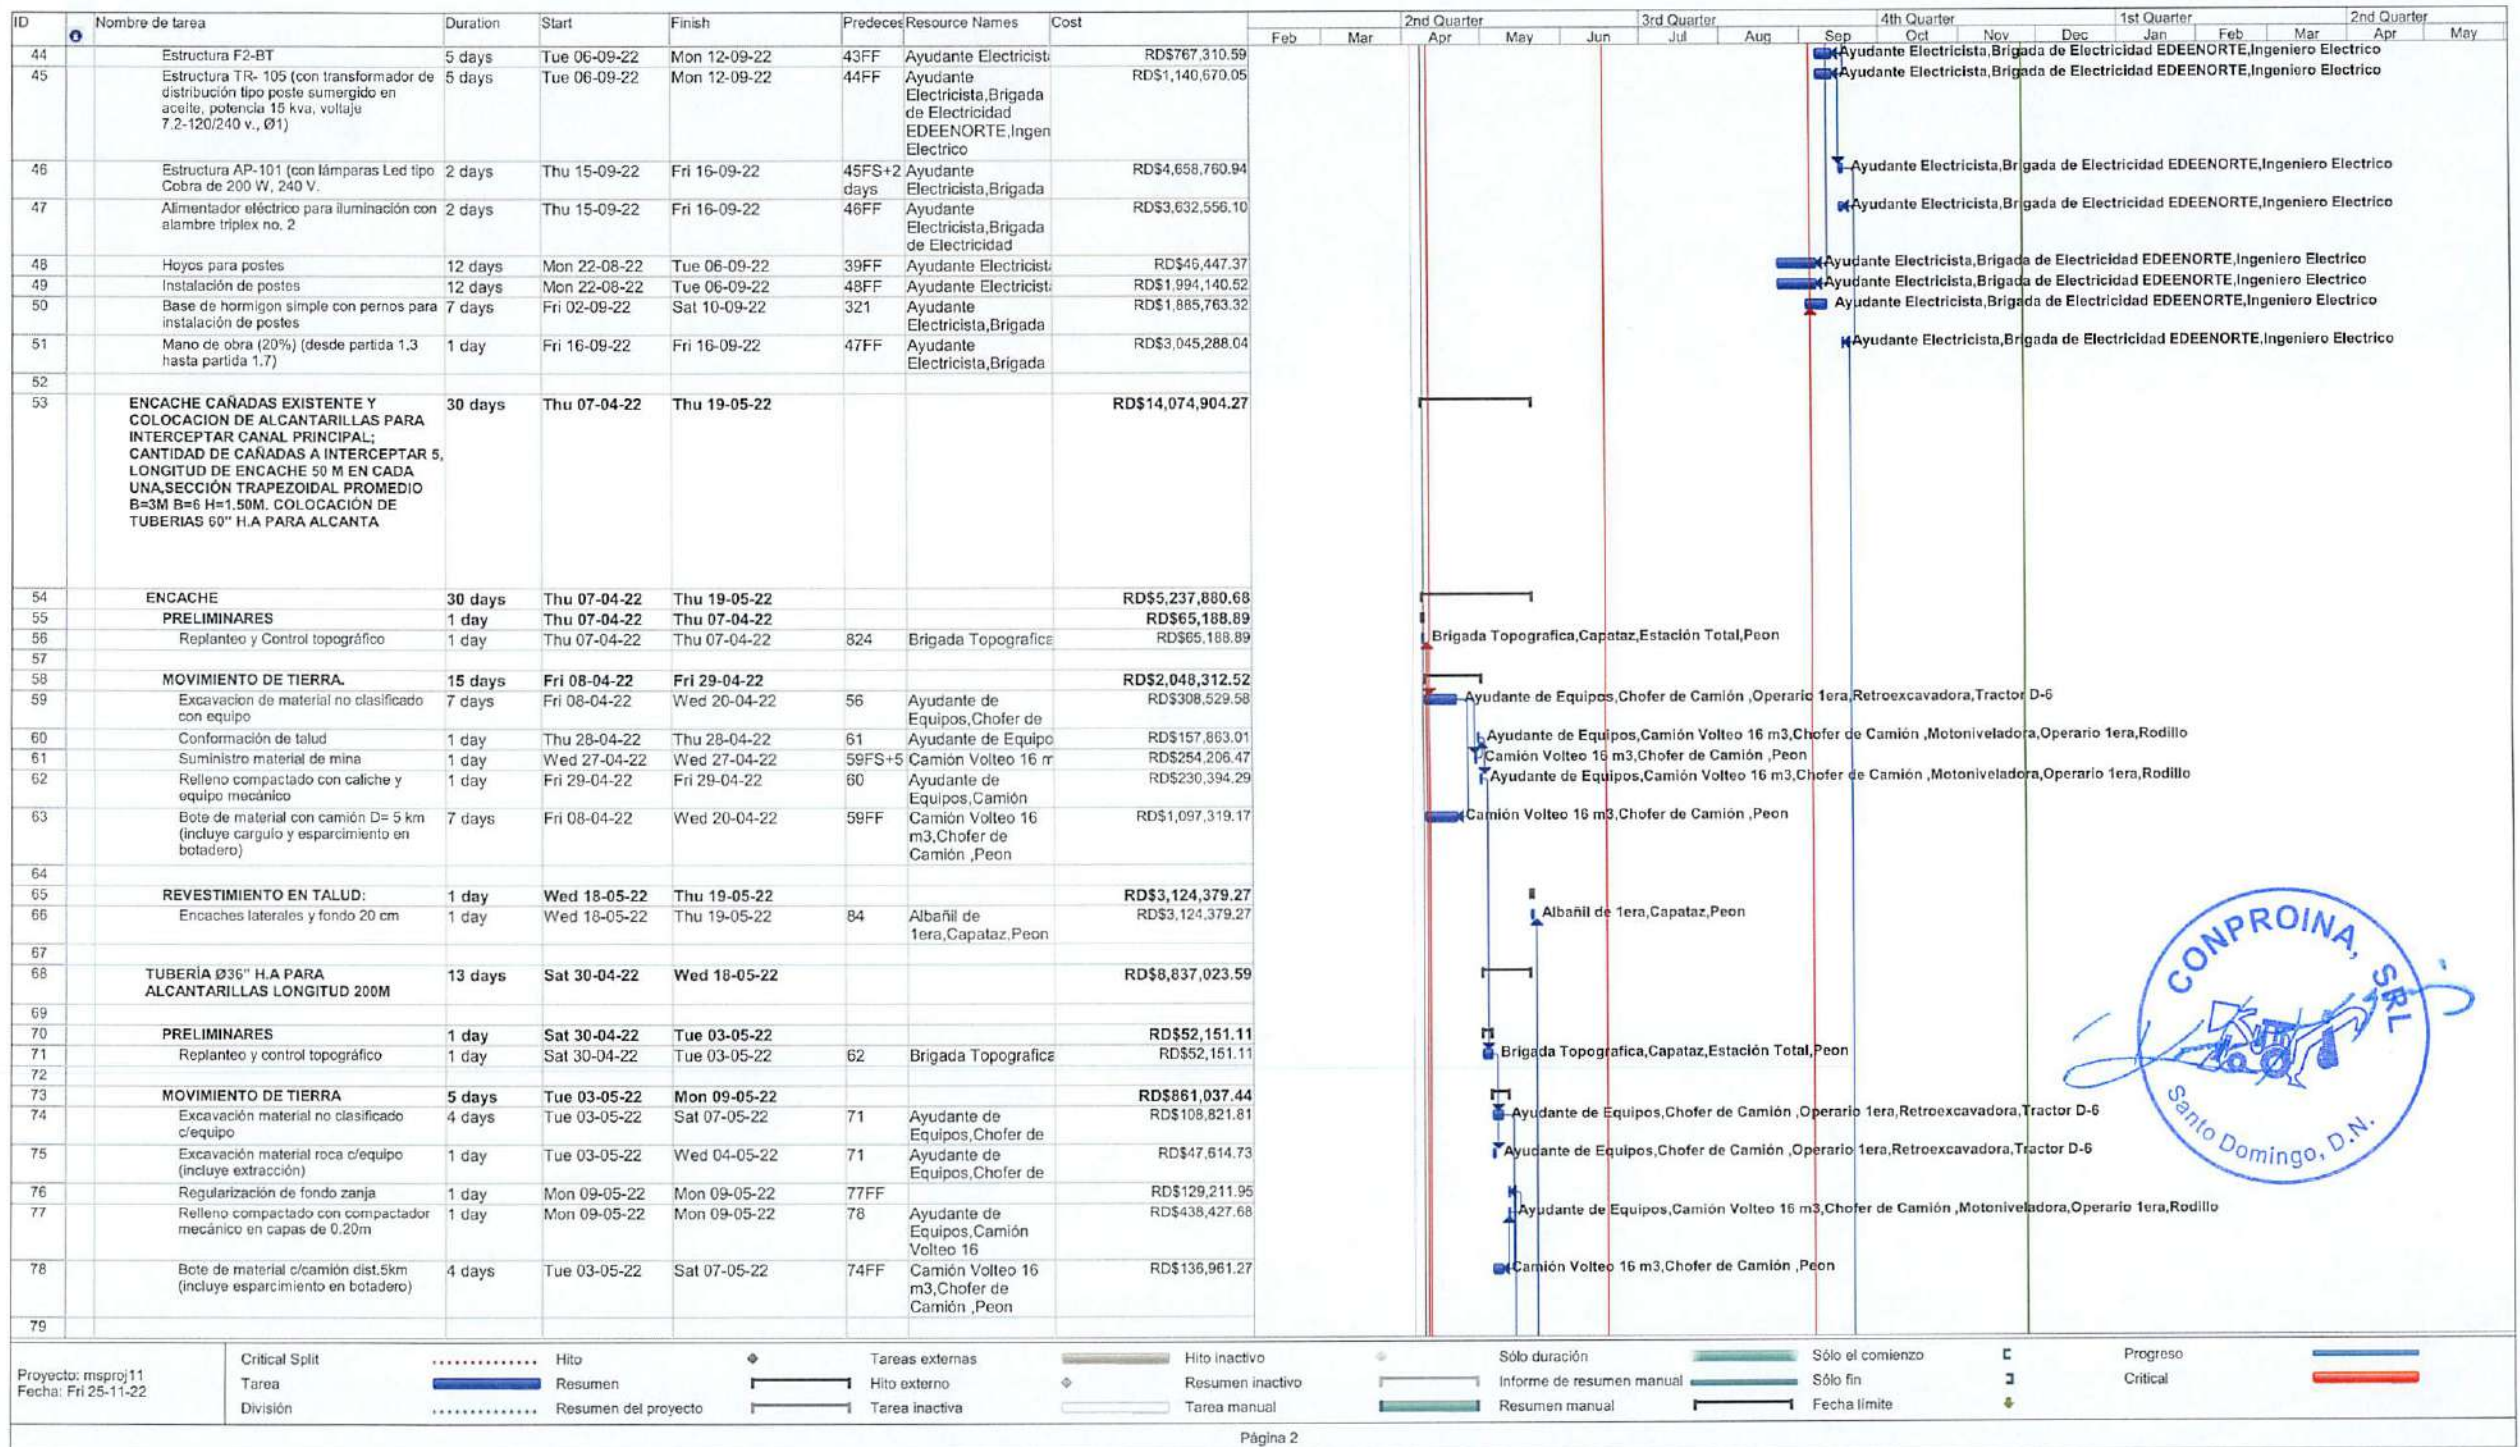

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Precedence	Resource Names	Cost	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
80	SUMINISTRO DE TUBERÍA	3 days	Tue 10-05-22	Thu 12-05-22			RD\$6,967,105.87																
81	De 60" H.A. Clase II	3 days	Tue 10-05-22	Thu 12-05-22	76	Director de Obra,Ing	RD\$6,967,105.87																
82																							
83	COLOCACIÓN DE TUBERÍA	7 days	Tue 10-05-22	Wed 18-05-22			RD\$747,493.05																
84	De 60" H.A. Clase II	7 days	Tue 10-05-22	Wed 18-05-22	81SS	Albañil de 1era,Cap	RD\$747,493.05																
85																							
86	CABEZAL DE DESCARGA	3 days	Tue 10-05-22	Thu 12-05-22	81SS	Albañil de 1era,Cap	RD\$209,236.12																
87																							
88	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y PAISAJISMO	20.5 days	Sat 17-09-22	Thu 13-10-22			RD\$56,375,105.02																
89																							
90	ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, PARQUES DE EJERCICIOS Y PAISAJISMO	19.5 days	Sat 17-09-22	Wed 12-10-22			RD\$6,577,404.32																
91																							
92	PRELIMINARES	0.5 days	Sat 17-09-22	Sat 17-09-22			RD\$50,251.80																
93	Replanteo	0.5 days	Sat 17-09-22	Sat 17-09-22	51	Brigada Topografica	RD\$50,251.80																
94																							
95	ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES (SEGÚN DISEÑO) (2 UD)	19 days	Mon 19-09-22	Wed 12-10-22			RD\$6,527,152.52																
96	Suministro y colocación de arena, e=0.15m	1 day	Fri 23-09-22	Fri 23-09-22	97FS+3	Camión Volteo 16 m3,Chofer de	RD\$477,347.62																
97	Piso de hormigón estampado en acerosos internos, e=0.15m	1 day	Mon 19-09-22	Mon 19-09-22	93	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$434,589.92																
98	Rueda giratoria	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	145	Capataz,Peon	RD\$475,184.49																
99	Balancín	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	98FF	Capataz,Peon	RD\$443,505.52																
100	Tobogán	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	99FF	Capataz,Peon	RD\$1,254,605.46																
101	Columpio triple	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	100FF	Capataz,Peon	RD\$506,863.45																
102	Barra escaladora o Juego de Pasamanos	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	101FF	Capataz,Peon	RD\$1,623,547.00																
103	Módulo de juegos múltiples	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	102FF	Capataz,Peon	RD\$649,418.80																
104	Tobogán con centro de juegos con deslizador	2 days	Tue 11-10-22	Wed 12-10-22	103FF	Capataz,Peon	RD\$662,090.26																
105																							
106	ÁREA DE SENDEROS	5 days	Mon 19-09-22	Fri 23-09-22			RD\$16,179,116.54																
107	Camino de hormigón para peatones, Ancho=1.20m	5 days	Mon 19-09-22	Fri 23-09-22	93	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$16,179,116.54																
108																							
109	EMBELLECIMIENTO Y JARDINERÍA GENERAL (INCLUYE SUMINISTRO, SEMBRADO Y MANTENIMIENTO POR 2 MESES)	20 days	Mon 19-09-22	Thu 13-10-22			RD\$33,618,584.16																
110	Grama	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	107	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$26,056,337.75																
111	Grava	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	110FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$633,720.52																
112	Árbol Mara	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	111FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$23,165.63																
113	Árbol Caoba	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	112FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$433,508.81																
114	Árbol Almácigo	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	113FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$21,946.38																
115	Árbol Avellano	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	114FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$77,412.29																
116	Árbol Caimito cimarrón	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	115FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$12,385.97																
117	Árbol Roble criollo	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	116FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$15,443.75																
118	Árbol Robillo	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	117FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$30,887.50																
119	Árbol Samán	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	118FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$15,443.75																
120	Árbol Frijolito	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	119FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$77,218.76																
121	Árbol Penda	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	120FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$38,609.38																
122	Árbol Grigri	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	121FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$46,331.25																
123	Árbol Guayacán	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	122FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$36,577.31																
124	Árbol Ceiba	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	123FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$11,611.84																
125	Árbol Caracolí	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	124FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$96,765.36																
126	Árbol Campeche	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	125FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$38,706.14																
127	Árbol Copey	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	126FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$77,412.29																
128	Árbol Juan Primero	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	127FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$38,648.08																
129	Árbol Caya amarilla	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	128FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$2,032.07																
130	Árbol Higuero	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	129FF	Capataz,Peon,Jardinero	RD\$40,641.45																

Proyecto: msproj11

Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split

Tarea

División

..... Hito

Resumen

..... Resumen del proyecto

◆ Tareas externas

— Hito externo

— Tarea inactiva

■ Hito inactivo

◆ Resumen inactivo

— Tarea manual

◆ Sólo duración

— Informe de resumen manual

— Resumen manual

■ Sólo el comienzo

— Sólo fin

— Fecha límite

■ Progreso

■ Critical



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	2nd Quarter					3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter								
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May							
131	Palma Real	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	130FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$464,473.72																							
132	Palma Cana	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	131FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$464,473.72																							
133	Palma Guano	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	132FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$464,473.72																							
134	Guáyiga	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	133FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$34,835.53																							
135	Arrayán	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	134FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$185,789.49																							
136	Busunuco	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	135FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$193,530.72																							
137	Aleli	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	136FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$365,773.06																							
138	Sauco amarillo	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	137FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$154,824.57																							
139	Doña Sanica	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	138FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$97,539.48																							
140	Oreja de Elefante	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	139FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$309,649.15																							
141	Costilla de Adán	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	140FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$270,943.01																							
142	Uva de playa	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	141FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$7,168.38																							
143	Tierra negra con abono	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	142FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$1,161,184.31																							
144	Requilete en áreas verdes	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	143FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$603,156.29																							
145	Tuberías y piezas de agua potable para regado de áreas verdes	12 days	Mon 26-09-22	Mon 10-10-22	144FF	Capataz, Peon, Jardiner	RD\$18,578.95																							
146																														
147	Suministro y colocación de banco de hormigón (Según diseño)	1 day	Thu 13-10-22	Thu 13-10-22	104	Capataz, Ingeniero Residente, Peon	RD\$509,218.03																							
148																														
149	Suministro y colocación de zafacones triples de reciclaje	1 day	Thu 13-10-22	Thu 13-10-22	147FF	Capataz, Ingeniero Residente, Peon	RD\$86,701.76																							
150																														
151	Limpieza final y continua	20 days	Mon 19-09-22	Thu 13-10-22	149FF	Capataz, Peon	RD\$401,463.99																							
152																														
153	CANCHA MIXTA Y GRADERÍAS (2 UD)	27.25 days	Tue 14-06-22	Wed 20-07-22			RD\$4,690,077.12																							
154																														
155	CANCHA MIXTA DE 32.00 M X 19.00 M	27.25 days	Tue 14-06-22	Wed 20-07-22			RD\$4,690,077.12																							
156																														
157	PRELIMINARES	1 day	Tue 14-06-22	Wed 15-06-22			RD\$50,251.80																							
158	Replanteo	1 day	Tue 14-06-22	Wed 15-06-22	20	Brigada Topografica	RD\$50,251.80																							
159																														
160	MOVIMIENTO DE TIERRA	3 days	Tue 14-06-22	Sat 18-06-22			RD\$91,425.96																							
161	Excavación de material no clasificado c/equipo	1 day	Wed 15-06-22	Fri 17-06-22	158	Ayudante de Equipos, Chofer de	RD\$11,712.23																							
162	Suministro de material de mina	1 day	Fri 17-06-22	Sat 18-06-22	161	Camión Volteo 16 m3, Chofer de	RD\$25,771.60																							
163	Relleno de material compactado c/compactador mecánico	1 day	Fri 17-06-22	Sat 18-06-22	162FF	Ayudante de Equipos, Camión	RD\$16,276.38																							
164	Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero)	1 day	Tue 14-06-22	Wed 15-06-22	158FF	Camión Volteo 16 m3, Chofer de	RD\$37,665.75																							
165																														
166	HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:	5 days	Mon 20-06-22	Fri 24-06-22			RD\$643,751.48																							
167	Zapata de muros bordillo (0.45m x 0.20m)	1 day	Mon 20-06-22	Mon 20-06-22	163	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$360,713.75																							
168	Zapata columnas soporte (0.80m x 1.70m x 0.50m)	1 day	Mon 20-06-22	Mon 20-06-22	167SS	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$98,950.12																							
169	Columnas soporte	1 day	Fri 24-06-22	Fri 24-06-22	168FS+	Albañil de 1era, Ayu	RD\$184,087.61																							
170																														

ID	Nombre de tarea /	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	2nd Quarter					3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter								
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May							
183	MISCELANEOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 day	Tue 19-07-22	Wed 20-07-22			RD\$351,563.88																							
184	Tablero de fibra de vidrio para basketball (incluye aro y malla)	1 day	Tue 19-07-22	Wed 20-07-22	193	Capataz, Ingeniero Residente, Peon	RD\$233,217.83																							
185	Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10" y Tubo de 3" x 2")	1 day	Tue 19-07-22	Wed 20-07-22	184FF	Ayudante de Herreria, Capataz, He	RD\$90,236.10																							
186	Malla de volleyball	1 day	Tue 19-07-22	Wed 20-07-22	185FF	Capataz, Peon	RD\$28,109.95																							
187																														
188	PINTURA	3.75 days	Thu 14-07-22	Tue 19-07-22			RD\$426,420.42																							
189	Pintura acrilica en columnas	0.25 days	Thu 14-07-22	Thu 14-07-22	178FS+	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$8,524.52																							
190	Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color rojo positivo	2.5 days	Thu 14-07-22	Mon 18-07-22	189	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$241,568.70																							
191	Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color verde	2.5 days	Thu 14-07-22	Mon 18-07-22	189	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$80,771.58																							
192	Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color azul	1 day	Mon 18-07-22	Tue 19-07-22	191	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$89,475.15																							
193	Señalización en cancha con líneas 5 cm, color blanco	1 day	Mon 18-07-22	Tue 19-07-22	192FF	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$6,080.47																							
194																														
195	GRADERIA EN CANCHA MIXTA	38 days	Tue 14-06-22	Tue 02-08-22			RD\$2,059,563.02																							
196																														
197	PRELIMINARES	1 day	Tue 14-06-22	Wed 15-06-22			RD\$20,100.72																							
198	Replanteo	1 day	Tue 14-06-22	Wed 15-06-22	158SS	Brigada Topografica	RD\$20,100.72																							
199																														
200	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 days	Wed 15-06-22	Sat 18-06-22			RD\$19,247.26																							
201	Excavación de material no clasificado c/equipo	1 day	Wed 15-06-22	Fri 17-06-22	198	Ayudante de Equipos, Chofer de Camión	RD\$4,424.55																							
202	Relleno de material compactado c/compactador mecánico	1 day	Fri 17-06-22	Sat 18-06-22	203	Ayudante de Equipos, Camión	RD\$1,275.99																							
203	Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero)	1 day	Wed 15-06-22	Fri 17-06-22	201FF	Camión Volteo 16 m3, Chofer de	RD\$13,546.72																							
204																														
205	HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:	21 days	Mon 20-06-22	Fri 15-07-22			RD\$713,100.92																							
206	Zapata de muro de 6" (0.45m x 0.25m)	3 days	Mon 20-06-22	Wed 22-06-22	202	Albañil de 1era, Ayud	RD\$158,357.08																							
207	Viga V1	3 days	Wed 29-06-22	Sat 02-07-22	206FS+	Albañil de 1era, Ayud	RD\$71,013.31																							
208	Losa de asiento e=0.13 m	3 days	Tue 12-07-22	Fri 15-07-22	207FS+	Albañil de 1era, Ayud	RD\$483,730.53																							
209																														
210	MURO DE BLOQUES	2.5 days	Thu 23-06-22	Sat 25-06-22			RD\$385,740.67																							
211	Bloque de muro de 6" B.N.P.	1 day	Thu 23-06-22	Thu 23-06-22	206	Albañil de 1era, Capa	RD\$126,444.61																							
212	Bloque de muro de 6" S.N.P.	1.5 days	Fri 24-06-22	Sat 25-06-22	211	Albañil de 1era, Capa	RD\$259,296.06																							
213																														
214	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	7 days	Fri 15-07-22	Mon 25-07-22			RD\$626,654.36																							
215	Pañete en muros	2 days	Mon 18-07-22	Tue 19-07-22	218	Albañil de 1era, Capa	RD\$123,574.78																							
216	Pañete en vigas	2 days	Mon 18-07-22	Tue 19-07-22	215FF	Albañil de 1era, Capa	RD\$11,725.56																							
217	Pañete pulido en asientos	2 days	Mon 18-07-22	Tue 19-07-22	216FF	Albañil de 1era, Capa	RD\$196,444.52																							
218	Fraguache	1 day	Fri 15-07-22	Sat 16-07-22	208	Albañil de 1era, Capa	RD\$39,444.97																							
219	Cantos	4 days	Wed 20-07-22	Mon 25-07-22	215	Albañil de 1era, Capa	RD\$255,464.53																							
220																														
221	PINTURA	5 days	Tue 26-07-22	Mon 01-08-22			RD\$163,708.48																							
222	Pintura de base en muros	2 days	Tue 26-07-22	Thu 28-07-22	219FS+	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$81,854.24																							
223	Pintura acrilica en muros	3 days	Thu 28-07-22	Mon 01-08-22	222	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$81,854.24																							
224																														
225	MISCELANEOS	24 days	Mon 04-07-22	Tue 02-08-22			RD\$131,010.61																							
226	Barandas de H.G. sobre muros de bloques	1 day	Tue 02-08-22	Tue 02-08-22	223	Albañil de 1era, Capataz, Peon	RD\$120,985.22																							
227	Escalones de cemento	2 days	Mon 04-07-22	Tue 05-07-22	207	Albañil de 1era, Capa	RD\$10,025.39																							
228																														
229	CANCHA DE VOLEYBALL Y GRADERÍAS (2 UD)	17.5 days	Tue 14-06-22	Thu 07-07-22			RD\$4,476,989.78																							
230																														

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split

Tarea

División

.....

.....

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Hito externo

Tarea inactiva

Tareas externas

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

◆

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Critical

Página 5

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		1st Quarter		2nd Quarter	
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
231	CANCHA VOLEYBALL DE 32.00 M X 19.00 M	17,5 days	Tue 14-06-22	Thu 07-07-22			RD\$4,476,989.78										
232																	
233	PRELIMINARES	0,5 days	Tue 14-06-22	Tue 14-06-22			RD\$50,251.80										
234	Replanteo	0,5 days	Tue 14-06-22	Tue 14-06-22	158SS	Brigada Topografica	RD\$50,251.80										
235																	
236	MOVIMIENTO DE TIERRA	3 days	Wed 15-06-22	Mon 20-06-22			RD\$91,425.97										
237	Excavación de material no clasificado c/equipo	1 day	Wed 15-06-22	Wed 15-06-22	234	Ayudante de Equipos,Chofer de	RD\$11,712.23										
238	Suministro de material de mina	1 day	Sat 18-06-22	Mon 20-06-22	237FS+	Camión Volteo 16 m	RD\$27,531.51										
239	Relleno de material compactado c/compactador mecánico	1 day	Sat 18-06-22	Mon 20-06-22	238FF	Ayudante de Equipos,Camión	RD\$15,263.60										
240	Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero)	1 day	Wed 15-06-22	Wed 15-06-22	237FF	Camión Volteo 16 m3,Chofer de	RD\$36,918.63										
241																	
242	HORMIGÓN ARMADO F'C 210 KG/CM² EN:	1 day	Mon 20-06-22	Tue 21-06-22			RD\$360,713.75										
243	Zapata de muros bordillo (0.45m x 0.20m)	1 day	Mon 20-06-22	Tue 21-06-22	239	Albañil de 1era,Ayudante de	RD\$360,713.75										
244																	
245	BLOQUES DE HORMIGÓN EN:	1 day	Mon 20-06-22	Tue 21-06-22			RD\$297,617.56										
246	Bordillo de 0.15 m (B.N.P.)	1 day	Mon 20-06-22	Tue 21-06-22	243SS	Albañil de 1era,Ayud	RD\$297,617.56										
247																	
248	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	3 days	Tue 28-06-22	Thu 30-06-22			RD\$64,825.07										
249	Pañete en exterior	1 day	Wed 29-06-22	Wed 29-06-22	251	Albañil de 1era,Capi	RD\$13,480.89										
250	Pañete liso en columnas	1 day	Wed 29-06-22	Wed 29-06-22	249FF	Albañil de 1era,Capi	RD\$22,945.59										
251	Fraguache	1 day	Tue 28-06-22	Tue 28-06-22	255FS+	Albañil de 1era,Capi	RD\$5,115.33										
252	Cantos en general	1 day	Thu 30-06-22	Thu 30-06-22	250	Albañil de 1era,Capi	RD\$23,283.26										
253																	
254	TERMINACIÓN DE PISOS	4 days	Tue 21-06-22	Sat 25-06-22			RD\$2,718,024.93										
255	De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10 m)	4 days	Tue 21-06-22	Sat 25-06-22	246	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$2,718,024.93										
256																	
257	MISCELANEOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 day	Wed 06-07-22	Thu 07-07-22			RD\$118,346.05										
258	Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10' y Tubo de 3" x 2")	1 day	Wed 06-07-22	Thu 07-07-22	264	Ayudante de Herreria,Herrero,Pe	RD\$90,236.10										
259	Malla de volleyball	1 day	Wed 06-07-22	Thu 07-07-22	258FF	Capataz,Peon	RD\$28,109.95										
260																	
261	PINTURA	3 days	Sat 02-07-22	Wed 06-07-22			RD\$775,784.65										
262	Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color rojo positivo	2 days	Sat 02-07-22	Tue 05-07-22	252FS+	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$241,568.70										
263	Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color verde	2 days	Sat 02-07-22	Tue 05-07-22	262FF	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$528,135.48										
264	Señalización en cancha con líneas 5 cm, color blanco	1 day	Tue 05-07-22	Wed 06-07-22	263	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$6,080.47										
265																	
266	GRADERÍA EN CANCHA VOLEYBALL	34 days	Tue 14-06-22	Thu 28-07-22			RD\$2,075,345.77										
267																	
268	PRELIMINARES	0,5 days	Tue 14-06-22	Tue 14-06-22			RD\$50,251.80										
269	Replanteo	0,5 days	Tue 14-06-22	Tue 14-06-22	158SS	Brigada Topografica	RD\$50,251.80										
270																	
271	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 days	Wed 15-06-22	Fri 17-06-22			RD\$19,378.02										
272	Excavación de material no clasificado c/equipo	1 day	Wed 15-06-22	Wed 15-06-22	269	Ayudante de Equipos,Chofer de	RD\$4,555.31										
273	Relleno de material compactado c/compactador mecánico	1 day	Fri 17-06-22	Fri 17-06-22	274	Ayudante de Equipos,Camión	RD\$1,275.99										
274	Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero)	1 day	Wed 15-06-22	Wed 15-06-22	272FF	Camión Volteo 16 m3,Chofer de	RD\$13,546.72										
275																	
276	HORMIGÓN ARMADO F'C 210 KG/CM² EN:	13 days	Sat 18-06-22	Tue 05-07-22			RD\$713,734.40										
277	Zapata de muro de 6" (0.45m x 0.25m)	1 day	Sat 18-06-22	Mon 20-06-22	273	Albañil de 1era,Ayud	RD\$158,990.56										

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split

Tarea

División

.....

.....

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

—

—

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

◆

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

■

■

+

Progreso

Critical


CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

Página 6

CONPROINA, S.R.L.

Santo Domingo, D.N.

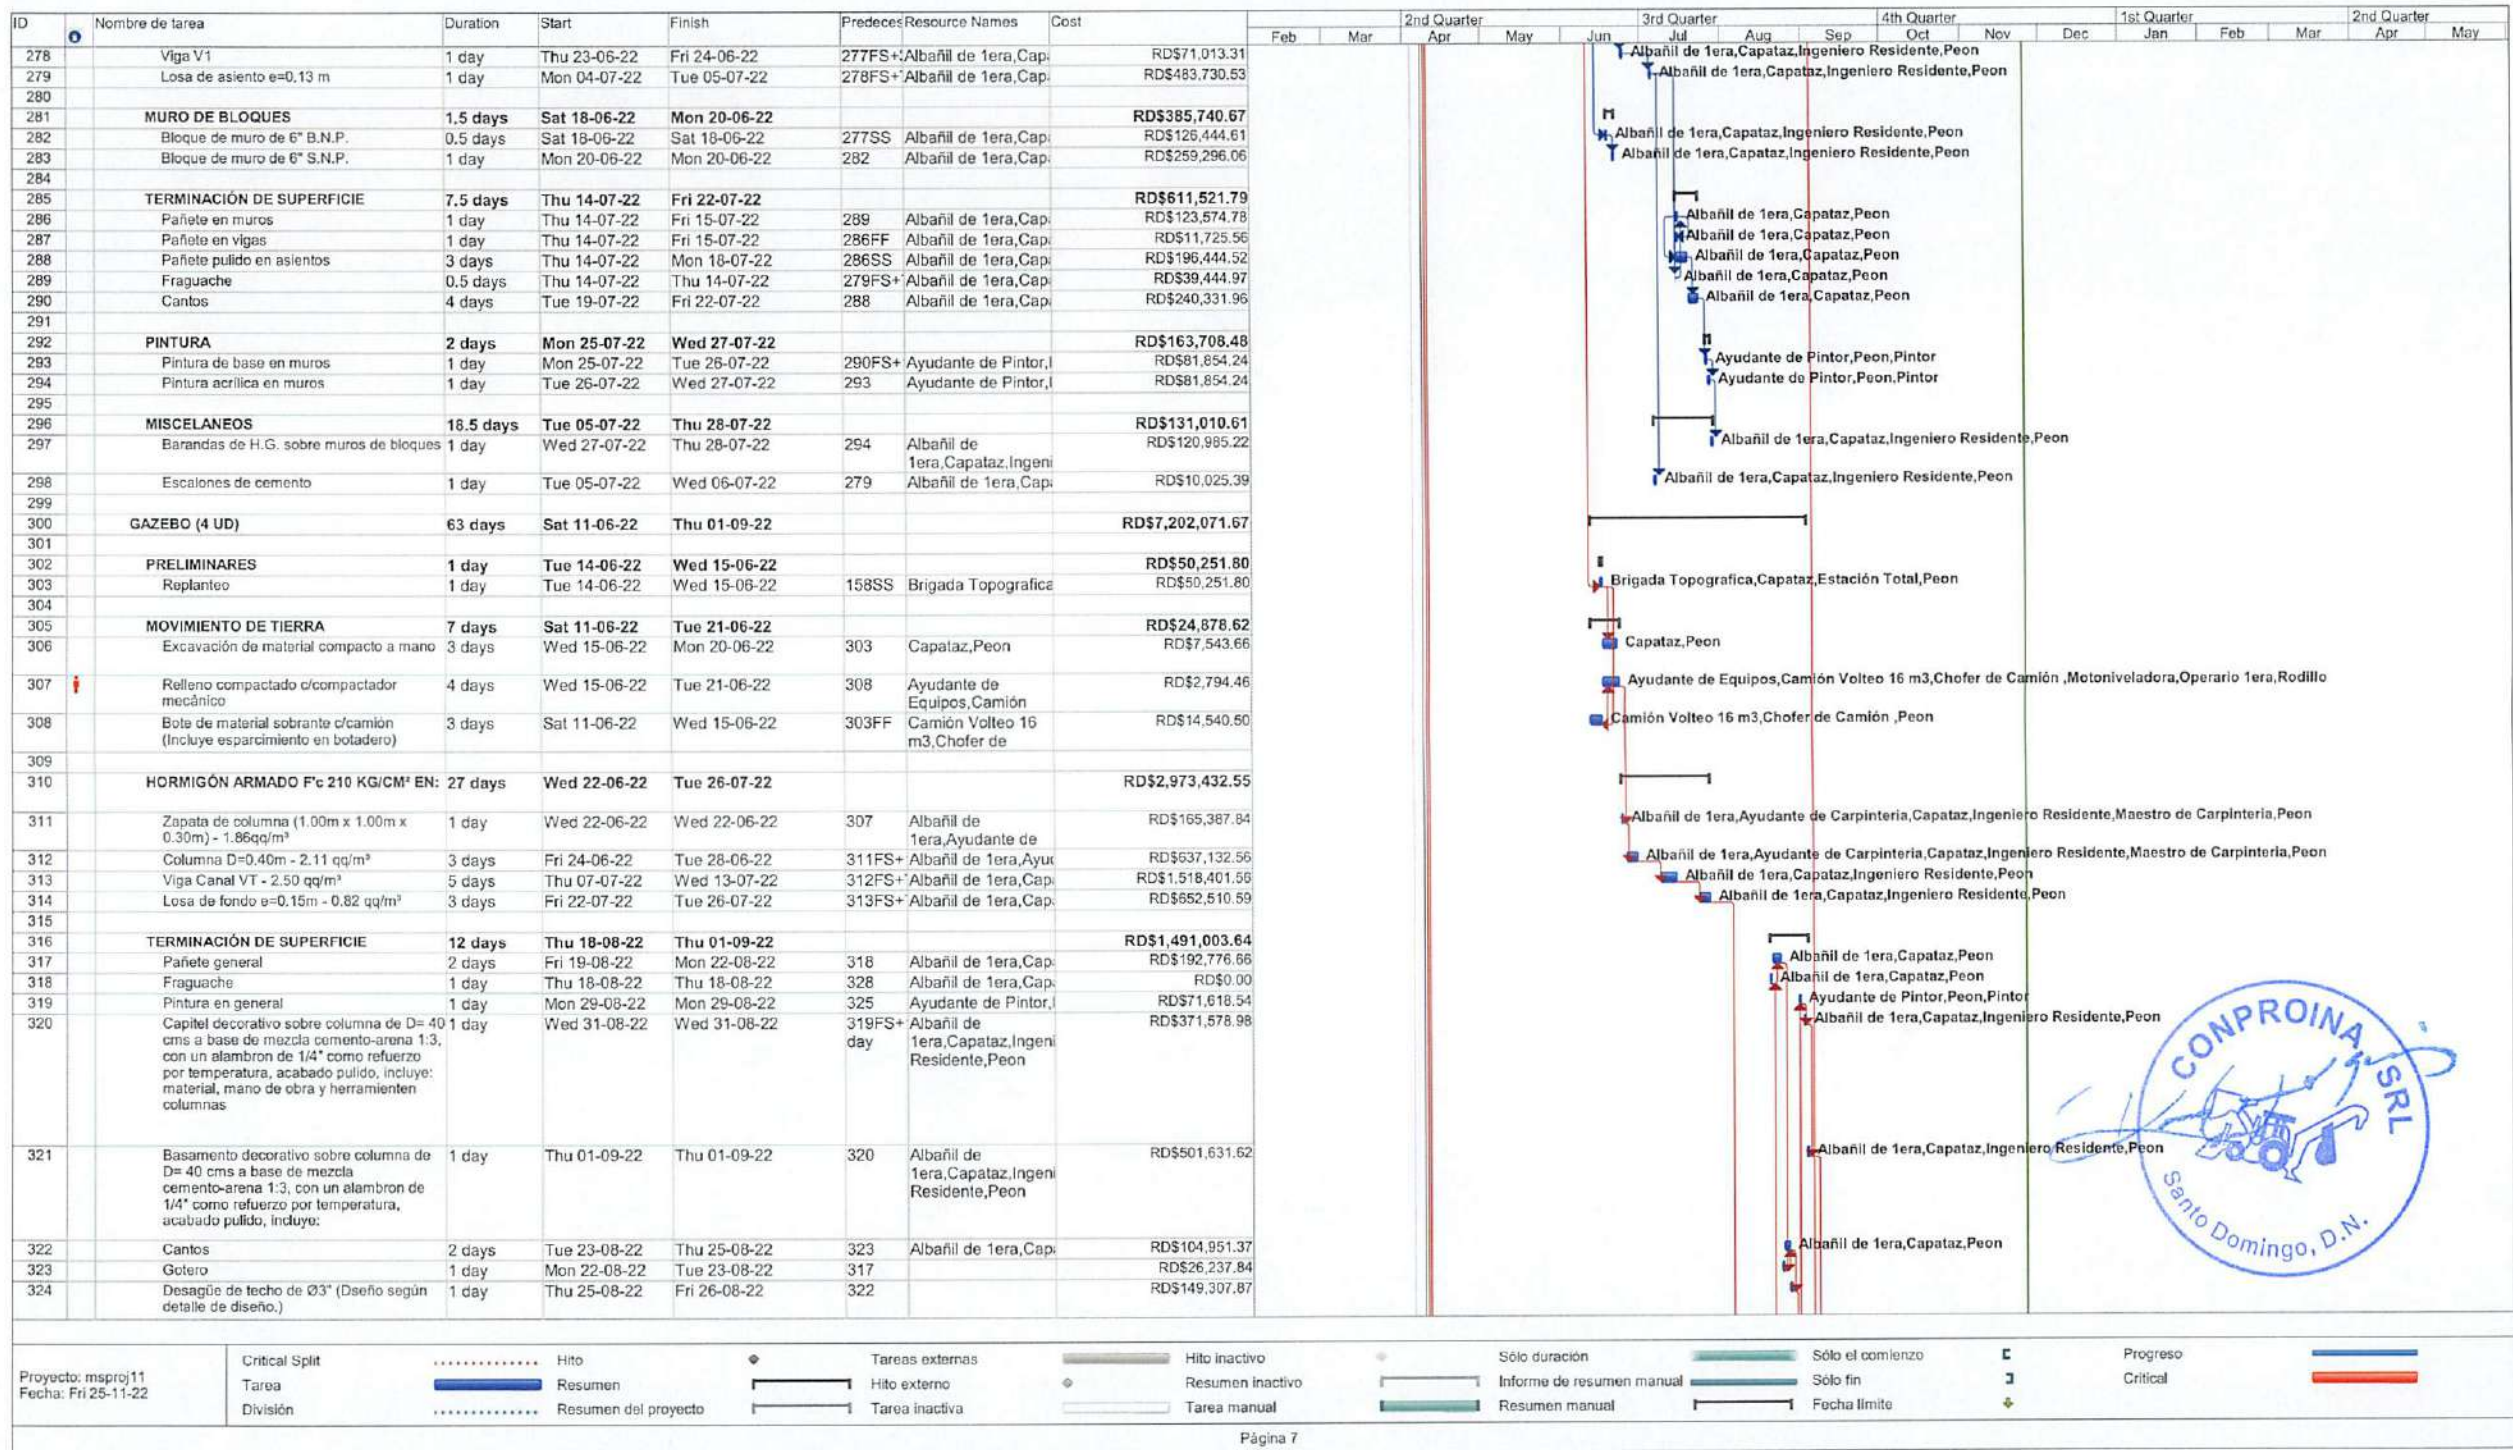

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter		1st Quarter		2nd Quarter		
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
325	Pintura Impermeabilizante en canaleta (3 Manos)	1 day	Fri 26-08-22	Sat 27-08-22	324	Ayudante de Pintor, Peon, Pintor	RD\$72,900.76											
326																		
327	SUMINISTRO E INTALACION DE TECHO EN ESTRUCTURA METALICA	10 days	Thu 04-08-22	Wed 17-08-22			RD\$2,247,514.69											
328	Channel 6" x 2" x 15.10' (vigas)	10 days	Thu 04-08-22	Wed 17-08-22	314FS+	Ayudante de Herreri	RD\$1,107,305.36											
329	Channel 4" x 2" x 30' (correas)	10 days	Thu 04-08-22	Wed 17-08-22	328FF	Ayudante de Herreri	RD\$144,915.80											
330	HSS 6"x 6" x 3/16" x 0.70' para unión	7 days	Mon 08-08-22	Wed 17-08-22	328FF	Ayudante de Herreri	RD\$26,320.18											
331	Cubierta de aluzinc calibre 26 liso (Dseño según detalle de diseño)	3 days	Fri 12-08-22	Wed 17-08-22	328FF	Ayudante de Herreria, Herrero, Ing	RD\$379,203.19											
332	Cubierta en Tejas Plastica (Dseño según detalle de diseño)	5 days	Wed 10-08-22	Wed 17-08-22	328FF	Ayudante de Herreria, Herrero, Ing	RD\$589,770.16											
333	Cubrefalta techo	2 days	Mon 15-08-22	Wed 17-08-22	328FF	Ayudante de Herreri	RD\$0.00											
334																		
335	MISCELANEOS	63 days	Sat 11-06-22	Thu 01-09-22			RD\$414,990.37											
336	Acera perimetral de 1.00 M	1 day	Thu 18-08-22	Thu 18-08-22	328	Albañil de 1era, Capataz, Peon	RD\$280,292.99											
337	Limpieza final y continual	63 days	Sat 11-06-22	Thu 01-09-22	321FF	Capataz, Peon	RD\$134,697.38											
338																		
339	ESTACIÓN DE POLICIA (14.10 M X 7.50 M)	111.75 days	Thu 01-09-22	Tue 24-01-23			RD\$8,392,967.97											
340																		
341	PRELIMINARES	5 days	Thu 01-09-22	Wed 07-09-22			RD\$905,708.80											
342	Remoción de capa vegetal 330m² e=0.20m	1 day	Fri 02-09-22	Fri 02-09-22	321	Ayudante de Equipos, Operario	RD\$6,897.43											
343	Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero)	1 day	Thu 01-09-22	Thu 01-09-22	321FF	Camión Volteo 16 m3, Chofer de	RD\$60,473.84											
344	Charrancho y replato	1 day	Sat 03-09-22	Mon 05-09-22	342	Ayudante de Carpin	RD\$686,117.10											
345	Caseta de Materiales 12' x 32'	3 days	Sat 03-09-22	Wed 07-09-22	342	Ayudante de Carpin	RD\$121,565.16											
346	Fumigación	1 day	Mon 05-09-22	Tue 06-09-22	344	Capataz, Peon	RD\$30,655.27											
347																		
348	MOVIMIENTO DE TIERRA:	7 days	Tue 06-09-22	Wed 14-09-22			RD\$65,083.67											
349	Excavación en material no clasificado a mano	1 day	Tue 06-09-22	Wed 07-09-22	346	Capataz, Peon	RD\$19,971.13											
350	Relleno de material compactado c/compactador mecánico	1 day	Wed 14-09-22	Wed 14-09-22	370	Ayudante de Equipos, Camión	RD\$23,579.09											
351	Relleno de reposición	1 day	Wed 14-09-22	Wed 14-09-22	350FF	Capataz, Peon	RD\$10,932.91											
352	Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero)	1 day	Tue 06-09-22	Wed 07-09-22	349FF	Camión Volteo 16 m3, Chofer de	RD\$10,600.54											
353																		
354	HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:	39 days	Wed 07-09-22	Thu 27-10-22			RD\$1,105,347.54											
355	Zapata para muros - 0.97 qq/m³	3 days	Wed 07-09-22	Sat 10-09-22	352	Albañil de 1era, Ayud	RD\$181,064.03											
356	Zapata para muros - 1.02 qq/m³	3 days	Wed 07-09-22	Sat 10-09-22	355FF	Albañil de 1era, Ayud	RD\$7,612.83											
357	Zapata para columnas - 1.83 qq/m³	3 days	Wed 07-09-22	Sat 10-09-22	356FF	Albañil de 1era, Ayud	RD\$18,155.84											
358	Columnas de Amarre 0.15m x 0.20m (10ud) - 4.13 qq/m³	2 days	Wed 28-09-22	Fri 30-09-22	372	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$69,443.59											
359	Columnas circulares d=0.25m - 4.07 qq/m³	2 days	Fri 30-09-22	Mon 03-10-22	358	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$44,957.22											
360	Vigas de Amarre 0.15m x 0.20m x 43.00 a nivel de piso - 4.87 qq/m³	2 days	Tue 04-10-22	Wed 05-10-22	359	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$68,913.80											
361	Vigas de Amarre 0.15m x 0.20m a nivel de techo - 4.87 qq/m³	2 days	Thu 06-10-22	Fri 07-10-22	360	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$68,913.80											
362	Viga en de carga 0.20m x 0.30m - 4.17 qq/m³	2 days	Sat 08-10-22	Tue 11-10-22	361	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$16,836.79											
363	Refuerzo plano 0.20m x 0.30m L=6.50m	2 days	Fri 14-10-22	Mon 17-10-22	362FS+	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$158,950.90											
364	Dinteles (0.15m x 0.50m) - 2.98 qq/m³	3 days	Fri 21-10-22	Tue 25-10-22	363FS+	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$103,358.33											
365	Losa de Techo e=0.12m - 1.21 qq/m³	3 days	Mon 24-10-22	Thu 27-10-22	367	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$323,469.38											
366	Viga de carga en arco (0.20m x 0.30m) - 4.69 qq/m³	2 days	Sat 08-10-22	Tue 11-10-22	362FF	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$16,773.85											
367	Losa en arco convencional e=0.10m - 1.34 qq/m³	3 days	Thu 20-10-22	Mon 24-10-22	366FS+	Albañil de 1era, Capataz, Ingeni	RD\$26,887.18											
368																		
369	MUROS DE BLOQUES	43 days	Mon 12-09-22	Fri 04-11-22			RD\$784,799.48											

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split

Tarea

División

.....

.....

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

—

—

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

—

—

—

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea inactiva

◆

—

—

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

—

—

—

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

—

—

—

Progreso


Critical

—

—

—

Página 8

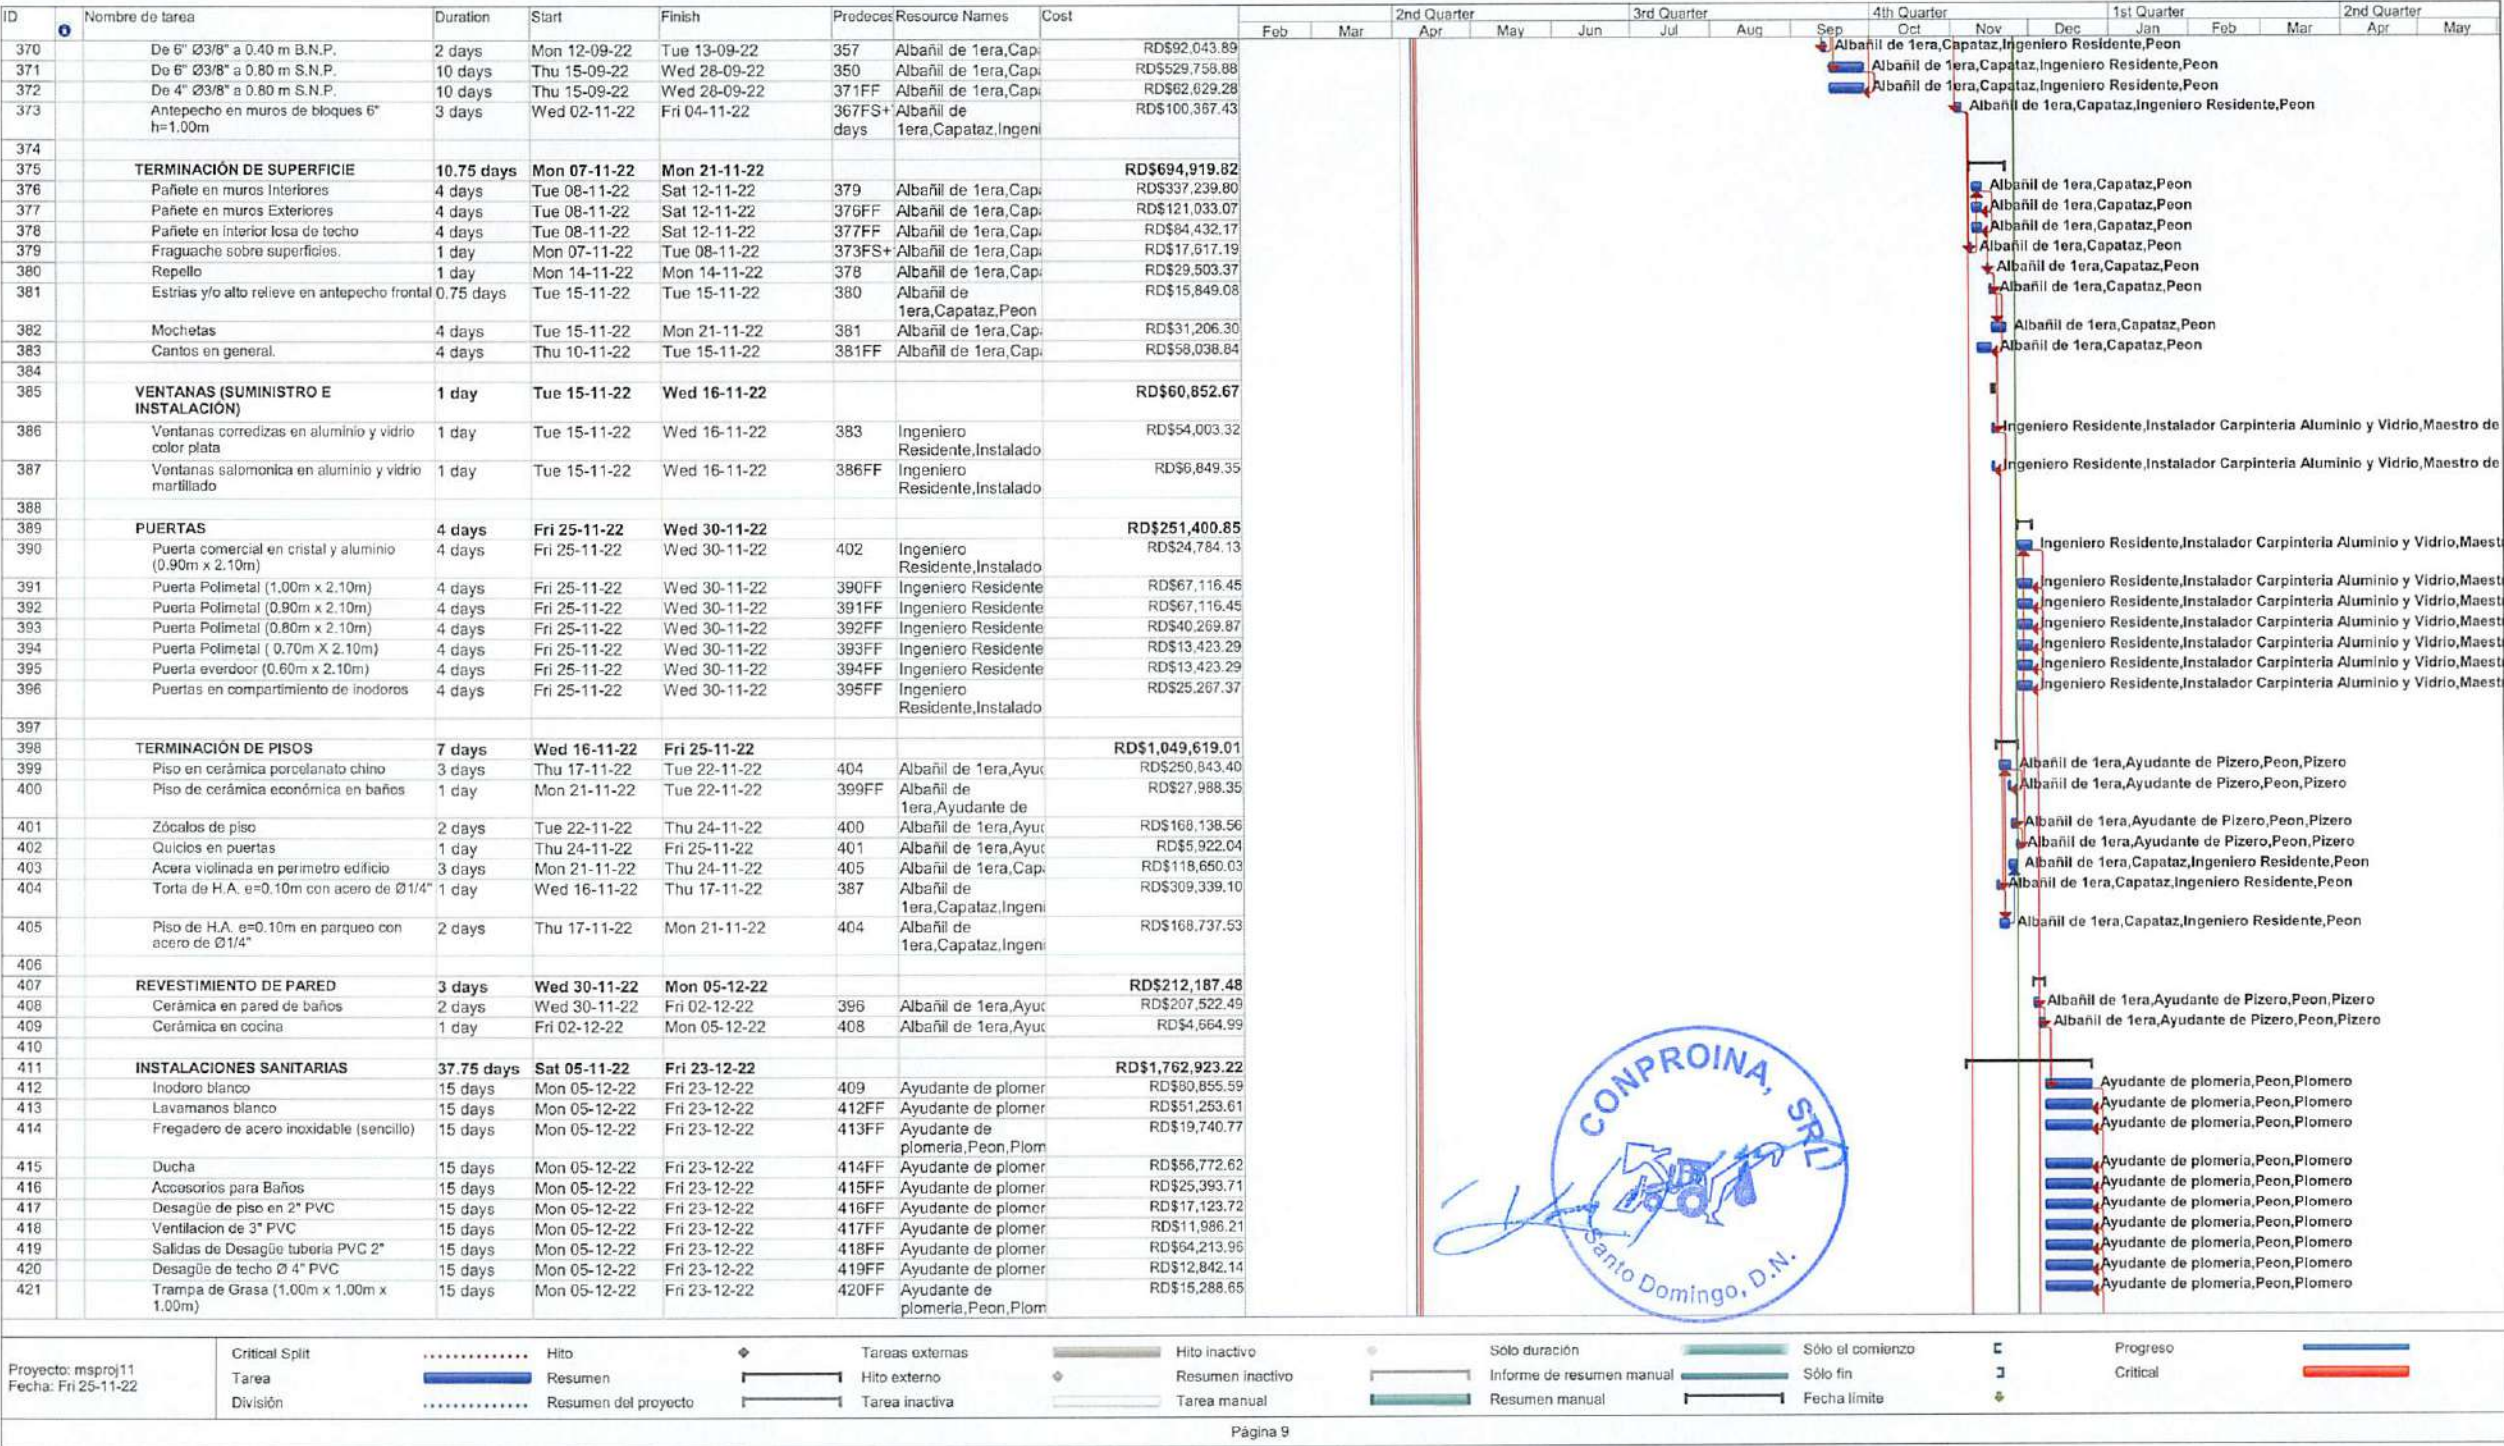

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	2nd Quarter					3rd Quarter		4th Quarter		1st Quarter		2nd Quarter	
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
422	Registro Sanitario (0.60m x 0.60m x 0.70m)	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	421FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$47,916.41													
423	Cisterna para 4000 gl (3.6m x 3.00m x 2.00m)	20 days	Mon 28-11-22	Fri 23-12-22	422FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$212,583.07													
424	Cámara Septica (1.70m x 3.40m x 1.60m)	20 days	Mon 28-11-22	Fri 23-12-22	423FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$102,400.91													
425	Llave de chorro	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	424FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$7,453.87													
426	Tinaco de 500 gls	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	425FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$17,606.98													
427	Pozo tubular para agua potable	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	426FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$536,931.63													
428	Filtrante en 8"	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	427FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$119,230.41													
429	Bomba Myers para cisterna de 2HP	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	428FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$44,126.94													
430	Tanque hidroneumatico de 120 gls	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	429FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$121,162.72													
431	Suministro e instalación Plafond en PVC en baños	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	430FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$22,716.95													
432	Sistema sanitario para cárceles (prevision fondos)	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	431FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$55,272.37													
433	Suministro de tuberías y piezas en PVC para aguas residuales	15 days	Sat 05-11-22	Thu 24-11-22	373	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$18,950.53													
434	Suministro de tuberías y piezas en PVC para agua potable	15 days	Sat 05-11-22	Thu 24-11-22	433FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$23,688.16													
435	Mano de obra plomero	15 days	Mon 05-12-22	Fri 23-12-22	432FF	Ayudante de plomeria,Peon,Plomero	RD\$77,412.29													
436																				
437	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23			RD\$518,564.18													
438	Salidas de luces cenitales	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	435	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$69,265.76													
439	Salidas interruptores simples	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	438FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$30,573.52													
440	Salidas interruptores dobles	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	439FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$6,304.21													
441	Salidas para Tomacorriente 120V	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	440FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$26,947.65													
442	Salidas para Tomacorriente 220V	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	441FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$9,784.79													
443	Caja de Breakers (8 circuitos)	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	442FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$8,448.78													
444	Registros eléctricos	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	443FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$4,974.51													
445	Acometida desde transformador hasta medidor	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	444FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$51,180.64													
446	Salidas para telefonos.	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	445FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$102,361.28													
447	Salidas para red de data y PC	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	446FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$3,316.34													
448	Salidas para abanicos de pared	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	447FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$11,370.32													
449	Abanicos KDK de pared (suministro y colocación)	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	448FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$52,697.02													
450	Tuberías y piezas materiales eléctricos	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	449FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$7,106.45													
451	Mano de obra electricista	15 days	Fri 23-12-22	Fri 13-01-23	450FF	Ayudante Electricista,Ingeniero Electrico,Peon,Tecnico	RD\$134,232.91													
452	TERMINACIÓN DE TECHO	8 days	Fri 13-01-23	Tue 24-01-23			RD\$302,819.11													
453	Fino en techo	2 days	Fri 13-01-23	Mon 16-01-23	451	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$93,040.67													
454	Zabalota en techo	2 days	Mon 16-01-23	Wed 18-01-23	453	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$9,831.78													
455	Impermeabilizante en techo	2 days	Fri 20-01-23	Tue 24-01-23	456	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$188,633.86													
456	Gotero ranurado	2 days	Wed 18-01-23	Fri 20-01-23	454	Albañil de 1era,Capataz,Peon	RD\$11,312.80													
457																				
458	TERMINACIÓN DE COCINA	5 days	Wed 30-11-22	Wed 07-12-22			RD\$99,928.99													
459	Gabinete de piso en pino tratado y plywood	5 days	Wed 30-11-22	Wed 07-12-22	396	Ayudante de Carpinteria,Maestro de Carpinteria,Peon	RD\$32,190.63													
460	Gabinete de pared en pino tratado y plywood	5 days	Wed 30-11-22	Wed 07-12-22	459FF	Ayudante de Carpinteria,Maestro de Carpinteria,Peon	RD\$32,190.63													
461	Muros de apoyo para tope de granito	5 days	Wed 30-11-22	Wed 07-12-22	460FF	Capataz,Ingeniero Residente,Peon	RD\$6,967.11													
462	Tope de marmolite en cocina	5 days	Wed 30-11-22	Wed 07-12-22	461FF	Ayudante de Pizero,Peon,Pizero	RD\$28,580.62													
463																				
464	PINTURA EN GENERAL	8 days	Wed 07-12-22	Fri 16-12-22			RD\$203,292.34													
465	Acrylica en muros interiores	8 days	Wed 07-12-22	Fri 16-12-22	462	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$110,307.59													
466	Acrylica en muros exteriores.	8 days	Wed 07-12-22	Fri 16-12-22	465FF	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$44,605.08													
467	Acrylica blanca económica en techo	8 days	Wed 07-12-22	Fri 16-12-22	466FF	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$28,252.48													
468	Pintura mantenimiento en hierro de cárceles	8 days	Wed 07-12-22	Fri 16-12-22	467FF	Ayudante de Pintor,Peon,Pintor	RD\$20,127.19													
469																				
470	MISCELANEOS	7 days	Fri 16-12-22	Mon 26-12-22			RD\$375,520.81													
471	Jardineria	7 days	Fri 16-12-22	Mon 26-12-22	468	Capataz,Jardinero,Peon	RD\$7,896.05													
472	Asta para banderas	7 days	Fri 16-12-22	Mon 26-12-22	471FF	Capataz,Peon	RD\$10,837.72													
473	Salida para GLP	7 days	Fri 16-12-22	Mon 26-12-22	472FF	Capataz,Peon	RD\$4,319.61													

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split

Tarea

División

.....

Resumen

.....

Hito

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite


Progreso

Critical

CONPROINA, SRL

Santo Domingo, D.N.

Página 10

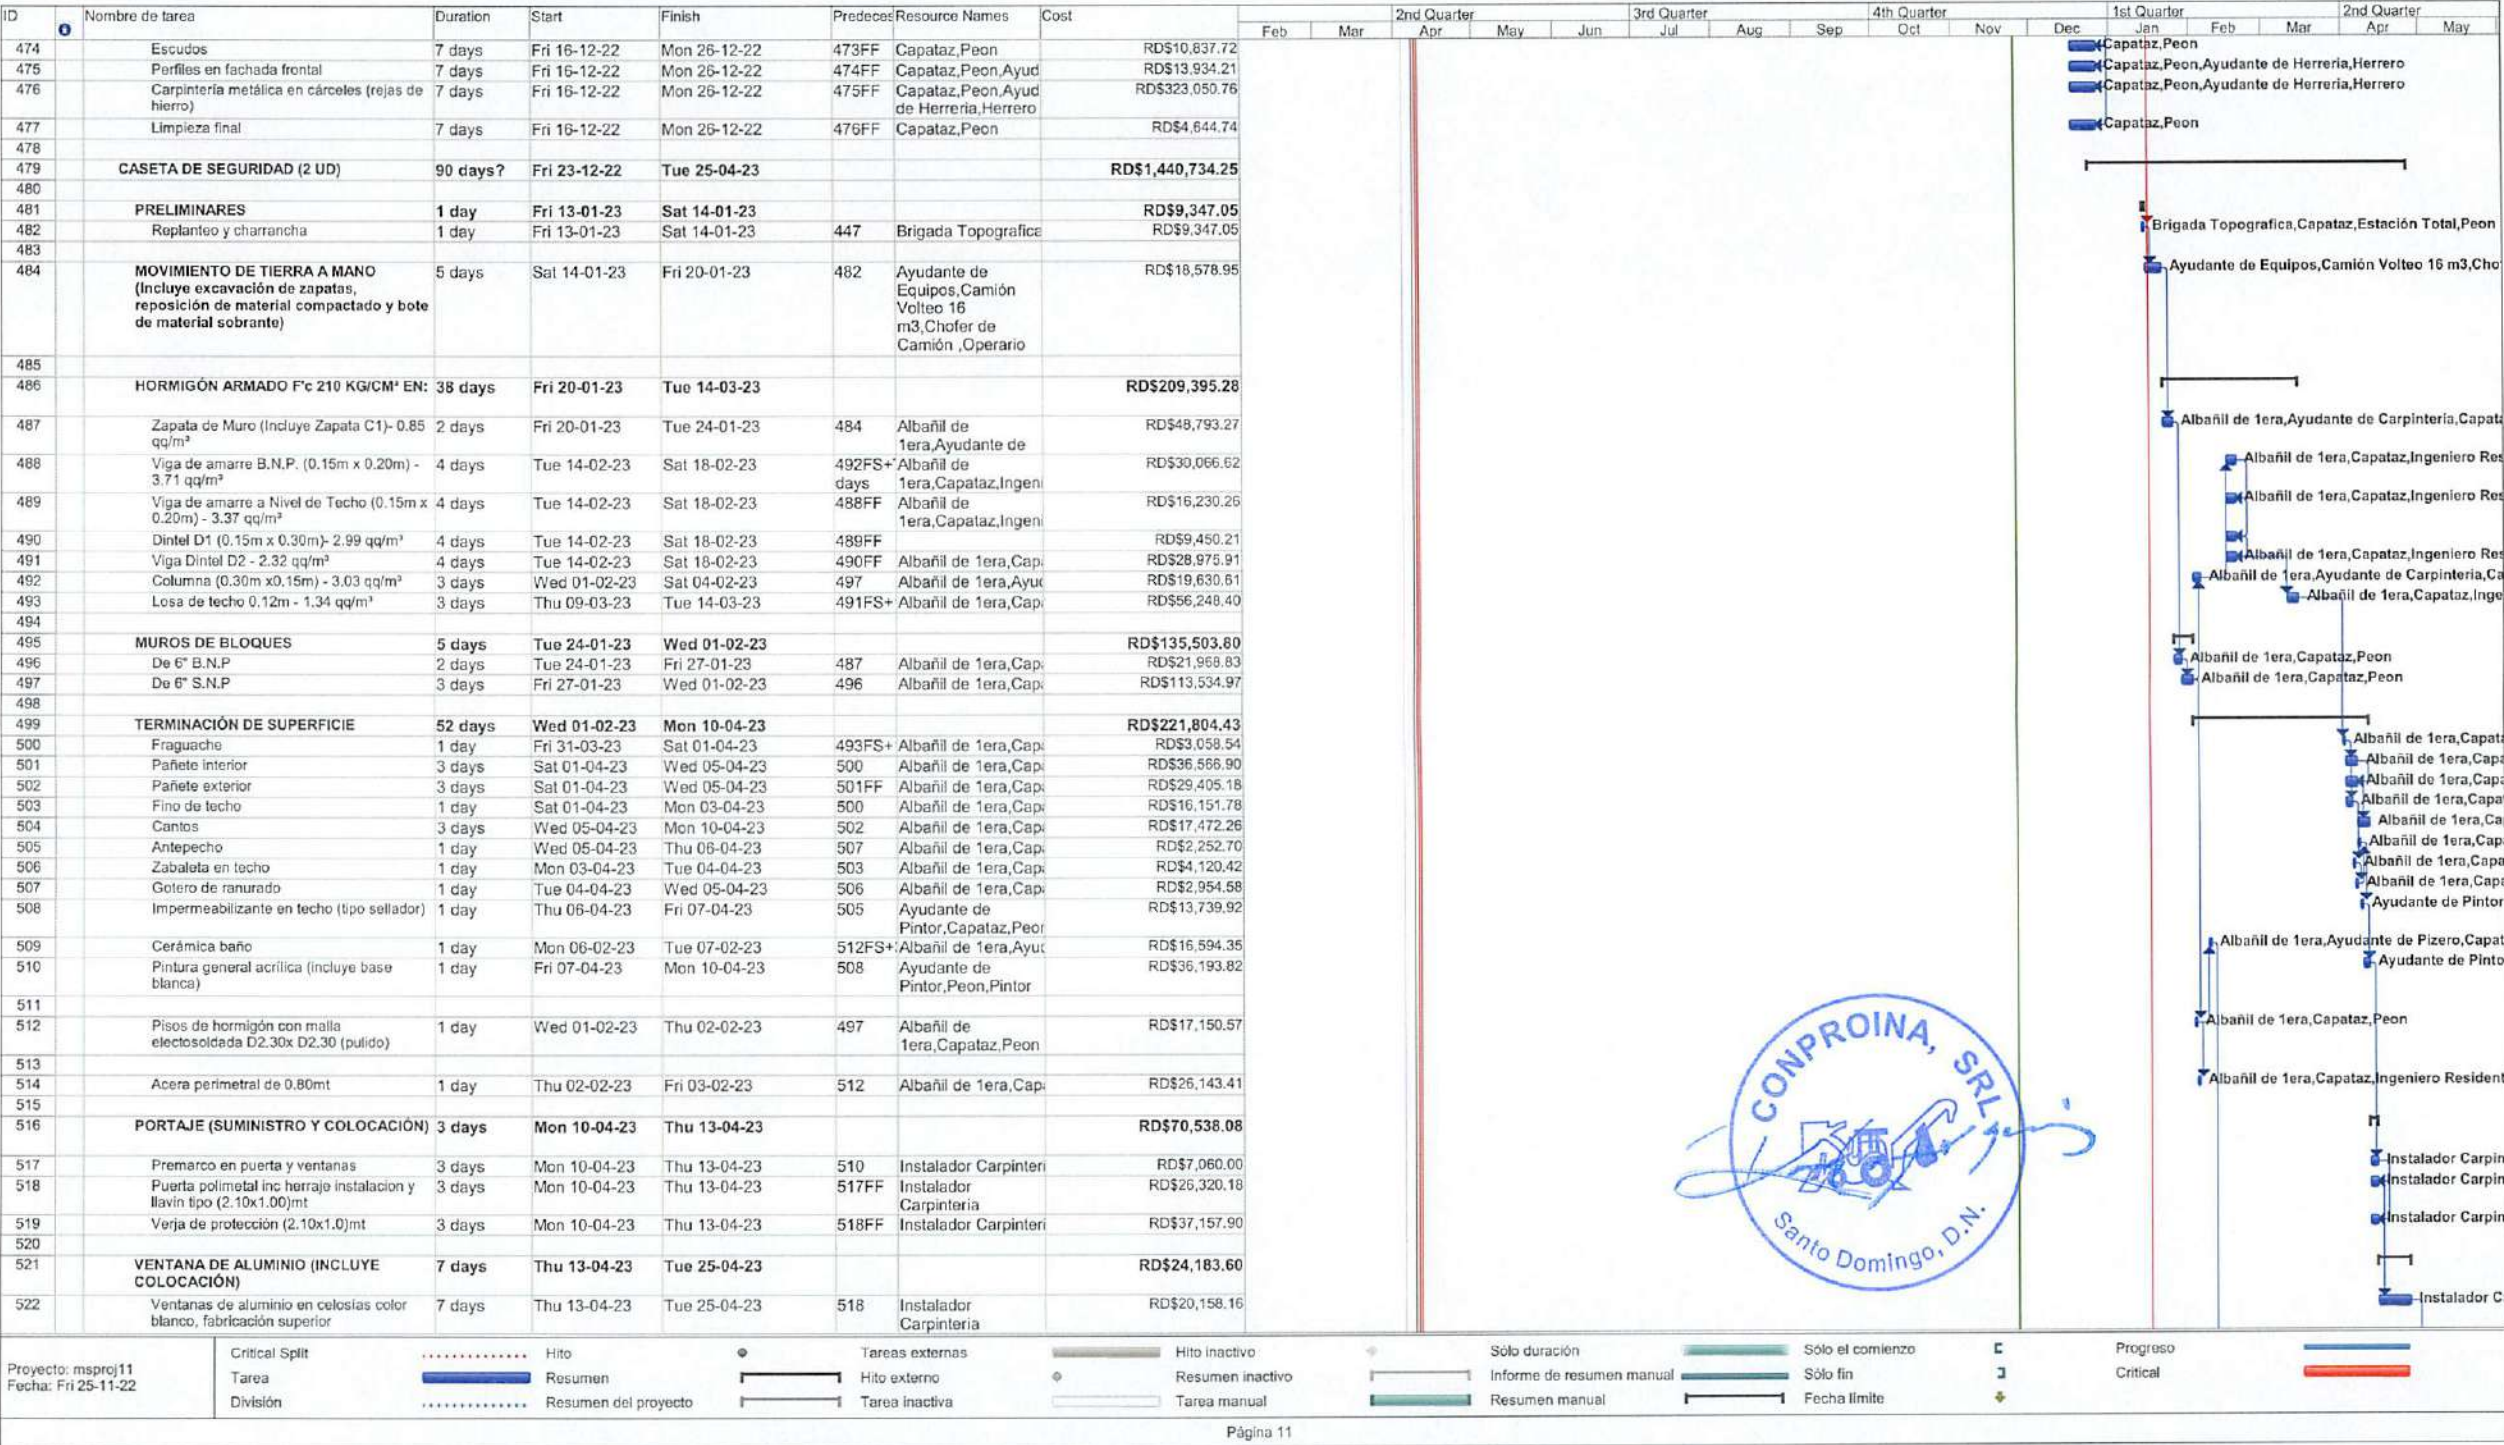

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
523	Verja de protección en ventanas	7 days	Thu 13-04-23	Tue 25-04-23	522FF	Instalador Carpinteri	RD\$4,025.44																
524																							
525	INSTALACIÓN SANITARIA	48 days?	Fri 23-12-22	Tue 28-02-23			RD\$640,051.87																
526	INSTALACIÓN SANITARIA	0 days?	Fri 23-12-22	Fri 23-12-22			RD\$0.00																
527	INSTALACIÓN SANITARIA	0 days?	Fri 13-01-23	Fri 13-01-23			RD\$0.00																
528	Lavamanos sencillos	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	509	Ayudante de plomer	RD\$34,169.07																
529	Inodoro	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	528FF	Ayudante de plomer	RD\$40,427.79																
530	Desagüe de techo	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	529FF	Ayudante de plomer	RD\$6,421.07																
531	Ducha	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	530FF	Ayudante de plomer	RD\$22,709.05																
532	Desagüe de piso 3"	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	531FF	Ayudante de plomer	RD\$5,556.62																
533	Columna de ventilación de 3"	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	532FF	Ayudante de plomer	RD\$7,990.81																
534	Cámara de inspección	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	533FF	Ayudante de plomer	RD\$19,898.67																
535	Séptico (1.90x1.10) m	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	534FF	Ayudante de plomer	RD\$204,801.82																
536	Tinaco 150gls	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	535FF	Ayudante de plomer	RD\$24,635.69																
537	Pozo Filtrante	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	536FF	Ayudante de plomer	RD\$238,460.81																
538	Barra de cortina baño	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	537FF	Ayudante de plomer	RD\$4,975.47																
539	Tubería 4" PVC (Drenaje Sanitario) (inc. Movimiento de tierra y colocación)	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	538FF	Ayudante de plomería, Capataz, Peon	RD\$9,475.26																
540	Mano de obra instalación	15 days	Tue 07-02-23	Tue 28-02-23	539FF	Ayudante de plomer	RD\$20,529.74																
541	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6 days	Tue 28-02-23	Tue 07-03-23			RD\$111,331.19																
542	Entrada general (incluye panel de Breaker de 4/8 circuitos)	5 days	Tue 28-02-23	Mon 06-03-23	540	Ayudante Electricista, Capataz	RD\$16,897.55																
543	Salida luces cenitales	5 days	Tue 28-02-23	Mon 06-03-23	542FF	Ayudante Electricista	RD\$36,138.66																
544	Salida tomacorrientes Doble 120 V	5 days	Tue 28-02-23	Mon 06-03-23	543FF	Ayudante Electricista	RD\$20,210.74																
545	Salida interruptor sencillo	5 days	Tue 28-02-23	Mon 06-03-23	544FF	Ayudante Electricista	RD\$18,344.11																
546																							
547	Logo y Letrero de INAPA	1 day	Mon 06-03-23	Tue 07-03-23	545	Ayudante de Pintor,	RD\$19,740.13																
548																							
549	CENTRO COMUNAL	117 days	Thu 12-01-23	Mon 19-06-23			RD\$4,535,023.08																
550																							
551	PRELIMINARES	1 day	Fri 13-01-23	Sat 14-01-23			RD\$55,336.05																
552	Replanteo y charrancho	1 day	Fri 13-01-23	Sat 14-01-23	447	Brigada Topografica	RD\$55,336.05																
553																							
554	MOVIMIENTO DE TIERRA	9 days	Thu 12-01-23	Tue 24-01-23			RD\$23,300.60																
555	Excavación material no clasificado a mano	2 days	Sat 14-01-23	Tue 17-01-23	552	Capataz, Peon	RD\$7,165.20																
556	Relleno compactado c/compactador mecánico	1 day	Mon 23-01-23	Tue 24-01-23	568	Ayudante de Equipos, Camión	RD\$3,244.18																
557	Bote de material in situ	2 days	Thu 12-01-23	Sat 14-01-23	552FF	Camión Volteo 16 m	RD\$12,891.22																
558																							
559	HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² EN:	32 days	Sat 14-01-23	Tue 28-02-23			RD\$624,040.71																
560	Zapata de columna Z1 (1.20m x 1.20m) - 2.18 qq/m³	3 days	Sat 14-01-23	Wed 18-01-23	557	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$112,419.02																
561	Zapata de muros de block de 6" - 0.71 qq/m³	3 days	Sat 14-01-23	Wed 18-01-23	560FF	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$171,742.77																
562	Pedestal (0.45m x 0.45m) - 6.94 qq/m³	3 days	Thu 09-02-23	Tue 14-02-23	569	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$100,310.83																
563	Columna de amarre - 2.97 qq/m³	3 days	Thu 09-02-23	Tue 14-02-23	562FF	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$100,264.29																
564	Viga de amarre (0.15m x 0.20m) - 3.66 qq/m³	3 days	Wed 22-02-23	Tue 28-02-23	563FS+	Albañil de 1era, Capataz, Ingeniero	RD\$95,394.71																
565	Dintel (0.15m x 0.20m) - 5.47 qq/m³	3 days	Wed 22-02-23	Tue 28-02-23	564FF	Albañil de 1era, Ayudante de	RD\$43,909.09																
566																							
567	MUROS DE BLOQUES	16 days	Wed 18-01-23	Thu 09-02-23			RD\$646,125.74																
568	De 6" B.N.P.	3 days	Wed 18-01-23	Mon 23-01-23	561	Albañil de 1era, Capataz	RD\$92,911.76																
569	De 6" S.N.P.	12 days	Tue 24-01-23	Thu 09-02-23	556	Albañil de 1era, Capataz	RD\$553,213.98																
570																							
571	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	36 days	Wed 08-03-23	Wed 26-04-23			RD\$273,361.75																
572	Fraguache interior elementos de hormigón	1 day	Wed 08-03-23	Thu 09-03-23	565FS+	Albañil de 1era, Capataz, Peon	RD\$5,849.44																
573	Pañete interior pulido	5 days	Thu 09-03-23	Thu 16-03-23	572	Albañil de 1era, Capataz	RD\$81,095.95																
574	Pañete exterior	5 days	Mon 17-04-23	Wed 26-04-23	586	Albañil de 1era, Capataz	RD\$66,491.66																
575	Pañete en viga y columna	5 days	Mon 17-04-23	Wed 26-04-23	574FF	Albañil de 1era, Capataz	RD\$119,924.70																



Proyecto: mspj11
Fecha: Fri 23-11-22

Critical Split

Tarea

División

.....

.....

.....

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

.....

.....

Hito externo

Tarea inactiva

.....

.....

Tareas externas

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

.....

.....

.....

.....

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

.....

.....

.....

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

.....

.....

.....

Progreso

Critical

.....

.....

Página 12

ID	Nombre de tareas	Start	Finish	Predecessor	Resource	Names	Cost												
717	Zapata de muros (0.45m x 0.30m) - 0.67	Wed 18-01-23	Mon 23-01-23	714	Albani de	714	RDS\$75,115.40												
718	Viga de amarre B.N.P. (0.20m x 0.20m) - 0.60 qm/m²	Fri 03-02-23	Tue 07-02-23	719	Albani de	719	RDS\$88,804.64												
719	Columna CA (0.15m x 0.30m) - 4.50 qm/m²	Tue 31-01-23	Fri 03-02-23	726	Albani de	726	RDS\$68,767.58												
720	Panel DI (0.15m x 0.30m) - 4.31 qm/m²	Fri 03-02-23	Tue 07-02-23	718FF	Albani de	718FF	RDS\$66,066.37												
721	Losas de piso con malla electrosoldada D2.3x2.3x20x20 (incluye rampa)	Fri 16-02-23	Mon 20-02-23	720FS+	Albani de	720FS+	RDS\$8,060.31												
722	Losas de techo e=0.12m - 1.60 qm/m²	Thu 16-02-23	Mon 20-02-23	721FF	Albani de	721FF	RDS\$11,566.06												
723	MUROS DE BLOQUES																		
724	Do 6" B.N.P.	Mon 23-01-23	Tue 31-01-23		Albani de	717	RDS\$36,645.12												
725	Do 6" S.N.P.	Mon 23-01-23	Tue 31-01-23	713	Albani de	713	RDS\$169,251.66												
726	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE																		
728	18 days	Thu 02-03-23	Fri 09-03-23	735FS+	Albani de	735FS+	RDS\$33,129.08												
729	Fregachote	Tue 07-03-23	Thu 09-03-23	735FS+	Albani de	735FS+	RDS\$33,129.08												
730	Pañete interior	Thu 09-03-23	Thu 09-03-23	729	Albani de	729	RDS\$101,268.14												
731	Pañete exterior	Thu 09-03-23	Thu 09-03-23	730FF	Albani de	730FF	RDS\$47,337.57												
732	Cantos	Thu 16-03-23	Mon 20-03-23	731	Albani de	731	RDS\$15,263.69												
733	Pintura base	Mon 20-03-23	Wed 22-03-23	732	Ayudante de	732	RDS\$65,206.30												
734	Pintura acrílica	Wed 22-03-23	Fri 24-03-23	733	Ayudante de	733	RDS\$65,206.57												
735	Antepecho	Thu 02-03-23	Sat 04-03-23	722FS+	Albani de	722FS+	RDS\$15,222.49												
736	Fino de techo	Sat 04-03-23	Mon 06-03-23	735	Albani de	735	RDS\$29,533.53												
737	INSTALACIONES SANITARIAS																		
738	12 days	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	760	Ayudante de	760	RDS\$20,213.90												
739	Indodoro	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	760	Ayudante de	760	RDS\$20,213.90												
740	Lavamanos	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	739FF	Ayudante de	739FF	RDS\$17,084.54												
741	Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	740FF	Ayudante de	740FF	RDS\$2,140.47												
742	Fregadero acero inoxidable doble	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	741FF	Ayudante de	741FF	RDS\$19,740.77												
743	Tampa de grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m)	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	742FF	Ayudante de	742FF	RDS\$15,288.65												
744	Camara séptica (1.00m x 2.40m x 1.00m)	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	743FF	Ayudante de	743FF	RDS\$102,400.91												
745	Registro de inspección (0.60m x 0.60m x 0.75m)	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	744FF	Ayudante de	744FF	RDS\$15,972.14												
746	Tubería y piezas de agua potable	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	745FF	Ayudante de	745FF	RDS\$18,950.53												
747	Tubería y piezas de agua residuales	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	746FF	Ayudante de	746FF	RDS\$23,688.16												
748	Mano de obra de plomero	Mon 03-04-23	Tue 18-04-23	747FF	Ayudante de	747FF	RDS\$63,168.43												
749	PISOS																		
750	5 days	Wed 22-03-23	Wed 29-03-23		Albani de	733	RDS\$195,564.83												
751	Piso de granito (0.30m x 0.30m) fondo grs	Wed 22-03-23	Wed 29-03-23		Albani de	733	RDS\$153,864.72												
752	Zócalos de granito (0.07m x 0.30m) fondo grs	Fri 24-03-23	Wed 29-03-23	751FF	Albani de	751FF	RDS\$41,700.11												
753	PUERTA Y VENTANAS																		
754	4 days	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	752	RDS\$107,030.85												
755	Puerta polimétrica (1.00m x 2.10m) (incluye llavín)	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	752	RDS\$13,160.09												
756	Puerta polimétrica (0.85m x 2.10m) (incluye llavín)	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	755FF	RDS\$40,269.87												
757	Puerta polimétrica (0.75m x 2.10m) (incluye llavín)	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	756FF	RDS\$13,423.29												
758	Ventana corredera de cristal y aluminio (1.20m x 1.00m)	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	757FF	RDS\$33,579.59												
759	Ventana corredera de cristal y aluminio (1.00m x 1.00m)	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	758FF	RDS\$5,202.11												
760	Ventana corredera de cristal y aluminio (0.60m x 0.50m)	Wed 29-03-23	Mon 03-04-23		Instalador	759FF	RDS\$1,395.90												
761	MOBILIARIO																		
762	2 days	Tue 18-04-23	Mon 24-04-23		Capataz, Ingeniero	748	RDS\$157,901.25												
763	Escritorio tipo melamina con estructura plateada (28" x 48")	Tue 18-04-23	Mon 24-04-23		Capataz, Ingeniero	748	RDS\$40,791.63												



ID	Nombre de tarea	Duración	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
764	Silla operativa en tela con brazos	2 days	Tue 18-04-23	Mon 24-04-23	763FF	Capataz,Ingeniero F	RDS\$33,655.46																Capataz,Inge
765	Silla de visita en tela negro con brazos	2 days	Tue 18-04-23	Mon 24-04-23	764FF	Capataz,Ingeniero F	RDS\$66,298.55																Capataz,Inge
766	Archivo metálico tipo módulo color aluminio de tres gavetas con ruedas	2 days	Tue 18-04-23	Mon 24-04-23	765FF	Capataz,Ingeniero Residente,Peon	RDS\$27,155.61																Capataz,Inge
767																							
768	MISCELANEOS	2 days	Mon 24-04-23	Wed 26-04-23			RDS\$78,923.50																
769	Suministro y colocación de barandas en acero inoxidable en entrada	2 days	Mon 24-04-23	Wed 26-04-23	766	Ayudante de Herreria,Herrero,Ing	RDS\$10,847.13																Ayudante de
770	Tope en granito natural para cocina	2 days	Mon 24-04-23	Wed 26-04-23	769FF		RDS\$18,532.50																
771	Letro de Oficina Administrativa en acrílico (0.85m x 0.45m) (Suministro y colocación)	2 days	Mon 24-04-23	Wed 26-04-23	770FF	Ayudante de Herreria,Herrero,Ing Residente,Peon	RDS\$10,063.60																Ayudante de
772	Logo y Letrero de INAPA	2 days	Mon 24-04-23	Wed 26-04-23	771FF	Albañil de 1era,Ayud	RDS\$39,480.27																Albañil de 1e
773																							
774	ELECTRIFICACIÓN GENERAL	43 days	Wed 26-04-23	Thu 22-06-23			RDS\$6,020,434.94																
775																							
776	ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE BASKETBALL Y VOLEYBALL	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23			RDS\$3,141,793.17																
777	Reflector LED de 150 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ, 52,000 LM, IP 65	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	772	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$743,157.96																Ayudar
778	Poste H.A.V 30', 300 DAM	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	777FF	Ayudante Electricista	RDS\$681,228.13																Ayudar
779	Conductor eléctrico de goma No. 5/3 para alimentación de reflectores	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	778FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$1,290,308.01																Ayudar
780	Salidas Panel de Breakers 2/4 Circuitos para el encendido de reflectores a instalar en poste	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	779FF	Ayudante Electricista,Capataz Electrico,Ingeniero	RDS\$44,211.71																Ayudar
781	Tubería PVC de Ø3/4" x 19'	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	780FF	Ayudante Electricista	RDS\$96,461.90																Ayudar
782	Instalación de postes	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	781FF	Ayudante Electricista	RDS\$216,754.40																Ayudar
783	Mano de obra eléctrica	10 days	Wed 26-04-23	Wed 10-05-23	782FF	Ayudante Electricista	RDS\$69,671.06																Ayudar
784																							
785	ELECTRIFICACIÓN DE GAZEBOS	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23			RDS\$485,575.08																
786	Reflector LED tipo campana de 80 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23	783	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$65,026.32																Ayu
787	Salidas eléctricas para tomacorrientes dobles 120V	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23	786FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$79,257.80																Ayu
788	Salidas eléctricas para reflector LED en tubería EMT	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23	787FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$49,982.95																Ayu
789	Conductor eléctrico de goma No. 8/3 para alimentación de reflectores	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23	788FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$178,667.56																Ayu
790	Tubería PVC de Ø3/4" x 19'	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23	789FF	Ayudante Electricista	RDS\$42,969.39																Ayu
791	Mano de obra eléctrica	7 days	Wed 10-05-23	Fri 19-05-23	790FF	Ayudante Electricista	RDS\$69,671.06																Ayu
792																							
793	ELECTRIFICACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23			RDS\$308,275.62																
794	Salidas cenitales	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23	791	Ayudante Electricista	RDS\$70,860.11																
795	Salidas para tomacorrientes dobles 120V	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23	794FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$38,326.49																
796	Conductor eléctrico THW No.10	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23	795FF	Ayudante Electricista	RDS\$42,037.24																
797	Salidas Panel de Breakers 4/8 circuitos	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23	796FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$55,749.85																
798	Salida interruptor sencillo	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23	797FF	Ayudante Electricista	RDS\$33,630.87																
799	Mano de obra eléctrica	7 days	Fri 19-05-23	Mon 29-05-23	798FF	Ayudante Electricista	RDS\$69,671.06																
800																							
801	ELECTRIFICACIÓN OFICINA ADMINISTRATIVA	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23			RDS\$236,501.49																
802	Salidas cenitales	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	799	Ayudante Electricista	RDS\$23,620.04																
803	Salidas para tomacorrientes dobles 120V	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	802FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$39,628.90																
804	Salida interruptor sencillo	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	803FF	Ayudante Electricista	RDS\$9,172.06																
805	Salida interruptor doble	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	804FF	Ayudante Electricista	RDS\$3,090.30																
806	Salida interruptor triple	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	805FF	Ayudante Electricista	RDS\$2,915.22																
807	Salidas para tomacorrientes dobles 120V	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	806FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$6,604.82																
808	Salidas Panel de Breakers 6/12 circuitos	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	807FF	Ayudante Electricista,Capataz	RDS\$14,317.87																

CONPROINA, SRL

Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11

Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split

Tarea

División

.....

.....

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

▬

▬

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

▬

▬

▬

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

◆

▬

▬

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

▬

▬

▬

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

▬

▬

▬

Progreso

Critical

▬

▬

Página 17

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names	Cost	2nd Quarter					3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter										
								Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May									
809	Registro metálico N-1R, 6" X 6" X 4"	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	808FF	Ayudante Electricista	RDS\$1,527.50																									
810	Registro metálico N-1R, 12" X 12" X 6"	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	809FF	Ayudante Electricista	RDS\$1,809.90																									
811	Conductor eléctrico THW No.8	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	810FF	Ayudante Electricista	RDS\$30,190.79																									
812	Conductor eléctrico THW No.10	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	811FF	Ayudante Electricista	RDS\$33,953.03																									
813	Mano de obra eléctrica	12 days	Mon 29-05-23	Tue 13-06-23	812FF	Ayudante Electricista	RDS\$69,671.06																									
814	ELECTRIFICACIÓN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23			RDS\$1,848,289.58																									
815	Reflector LED de 150 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ, 52,000 LM, IP 65	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23	813	Capataz,Ingeniero Electrico,Ingeniero	RDS\$371,578.98																									
816	Poste H.A.V 30', 300 DAM	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23	815FF	Capataz,Ingeniero E	RDS\$340,614.06																									
817	Conductor eléctrico de goma No. 6/3	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23	816FF	Capataz,Ingeniero E	RDS\$817,195.07																									
818	Tubería PVC de Ø3/4" x 19'	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23	817FF	Capataz,Ingeniero E	RDS\$78,923.38																									
819	Instalación de postes	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23	818FF	Capataz,Ingeniero E	RDS\$108,377.20																									
820	Mano de obra eléctrica	7 days	Tue 13-06-23	Thu 22-06-23	819FF	Capataz,Ingeniero E	RDS\$131,600.89																									
821																																
822	VARIOS	5 days	Mon 04-04-22	Fri 08-04-22			RDS\$3,194,489.81																									
823	Valla anunciando obra 16' x 8' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4".	1 day	Mon 04-04-22	Mon 04-04-22	2	Ayudante de Herrería, Capataz, He	RDS\$75,947.42																									
824	Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión	3 days	Mon 04-04-22	Wed 06-04-22	2	Capataz,Ingeniero Electrico,Ingeniero Residente, Peon	RDS\$2,180,388.84																									
825	Limpieza final y continua	1 day	Fri 08-04-22	Fri 08-04-22	56	Capataz, Peon	RDS\$438,153.55																									

