

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	20212022202320242025202620272028													
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
55		REPLANTEO	2 días	28-12-21	30-12-21			30-12											
56		MOVIMIENTO DE TIERRA:	74.5 días	30-12-21	04-04-22			28-12											
60		Zapata de muro (incl. Zap. C1) 0.85 qq/m3	30 días	30-12-21	07-02-22			04-04											
61		MURO DE BLOCK:	25 días	09-02-22	12-03-22			30-12											
64		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	30 días	16-03-22	22-04-22			07-02											
69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:	66 días	16-03-22	08-06-22			30-12											
72		GARITA DE VIGILANTE Y AREAS ALREDEDOR	36 días	11-05-22	25-06-22			12-03											
73		REPLANTEO	1 día	11-05-22	12-05-22			09-02											
74		MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material s	1 día	12-05-22	13-05-22			22-04											
75		MUROS DE BLOCK	8.5 días	13-05-22	24-05-22			16-03											
78		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	11 días	25-05-22	08-06-22			08-06											
86		PISO DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA D2.30X D2.30 (PULIDO)	1 día	02-06-22	03-06-22			16-03											
87		ACERA PERIMETRAL DE 0.80M	2 días	03-06-22	06-06-22			25-06											
88		PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):	1 día	07-06-22	08-06-22			11-05											
89		VENTANAS DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN):	1 día	03-06-22	04-06-22			12-05											
90		INSTALACIÓN SANITARIA:	12 días	25-05-22	09-06-22			13-05											
91		INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	12 días	25-05-22	09-06-22			24-05											
92		CANAleta DE DRENAJE	1 día	25-05-22	26-05-22			13-05											
93		CAMINO DE ACCESO INTERNO	32.5 días	16-05-22	25-06-22			08-06											
96		ELECTRIFICACIÓN DE LA PLANTA	30 días	12-05-22	20-06-22			25-05											

Project: ADENDA NO.4 ALCANTAR
Date: 20-06-25

División crítica

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

Tareas críticas

Page 2

INGENIERIA ESTRELLA S.A.

ESTRELLA

Santiago, Rep. Dom.

AG

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin																
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
99		SAN FRANCISCO DE MACORÍS	600.5 días	19-10-21	04-12-23																
100		SECTOR VILLA VERDE	161.5 días	19-10-21	11-05-22																
101		RED COLECTORA	161.5 días	19-10-21	11-05-22																
154		SECTOR VISTA DEL VALLE, PRIMERA ETAPA	275 días	07-12-22	04-12-23																
155		LÍNEAS DE IMPULSIÓN	80 días	07-12-22	22-03-23																
167		LÍNEAS COLECTORAS	230 días	07-12-22	05-10-23																
179		II-3 ESTACIÓN DE BOMBEO: CAPACIDAD =57.50 M3, Q=73.03 LPS , EQUIPADA CON (3) TRES ELECTROBOMBAS NO ATASCABLES, 570 GPM C/U, TTH=50' 10HP C/U	45 días	06-10-23	04-12-23																
180		VILLA RIVA	488.84 días	03-03-22	27-11-23																
181		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 25LPS VILLA RIVA	308.34 días	19-10-22	27-11-23																
182		DESARENADOR	88.5 días	28-02-23	24-06-23																
194		LAGUNA PRIMARIA FACULTATIVA	147.42 días	19-10-22	02-05-23																
204		LAGUNA SECUNDARIA FACULTATIVA	154.5 días	25-10-22	17-05-23																
214		CASETA DE CLORACION	42.25 días	16-05-23	10-07-23																
216		SISTEMA DE CLORACION Y DECLORACION CON METALBISULFITO LIQUIDO	77.5 días	10-05-23	19-08-23																
219		INSTALACION ELECTRICA	135.5 días	18-04-23	10-10-23																
228		CAMARA DE CONTACTO	97.34 días	28-02-23	07-07-23																
237		REDES Y PIEZAS ESPECIALES	27.75 días	27-03-23	04-05-23																
242		CABEZAL DE DESCARGA	22.5 días	29-05-23	27-06-23																
244		VIAS DE ACCESO Y PARQUEOS	183 días	13-01-23	12-09-23																

Project: ADENDA NO.4 ALCANTAR Date: 20-06-25	División crítica		Project Summary	—————	Inactive Summary	—————	Start-only	[
	Task	—————	External Tasks	—————	Manual Task	—————	Finish-only	]
	Split		External Milestone	◆	Duration-only	—————	Deadline	△
	Milestone	◆	Inactive Task	—————	Manual Summary Rollup	—————	Progress	—————
	Summary	—————	Inactive Milestone	—————	Manual Summary	—————	Progreso manual	—————




Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	20212022202320242025202620272028													
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
256		VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA	122.45 días	15-12-22	27-05-23					15-12	27-05								
265		GARITA DE VIGILANTE	182.32 días	04-01-23	02-09-23					04-01	02-09								
267		CONSTRUCCION DE CAMARA DE TAMIZADO Y PORTICOS	71.5 días	09-05-23	08-08-23					09-05	08-08								
277		ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA RIVA	110 días	07-07-23	27-11-23					07-07	27-11								
287		REDES COLECTORAS VILLA RIVA	433 días	03-03-22	15-09-23					03-03	15-09								
288		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	425.57 días	03-03-22	06-09-23					03-03	06-09								
290		CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO	384.73 días	03-03-22	14-07-23					03-03	14-07								
294		MOVIMIENTO DE TIERRA	424.56 días	04-03-22	06-09-23					04-03	06-09								
300		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA	424.22 días	04-03-22	06-09-23					04-03	06-09								
310		CONSTRUCCION DE SOPORTES PARA ANCLAJE DE TUBERIAS	40 días	29-06-23	19-08-23						29-06	19-08							
327		REGISTRO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, A CONSTRUIR (SEGÚN DETALLE DE DISEÑO, INCLUYE TAPA DE GRP, POLIETILENO O SIMILAR)	424.23 días	04-03-22	06-09-23					04-03	06-09								
329		REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: (INCLUYE EXCAVACIÓN, ASIENTO DE ARENA, RELLENO, BOTE, TUBERÍAS Y PIEZAS)	424.14 días	04-03-22	06-09-23					04-03	06-09								
331		Control y Manejo de Tránsito	414 días	03-03-22	15-09-23					03-03	15-09								
332		Señalización, Control, Seguridad en la Obra y Manejo de Transito (Incluye: Uso de Letreros, Uso de Conos Refractarios y Hombres Con Banderolas)	414 días	03-03-22	15-09-23					03-03	15-09								
333		Limpieza Final y Continua	414 días	03-03-22	15-09-23					03-03	15-09								
334		Reposición de Aceras y Contenes	30 días	17-04-23	02-08-23						02-08								
335		Colocacion de Material de Base	30 días	08-08-23	15-09-23						08-08	15-09							
336		PIMENTEL	1111 días	19-10-21	15-09-25					19-10	15-09								
						19-1015-09PIMENTEL													
Project: ADENDA NO.4 ALCANTAR Date: 20-06-25		División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	Tareas críticas													
		Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only														
		Split	External Milestone	Duration-only	Deadline														
		Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress														
		Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual														



Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin																
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
337		VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA	91.5 días	28-12-21	22-04-22																
338		PRELIMINARES	2 días	28-12-21	30-12-21																
339		Replanteo	1 día	20-01-22	20-01-22																
340		Verja perimetral	40 días	21-01-22	12-03-22																
341		Embellecimiento con gravilla	5 días	14-04-22	20-04-22																
342		Acera exterior 0.80 m	7 días	14-04-22	22-04-22																
343		Logo y letrero de inapa en caseta	1 día	14-04-22	15-04-22																
344		Limpieza final	5 días	14-04-22	20-04-22																
345		REDES COLECTORAS	365 días	19-10-21	27-01-23																
346		Replanteo y Control Topográfico	360 días	19-10-21	20-01-23																
347		MOVIMIENTO DE TIERRA	360 días	19-10-21	20-01-23																
348		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	360 días	19-10-21	20-01-23																
354		PRUEBA HIDROSTÁTICA	39.5 días	07-12-22	27-01-23																
359		ENTIBADOS	10 días	07-12-22	19-12-22																
361		CAÍDAS	240.05 días	19-03-22	20-01-23																
363		REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: (Incluye excavación, asiento de arena, relleno, bote, tuberías y	280.77 días	27-01-22	20-01-23																
364		REDES COLECTORAS CALLE ADICIONALES	70 días	18-06-25	15-09-25																
365		Replanteo y Control Topográfico	55 días	01-07-25	08-09-25																
366		CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE ASFALTO	55 días	01-07-25	08-09-25																
367		MOVIMIENTO DE TIERRA	55 días	01-07-25	08-09-25																

Project: ADENDA NO.4 ALCANTAR Date: 20-06-25	División crítica		Project Summary	=====	Inactive Summary	=====	Start-only	[	Tareas críticas	=====
	Task	=====	External Tasks	=====	Manual Task	=====	Finish-only	]		
	Split		External Milestone	◆	Duration-only	=====	Deadline	+		
	Milestone	◆	Inactive Task	=====	Manual Summary Rollup	=====	Progress	=====		
	Summary	=====	Inactive Milestone	=====	Manual Summary	=====	Progreso manual	=====		



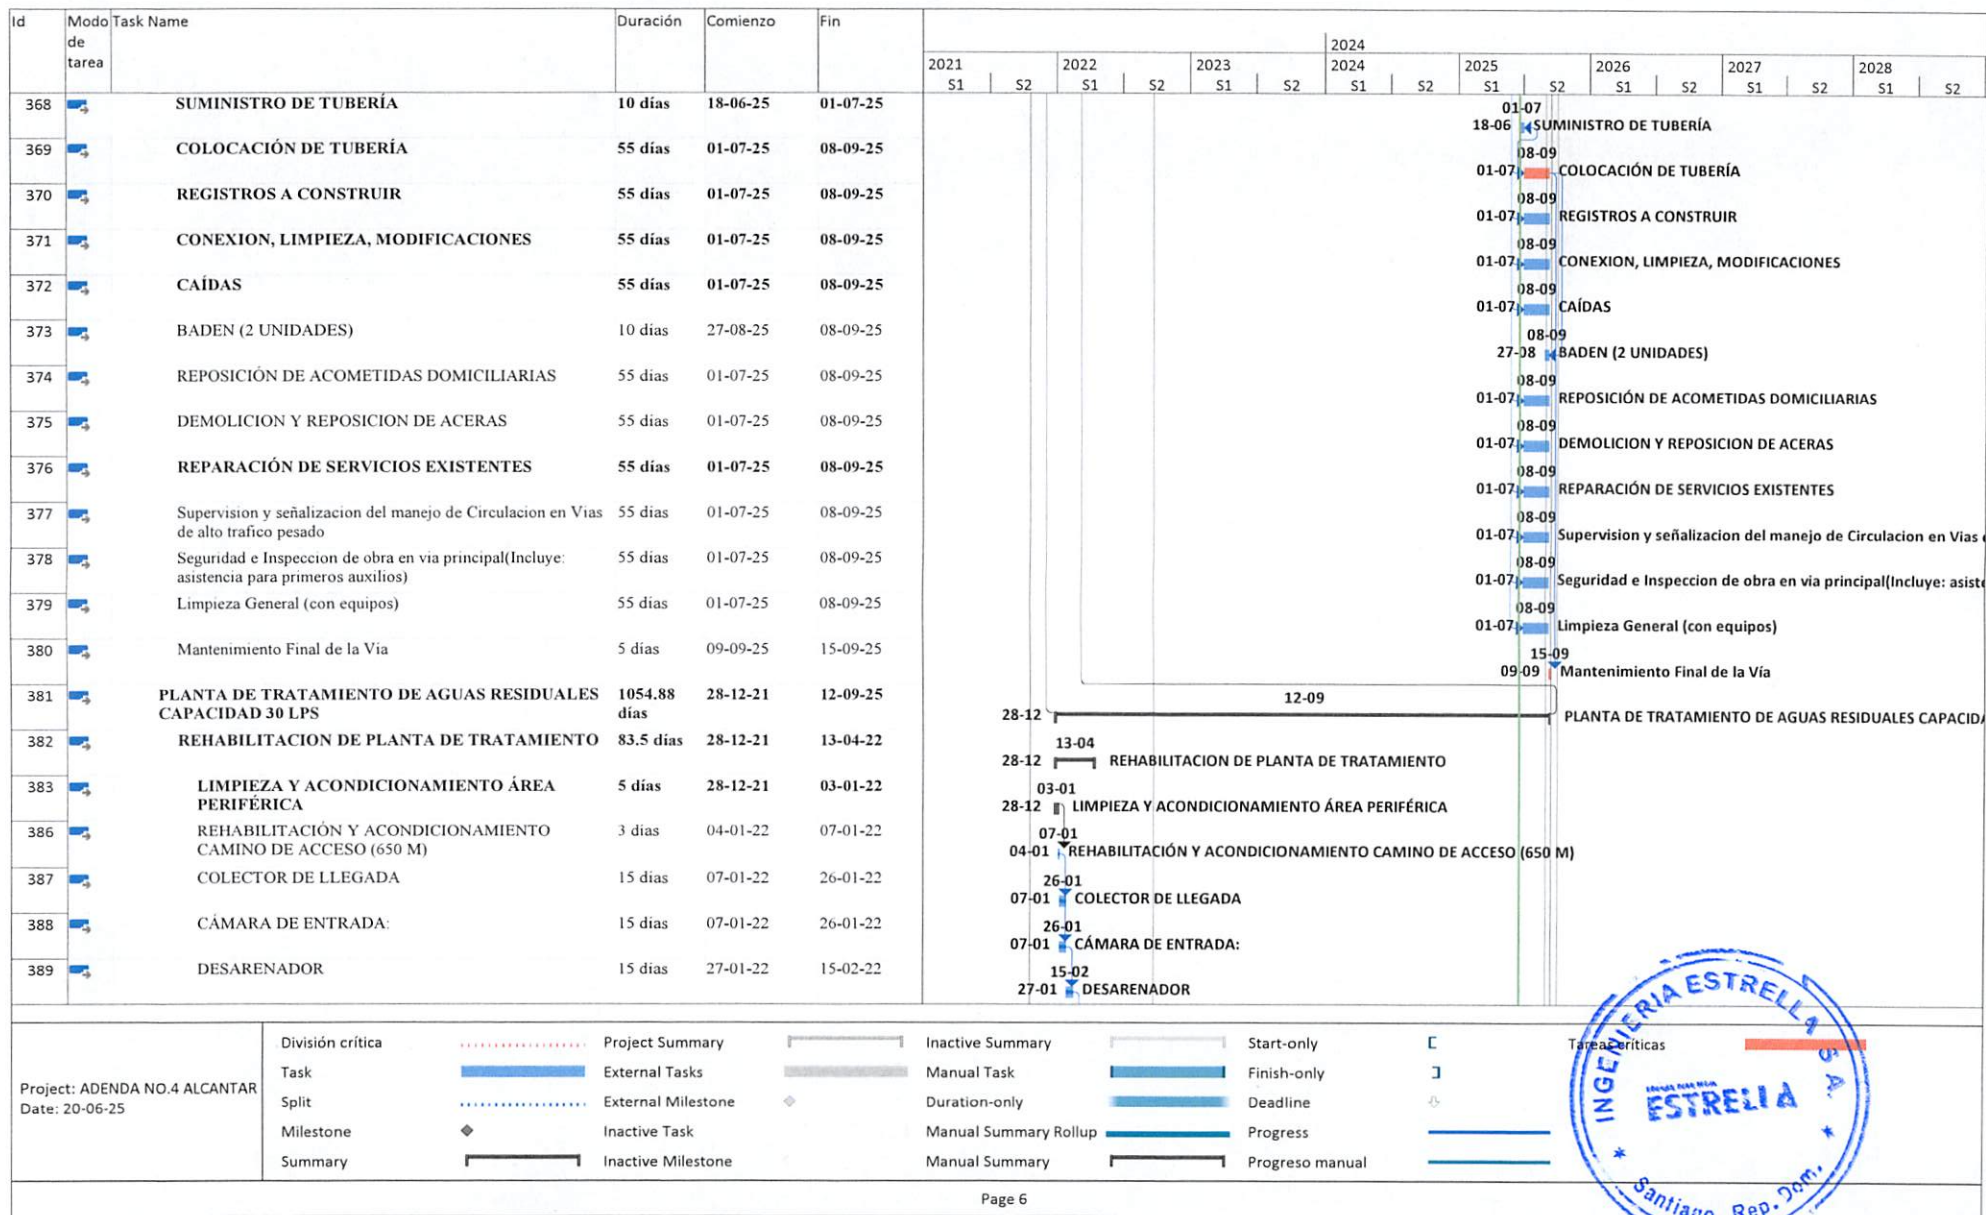

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin																
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
484	→	GARITA DE VIGILANTE	50 días	14-04-25	16-06-25																
486	→	MISCELÁNEOS	47 días	20-12-24	18-02-25																
492	→	EMBALLECIMIENTO	25 días	13-08-25	12-09-25																
494	→	FIN	0 días	15-09-25	15-09-25																



Project: ADENDA NO.4 ALCANTAR

Date: 20-06-25

División crítica

Task

Split

Milestone

Summary

.....

—————

.....

◆

—————

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

—————

—————

◆

—————

—————

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

—————

—————

—————

—————

—————

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progreso manual

⌈

⌋

◆

—————

—————

Tareas críticas

—————
