



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

INFORMACIÓN	
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL RAMÓN, SAN FRANCISCO, CARVAJAL Y BORUGA-HATO DAMA-DAZA I Y II, LOS MONTONES, LOS HOYOS Y LIMÓN DULCE- EQUIPAMIENTO CAMPO DE POZOS ITABO, LÍNEAS DE IMPULSIÓN INTERNA Y DEPÓSITOS REGULADORES DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL CARRIL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
Provincia	San Cristóbal
Contrato	037-2003
Contratista	CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS.
Monto contratado	RD\$ 1,499,633,723.57
Duración del proyecto	2.5 años
Periodo de ejecución	Trimestre septiembre – diciembre 2025
Monto ejecutado	RD\$ 1,205,902,094.11
% Avance financiero de las obras	80.41%
% Avance físico	78.00%

OBRA DE TOMA VILLA ALTAGRACIA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

OBRA DE TOMA VILLA ALTAGRACIA (TERMINADA)



ESTACION DE BOMBEO VILLA ALTAGRACIA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

REDES HATO DAMA



AC. HAINA





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**






**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

CASA DE OPERADOR VILLA ALTAGRACIA



DEPOSITO REGULADOR VILLA ALTAGRACIA

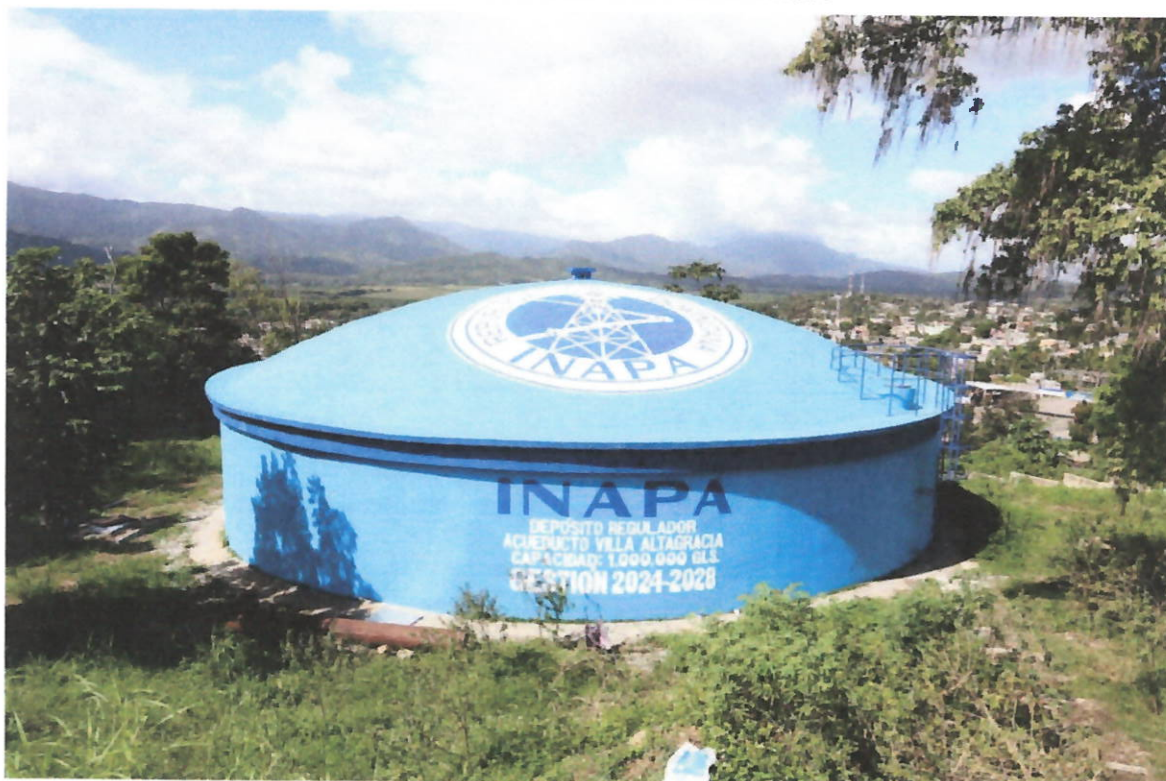

ARQ. RENE GARCÍA VILLANUEVA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

