

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024	Half 2
1		Obra: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SNIP:14991.	731 days	Mon 2/19/24	Fri 6/19/26		J F J M A M J J	J
2		INICIO	0 days	Mon 2/19/24	Mon 2/19/24			
3		VIARIOS:	731 days	Mon 2/19/24	Fri 6/19/26			
4		VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de Inapa, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½"x 1½" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4"	730 days	Mon 2/19/24	Thu 6/18/26			
5		CAMPAMENTO (alquiler de casa con o sin solar y caseta para materiales)	731 days	Mon 2/19/24	Fri 6/19/26	4SS		
6		RED COLECTORA	630 days	Mon 2/19/24	Sun 2/22/26	4SS		
7		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	630 days	Mon 2/19/24	Sun 2/22/26	4SS		
8		REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	10 days	Mon 2/19/24	Thu 2/29/24	4SS		
9		CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 ML)	80 days	Fri 3/1/24	Sun 6/2/24	8		
10		Corte de asfalto c/disco e= 2" ambos lados	30 days	Fri 3/1/24	Thu 4/4/24	8		
11		Remoción de asfalto e= 2"	28 days	Fri 4/5/24	Tue 5/7/24	10		
12		Bote de material c/camión d=5 km (incluye esparcimiento en botadero)	20 days	Fri 3/1/24	Sun 3/24/24	10SS		
13		MOVIMIENTO DE TIERRA	200 days	Fri 4/26/24	Sun 12/15/24	9		
14		Excavación material compacto c/equipo	42 days	Mon 6/3/24	Sun 7/21/24	9		
15		Regularización de fondo de zanja	36 days	Mon 7/22/24	Sun 9/1/24	14		
16		Asiento de arena, e=0.10 m	14 days	Mon 9/2/24	Tue 9/17/24	15		


Constructora OlivoP
 RNC: 131135315

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024	Half 2
17		Suministro de material de mina 20 days dist. aprox 10.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor)	20 days	Wed 9/18/24	Thu 10/10/24	16	J	J
18		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	20 days	Wed 9/18/24	Thu 10/10/24	17SS		
19		Bote de Material C/Camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero)	30 days	Mon 6/3/24	Sun 7/7/24	14SS		
20		SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	402 days	Fri 4/26/24	Thu 8/7/25	13SS		
21		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m, L=1.50m	140 days	Mon 6/3/24	Tue 11/12/24	14SS		
22		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m, L=1.50m	150 days	Wed 11/13/24	Tue 5/6/25	21		
23		COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PREFABRICADA H.A.	430 days	Fri 4/26/24	Tue 9/9/25	20SS		
24		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 0.90m,	120 days	Mon 6/3/24	Sun 10/20/24	21SS		
25		De sección rectangular (Interior) 1.50m x 1.50m,	150 days	Wed 11/13/24	Tue 5/6/25	22SS		
26		CARPETA ASFÁLTICA (L=930.00 M)	100 days	Wed 9/10/25	Sun 1/4/26	23		
27		Imprimación Sencilla	50 days	Wed 9/10/25	Thu 11/6/25	23		
28		Suministro y colocación de Asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia)	50 days	Fri 11/7/25	Sun 1/4/26	27		
29		Transporte de Asfalto, distancia aproximada de 65 km	60 days	Wed 9/10/25	Tue 11/18/25	27SS		
30		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTROS PREFABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO (INCLUYE TAPA EN GRP O POLIETILENO Y ESCALERA) VER DETALLE DE PLANO	30 days	Fri 4/26/24	Thu 5/30/24	23SS		
31		De 1.00 a 1.50 m	30 days	Fri 4/26/24	Thu 5/30/24	23SS		
32		CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL:	66 days	Fri 5/31/24	Thu 8/15/24	30		


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2024	Half 2
33		Imbormal de tres parrillas sin filtrar 24 days	24 days	Fri 5/31/24	Thu 6/27/24	31	J	J
34		Imbormal de tres parrillas con filtrante (perforado en Ø16" y en camizado en Ø12", profundidad=200 PL)	42 days	Fri 6/28/24	Thu 8/15/24	33	J	J
35		Limpieza de imbormal existente, incluye bote de materiales	10 days	Fri 5/31/24	Tue 6/11/24	33SS	J	J
36		CONSTRUCCIÓN DE BADÉN	28 days	Fri 5/31/24	Tue 7/2/24	32SS	J	J
37		REPACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES	60 days	Wed 7/3/24	Tue 9/10/24	36	J	J
38		USO BOMBAS DE ACHIQUE	10 days	Wed 7/3/24	Sun 7/14/24	32SS	J	J
39		Achique Ø3" (5,5 HP)	10 days	Wed 7/3/24	Sun 7/14/24	32SS	J	J
40		SUMINISTRO TUBERÍAS	7 days	Wed 7/3/24	Wed 7/10/24	38SS	J	J
41		De Ø½" PVC (SCH-40)	2 days	Wed 7/3/24	Thu 7/4/24	39SS	J	J
42		De Ø¾" PVC (SCH-40)	2 days	Fri 7/5/24	Sun 7/7/24	41	J	J
43		De Ø1" PVC (SCH-40)	1 day	Mon 7/8/24	Mon 7/8/24	42	J	J
44		De Ø2" PVC (SCH-40)	1 day	Tue 7/9/24	Tue 7/9/24	43	J	J
45		De Ø3" PVC SDR-26 C/IG	1 day	Wed 7/10/24	Wed 7/10/24	44	J	J
46		SUMINISTRO DE:	6 days	Thu 7/11/24	Wed 7/17/24	40	J	J
47		Coupling Ø½" PVC	6 days	Thu 7/11/24	Wed 7/17/24	41	J	J
48		Coupling Ø¾" PVC	0.5 days	Thu 7/11/24	Thu 7/11/24	42	J	J
49		Coupling Ø1" PVC	0.5 days	Thu 7/11/24	Thu 7/11/24	43	J	J
50		Coupling Ø2" PVC	0.5 days	Thu 7/11/24	Thu 7/11/24	44	J	J
51		Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	4 days	Thu 7/11/24	Mon 7/15/24	45	J	J
52		MANO DE OBRA	60 days	Wed 7/3/24	Tue 9/10/24	38SS	J	J
53		Maestro plomero (1H)	60 days	Wed 7/3/24	Tue 9/10/24	38SS	J	J
54		Peón (2H)	6 days	Wed 7/3/24	Tue 7/9/24	53SS	J	J
55		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye: Letreros con base, Conos Refractarios, Cinta de peligro, Malla de seguridad naranja, Tanques de 55 GI pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, Pasarelas de Madera	14 days	Mon 2/19/24	Tue 3/5/24	7SS	J	J

[illegible]

[illegible]

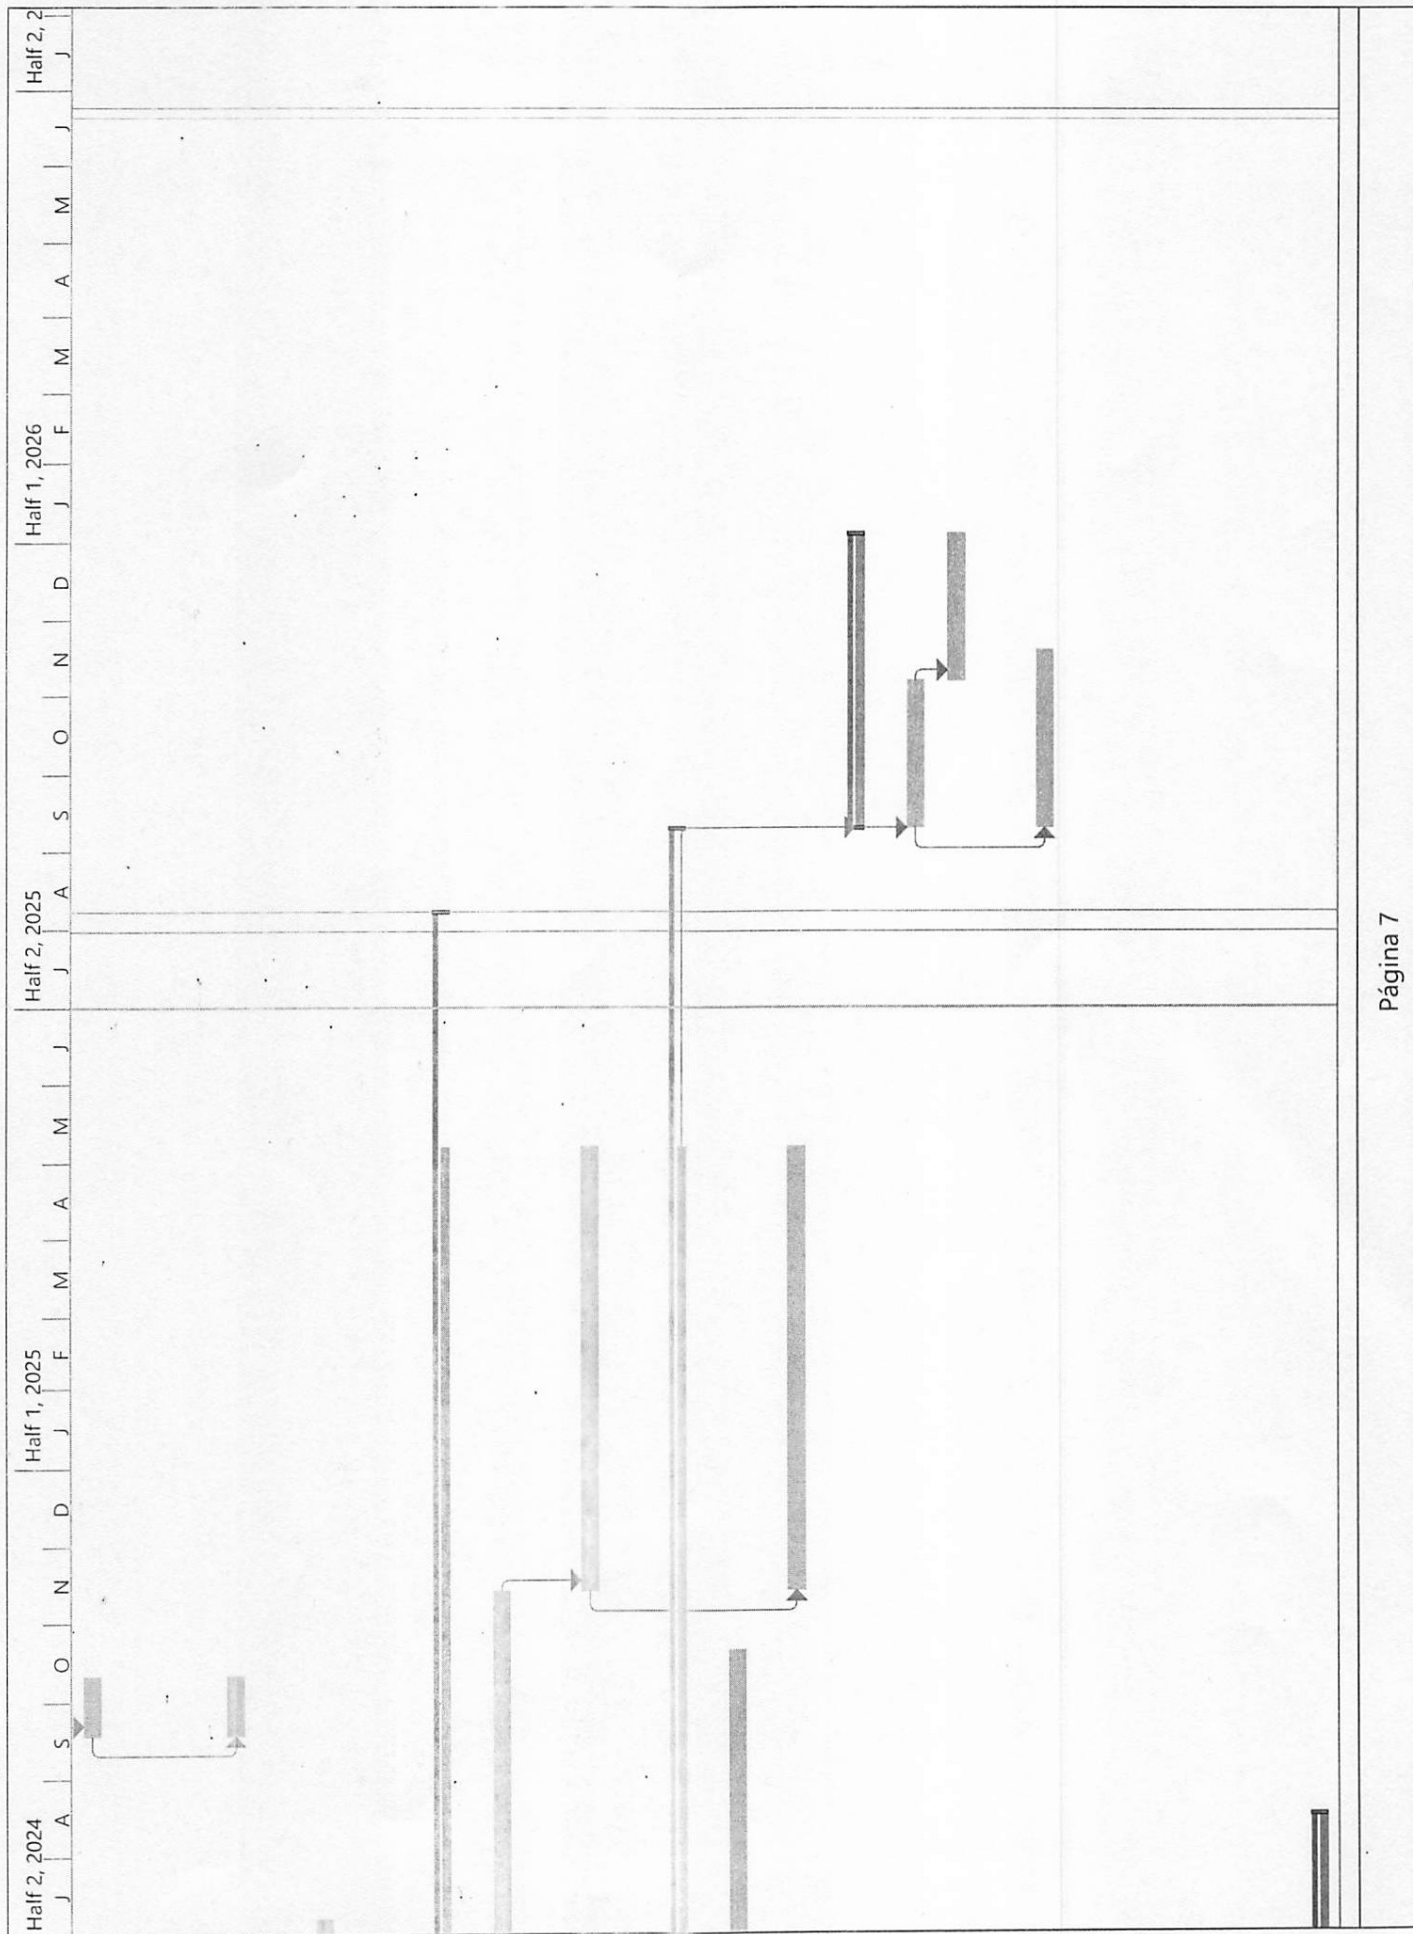

[illegible]

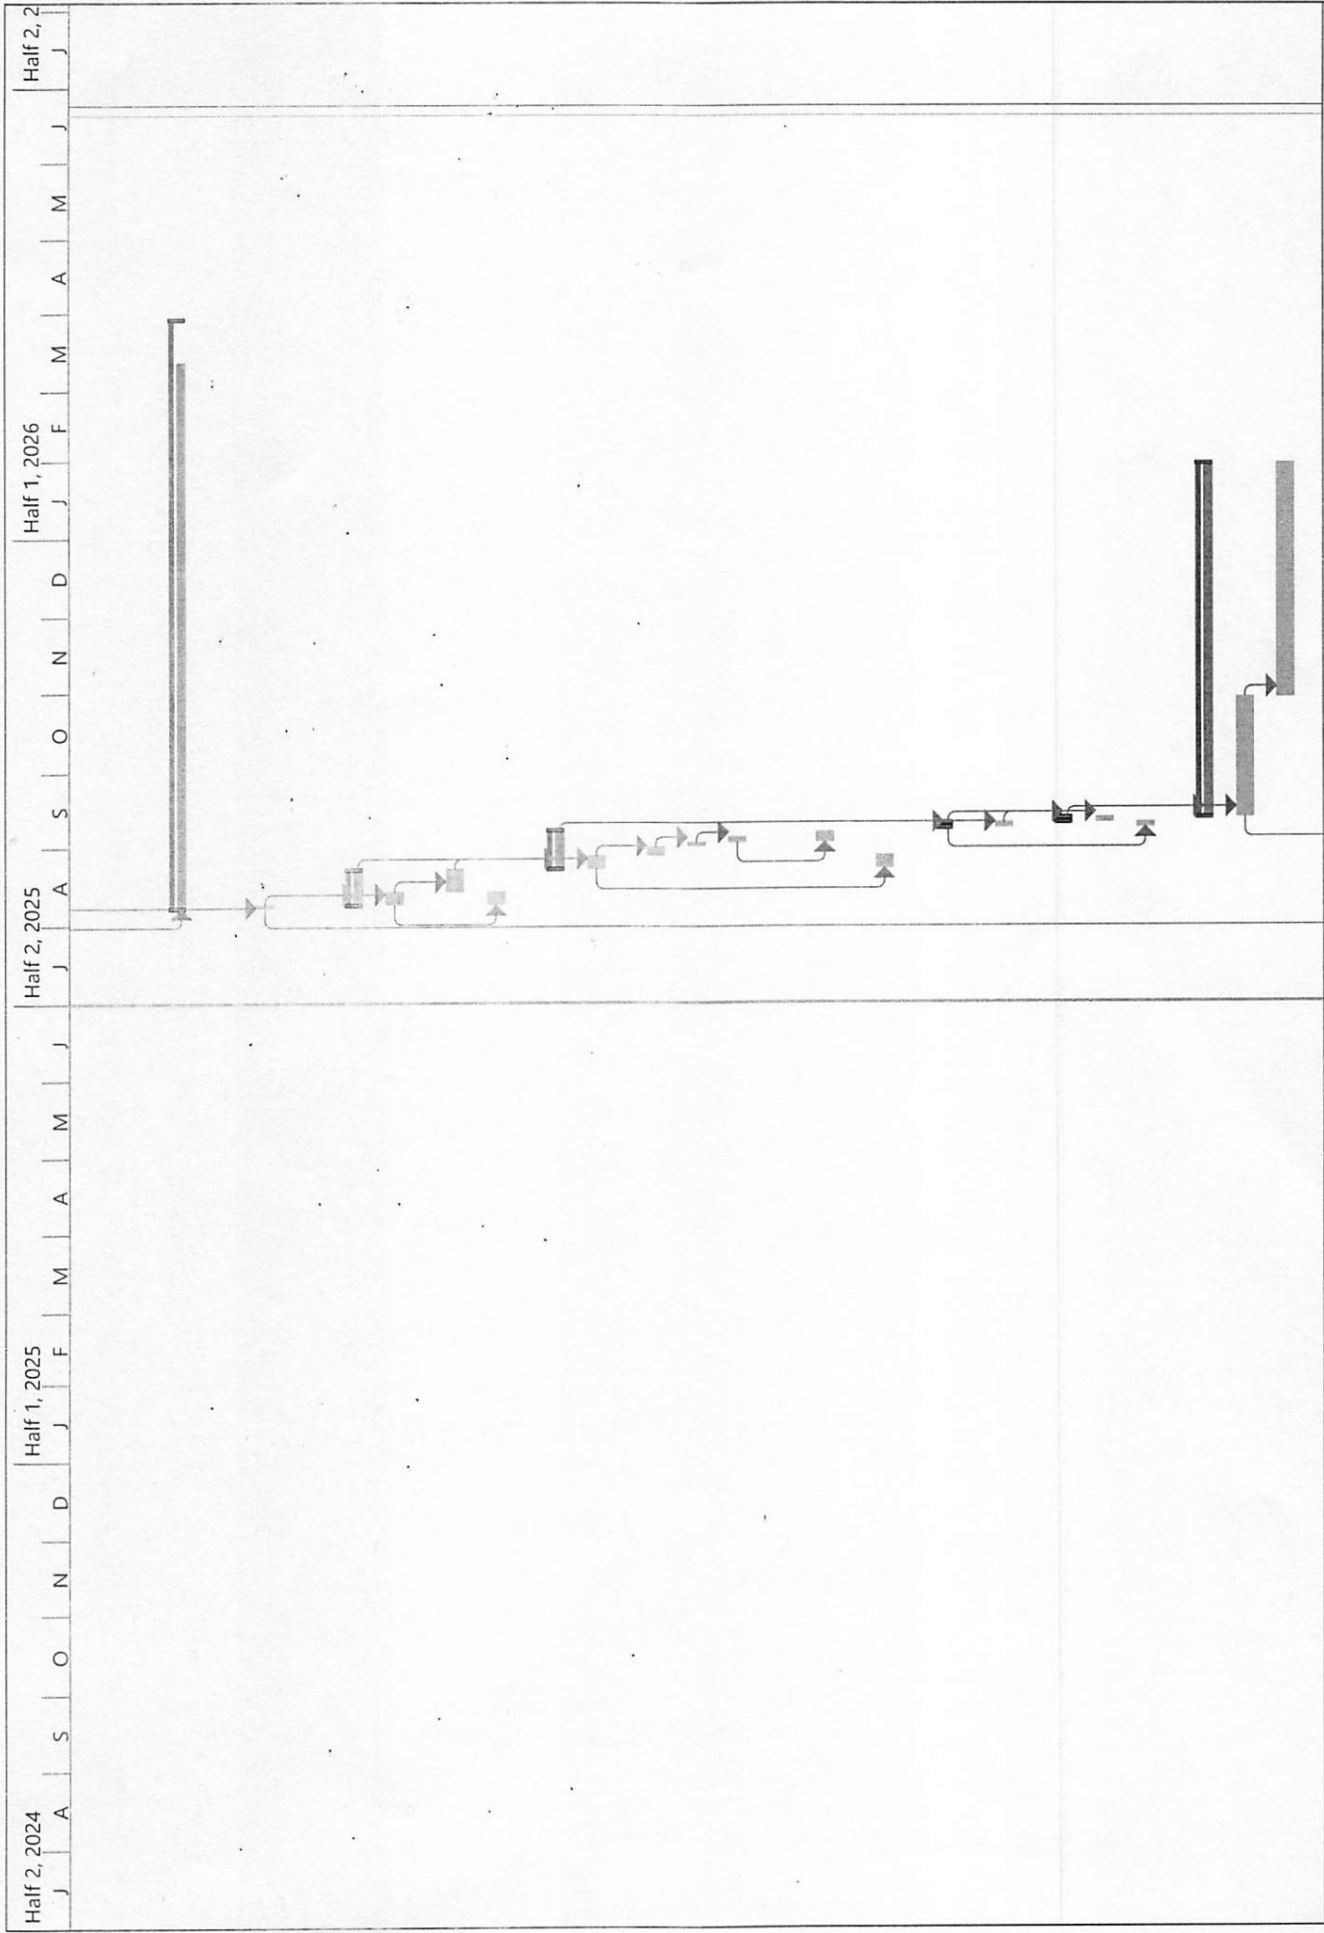

[illegible]
