

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026					
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M		
0		Obra: AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGÜEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 2)																																	
1		Ubicación: PROVINCIA LA ALTAGRACIA	522 días	jue 11/1/24	dom 11/1/26																														
2		PRESUPUESTO BASE	522 días	jue 11/1/24	vie 9/1/26																														
3		REDES DE DISTRIBUCION	151.63 días	jue 11/1/24	vie 9/8/24																														
4		REPLANTEO	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																														
5		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L=974.14 M	50 días	lun 4/3/24	vie 10/5/24																														
6		Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos l	15 días	lun 4/3/24	lun 25/3/24																														
7		Extracción carpeta asfáltica 2"	15 días	mié 20/3/24	mié 10/4/24																														
8		Bote de material con camión D= 15 Kkm. Incluye esparcimiento en lugar de botadero	15 días	dom 24/3/24	jue 11/4/24																														
9		MOVIMIENTO DE TIERRA	101 días	jue 11/1/24	jue 30/5/24																														
10		Excavación material compacto c/equipo	70 días	vie 29/3/24	jue 4/7/24																														
11		Excavación en roca c/equipo, Inc. extracción de material	47 días	dom 21/4/24	mar 25/6/24																														
12		Asiento de arena	8 días	mar 7/5/24	jue 16/5/24																														
13		Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 km	20 días	vie 10/5/24	mié 5/6/24																														
14		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	16 días	jue 16/5/24	vie 7/6/24																														
15		Bote material c/camión D= 15 KM, Incluye carguío y esparcimiento en lugar de botadero	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																														
16		SUMINISTRO DE TUBERÍAS:	70 días	jue 11/1/24	mié 17/4/24																														
17		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% pérdida por cam	58 días	mié 22/5/24	jue 8/8/24																														
18		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por cam	35 días	jue 11/1/24	mié 28/2/24																														
19		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% pérdida por cam	58 días	vie 19/4/24	mar 9/7/24																														
20		COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:	60 días	mié 8/5/24	mié 31/7/24																														
21		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	mié 8/5/24	mié 5/6/24																														
22		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	jue 9/5/24	jue 6/6/24																														
23		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	jue 9/5/24	jue 6/6/24																														
24		PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:	40 días	jue 11/1/24	mié 6/3/24																														
25		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	20 días	vie 12/1/24	mié 7/2/24																														

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026			
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
26		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	10 días	jue 11/1/24	jue 25/1/24																												
27		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometidas	10 días	jue 11/1/24	mié 24/1/24																												
28		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	150 días	jue 11/1/24	mié 7/8/24																												
29		Tee Ø 8" X 4" Acero SCH-40	4 días	jue 11/1/24	mié 17/1/24																												
30		Tee Ø 8" X 3" Acero SCH-40	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24																												
31		Tee Ø 4" X 4" PVC SCH-40	7 días	jue 11/1/24	vie 19/1/24																												
32		Tee Ø 3" X 3" PVC SCH-40	1 día	jue 11/1/24	jue 11/1/24																												
33		Cruz Ø 8" X 4" Acero SCH-40	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																												
34		Cruz Ø 3" X 3" PVC SCH-40	5 días	jue 11/1/24	mié 17/1/24																												
35		Codo de Ø 4" X 90° PVC SCH-40	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24																												
36		Codo de Ø 3" X 90° PVC SCH-40	6 días	jue 11/1/24	jue 18/1/24																												
37		Codo de Ø 3" X 45° PVC SCH-40	2 días	jue 11/1/24	vie 12/1/24																												
38		Reducción de Ø4" a 3" PVC SCH-40	2 días	jue 11/1/24	vie 12/1/24																												
39		Tapón de Ø 3" PVC SCH-40	8 días	jue 11/1/24	lun 22/1/24																												
40		Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 150 PSI	12 días	jue 11/1/24	vie 26/1/24																												
41		Junta mecánica tipo Dresser de Ø4" DE 150 PSI	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																												
42		Junta mecánica tipo Dresser de Ø8" DE 150 PSI	15 días	jue 11/1/24	mié 31/1/24																												
43		Anclajes H.S. P/piezas, según detalle	14 días	jue 11/1/24	mar 30/1/24																												
44		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	40 días	vie 12/1/24	jue 7/3/24																												
45		Válvula de compuerta Ø 4" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo	12 días	vie 12/1/24	lun 29/1/24																												
46		Válvula de compuerta Ø3" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y 2 juntas mecánicas tipo	10 días	dom 14/1/24	mié 24/1/24																												
47		Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle	8 días	mié 17/1/24	vie 26/1/24																												
48		ASFALTO	60 días	jue 11/1/24	mié 3/4/24																												
49		Riego adherencia	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																												
50		Imprimación con arena	20 días	jue 11/1/24	jue 8/2/24																												
51		Suministro de asfalto en planta esponjado	20 días	vie 12/1/24	mié 7/2/24																												

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
52		Colocación carpeta asfáltica 2"	35 días	vie 12/1/24	jue 29/2/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026								
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M					
71		VARIOS	10 días	jue 11/1/24	mié 24/1/24																																	
72		Valla anunciando obra 16' x8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x 4"	6 días	vie 12/1/24	lun 22/1/24																																	
73		Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños portatil y caseta para materiales)	5 días	lun 3/6/24	lun 10/6/24																																	
74		PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO	300 días	jue 11/1/24	mié 5/3/25																																	
75		REDES DE DISTRIBUCIÓN	277 días	jue 11/4/24	vie 2/5/25																																	
76		REPLANTEO	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																																	
77		REPLANTEO	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																																	
78		REPLANTEO	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																																	
79		MOVIMIENTO DE TIERRA	170 días	mié 11/9/24	mar 6/5/25																																	
80		Excavación material compacto c/equipo	70 días	vie 12/1/24	vie 19/4/24																																	
81		Excavación material compacto c/equipo	80 días	lun 3/6/24	lun 23/9/24																																	
82		Asiento de arena	20 días	lun 2/9/24	lun 30/9/24																																	
83		Asiento de arena	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																																	
84		Asiento de arena	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																																	
85		Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 km	30 días	jue 11/1/24	mié 21/2/24																																	
86		Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 km	30 días	jue 11/1/24	mié 21/2/24																																	
87		Suministro de material de mina para relleno (caliche) D= 20 km	45 días	jue 11/1/24	mié 13/3/24																																	
88		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	35 días	jue 11/1/24	mié 28/2/24																																	
89		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	35 días	jue 11/1/24	mié 28/2/24																																	
90		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	35 días	jue 11/1/24	mié 28/2/24																																	
91		COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:	150 días	vie 12/1/24	vie 9/8/24																																	

Página 4

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026		
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
92		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.	30 días	vie 12/1/24	vie 23/2/24																											
93		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	lun 3/6/24	lun 1/7/24																											
94		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	30 días	lun 2/9/24	lun 14/10/24																											
95		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																											
96		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																											
97		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																											
98		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																											
99		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	130 días	vie 12/1/24	vie 12/7/24																											
100		Tee Ø 8" X 4" Acero SCH-40	40 días	vie 12/1/24	vie 8/3/24																											
101		Tee Ø 8" X 3" Acero SCH-40	20 días	lun 3/6/24	lun 1/7/24																											
102		Anclajes H.S. P/piezas, según detalle	5 días	lun 2/9/24	lun 9/9/24																											
103		Anclajes H.S. P/piezas, según detalle	20 días	jue 11/1/24	mié 7/2/24																											
104		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	5 días	vie 12/1/24	vie 19/1/24																											
105		Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																											
106		ACOMETIDAS	30 días	vie 12/1/24	vie 23/2/24																											
107		Acometidas urbanas C/polietileno	15 días	vie 12/1/24	vie 2/2/24																											
108		Acometidas rurales C/polietileno	20 días	lun 3/6/24	lun 1/7/24																											
109		REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES	66.75 días	jue 11/1/24	vie 12/4/24																											
110		DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	66.75 días	jue 11/1/24	vie 12/4/24																											
111		DEMOLICIÓN:	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24																											
112		De contenes y aceras	4 días	vie 12/1/24	jue 18/1/24																											
113		Bote de material C/camión D= 5 KM, (incluye esparcimiento en botadero)	4 días	dom 14/1/24	mar 16/1/24																											

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026		
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
114		SEÑALIZACIÓN, CONTROL, manejo de tránsito y seguridad en la vía, (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios,luces intermitentes color ambar con cargadores solares, barreras de peligro naranja y	40 días	jue 11/1/24	mié 6/3/24																											
115		SEÑALIZACIÓN, CONTROL, manejo de tránsito y seguridad en la vía, (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios,luces intermitentes color ambar con cargadores solares, barreras de peligro naranja y	40 días	jue 11/1/24	mié 6/3/24																											
116		SEÑALIZACIÓN, CONTROL, manejo de tránsito y seguridad en la vía, (incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos refractarios,luces intermitentes color ambar con cargadores solares, barreras de peligro naranja y	40 días	jue 11/1/24	mié 6/3/24																											
117		LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camión y herramientas menores) con t	522 días	jue 11/1/24	vie 9/1/26																											
118		LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	522 días	jue 11/1/24	vie 9/1/26																											
119		LIMPIEZA CONTINUA y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	522 días	jue 11/1/24	vie 9/1/26																											
120		VARIOS	60 días	vie 12/1/24	vie 5/4/24																											
121		Valla anunciando obra 16' x8' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuadrado. 4" x	20 días	vie 12/1/24	vie 9/2/24																											

Página 6

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026		
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
122		Campamento, (Incluye: Alquiler de casa con o sin solar, baños portatil y caseta para materiales)	30 días	lun 3/6/24	lun 15/7/24																											
123		REDUCCION DE PARTIDAS	1 día?	jue 11/1/24	jue 11/1/24																											
124		REDES DE DISTRIBUCIÓN	1 día?	jue 11/1/24	jue 11/1/24																											
125		MOVIMIENTO DE TIERRA	1 día	vie 12/1/24	sáb 13/1/24																											
126		EXCAVACIÓN EN ROCA C/EQUIPO, INC. EXTRACCIÓN DE MATERIAL	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																											
127		AUMENTO DE CANTIDAD	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																											
128		REDES DE DISTRIBUCIÓN	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																											
129		REPLANTEO	3 días	jue 11/1/24	lun 15/1/24																											
130		CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	169.25 días?	jue 11/1/24	mié 4/9/24																											
131		CORTE CON DISCO DE CARPETA ASFALTICA 2" 2 LADOS	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																											
132		EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA DE 2"	273 días	lun 3/6/24	jue 19/6/25																											
133		BOTE DE MATERIAL CON CAMION D=15KM, INCLUYE ESPARCIAMIENTO EN LUGAR DE BOTADERO	4 días	lun 2/9/24	vie 6/9/24																											
134		MOVIMIENTO DE TIERRA	169.25 días?	jue 11/1/24	mié 4/9/24																											
135		EXCAVACION DE MATERIAL COMPACTO C/EQUIPOS	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																											
136		ASIENTO DE ARENA	273 días	lun 3/6/24	jue 19/6/25																											
137		SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO(CALICHE) D=20KM	4 días	lun 2/9/24	vie 6/9/24																											
138		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPA DE 0.20M	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24																											
139		BOTE DE MATERIAL C/CAMION D=15KM, INCLUYE ESPARCIAMIENTO EN LUGAR DE BOTADERO	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24																											
140		SUMINISTRO DE TUBERÍAS:	169.25 días	jue 11/1/24	mié 4/9/24																											

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026			
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
141		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. + 3% PÉRDIDA POR CAMPANA	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																												
142		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% PÉRDIDA POR CAMPANA	273 días	lun 3/6/24	jue 19/6/25																												
143		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. + 2% PÉRDIDA POR CAMPANA	4 días	lun 2/9/24	vie 6/9/24																												
144		COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:	114 días	jue 11/1/24	mar 18/6/24																												
145		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.	48 días	vie 12/1/24	mié 20/3/24																												
146		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	55 días	lun 3/6/24	lun 19/8/24																												
147		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	60 días	jue 11/1/24	mié 3/4/24																												
148		PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:	168 días	vie 12/1/24	mié 4/9/24																												
149		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. TRAMO SIN ACOMETIDAS	60 días	vie 12/1/24	vie 5/4/24																												
150		Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G. TRAMO SIN ACOMETIDAS	80 días	lun 3/6/24	lun 23/9/24																												
151		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. TRAMO SIN ACOMETIDAS	25 días	lun 2/9/24	lun 7/10/24																												
152		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	169 días	sáb 11/1/25	mié 3/9/25																												
153		CODO DE Ø 4" X 90° PVC SCH-40	60 días	sáb 11/1/25	jue 3/4/25																												
154		TAPÓN DE Ø 3" PVC SCH-40	70 días	jue 3/7/25	mié 8/10/25																												
155		JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER DE Ø 3" DE 150 PSI	50 días	jue 3/7/25	mié 10/9/25																												
156		JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER DE Ø4' DE 150 PSI	54 días	jue 3/7/25	mar 16/9/25																												
157		JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER DE Ø8' DE 150 PSI	45 días	jue 3/7/25	mié 3/9/25																												
158		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	169.25 días	jue 11/1/24	mié 4/9/24																												

Página 8

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026		
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
159		VÁLVULA DE COMPUERTA E3" HF PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INC. TOMILLOS, JUNTA DE GOMA, NIPLES PLATILLADOS Y 2 JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER)	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																											
160		CAJAS TELESCÓPICAS EN H.F. PARA VÁLVULA, SEGÚN DETALLE	273 días	lun 3/6/24	jue 19/6/25																											
161		ACOMETIDAS	169.25 días	jue 11/1/24	mié 4/9/24																											
162		ACOMETIDAS URBANAS C/POLIETILENO	3 días	vie 12/1/24	mié 17/1/24																											
163		REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES	6.13 días	jue 11/1/24	jue 18/1/24																											
164		DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	6.13 días	jue 11/1/24	jue 18/1/24																											
165		DEMOLICIÓN:	4 días	jue 11/1/24	mar 16/1/24																											
166		DE CONTENES Y ACERAS	4 días	vie 12/1/24	jue 18/1/24																											
167		BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN D= 5 KM, (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	4 días	dom 14/1/24	mar 16/1/24																											
168		REPOSICIÓN DE:	3 días	lun 15/1/24	mié 17/1/24																											
169		ACERA PERIMETRAL 0.80 M (HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM²	3 días	mar 16/1/24	jue 18/1/24																											
170		CONTENES	3 días	mié 17/1/24	vie 19/1/24																											


Página 9

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024												2025												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
185		COPLING DE 4" PVC	20 días	mié 12/11/25	mar 9/12/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

Arg. Freddy Ysmael García Pérez

ING. ONESIMO MORETA CUEVAS

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin													
						S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1		AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS, (PARTE 3), PROVINCIA LA ALTAGRACIA	1175 días	mar 11/1/22	sáb 11/7/26													
2		INICIO	0 días	mar 11/1/22	mar 11/1/22													
3		VALLA ANUNCIANDO OBRA	1 día	mar 11/1/22	mar 11/1/22													
4		CAMPAMENTO	1173 días	jue 13/1/22	sáb 11/7/26													
5		REDES DE DISTRIBUCION	1173 días	jue 13/1/22	sáb 11/7/26													
6		REPLANTEO	45 días	jue 20/1/22	mié 23/3/22													
7		CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA	50 días	vie 21/1/22	jue 31/3/22													
8		MOVIMIENTO DE TIERRA	900 días	vie 21/1/22	jue 4/6/26													
9		SUMINISTRO DE TUBERIA	95 días	jue 20/1/22	mié 1/6/22													
10		COLOCACION DE TUBERIA	350 días	jue 2/6/22	mié 10/9/25													
11		PRUEBA HIDROSTATICA	5 días	jue 9/10/25	mié 15/10/25													
12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS	20 días	jue 11/9/25	mié 8/10/25													
13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	20 días	jue 9/10/25	mié 5/11/25													
14		ASFALTO	45 días	jue 6/11/25	mié 7/1/26													
15		ACOMETIDAS	65 días	jue 8/1/26	mié 8/4/26													
16		REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	45 días	lun 17/1/22	vie 18/3/22													
17		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES	45 días	lun 17/1/22	vie 18/3/22													
18		EMPALME A TUBERIA EXISTENTE	10 días	jue 28/8/25	mié 10/9/25													
19		SENAUZACION, CONTROL, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1173 días	jue 13/1/22	sáb 11/7/26													
20		FIN	0 días	sáb 11/7/26	sáb 11/7/26													

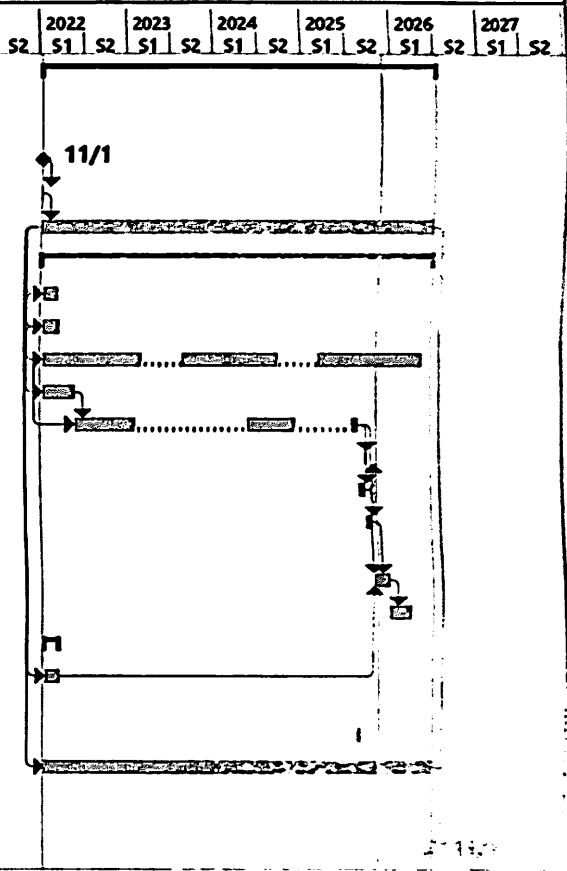

[Handwritten signature]


FERNANDO ANTONIO LARA SANCHEZ

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028											
						S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1		AMPLIACION REDES ACUEDUCTO DE HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS, (PARTE 4), PROVINCIA LA ALTAGRACIA	1305 días	sáb 29/1/22	vie 29/1/27												
2		INICIO	0 días	sáb 29/1/22	sáb 29/1/22												
3		VALLA ANUNCIANDO OBRA	1 día	lun 31/1/22	lun 31/1/22												
4		CAMPAMENTO	1304 días	mar 1/2/22	vie 29/1/27												
5		REDES DE DISTRIBUCION	1304 días	mar 1/2/22	vie 29/1/27												
6		REPLANTEO	45 días	mar 8/2/22	lun 11/4/22												
7		CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA	50 días	mié 9/2/22	mar 19/4/22												
8		MOVIMIENTO DE TIERRA	900 días	mié 9/2/22	lun 14/9/26												
9		SUMINISTRO DE TUBERIA	95 días	mar 8/2/22	lun 20/6/22												
10		COLOCACION DE TUBERIA	450 días	mar 21/6/22	lun 16/2/26												
11		PRUEBA HIDROSTATICA	5 días	mar 17/3/26	lun 23/3/26												
12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS	20 días	mar 17/2/26	lun 16/3/26												
13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	20 días	mar 17/3/26	lun 13/4/26												
14		ASFALTO	45 días	mar 14/4/26	lun 15/6/26												
15		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTA DRESSER, VALVULAS DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOVIMIENTO DE TIERRA, ACLAJE Y MANO DE OBRA)	65 días	mar 14/4/26	lun 13/7/26												
16		ACOMETIDAS	65 días	mar 14/7/26	lun 12/10/26												
17		REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	45 días	jue 3/2/22	mié 6/4/22												
18		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTENES	45 días	jue 3/2/22	mié 6/4/22												
19		EMPALME A TUBERIA EXISTENTE	10 días	mar 14/7/26	lun 27/7/26												
20		SENAIZACION, CONTROL, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD EN LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1304 días	mar 1/2/22	vie 29/1/27												
21		FIN	0 días	vie 29/1/27	vie 29/1/27												

Fernando Lara

AMPLIACION ACUEDUCTO HIGUEY A RED URBANIZACION ARBOLEDA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, ZONA VI, LOTE

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO. 020/2022

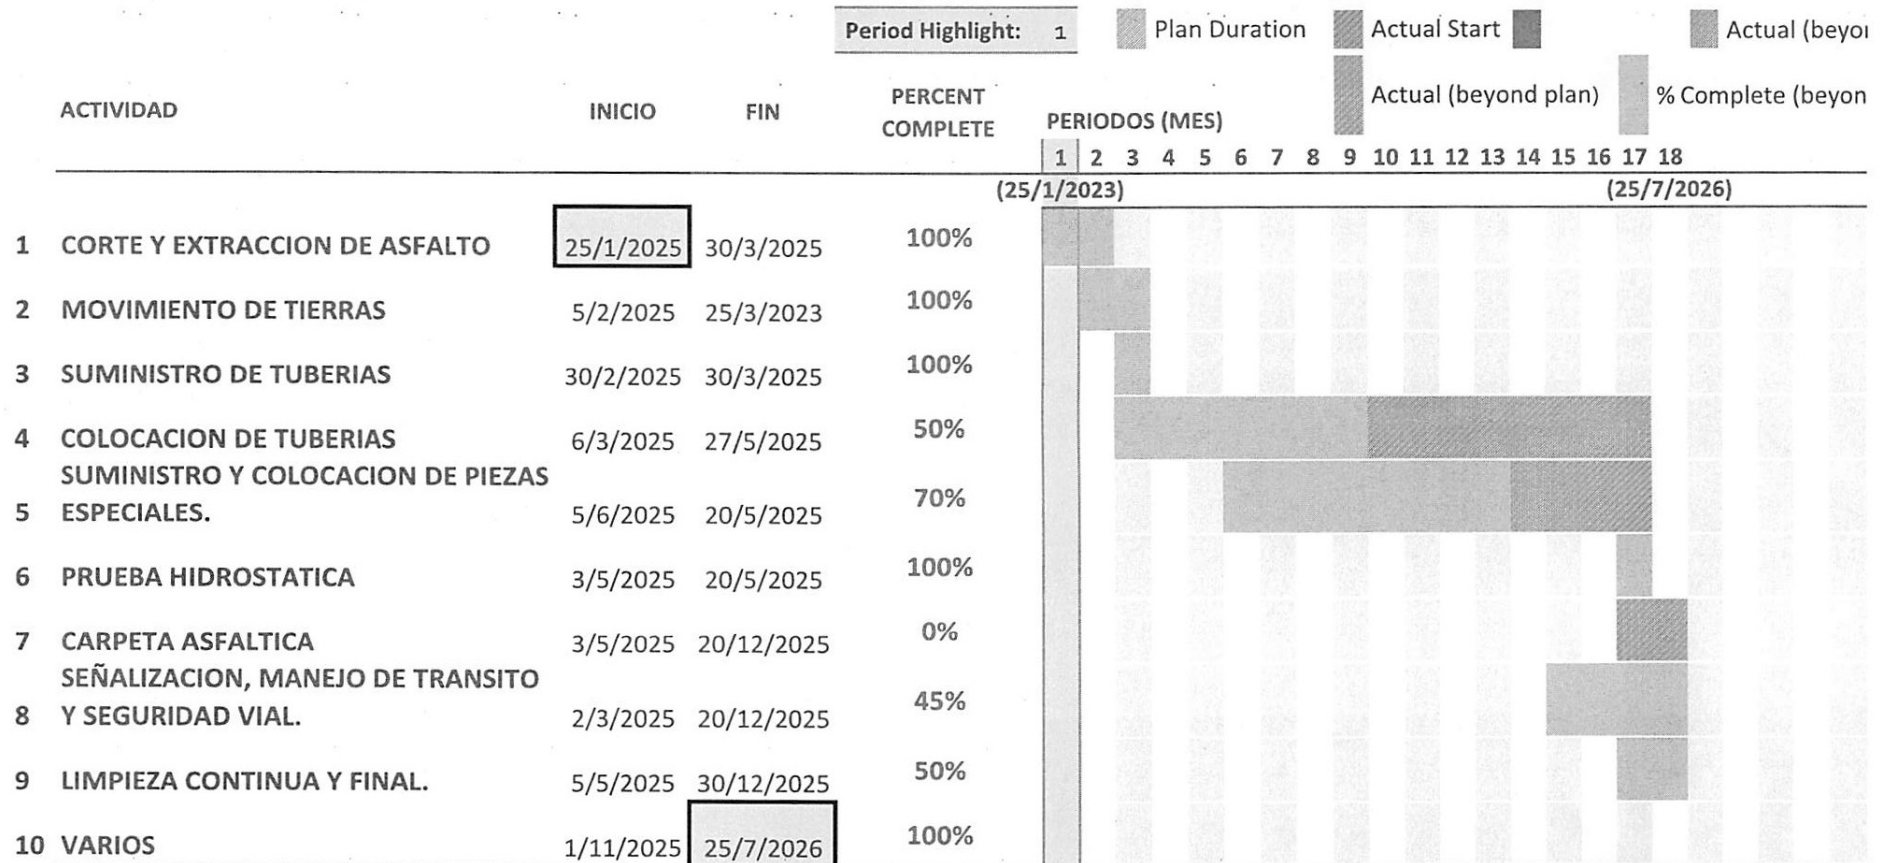

Freddu A. Recio Méndez
001-1003682-3
Freddu A. Recio Méndez
