
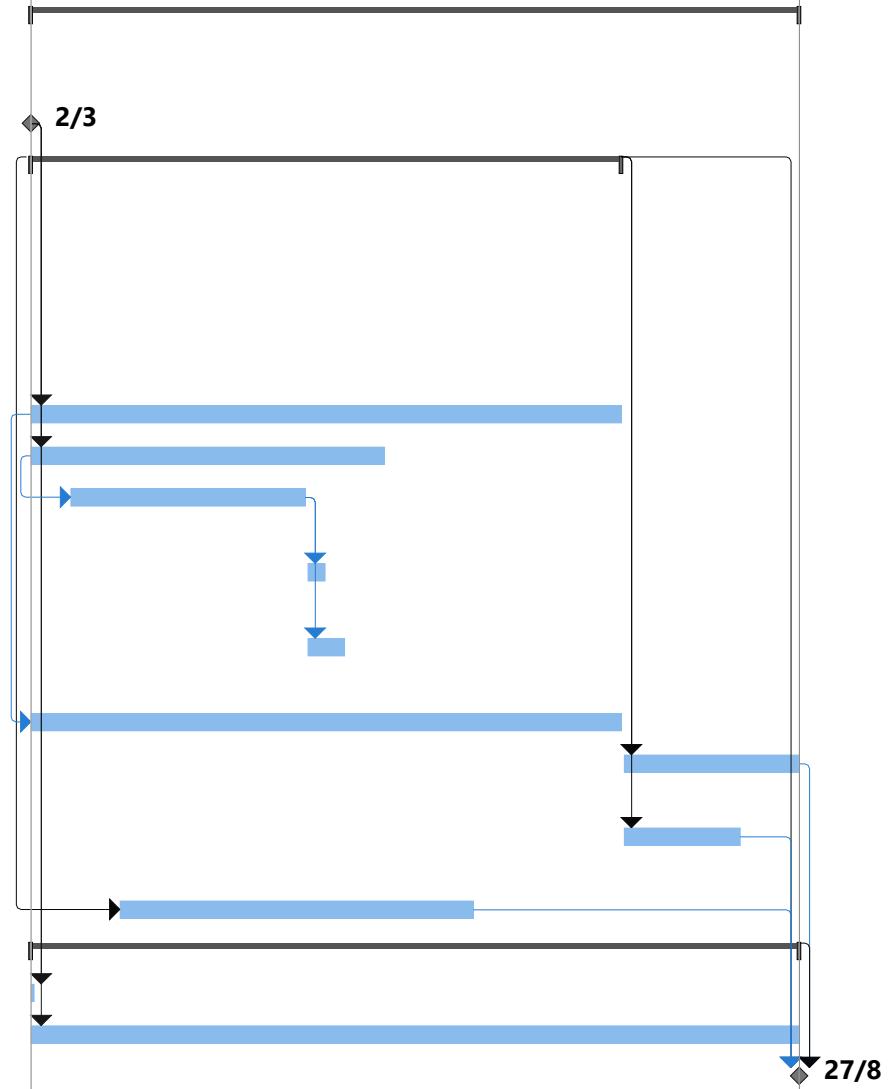


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora:	S2	2026	2027	2028	
								S1	S2	S1	
1	➡	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA CAÑADA HOYA CATIVA MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA	390 días	lun 2/3/26	vie 27/8/27						
2	➡	INICIO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26						
3	➡	CONSTRUCCIÓN CANAL CUYA SECCIÓN ES TRAPEZOIDAL (SECCIÓN CANAL 1: DESDE EO+000 @EO+400 B= M, b=5.00 M, H=2.75 M, BL 0.25 M. SECCIÓN CANAL 2: DESDE EO+400 @EO+888.20 B= M, b=8.0M, H=2.00 M, BL 0.50 M2 . REVESTIDO DE CONCRETO e=0.15 M, LONGITUD 888.20	300 días	lun 2/3/26	vie 23/4/27						
4	➡	PRELIMINARES	300 días	lun 2/3/26	vie 23/4/27	2					
5	➡	MOVIMIENTO DE TIERRA	180 días	lun 2/3/26	vie 6/11/26	2					
6	➡	HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM ² INDUSTRIAL (SECCIÓN 1 y 2) EN	120 días	lun 30/3/26	vie 11/9/26	5CC+20 días					
7	➡	EXTENSIÓN TUBERÍAS DE ENTRADA EN TALUDES LATERALES	10 días	lun 14/9/26	vie 25/9/26	6					
8	➡	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES EN TUBERÍA Ø36" CRUZADA EN CANAL	20 días	lun 14/9/26	vie 9/10/26	6					
9	➡	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	300 días	lun 2/3/26	vie 23/4/27	4CC					
10	➡	CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL Y SUMINISTRO DE PARRILLA PLUVIAL	90 días	lun 26/4/27	vie 27/8/27	3					
11	➡	CONSTRUCCIÓN CRUCES DE ALCANTARILLA TIPO CAJÓN	60 días	lun 26/4/27	vie 16/7/27	3					
12	➡	PAISAJISMO ENTORNO CAÑADA	180 días	lun 4/5/26	vie 8/1/27	3CC+45 días					
13	➡	VARIOS	390 días	lun 2/3/26	vie 27/8/27						
14	➡	VALLA	2 días	lun 2/3/26	mar 3/3/26	2					
15	➡	CAMPAMENTO	390 días	lun 2/3/26	vie 27/8/27	2					
16	➡	FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 27/8/27	vie 27/8/27	11;3;10;12					



Proyecto: Programacion Const. Fecha: vie 26/12/25	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
