



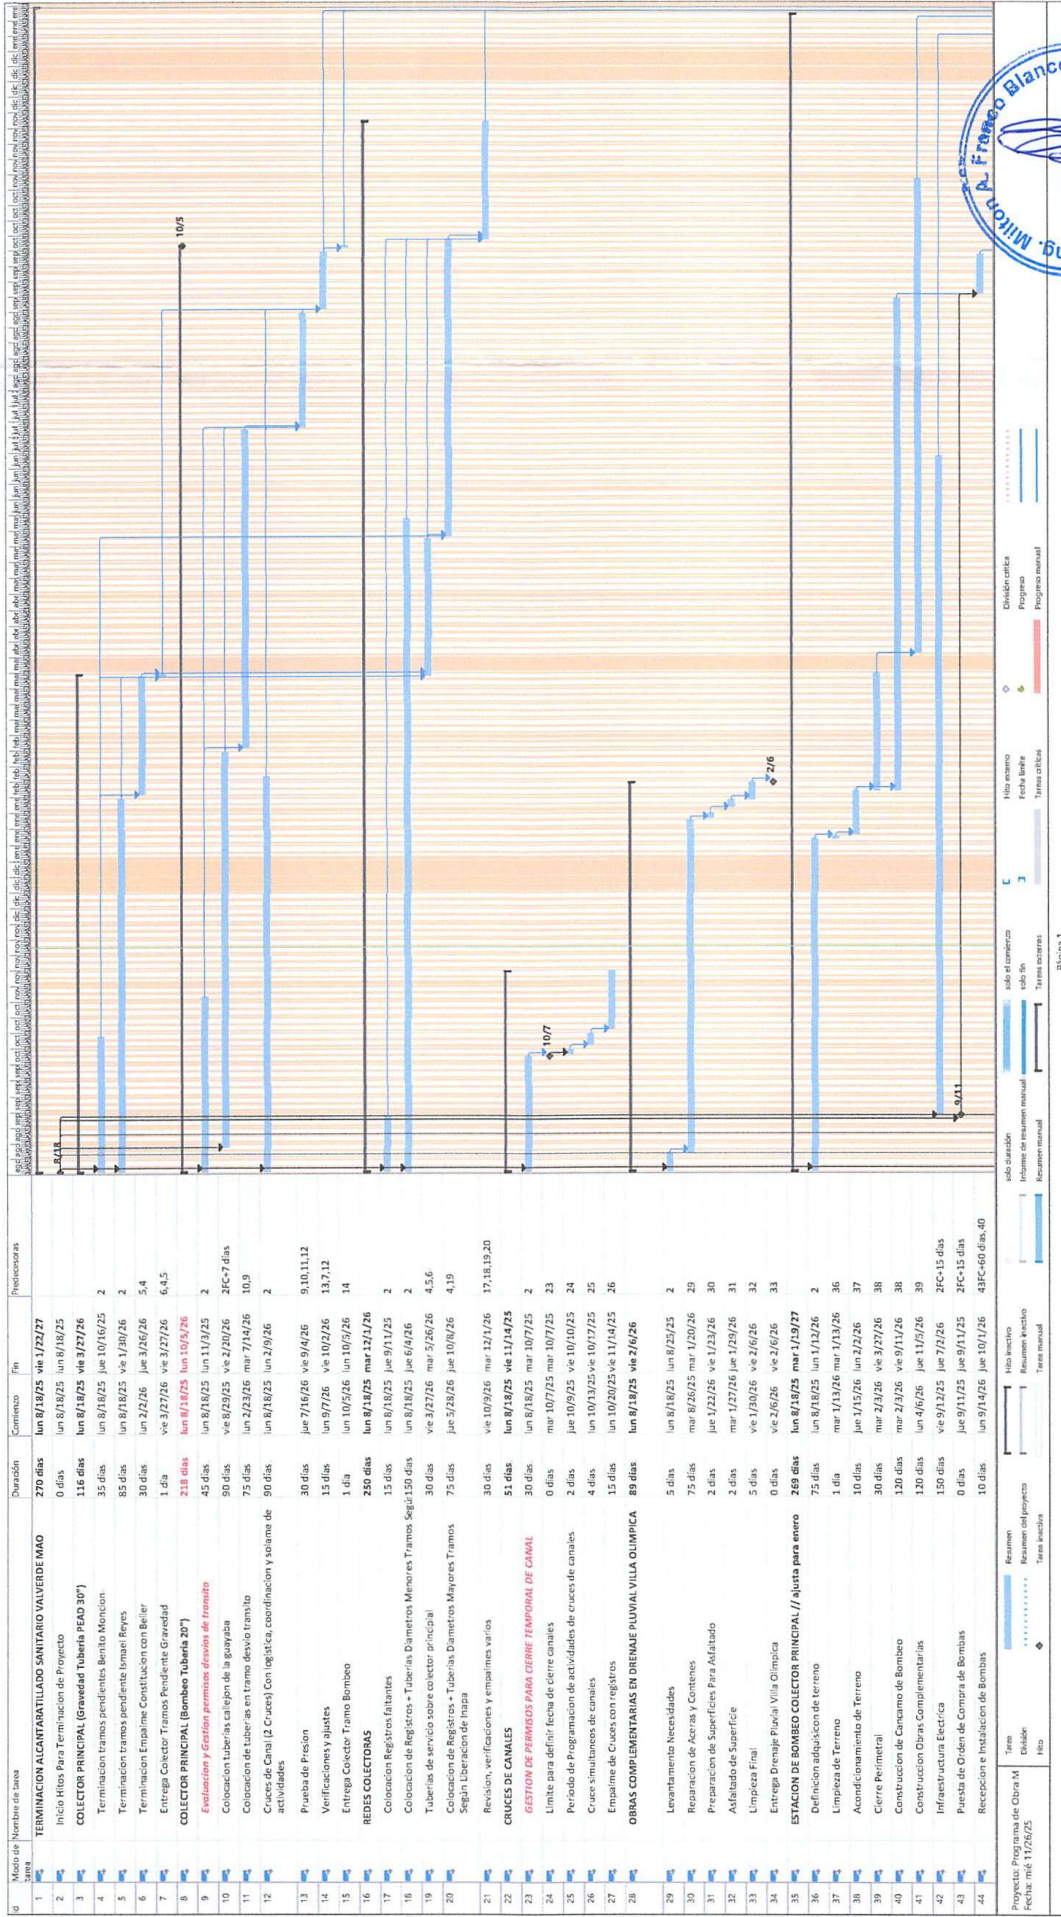

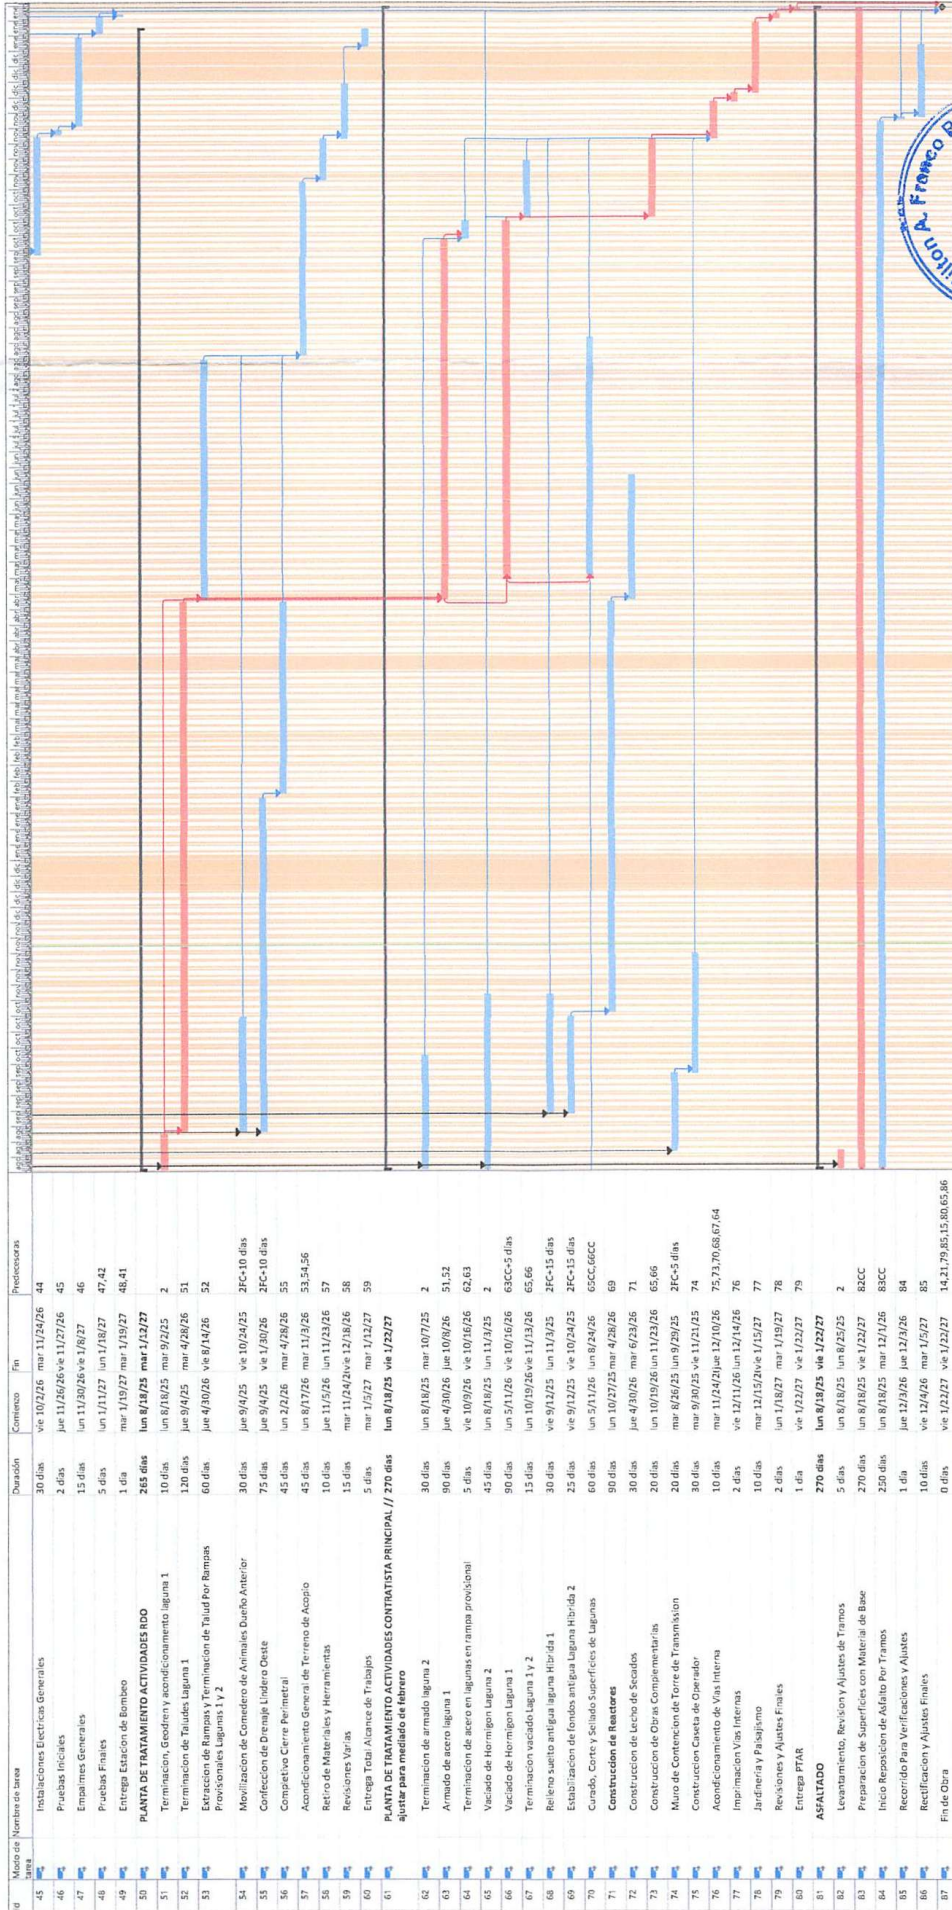

Ing. Milton A. Franco Blanco
Santo Domingo
R.D.
001-0094359-4
07-0094359-4

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia
45	Instalaciones Eléctricas Generales	30 días	vie 10/2/26	mar 11/24/26	44
46	Pruebas Finales	2 días	jue 11/26/26	vie 11/27/26	45
47	Empalmes Generales	15 días	lun 11/30/26	vie 1/8/27	46
48	Pruebas Finales	5 días	lun 1/11/27	lun 1/18/27	47, 42
49	Entrega Estación de Bombeo	1 día	mar 1/19/27	mar 1/19/27	48, 41
50	PLANTA DE TRATAMIENTO ACTIVIDADES RDO	265 días	lun 8/18/25	mar 1/22/27	
51	Terminación, Grouting y acondicionamiento laguna 1	10 días	lun 8/18/25	mar 9/2/25	2
52	Terminación de Taludes Laguna 1	120 días	jue 9/4/25	mar 4/28/26	51
53	Extracción de Rampas y Terminación de Tlud Por Rampas Provisionales Lagunas 1 y 2	60 días	jue 9/4/25	vie 8/14/26	52
54	Movilización de Concreto de Animales Dueño Anterior	30 días	jue 9/4/25	vie 10/24/25	2FC-10 días
55	Confección de Drenaje Lindero Oeste	75 días	jue 9/4/25	vie 1/30/26	2FC-10 días
56	Completivo Cierre Perimetral	45 días	lun 12/2/26	mar 4/28/26	55
57	Acondicionamiento General de Terreno de Acopio	45 días	lun 8/17/26	mar 11/3/26	53, 54, 56
58	Retiro de Materiales y Herramientas	10 días	jue 11/5/26	lun 11/23/26	57
59	Revisión de Vías	15 días	mar 11/24/26	vie 12/18/26	58
60	Entrega Total Alcance de Trabajos	5 días	mar 1/19/27	mar 1/22/27	59
61	PLANTA DE TRATAMIENTO ACTIVIDADES CONTRATISTA PRINCIPAL // ajuste para mediados de febrero	270 días	lun 8/18/25	vie 1/22/27	
62	Terminación de armado laguna 2	30 días	lun 8/18/25	mar 10/7/25	2
63	Armado de acero laguna 1	90 días	jue 9/4/26	jue 10/9/26	51, 52
64	Terminación de acero en lagunas en rampa provisional	5 días	jue 10/9/26	vie 10/16/26	62, 63
65	Vaciado de Hormigón Laguna 2	45 días	lun 8/18/25	lun 11/9/25	2
66	Vaciado de Hormigón Laguna 1	90 días	lun 5/11/26	vie 10/16/26	65CC-5 días
67	Terminación vaciado Laguna 1 y 2	15 días	lun 10/19/26	vie 11/13/26	65, 66
68	Relevo suelto antiguo laguna Hírida 1	30 días	vie 9/12/25	lun 11/9/25	2FC-15 días
69	Estabilización de fondos antigua laguna Hírida 2	25 días	vie 9/12/25	vie 10/24/25	2FC-15 días
70	Curado, Corte y Sellado Superficies de Lagunas	60 días	lun 5/11/26	lun 8/24/26	65CC-66CC
71	Construcción de Reactores	90 días	lun 10/27/25	mar 4/28/26	69
72	Construcción de Lecho de Secados	30 días	jue 4/30/26	mar 6/23/26	71
73	Construcción de Obras Complementarias	20 días	lun 10/19/26	lun 11/23/26	65, 66
74	Muro de Contención de Torre de Transmisión	20 días	mar 8/26/25	lun 9/29/25	2FC-5 días
75	Construcción Caseta de Operador	30 días	mar 9/30/25	vie 11/21/25	74
76	Acondicionamiento de Vías Internas	10 días	mar 11/24/26	jue 12/10/26	75, 73, 70, 65, 67, 64
77	Impregnación Vías Internas	2 días	vie 12/11/26	lun 12/14/26	76
78	Jardinería y Paisajismo	10 días	mar 12/15/26	vie 1/13/27	77
79	Revisión y Ajustes Finales	2 días	lun 1/18/27	mar 1/19/27	78
80	Entrega PTAR	1 día	vie 1/22/27	vie 1/22/27	79
81	ASFIATADO	270 días	lun 8/18/25	vie 1/22/27	
82	Levantamiento, Revisión y Ajustes de Tramos	5 días	lun 8/18/25	lun 8/25/25	2
83	Preparación de Superficies con Material de Base	270 días	lun 8/18/25	vie 1/22/27	82CC
84	Inicio Reposición de Asfalto Por Tramos	250 días	lun 8/18/25	mar 12/1/26	83CC
85	Recorrido Para Verificaciones y Ajustes	1 día	jue 12/13/26	jue 12/13/26	84
86	Rectificación y Ajustes Finales	10 días	vie 12/14/26	mar 1/15/27	85
87	Fin de Obra	0 días	vie 1/22/27	vie 1/22/27	14, 21, 79, 85, 15, 80, 65, 86
