



**Construcción Sistema de Saneamiento
Arroyo Gurabo y Su Entorno
Cronograma de Adenda de Obra**




Id	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Cronograma Gantt																									
					mar	tri 2, 2025	abr	may	jun	tri 3, 2025	jul	ago	sep	tri 4, 2025	oct	nov	dic	tri 1, 2026	ene	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul			
0	0	Cronograma ADD - Construcción Sistema de Saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno	18/4/2025	18/6/2026	[Gantt bar from 18/4/2025 to 18/6/2026]																									
1	1	Inicio	18/4/2025	18/4/2025	◆ 18/4																									
2	2	Fin	18/6/2026	18/6/2026	◆ 18/6																									
23	7	COLECTORES RESIDUALES PARALELOS AL CANAL: COLOCACIÓN TUBERÍA Ø12" PVC SDR-32.5 LONG. 6.00KM Y Ø16" PVC SDR-32.5 LONGITUD 4.4KM	18/4/2025	18/6/2026	[Gantt bar from 18/4/2025 to 18/6/2026]																									
27	8	REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES	8/1/2026	17/3/2026	[Gantt bar from 8/1/2026 to 17/3/2026]																									
29	9	ALCANTARILLA DE 42 H.A. Y SUS CABEZALES	8/1/2026	30/3/2026	[Gantt bar from 8/1/2026 to 30/3/2026]																									
31	10	VERJA PERIMETRAL EN LOS SOLARES, CIRUELITOS Y LA TERRACITA	16/12/2025	26/5/2026	[Gantt bar from 16/12/2025 to 26/5/2026]																									
33	11	INTERCONEXIONES	1/9/2025	18/6/2026	[Gantt bar from 1/9/2025 to 18/6/2026]																									
35	12	SOLUCION PLUVIAL CALLE 15 Y AV HATUEY	8/1/2026	24/4/2026	[Gantt bar from 8/1/2026 to 24/4/2026]																									
37	13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PARQUES	8/1/2026	11/6/2026	[Gantt bar from 8/1/2026 to 11/6/2026]																									
39	14	MISCELÁNEOS (OTROS SERVICIOS)	1/9/2025	25/5/2026	[Gantt bar from 1/9/2025 to 25/5/2026]																									

[Handwritten signature]



Tarea	[Barra gris]	Resumen del proyecto	[Barra blanca]	Tarea manual	[Barra gris]	solo el comienzo	[Caja]	Fecha limite	↓
División	[Puntos]	Tarea inactiva	[Barra blanca]	solo duración	[Barra gris]	solo fin	[Caja]	Progreso	[Barra]
Hito	◆	Hito inactivo	◆	Informe de resumen manual	[Barra gris]	Tareas externas	[Barra]	Progreso manual	[Barra]
Resumen	[Barra gris]	Resumen inactivo	[Barra blanca]	Resumen manual	[Barra gris]	Hito externo	◆		

ID	Task Mode	Fase	Nombre de tarea	Qty	UoM	Rend	Duracion Estimada	Duration	Start	Finish	3, 2024 Aug	Qtr 4, 2024 Oct	Qtr 1, 2025 Nov	Qtr 2, 2025 Dec	Qtr 3, 2025 Jan	Qtr 4, 2025 Feb	Qtr 1, 2026 Mar	Qtr 2, 2026 Apr	Qtr 3, 2026 May	Qtr 4, 2026 Jun	Qtr 1, 2027 Jul	Qtr 2, 2027 Aug	Qtr 3, 2027 Sep	Qtr 4, 2027 Oct	Qtr 1, 2028 Nov	Qtr 2, 2028 Dec	Qtr 3, 2029 Jan	Qtr 4, 2029 Feb			
1			CANALIZACIÓN ARROYO GURABO- ETAPA II	0		0	121,31	740,38 days	Fri 30/08/24	Tue 08/12/26																					
2	✓		PRELIMINARES	0		0	0	43,75 days	Fri 30/08/24	Fri 18/10/24																					
3	✓		Notificación de adjudicación	0		0	0	0 days	Fri 30/08/24	Fri 30/08/24																					
4	✓		Constitución de garantías	0		0	0	0 days	Fri 30/08/24	Fri 30/08/24																					
5	✓		Firma del Contrato	0		0	0	0 days	Mon 09/09/24	Mon 09/09/24																					
6	✓		Gestiones Contractuales Contraloría	0		0	0	0 days	Mon 09/09/24	Mon 09/09/24																					
7	✓		Recepción del anticipo	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
8	✓		Otros	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
9	✓		Recepción de la Ingeniería de Detalle	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
10	✓		Recepción del Estudio de Impacto Ambiental	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
11	✓		INICIO DE LA OBRA	0		0	0	0 days	Fri 01/11/24	Fri 01/11/24																					
12	✓		MOVILIZACION	0		0	0	10 days	Fri 01/11/24	Tue 12/11/24																					
13	✓		PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
14	✓		METODOLOGÍA DE TRABAJO	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
15	✓		ENSAYOS DE MATERIALES	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
16	✓		FICHAS TÉCNICAS MATERIALES-MURO MESA	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
17	✓		FICHAS TÉCNICAS MATERIALES-TERRAMESH	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
18	✓		MEZCLAS DE HORMIGÓN	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
19	✓		FICHAS TÉCNICAS-GEOMANTO CONTROL EROSIÓN	0		0	0	0 days	Fri 18/10/24	Fri 18/10/24																					
20	✓		PROCURAS CLAVES	0		0	0	60 days	Fri 18/10/24	Tue 24/12/24																					
21	✓		MATERIALES RELLENOS	0		0	0	30 days	Fri 18/10/24	Thu 21/11/24																					
22	✓		MATERIALES-MURO MESA	0		0	0	60 days	Fri 18/10/24	Tue 24/12/24																					
23	✓		MATERIALES-TERRAMESH	0		0	0	60 days	Fri 18/10/24	Tue 24/12/24																					
24	✓		GEOMANTO CONTROL EROSIÓN	0		0	0	60 days	Fri 18/10/24	Tue 24/12/24																					
25			TRABAJOS CONTRACTUALES	0		0	121,31	667,13 days	Tue 12/11/24	Mon 30/11/26																					

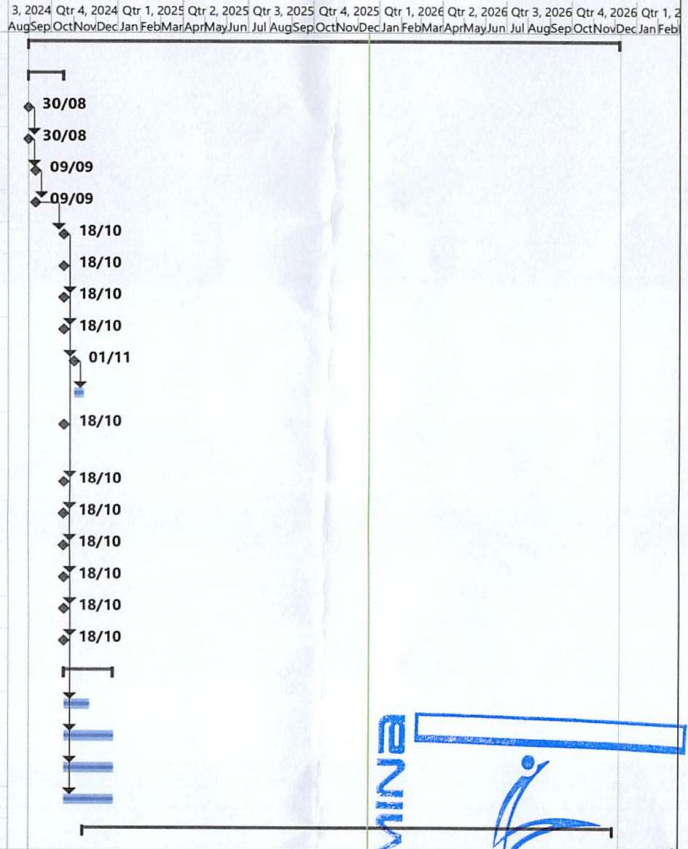

Tarea Resumen del proyecto Tarea manual solo el comienzo Fecha límite
 División Tarea inactiva Tarea duración solo fin Progreso
 Hit Hit inactivo Informe de resumen manual Tareas externas Progreso manual
 Resumen Resumen inactivo Resumen manual Hit externo

Proyecto: CRONOGRAMA CAN
 Fecha: Wed 17/12/25

