



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predifensoras
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO PEDERNALES	1,097 días	ma. 15/08/23 9:00	sá. 15/08/26 17:00	
POZO NO. 1	540 días	ma. 15/08/23 9:00	ma. 04/02/25 19:00	
PERFORACION DE POZO	105 días	ma. 15/08/23 9:00	lu. 27/11/23 19:00	
Limpieza y desarrollo por pistoneo	55 días	ma. 15/08/23 9:00	do. 08/10/23 17:00	
Prueba de Aforo	50 días	lu. 09/10/23 9:00	lu. 27/11/23 19:00	4
ELECTRIFICACION PRIMARIA	5 días	lu. 16/10/23 9:00	vi. 20/10/23 19:00	24
EQUIPOS DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	220 días	ju. 20/06/24 9:00	sá. 25/01/25 17:00	8
EQUIPO BOMBEO POZO	220 días	lu. 13/11/23 9:00	mi. 19/06/24 19:00	22
VERJA PERIMETRAL	540 días	ma. 15/08/23 9:00	ma. 04/02/25 19:00	
Movimiento de tierra	15 días	ma. 15/08/23 9:00	ma. 29/08/23 19:00	455
Hormigon Armado	20 días	mi. 30/08/23 9:00	lu. 18/09/23 19:00	10
Muros de bloques	15 días	ma. 19/09/23 9:00	ma. 03/10/23 19:00	11
Terminacion de Superficie	20 días	mi. 04/10/23 9:00	lu. 23/10/23 19:00	12
Pintura	10 días	do. 26/01/25 8:00	ma. 04/02/25 19:00	7
GARITA DE VIGILANTE	325 días	ma. 15/08/23 9:00	ju. 04/07/24 19:00	
Replanteo	5 días	ma. 15/08/23 9:00	sá. 19/08/23 17:00	1055
Movimiento de tierra	15 días	do. 20/08/23 8:00	do. 03/09/23 17:00	16
Hormigon Armado	20 días	lu. 04/09/23 9:00	sá. 23/09/23 17:00	17
Muro de bloques	15 días	do. 24/09/23 8:00	do. 08/10/23 17:00	18
Terminacion de Superficie	20 días	lu. 09/10/23 9:00	sá. 28/10/23 17:00	19
Pintura	15 días	ju. 20/06/24 9:00	ju. 04/07/24 19:00	8
Instalacion de Forton	15 días	do. 29/10/23 8:00	do. 12/11/23 17:00	20
Instalaciones Sanitarias	20 días	ma. 26/09/23 9:00	do. 15/10/23 17:00	1955+2 días
Electrificacion	20 días	ma. 26/09/23 9:00	do. 15/10/23 17:00	1955+2 días
POZO NO. 2	542 días	ju. 20/02/25 9:00	sá. 15/08/26 17:00	
PERFORACION DE POZO	80 días	ju. 20/02/25 9:00	sá. 10/05/25 17:00	
Perforacion con maquina	40 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	14FS+15 días
Renurado de tubería	40 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	2755
Encamisado	40 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	2855
Suministro de tubería	40 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	2955
Suministro de Zapata de Acero	40 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	3055
Limpieza y desarrollo por pistoneo	40 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	3155
Prueba de Aforo	40 días	ma. 01/04/25 9:00	sá. 10/05/25 17:00	32
ELECTRIFICACION PRIMARIA	250 días	mi. 30/04/25 9:00	do. 04/01/26 17:00	52
EQUIPOS DE ELECTRIFICACION PRIMARIA	204 días	lu. 19/01/26 9:00	lu. 10/08/26 19:00	36
EQUIPO BOMBEO POZO	261 días	sá. 03/05/25 8:00	do. 18/01/26 17:00	50
VERJA PERIMETRAL	542 días	ju. 20/02/25 9:00	sá. 15/08/26 17:00	
Movimiento de tierra	5 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 24/02/25 19:00	2755
Hormigon Armado	10 días	ma. 25/02/25 9:00	ju. 06/03/25 19:00	38
Muros de bloques	10 días	vi. 07/03/25 9:00	do. 16/03/25 17:00	39
Terminacion de Superficie	10 días	lu. 17/03/25 9:00	mi. 26/03/25 19:00	40
Pintura	5 días	ma. 11/08/26 9:00	sá. 15/08/26 17:00	35
GARITA DE VIGILANTE	348 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 02/02/26 19:00	
Replanteo	5 días	ju. 20/02/25 9:00	lu. 24/02/25 19:00	3855
Movimiento de tierra	15 días	ma. 25/02/25 9:00	ma. 11/03/25 19:00	44
Hormigon Armado	20 días	mi. 12/03/25 9:00	lu. 31/03/25 19:00	45
Muro de bloques	7 días	ma. 01/04/25 9:00	lu. 07/04/25 19:00	46
Terminacion de Superficie	15 días	ma. 08/04/25 9:00	ma. 22/04/25 19:00	47
Pintura	15 días	lu. 19/01/26 9:00	lu. 02/02/26 19:00	36
Instalacion de Forton	10 días	mi. 23/04/25 9:00	vi. 02/05/25 19:00	48
Instalaciones Sanitarias	20 días	ju. 10/04/25 9:00	ma. 29/04/25 19:00	4855+2 días
Electrificacion	20 días	ju. 10/04/25 9:00	ma. 29/04/25 19:00	4855+2 días




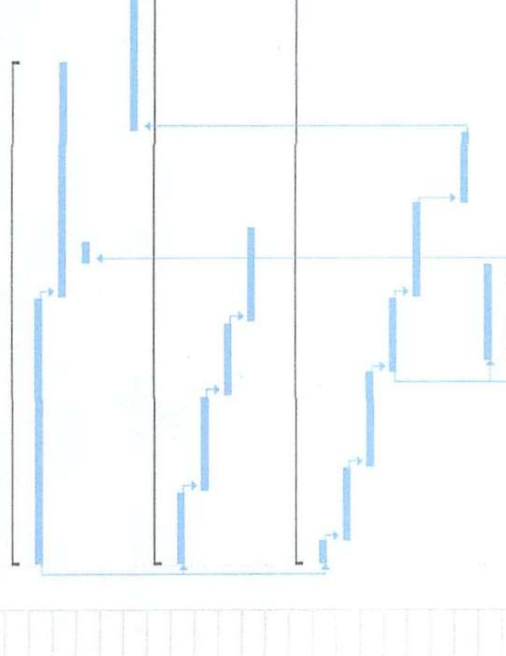

26 en 02 fe 09 | 16 fe 23 fe 02 m 09 m 16 m 23 m 30 m 06 ab 13 ab 20 ab 27 ab 04 m 11 m 18 m 25 m 01 ju 08 ju 15 ju 22 ju 29 ju 06 jul 13 jul 20 jul 27 jul 03 ag 10 ag 17 ag 24 ag 31 ag 07 se 14 se 21 se 28 se 05 oc 12 oc 19 oc 26 oc 02 n 09 n 16 n 23 n 30 n 07 di 14 di 21 di 28 di 04 en 11 en 18 en 25 en 01 fe 08 fe

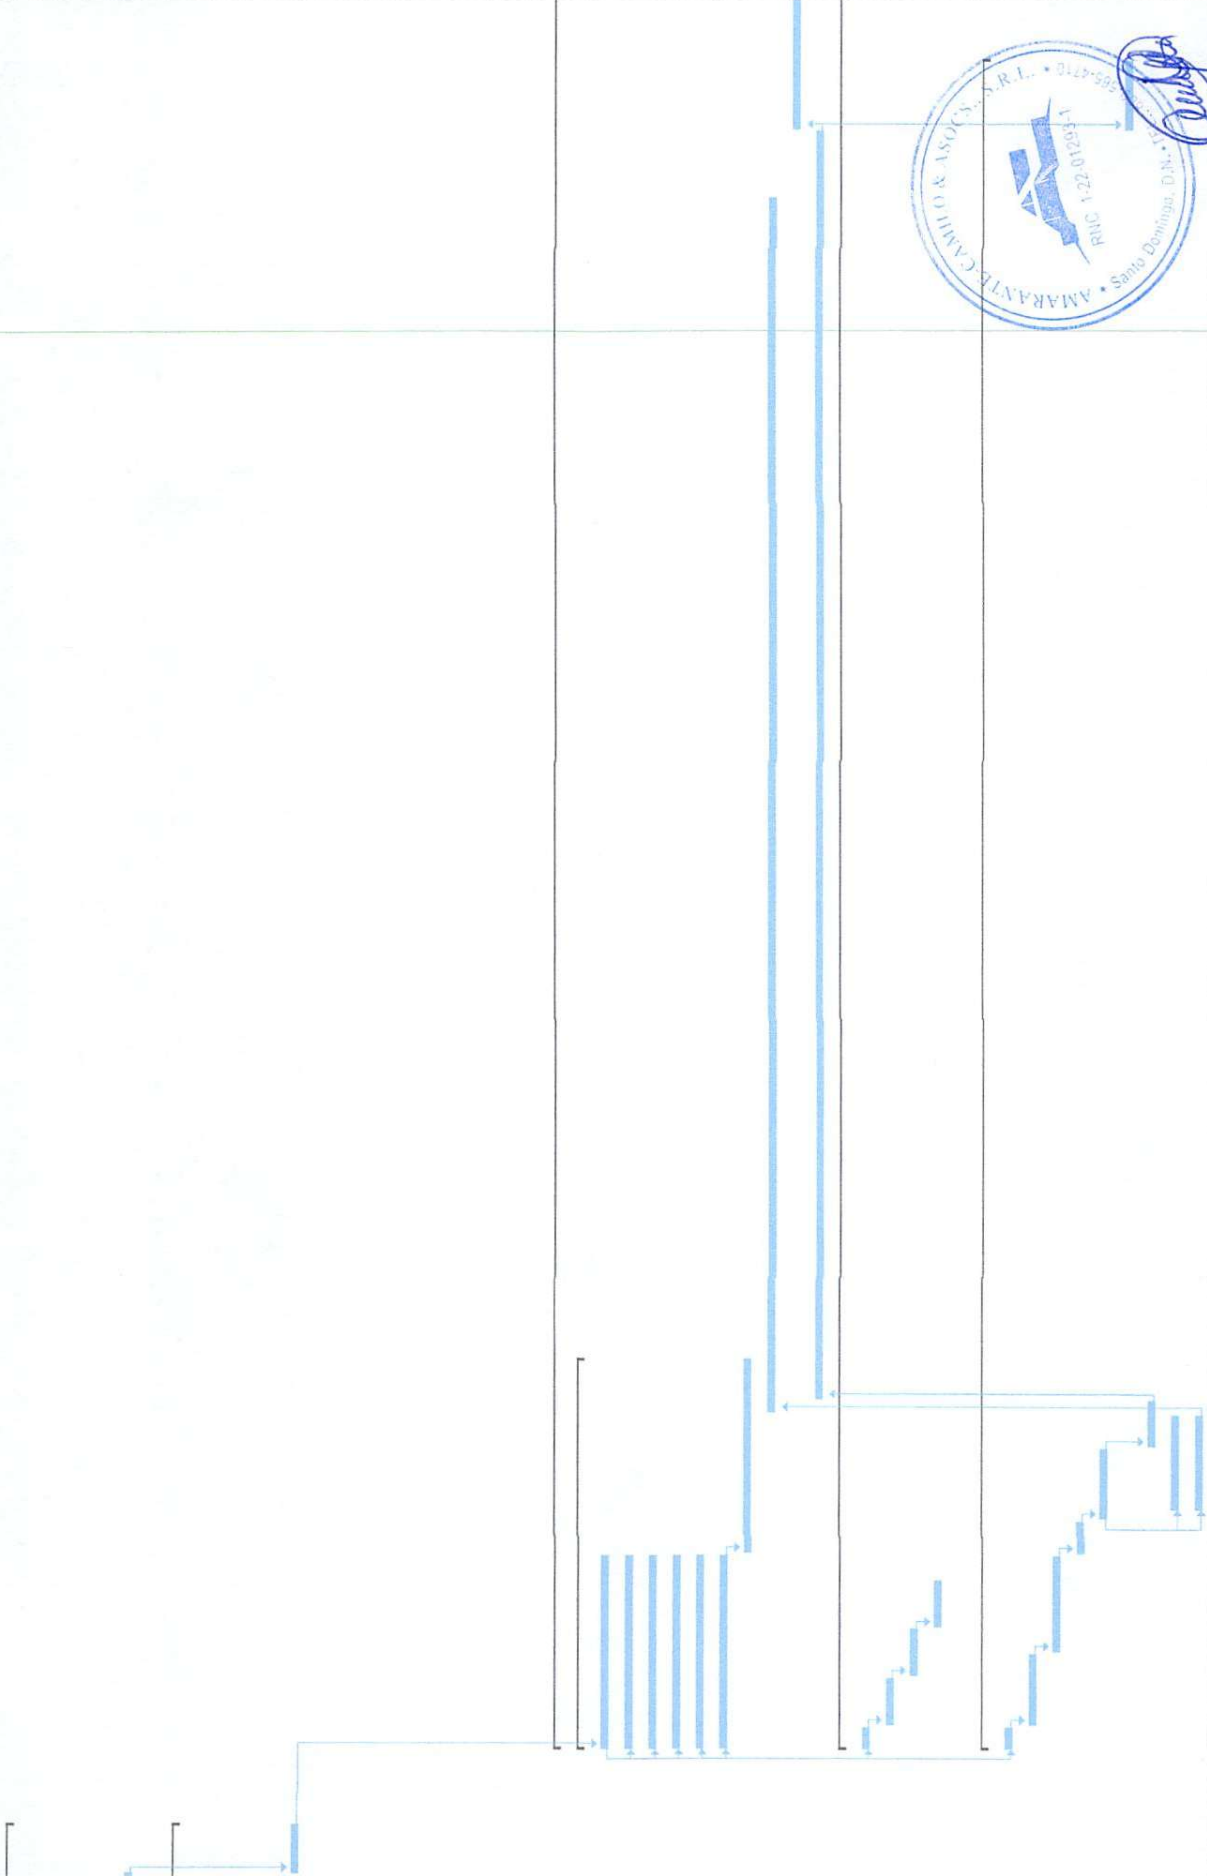

5 fe 22 fe 01 m 08 m 15 m 22 m 29 m 05 ab 12 ab 19 ab 26 ab 03 m 10 m 17 m 24 m 31 m 07 ju 14 ju 21 ju 28 ju 05 jul 12 jul 19 jul 26 jul 02 ag 09 ag 16 ag 23 ag 30 ag 06 se 13 se 20 se 27 se 04 oc 11 oc 18 oc 25 oc 01 n 08 n 15 n 22 n 29 n 06 di 13 di 20 di 27 di 03 en 10 en 17 en 24 en 31 en 07 fe 14 fe 21 fe 28 fe 07 fe



Proyecto: Project1  
 Fecha: lu. 08/12/25  
 14:15

Tarea	Informe de resumen manual
División	Resumen manual
Hito	solo el comienzo
Resumen	solo fin
Resumen del proyecto	Tareas externas
Tarea inactiva	Hito externo
Hito inactivo	Fecha límite
Resumen inactivo	Progreso
Tarea manual	Progreso manual
solo duración	

