


CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	2025	ene	mar	may	jul	sep	nov	2026	ene	mar	may	jul	sep	nov
1	PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS	548 días	mar 18-03-25	jue 17-09-26														
2	CASA DE QUÍMICOS	363 días	sáb 29-03-25	vie 27-03-26														
3	TRABAJOS DE ADECUACIÓN	304 días	sáb 29-03-25	mar 27-01-26														
4	Suministro y colocación de elevador de sulfato con diferencial eléctrico industrial 1 ton.	10 días	vie 16-01-26	lun 26-01-26														
5	Rapilado de techo y paredes	6 días	vie 16-01-26	jue 22-01-26														
6	Fino de techo	3 días	sáb 29-03-25	mar 01-04-25														
7	Impermeabilizante de techo con lona asfáltica de 4 mm	3 días	mar 01-04-25	vie 04-04-25														
8	Resane y masilla de pared	5 días	jue 22-01-26	mar 27-01-26														
9	Pintura acrílica exterior e interior de almacén casa de químicos (techo y paredes)	5 días	dom 18-01-26	vie 23-01-26														
10	Suministro y colocación de puerta entrada de dos hojas (1.80 m incluye limpieza final área de sulfato, las tinas y riel soporte de agitadores)	2 días	vie 16-01-26	dom 18-01-26														
11	Limpieza final área de sulfato, las tinas y riel soporte de agitadores	2 días	dom 25-01-26	mar 27-01-26														
12	Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1.5 HPM, monofásico 115/240 V, frecuencia 60 Hz, 1,750 rpm con motor reductor, vástago ø3/4" acero inoxidable y aspas con 4 aletas.	5 días	mar 20-01-26	dom 25-01-26														
13	Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø1/2" HP rango de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, transporte y	5 días	mar 20-01-26	dom 25-01-26														
14	BAÑO	5 días	mar 27-01-26	dom 01-02-26														
15	Inodoro	3 días	mar 27-01-26	vie 30-01-26														
16	Lavamanos	3 días	mar 27-01-26	vie 30-01-26														
17	Mano de obra instalación (incluye desmonte de aparato existente)	5 días	mar 27-01-26	dom 01-02-26														
18	Puerta polimétrica blanca (incluye llav 2	2 días	mar 27-01-26	jue 29-01-26														
19	ELECTRICOS	4 días	dom 01-02-26	jue 05-02-26														
20	Suministro y colocación de roseta de porcelana con bombilla de bajo	2 días	dom 01-02-26	mar 03-02-26														
21	Suministro y colocación de panel de breaker 4/8 c, 125 Amp incl. Breaker	4 días	dom 01-02-26	jue 05-02-26														
22	Suministro y colocación de accesorios eléctricos (interruptores y	2 días	dom 01-02-26	mar 03-02-26														
23	TINAS	277 días	jue 17-04-25	lun 19-01-26														
24	Limpieza de area (raspado, pulido de paredes y lavado a presión)	5 días	jue 17-04-25	mar 22-04-25														
25	Impermeabilización en tina con blockal	2 días	mié 23-04-25	vie 25-04-25														
26	Fino de fondo con pendiente a desagüe	2 días	dom 20-04-25	mar 22-04-25														
27	Desagüe de pisos en interior de tina	3 días	jue 17-04-25	dom 20-04-25														
28	Mantenimiento (pulido, anticorrosivo y pintura industrial azul) a perfil metálico, base de agitadores.	3 días	vie 16-01-26	lun 19-01-26														
29	DOSSIFICADOR	5 días	vie 06-02-26	mié 11-02-26														
30	Lavado a presión de superficie	3 días	vie 06-02-26	lun 09-02-26														
31	Aplicación de 2 manos de fibra de vidrio y resina de secado	4 días	vie 06-02-26	mar 10-02-26														
32	Curado de superficie con thinner	4 días	vie 06-02-26	mar 10-02-26														
33	Suministro y colocación de tubería de 1½" PVC (SCH-40) para el dosificador.	5 días	vie 06-02-26	mié 11-02-26														
34	FLOCULADORES	338 días	mié 23-04-25	vie 27-03-26														
35	Desmonte de compuertas existente	2 días	mié 23-04-25	vie 25-04-25														





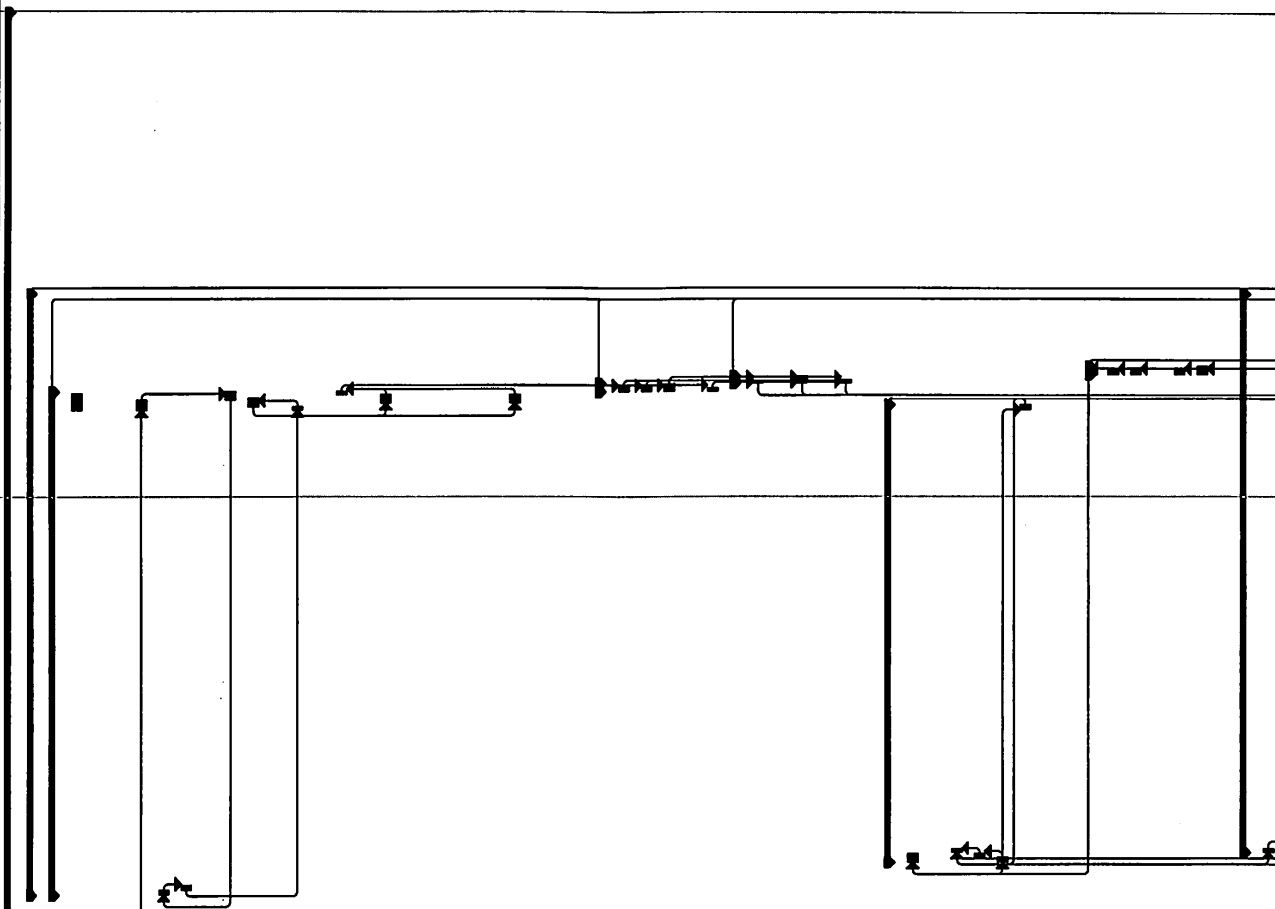








CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	2025	2026	2027			
					ene	mar	may	jul	sep	nov
281	Valle anunciando obra 18" x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratas, estructura en tubos galvanizados 1 1/2" x 1 1/2" y soportes en tubo	5 días	sáb 31-01-26	jue 05-02-26						
282	Campamento (incluye alquiler de casa o solar con casita de materiales con un baño móvil)	15 días	sáb 31-01-26	dom 15-02-26						
283	EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS CUBICAS/90 días	90 días	sáb 31-01-26	vie 01-05-26						
284	PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS	10 días	sáb 11-04-26	mar 21-04-26						
285	CASA DE QUÍMICOS	3 días	sáb 11-04-26	mar 14-04-26						
286	TRABAJOS DE ADECUACIÓN	5 días	sáb 11-04-26	jue 16-04-26						
287	Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1.5 HP, monofásico 115/240 v, frecuencia 60 Hz, 1,750 rpm con moto reductor, vistago ø3/4" acero inoxidable y espas con 4 blades.	5 días	sáb 11-04-26	jue 16-04-26						
288	Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø12" HP range de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, transporte y BANO)	10 días	sáb 11-04-26	mar 21-04-26						
289	Inodoro	2 días	sáb 11-04-26	lun 13-04-26						
290	Lavamanos	2 días	sáb 11-04-26	lun 13-04-26						
291	TINAS	12 días	sáb 31-01-26	jue 12-02-26						
292	Impresabilización en fina con blockaid	12 días	sáb 31-01-26	jue 12-02-26						
293	FLOCULADORES	15 días	jue 16-04-26	vie 01-05-26						
294	Suministro y colocación compuertas de entrada a filtro (0.45 x 0.55) en acero	15 días	jue 16-04-26	vie 01-05-26						
295	FILTRO	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
296	COMPUERTAS	15 días	vie 27-02-26	sáb 14-03-26						
297	Suministro y colocación de compuertas de entrada doble sección (0.85 m x 0.70 m)	15 días	vie 27-02-26	sáb 14-03-26						
298	Suministro y colocación de compuertas de salida (1.30 m x 1.10 m)	15 días	vie 27-02-26	sáb 14-03-26						
299	Suministro y colocación de compuertas de salida (0.70 x 0.85)	15 días	vie 27-02-26	sáb 14-03-26						
300	SUMINISTRO MATERIAL DE FILTRO	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
301	Arena ø=0.80 m * 10% resacomo	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
302	Capa topedo ø=0.10 m + 15% resacomo	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
303	Grava 1/4" ø=0.05 m	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
304	Grava 3/4" ø=0.05 m	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
305	Grava 1 1/2" ø=0.20 m	30 días	vie 27-02-26	dom 29-03-26						
306	Transporte de material	10 días	vie 27-02-26	lun 09-03-26						
307	ÁREA EXTERNA	12 días	dom 08-03-26	vie 20-03-26						
308	VERJA EN BLOQUES DE 6" VOLINADOS	12 días	dom 08-03-26	vie 20-03-26						
309	Puerta cortizada Long=4.0 m	12 días	dom 08-03-26	vie 20-03-26						
310	Embellacimiento con gravilla	10 días	dom 08-03-26	mié 18-03-26						
311	PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 3 D/J	180.25 días	vie 20-03-26	jue 17-09-26						
312	AGOSTO/2025 ELIMINACION DE PARTIDAS (N.P.) DEL PRESUPUESTO BASE	180.25 días	vie 20-03-26	jue 17-09-26						
313	PLANTA POTABILIZADORA 75 LPS	180.25 días	vie 20-03-26	jue 17-09-26						
314	CASA DE QUÍMICOS	180.25 d	vie 20-03-26	jue 17-09-26						
315	TRABAJOS DE ADECUACIÓN	37 días	mar 21-04-26	jue 28-05-26						
316	Suministro y colocación de elevador de sulfato con diferencial eléctrico industrial 1	37 días	mar 21-04-26	jue 28-05-26						
317	Suministro y colocación de agitadores de sulfato con motor eléctrico de 1.5 HP, monofásico 115/240 v, frecuencia 60 Hz, 1,750 rpm con moto reductor, vistago ø3/4" acero inoxidable y espas con 4	20 días	mar 21-04-26	lun 11-05-26						
318	Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø12" HP range de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, Limpieza con lavado a presión de muros (822 m <sup>2</sup> ))	12 días	lun 11-05-26	sáb 23-05-26						
319	Bomba dosificadora de sulfato tipo diafragma ø12" HP range de aplicación 0-10 GPM (incluye suministro, instalación, Limpieza con lavado a presión de muros (822 m <sup>2</sup> ))	5 días	sáb 23-05-26	jue 28-05-26						
320	SEMMENTADOR	2 días	mar 21-04-26	jue 23-04-26						
321	Conexión de grietas	22 días	jue 28-05-26	vie 19-06-26						
322	CASA DE CLORACIÓN	22 días	jue 28-05-26	vie 19-06-26						
323	Acera exterior 0.80 m	12 días	mar 21-04-26	dom 03-05-26						
324	Logo y letrero de INAPA	12 días	mar 21-04-26	dom 03-05-26						
325	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	5 días	mar 21-04-26	dom 26-04-26						
326	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	30 días	vie 19-06-26	dom 19-07-26						



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV

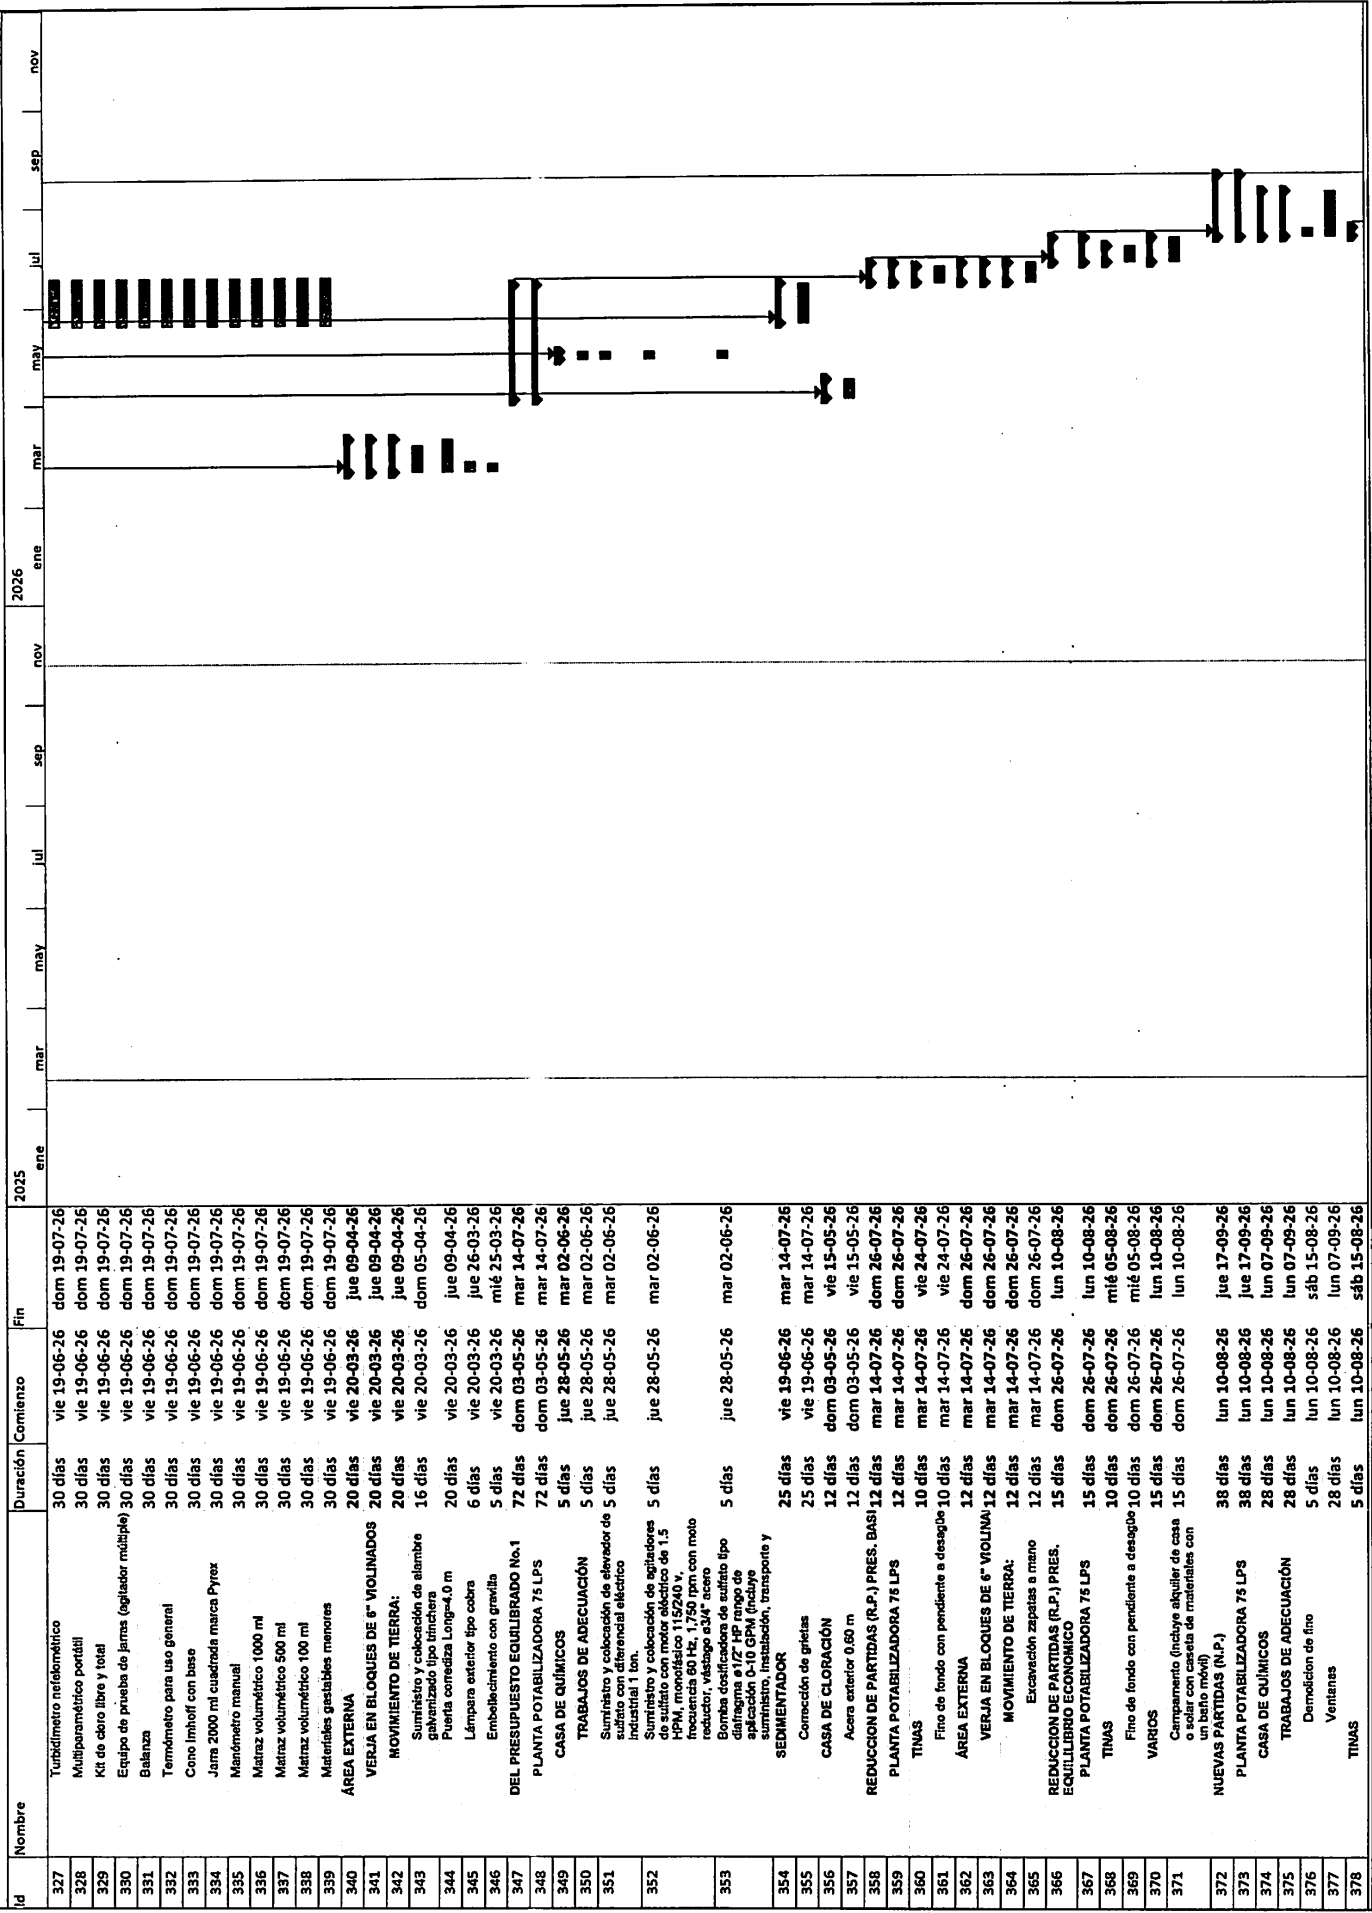



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV

<p>Tareas críticas                      División crítica                      Tarea                      División                      Hito</p>	<p>Atraso                      Resumen                      Resumen del proyecto                      Tarea crítica resumida                      División crítica resumida</p>	<p>Tareas externas                      Hito externo                      Tarea inactiva                      Hito inactivo                      Resumen inactivo</p>	<p>Tarea manual                      Sólo duración                      Informe de resumen manual                      Resumen manual                      Sólo el comienzo</p>	<p>Sólo fin                      Fecha límite                      Progreso</p>
