


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Semestre 2, 2026												Semestre 1, 2027												Semestre 2, 2027												Semestre 1, 2028												Semestre 2, 2028											
							S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O																						
1		<b>AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE COMENDADOR-EL LLANO-GUANITO, PARTE A, PROVINCIA ELÍAS PIÑA</b>	<b>510 días</b>	<b>lun 5/10/26</b>	<b>vie 15/9/28</b>																																																													
2		INICIO	0 días	lun 5/10/26	lun 5/10/26																																																													
3		OBRA DE TOMA	250 días	lun 5/10/26	vie 17/9/27	2																																																												
4		LÍNEA DE ADUCCIÓN Ø24" HD C-25	200 días	lun 13/12/27	vie 15/9/28	3FC+60 días																																																												
5		PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 250 LPS DE CAPACIDAD Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE 585 M³ CON CISTERNA (A CONSTRUIR)	300 días	lun 5/10/26	vie 26/11/27	2																																																												
6		LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø16" H.D C25 L=150.00m DESDE PLANTA CAP. 250LPS(A CONSTRUIR) Y 70LPS (A REHABILITAR) HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 585 M3 (A CONSTRUIR ) PARA BOMBEAR LOS DEPÓSITOS DE EL LLANO-LAS CARRERAS-EL PONTÓN-LOS MOLINOS-LA ESTACA-LUIS SIMÓ-OLIVER	80 días	lun 21/2/28	vie 9/6/28	5FC+60 días																																																												
7		CAMPAMENTO	510 días	lun 5/10/26	vie 15/9/28	2CC;8FF																																																												
8		FIN DEL PROYECTO	0 días	lun 5/10/26	lun 5/10/26																																																													

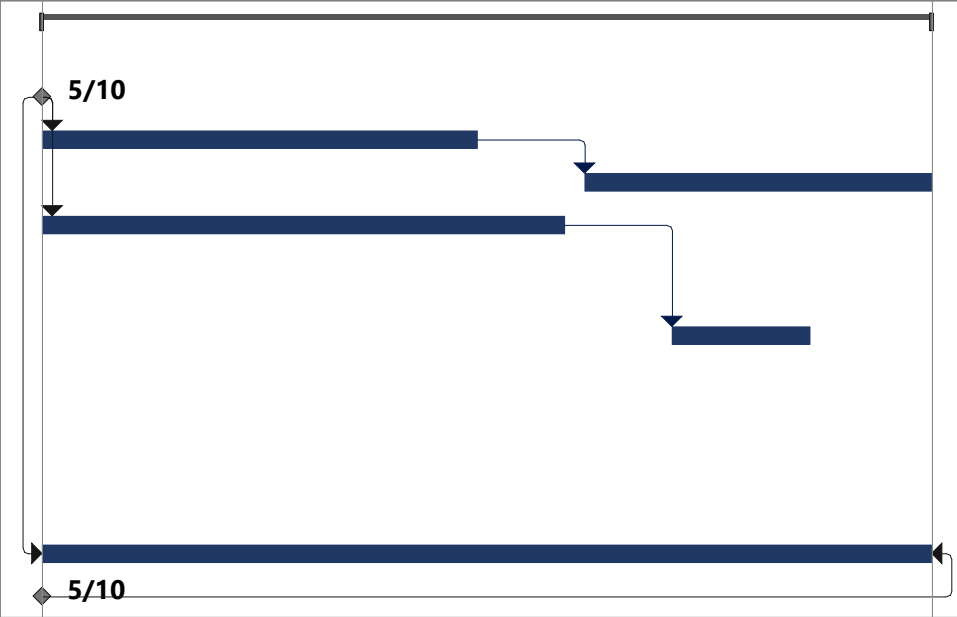

Proyecto: Programacion Const.  
Fecha: mar 9/6/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
