

Cronograma Lote 9

|    | i | Modo de tarea | Nombre de tarea                                                                                                                                       | Duración | unidad | cantidad | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | X | J | V | S | D | L | M | 27 oct '24 |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1  |   |               | <b>Ampliacion Acueducto Multiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabon, Zona I. No. SNIP 14766 - Late I- Red De Distribucion Sector Mata De Tuna.</b> | 175 días |        |          | jue 24/10/24 | mié 25/6/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 2  |   |               | Inicio                                                                                                                                                | 0 días   |        |          | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 |              |   |   |   |   |   |   |   | 28/10      |
| 3  |   |               | <b>A RED DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA</b>                                                                                                      | 175 días |        |          | jue 24/10/24 | mié 25/6/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 4  |   |               | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                   | 35 días  |        |          | mar 29/10/24 | lun 16/12/24 |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 5  |   |               | Replanteo                                                                                                                                             | 35 días  | M      | 2,284.15 | mar 29/10/24 | lun 16/12/24 | 2FC+1 día    |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 6  |   |               | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                                           | 115 días |        |          | jue 24/10/24 | mié 2/4/25   |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 7  |   |               | Excavation material compact° c/equipo                                                                                                                 | 50 días  | M'N    | 1,753.56 | jue 31/10/24 | mié 8/1/25   | 5FC-33 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 8  |   |               | Asiento de arena (Suministro y colocadn)                                                                                                              | 70 días  | M'S    | 167.65   | jue 28/11/24 | mié 5/3/25   | 7FC-30 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 9  |   |               | Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobacion por la                                                                                    | 80 días  | M3E    | 532.67   | jue 24/10/24 | mié 12/2/25  | 7FC-55 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 10 |   |               | Relleno compactado de material c/compactador mecanico en capas de 0.20m                                                                               | 15 días  | M2C    | 1,479.64 | jue 13/3/25  | mié 2/4/25   | 17FC-20 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 11 |   |               | Bate material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)                                                                                            | 15 días  | M3E    | 861.37   | jue 12/12/24 | mié 1/1/25   | 7FC-20 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 12 |   |               | <b>SUMINISTRO DE TUBERIA:</b>                                                                                                                         | 50 días  |        |          | mar 26/11/24 | lun 3/2/25   |              |   |   |   |   |   |   |   |            |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

# Cronograma Lote 9

|    |  | Modo de tarea | Nombre de tarea                                         | Duración | unidad | cantidad | Comienzo           | Fin                | Predecesoras | X | J | V | S | D | L | M | 27 oct '24 |
|----|--|---------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------|--------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 13 |  |               | De 06" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% perdida por campana    | 35 días  | M      | 798.60   | mar 26/11/24       | lun 13/1/25        | 5FC-15 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 14 |  |               | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% perdida por campana    | 50 días  | M      | 1,538.99 | mar 26/11/24       | lun 3/2/25         | 5FC-15 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 15 |  |               | <b>COLOCACION DE TUSERk:</b>                            | 90 días  |        |          | <b>jue 5/12/24</b> | <b>mié 9/4/25</b>  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 16 |  |               | De 06" PVC (SDR-26) c/J. G.                             | 45 días  | M      | 775.34   | jue 5/12/24        | mié 5/2/25         | 8FC-65 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 17 |  |               | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G.                             | 55 días  | M      | 1,508.81 | jue 23/1/25        | mié 9/4/25         | 16FC-10 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 18 |  |               | <b>PRUEBA HIDROSTATICA</b>                              | 70 días  |        |          | <b>jue 6/2/25</b>  | <b>mié 14/5/25</b> |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 19 |  |               | De 06" PVC (SDR-26) c/J. G.                             | 20 días  | M      | 775.34   | jue 6/2/25         | mié 5/3/25         | 16           |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 20 |  |               | De 03" PVC (SDR-26) c/J. G.                             | 25 días  | M      | 1,508.81 | jue 10/4/25        | mié 14/5/25        | 17           |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 21 |  |               | <b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE:</b> | 90 días  |        |          | <b>jue 2/1/25</b>  | <b>mié 7/5/25</b>  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 22 |  |               | <b>ACERO SCH-40 (proteccion anticorrosivo):</b>         | 65 días  |        |          | <b>jue 2/1/25</b>  | <b>mié 2/4/25</b>  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 23 |  |               | Code 6" x 50°                                           | 10 días  |        |          | jue 23/1/25        | mié 5/2/25         | 16FC-10 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 24 |  |               | Tee 6" x 6"                                             | 10 días  | Ud     | 1.00     | jue 2/1/25         | mié 15/1/25        | 16FC-25 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 25 |  |               | Tee 6" x 3"                                             | 5 días   | Ud     | 2.00     | jue 2/1/25         | mié 8/1/25         | 16FC-25 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 26 |  |               | Reduccion 6" a 3"                                       | 5 días   | Ud     | 1.00     | jue 16/1/25        | mié 22/1/25        | 16FC-15 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 27 |  |               | Junta mecanica tipo Dresser de 6" 150 PSI               | 5 días   | Ud     | 10.00    | jue 16/1/25        | mié 22/1/25        | 16FC-15 días |   |   |   |   |   |   |   |            |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

Cronograma Lote 9

|    | Modo de tarea | Nombre de tarea                                                      | Duración | unidad | cantidad | Comienzo    | Fin         | Predecesoras | X | J | V | S | 27 oct '24 | D | L | M |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 28 |               | Junta mecanica tipo Dresser de 3" 150 PSI                            | 5 días   | Ud     | 3.00     | jue 20/3/25 | mié 26/3/25 | 17FC-15 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 29 |               | Anclaje de H. A. Fc = 210 kg/cm2 p/piezas (Según detalle de diseño)  | 5 días   | M3     | 0.25     | jue 27/3/25 | mié 2/4/25  | 17FC-10 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 30 |               | PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):                              | 17 días  |        |          | mar 15/4/25 | mié 7/5/25  | 20FC-22 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 31 |               | Codo 3" x 45°                                                        | 5 días   | Ud     | 2.00     | jue 1/5/25  | mié 7/5/25  | 20FC-10 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 32 |               | Tee 3" x 3"                                                          | 5 días   | Ud     | 1.00     | mar 29/4/25 | lun 5/5/25  | 20FC-12 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 33 |               | Tee 4" x 4"                                                          | 5 días   | Ud     | 1.00     | lun 28/4/25 | vie 2/5/25  | 20FC-13 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 34 |               | Reduccian 4" a 3"                                                    | 5 días   | Ud     | 1.00     | jue 24/4/25 | mié 30/4/25 | 20FC-15 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 35 |               | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm' p/piezas (Según detalle de diseño) | 3 días   | M3     | 0.20     | mar 15/4/25 | jue 17/4/25 | 29           |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 36 |               | CRUCES:                                                              | 38 días  |        |          | jue 27/3/25 | lun 19/5/25 |              |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 37 |               | CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 03" ACERO SCH-40 ,L=20.00 M (1 UD)     | 38 días  |        |          | jue 27/3/25 | lun 19/5/25 |              |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 38 |               | Replanteo                                                            | 10 días  | Ud     | 1.00     | jue 27/3/25 | mié 9/4/25  | 17FC-10 días |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 39 |               | Suministro de Tuberia de 03" Acero SCH-40 (Incluye brazos)           | 10 días  | M      | 22.00    | jue 10/4/25 | mié 23/4/25 | 38           |   |   |   |   |            |   |   |   |
| 40 |               | Suministro de Codo de 03" x 45° Acero SCH-40 c/proteccion            | 10 días  | Ud     | 4.00,    | jue 10/4/25 | mié 23/4/25 | 38           |   |   |   |   |            |   |   |   |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez



# Cronograma Lote 9

|    | 1 | Modo de tarea | Nombre de tarea                                                                  | Duración | unidad | cantidad | Comienzo    | Fin         | Predecesoras | X | J | V | S | D | L | M | 27 oct '24 |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 41 |   |               | Suministro de Junta mecanica tipa Dresser de 03" 150 PSI                         | 10 días  | Ud     | 2.00     | jue 10/4/25 | mié 23/4/25 | 38           |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 42 |   |               | Anclaje de H. A. F'c = 210 kg/cm2 p/piezas (SegUn detalle de ldiseflo)           | 10 días  | M3     | 0.10     | mar 22/4/25 | lun 5/5/25  | 41FC-2 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 43 |   |               | Pintura anticorrosive para tuberia (Suministro y aplicacion)                     | 10 días  | M2     | 5.27     | mar 6/5/25  | lun 19/5/25 | 42           |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 44 |   |               | Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicacion)                             | 10 días  | M2     | 5.27     | mar 6/5/25  | lun 19/5/25 | 42           |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 45 |   |               | Abrazadera (Incluye pernos)                                                      | 15 días  | Ud     | 4.00     | mar 29/4/25 | lun 19/5/25 | 42FC-5 días  |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 46 |   |               | Mano de obra de colocacion (Incluye equipos, personal y l                        | 13 días  | Ud     | 1.00     | jue 10/4/25 | lun 28/4/25 | 39FC-10 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 47 |   |               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGUN DETALLES DE DISEÑO): | 40 días  |        |          | jue 17/4/25 | mié 11/6/25 |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 48 |   |               | ACOMETIDAS URBANAS                                                               | 15 días  |        |          | jue 17/4/25 | mié 7/5/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 49 |   |               | De 03"                                                                           | 15 días  | Ud     | 30.00    | jue 17/4/25 | mié 7/5/25  | 20FC-20 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 50 |   |               | ACOMETIDAS RURALES                                                               | 35 días  |        |          | jue 24/4/25 | mié 11/6/25 |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 51 |   |               | De 03"                                                                           | 35 días  | Ud     | 40.00    | jue 24/4/25 | mié 11/6/25 | 20FC-15 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 52 |   |               | DEMOLICION DE:                                                                   | 38 días  |        |          | jue 13/3/25 | lun 5/5/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 53 |   |               | Acera de 1.00 m                                                                  | 30 días  | M3     | 3.00     | jue 13/3/25 | mié 23/4/25 | 49FF-10 días |   |   |   |   |   |   |   |            |
| 54 |   |               | Conten                                                                           | 20 días  | M3     | 2.10     | jue 27/3/25 | mié 23/4/25 | 49FF-10 días |   |   |   |   |   |   |   |            |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez


Cronograma Lote 9

|    |  | Modo de tarea | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                                                              | Duración | unidad | cantidad | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | X | J | V | S | D | L | M |
|----|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 |  |               | Bate de material demolido c/camiOn                                                                                                                                                                                                                           | 12 días  | M'E    | 6.63     | vie 18/4/25  | lun 5/5/25   | 54FC-4 días  |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 |  |               | REPOSICION DE:                                                                                                                                                                                                                                               | 20 días  |        |          | jue 29/5/25  | mié 25/6/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 |  |               | Acera de 1.00 m                                                                                                                                                                                                                                              | 15 días  | M2     | 30.00    | jue 29/5/25  | mié 18/6/25  | 50FC-10 días |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 |  |               | Conten                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 días   | M      | 30.00    | lun 16/6/25  | mié 25/6/25  | 57FC-3 días  |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 |  |               | SEÑALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 días |        |          | lun 28/10/24 | vie 14/3/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 |  |               | SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de ,seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados con amarillo trafico cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con. banderolos, cha | 100 días | M      | 2,284.15 | lun 28/10/24 | vie 14/3/25  | 2            |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 |  |               | VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 días |        |          | jue 31/10/24 | mié 16/4/25  |              |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 |  |               | VALLA anunciando obra 16' x 10' impresiOn full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 x 4" 1/2" y soportes en tuba cuadrado 4"                                                        | 15 días  |        |          | lun 4/11/24  | vie 22/11/24 | 2FC+5 días   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 |  |               | CAMPAMENTO (Incluye alquiler de case o solar y caseta de materiales)                                                                                                                                                                                         | 120 días |        |          | jue 31/10/24 | mié 16/4/25  | 2FC+3 días   |   |   |   |   |   |   |   |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

# Cronograma Lote 9

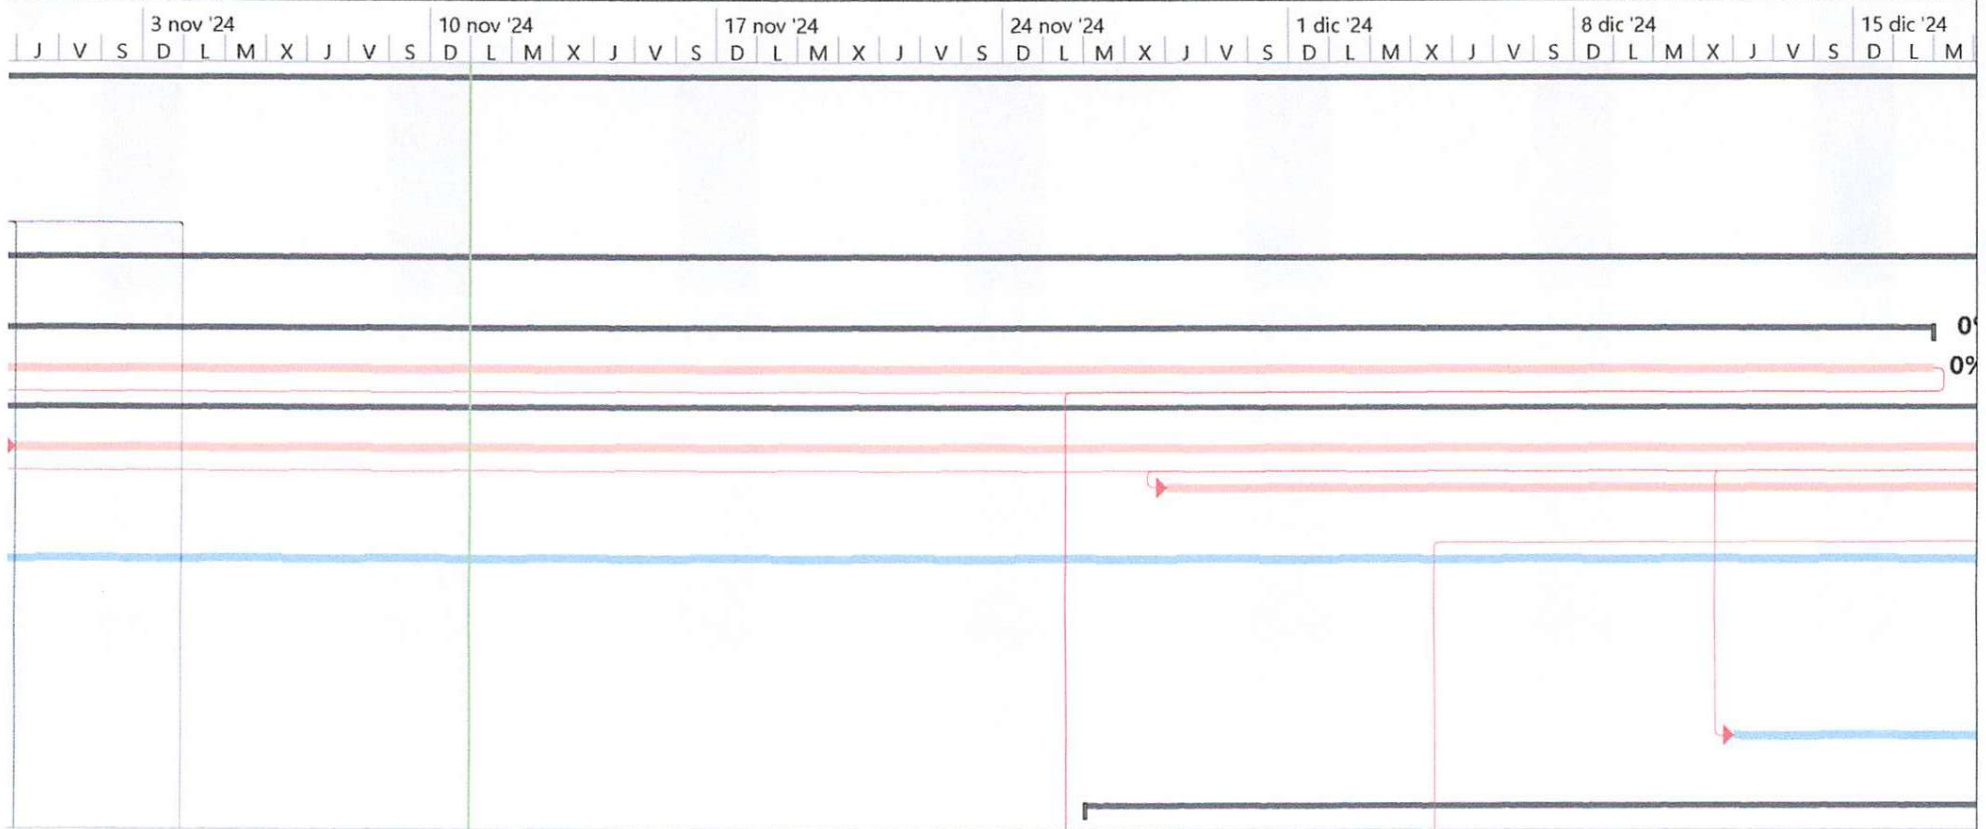


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez




# Cronograma Lote 9

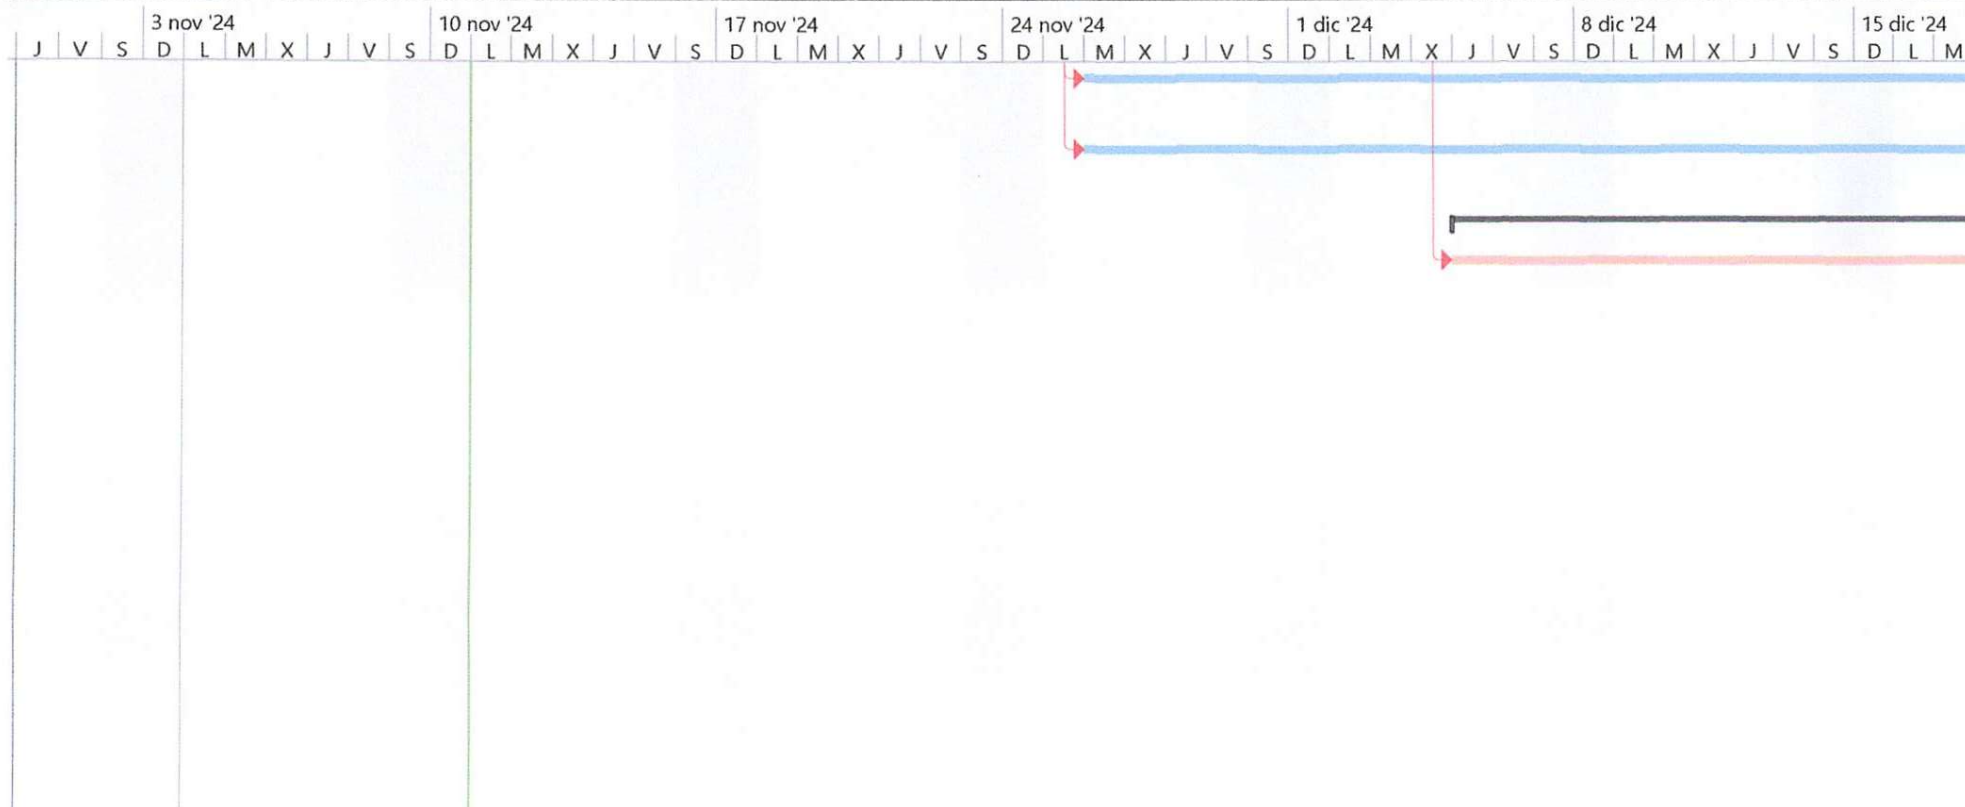

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

# Cronograma Lote 9



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez




### Cronograma Lote 9

[illegible]

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |

Andri Rodriguez

# Cronograma Lote 9

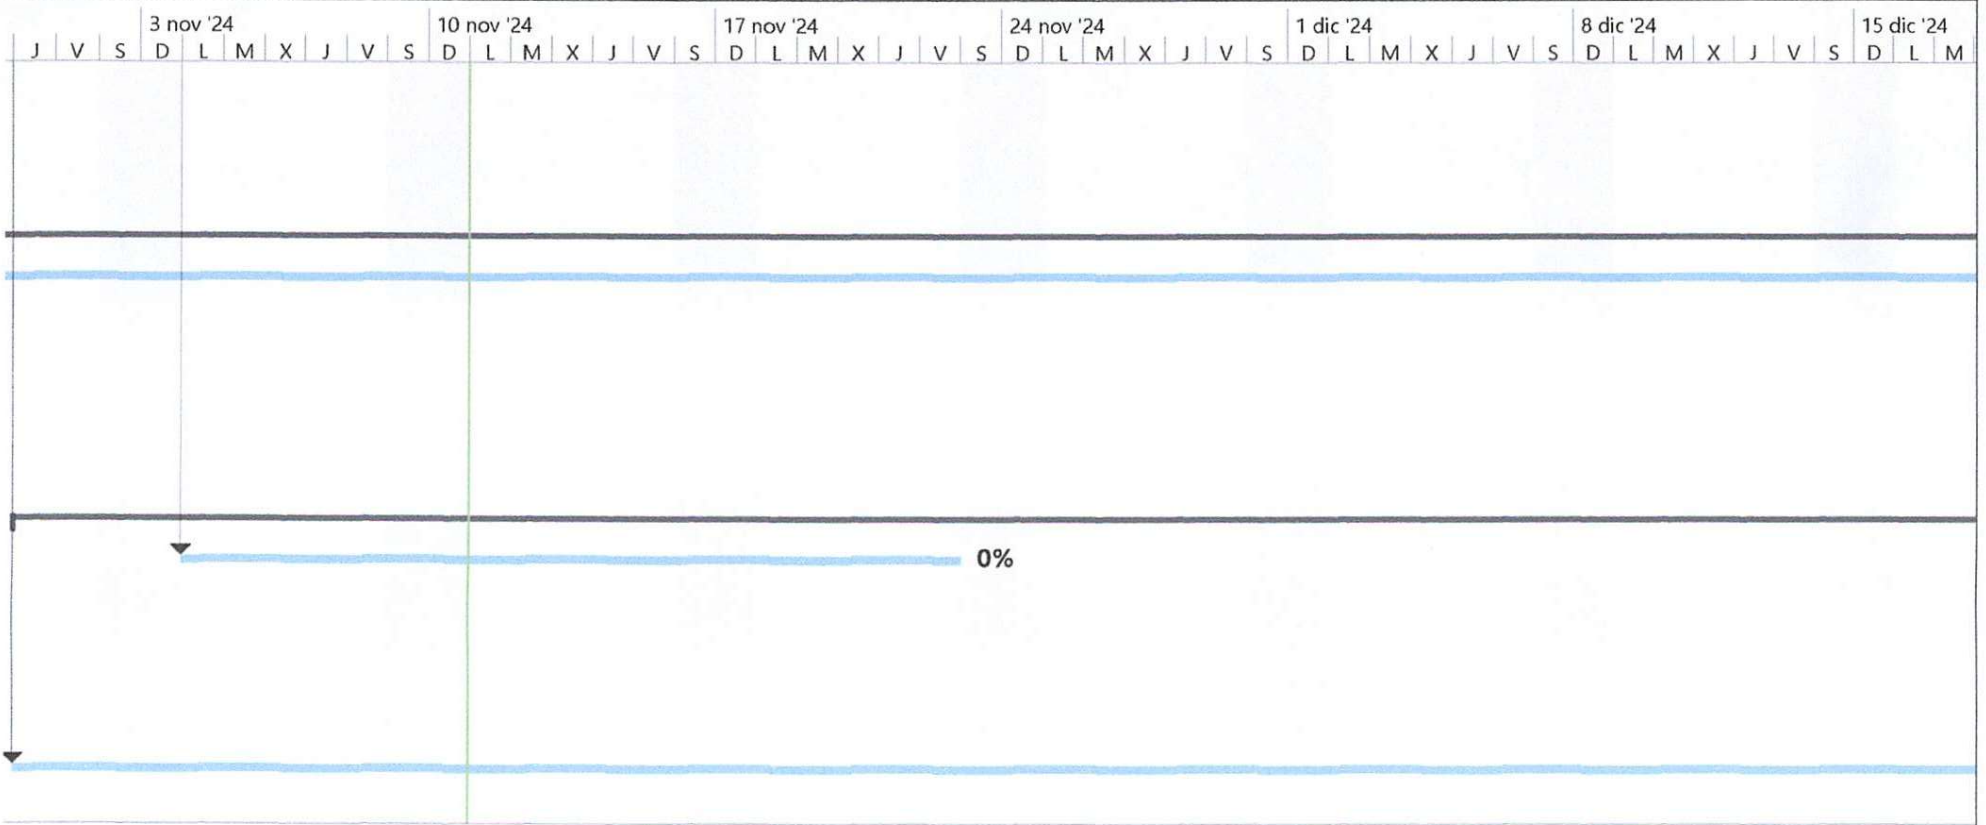

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez


The figure consists of two horizontal bar charts. The top chart has a red bar labeled '0%' and a blue bar labeled '0%'. The bottom chart has a red bar labeled '0%' and a blue bar labeled '0%'. The x-axis represents the percentage of respondents, ranging from 0% to 100%.

Página 11

Andri Rodriguez



# Cronograma Lote 9

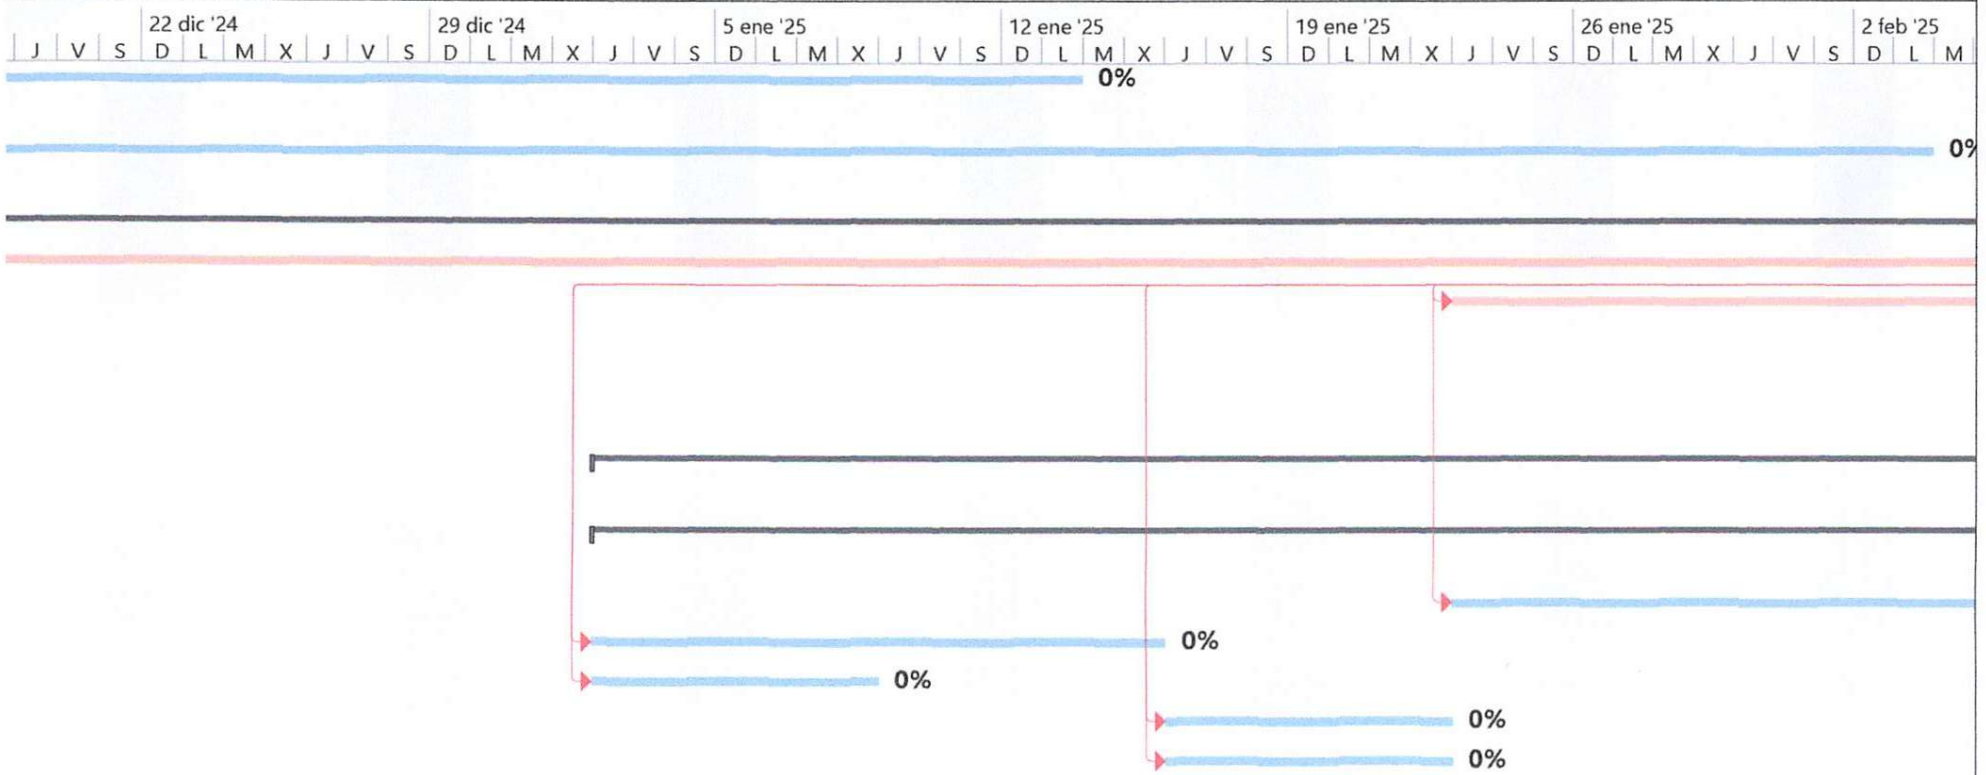

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez


Cronograma Lote 9

|            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 22 dic '24 |   |   |   |   |   |   | 29 dic '24 |   |   |   |   |   |   | 5 ene '25 |   |   |   |   |   |   | 12 ene '25 |   |   |   |   |   |   | 19 ene '25 |   |   |   |   |   |   | 26 ene '25 |   |   |   |   |   |   | 2 feb '25 |   |   |   |   |   |  |
| J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M |  |

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

Cronograma Lote 9



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez



Cronograma Lote 9



J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

22 dic '24      29 dic '24      5 ene '25      12 ene '25      19 ene '25      26 ene '25      2 feb '25

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez

### Cronograma Lote 9

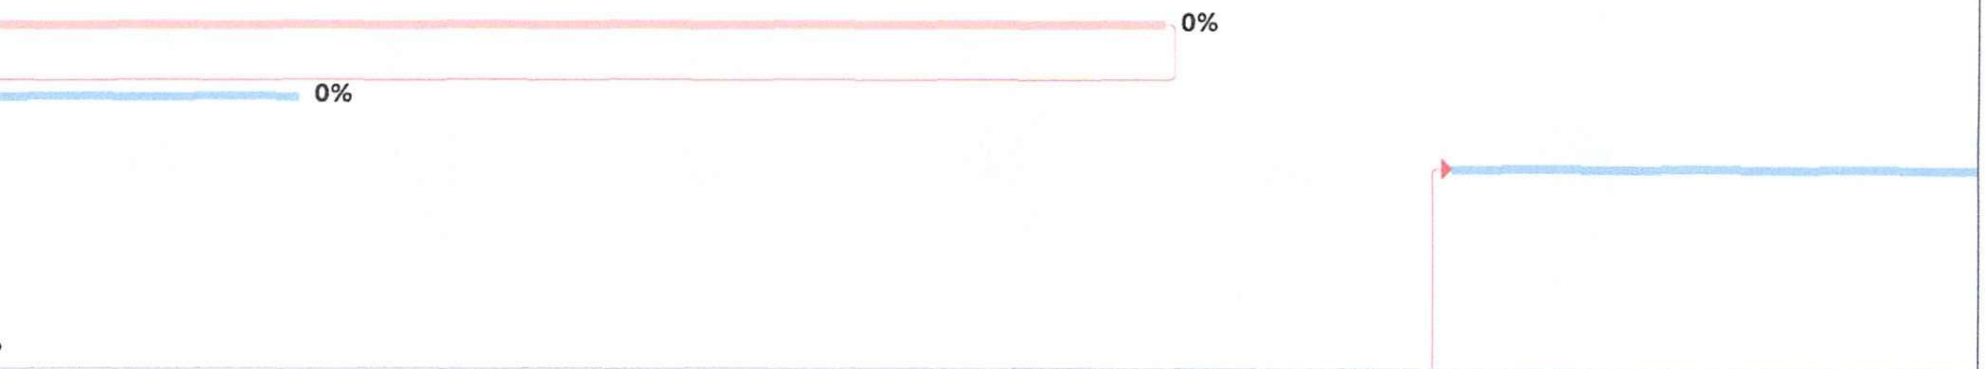


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |

Andi Rodriguez

# Cronograma Lote 9

9 feb '25 16 feb '25 23 feb '25 2 mar '25 9 mar '25 16 mar '25 23 mar '25


J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

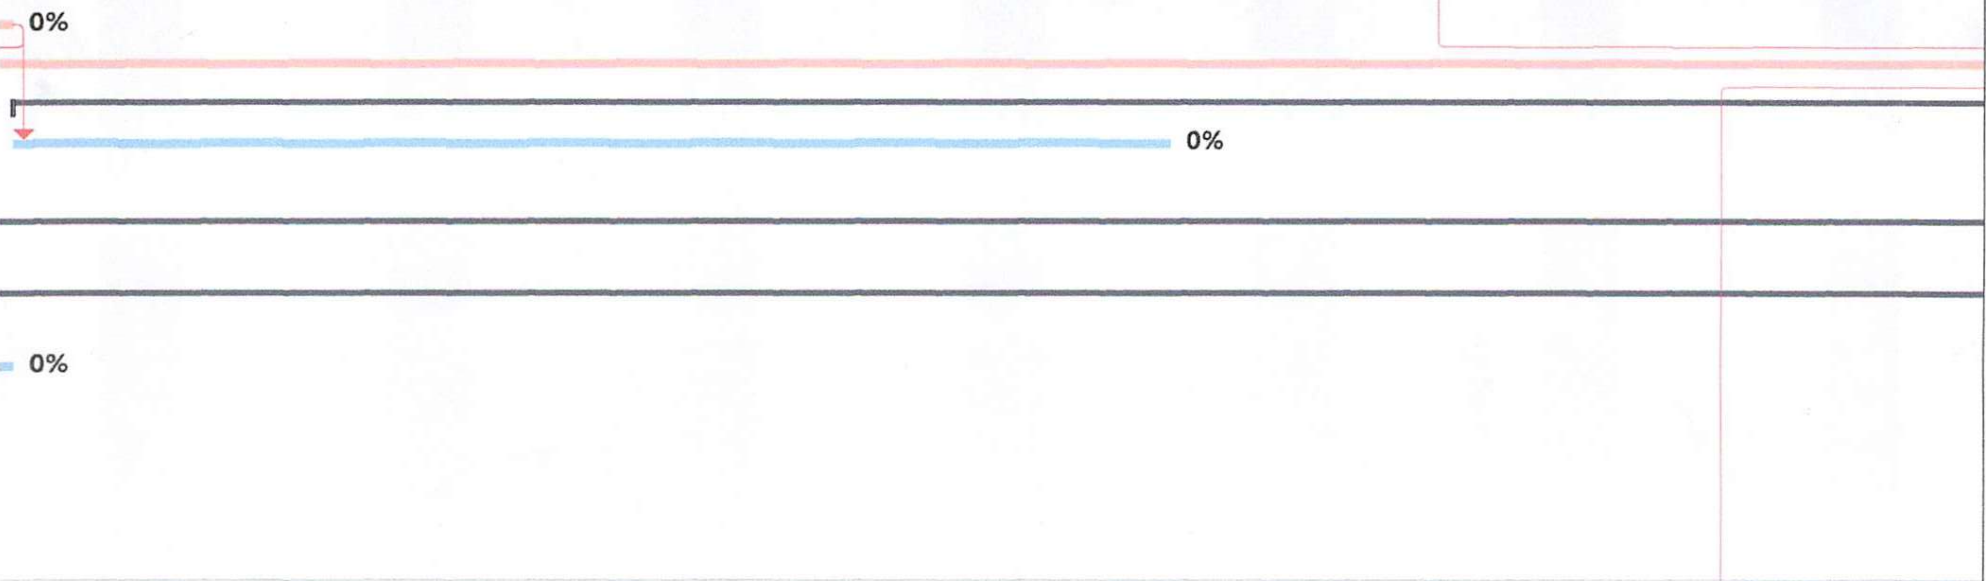

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez

# Cronograma Lote 9



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

*Andi Rodriguez*



# Cronograma Lote 9



| 9 feb '25 |   |   |   |   |   |   | 16 feb '25 |   |   |   |   |   |   | 23 feb '25 |   |   |   |   |   |   | 2 mar '25 |   |   |   |   |   |   | 9 mar '25 |   |   |   |   |   |   | 16 mar '25 |   |   |   |   |   |   | 23 mar '25 |   |   |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--|
| J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M |  |



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

Cronograma Lote 9

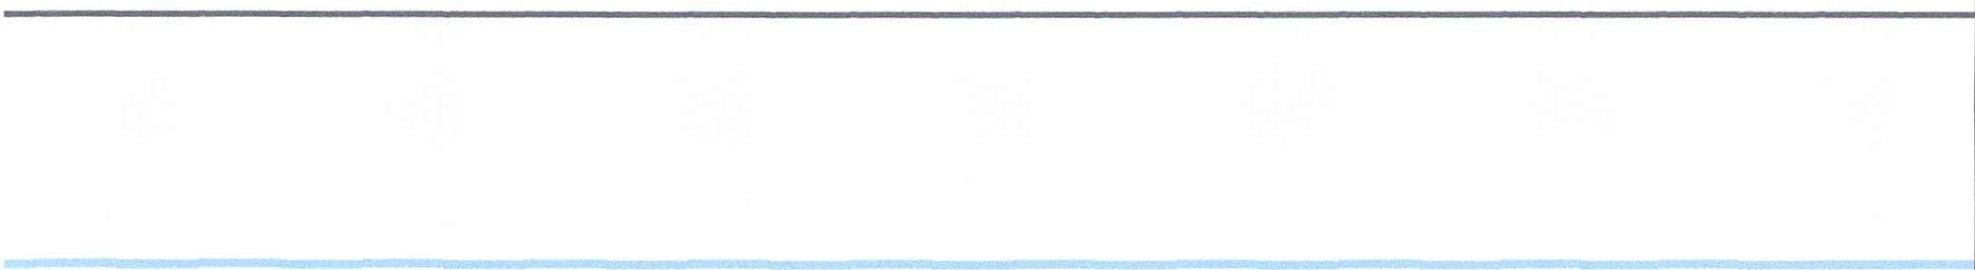

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez

# Cronograma Lote 9

|            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 30 mar '25 |   |   |   |   |   |   | 6 abr '25 |   |   |   |   |   |   | 13 abr '25 |   |   |   |   |   |   | 20 abr '25 |   |   |   |   |   |   | 27 abr '25 |   |   |   |   |   |   | 4 may '25 |   |   |   |   |   |   | 11 may '25 |   |   |   |   |   |
| J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M |


0%

0%

|                           |                                                                                     |                           |                                                                                       |                      |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andrii Rodriguez

### Cronograma Lote 9

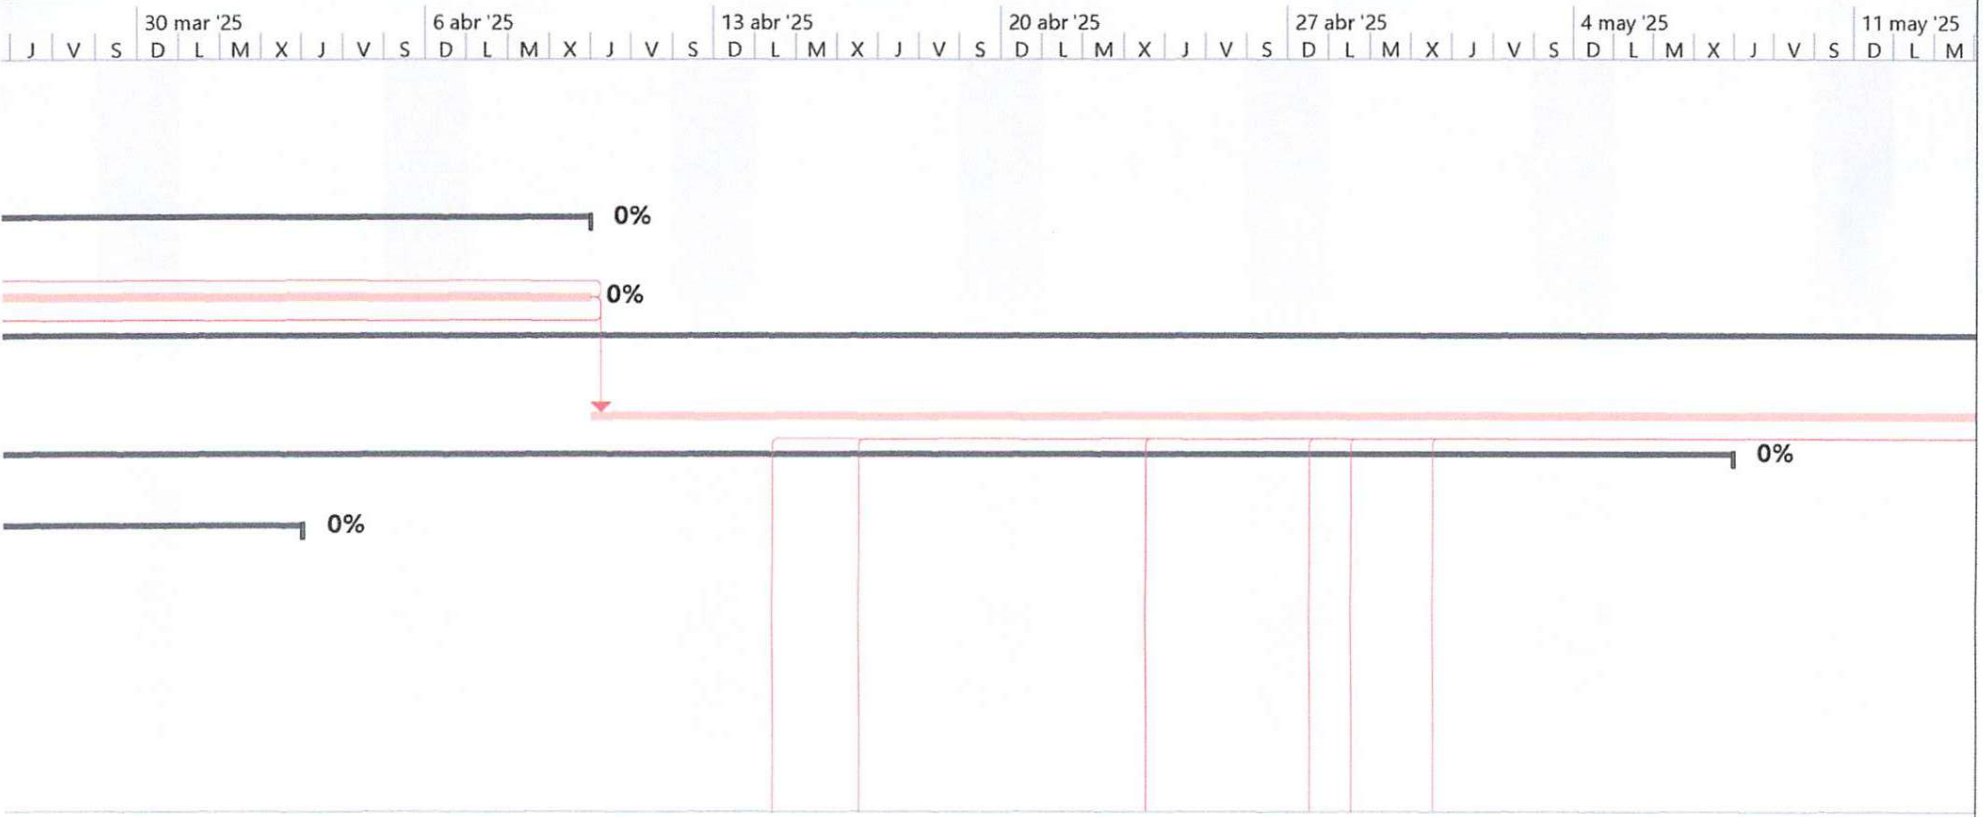


|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez




# Cronograma Lote 9

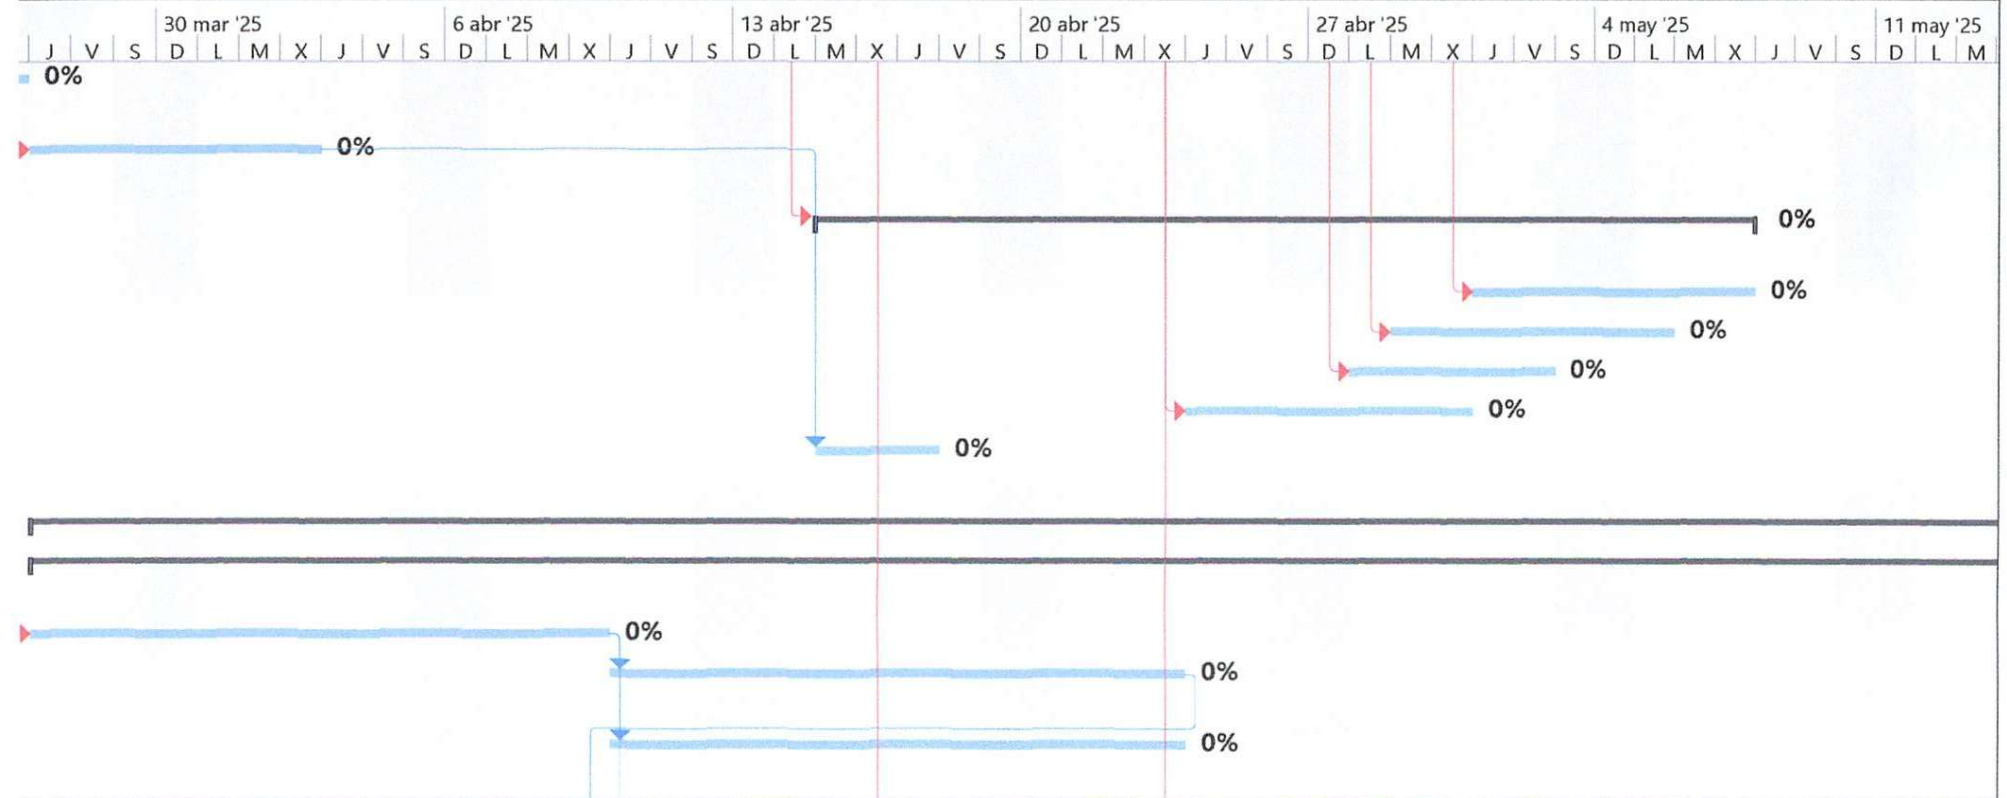

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez


# Cronograma Lote 9

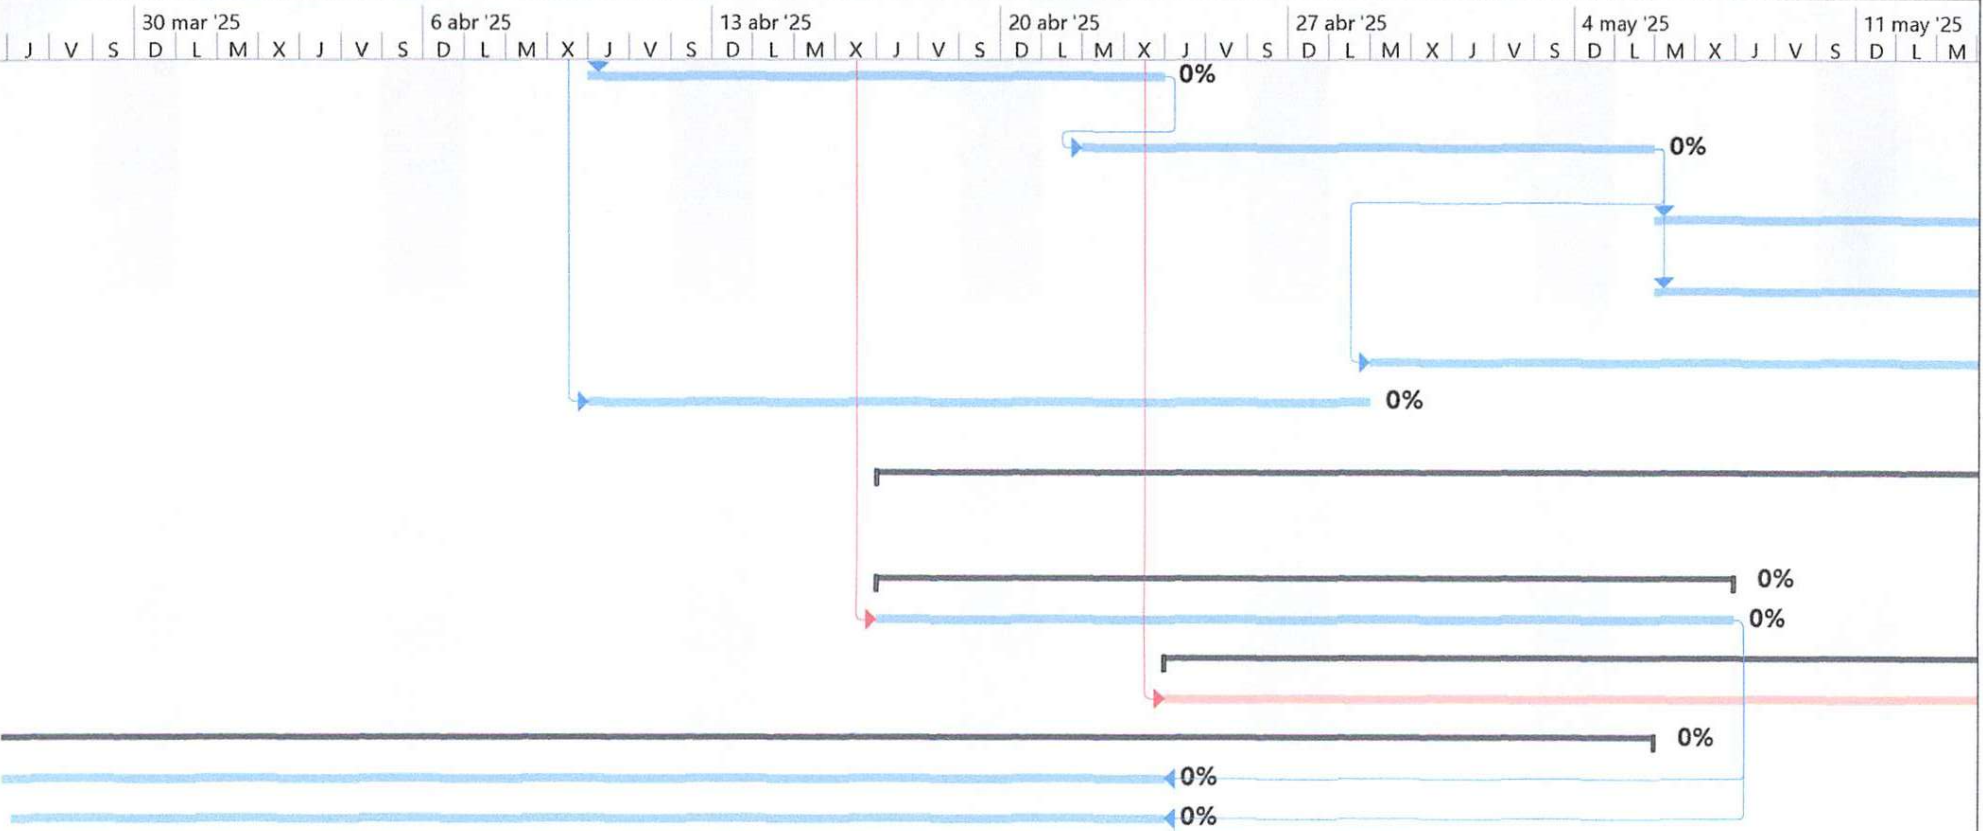

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez

# Cronograma Lote 9



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez





# Cronograma Lote 9

J V S 18 may '25 D L M X J V S 25 may '25 D L M X J V S 1 jun '25 D L M X J V S 8 jun '25 D L M X J V S 15 jun '25 D L M X J V S 22 jun '25 D L M X J V S 29 jun '25 D L M

1 0%

0%

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez

Cronograma Lote 9

| 18 may '25 |   |   |   |   |   |   | 25 may '25 |   |   |   |   |   |   | 1 jun '25 |   |   |   |   |   |   | 8 jun '25 |   |   |   |   |   |   | 15 jun '25 |   |   |   |   |   |   | 22 jun '25 |   |   |  |  |  |  | 29 jun '25 |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|
| J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J         | V | S | D | L | M | X | J          | V | S | D | L | M | X | J          | V | S |  |  |  |  |            |  |  |
|            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |  |  |  |  |            |  |  |


0%

0%

0%

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha limite         |  |


### Cronograma Lote 9

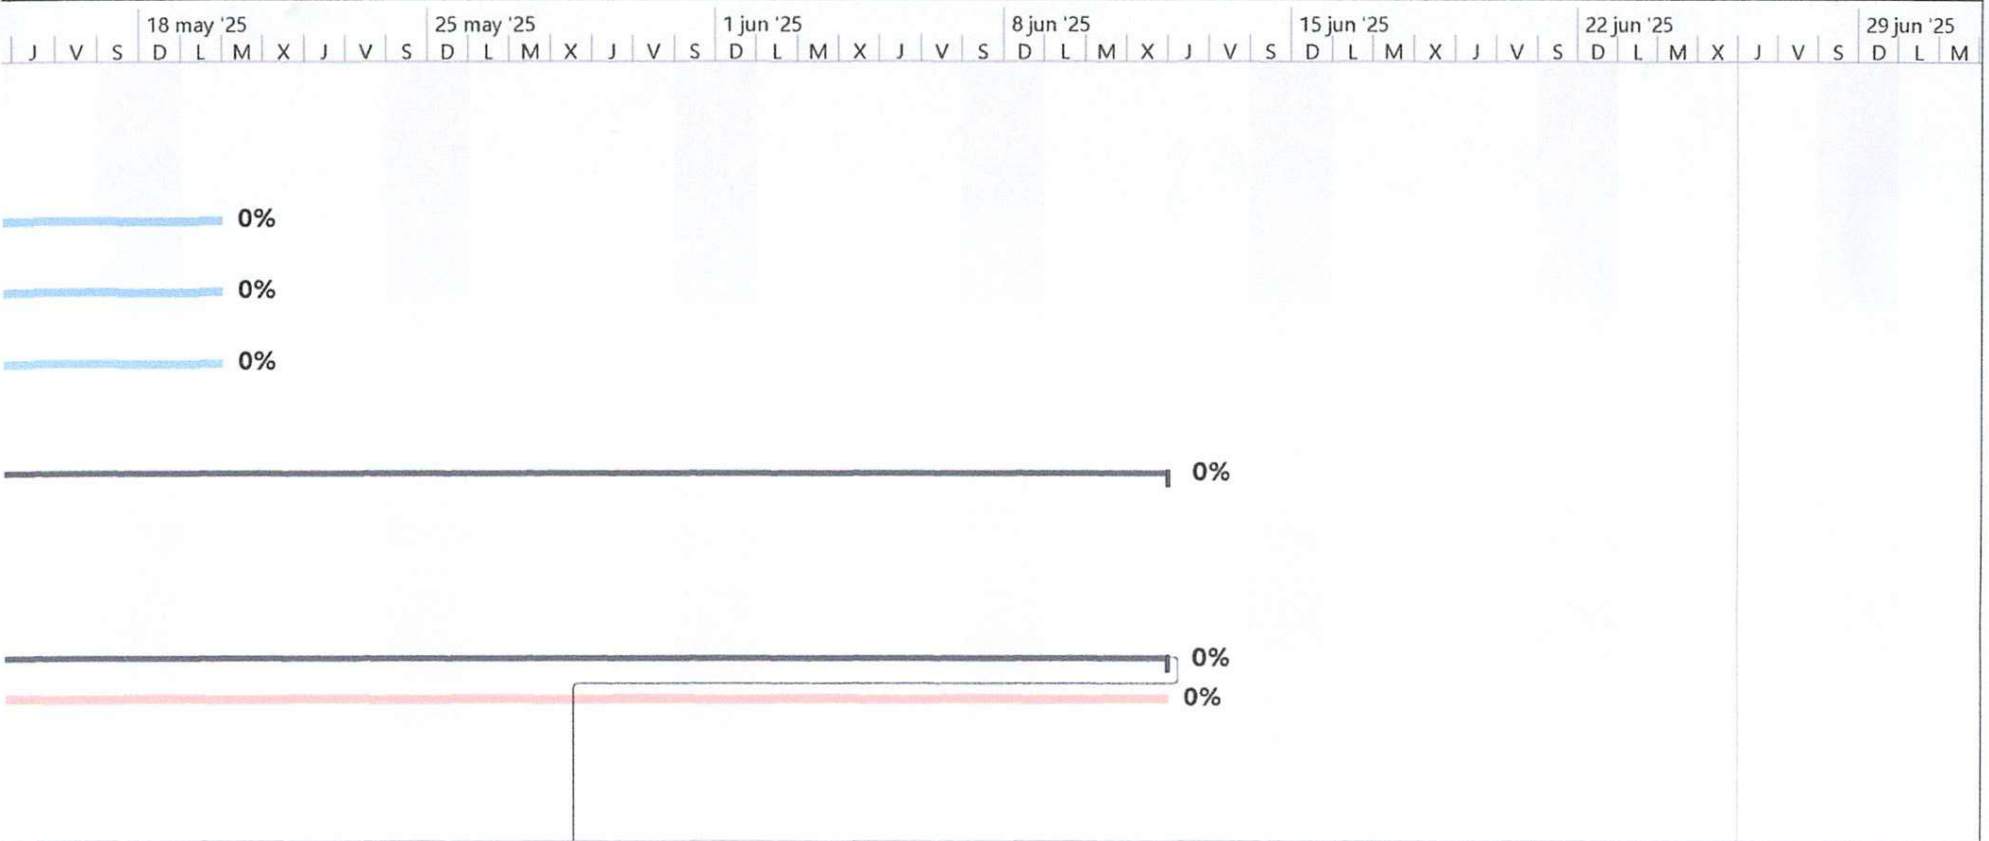

|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andri Rodriguez

### Cronograma Lote 9



|                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas           |  | solo fin                  |  | Resumen manual       |  |
| División crítica          |  | solo duración             |  | Resumen del proyecto |  |
| Progreso de tarea crítica |  | Línea base                |  | Tareas externas      |  |
| Tarea                     |  | División de la línea base |  | Hito externo         |  |
| División                  |  | Hito de línea base        |  | Tarea inactiva       |  |
| Progreso de tarea         |  | Hito                      |  | Hito inactivo        |  |
| Tarea manual              |  | Progreso del resumen      |  | Resumen inactivo     |  |
| solo el comienzo          |  | Resumen                   |  | Fecha límite         |  |

Andi Rodriguez.



## Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I, No. SNIP 14766 - Lote K - Red De Distribución Sector Los Babosos

| No  | Actividad                                                       | Fecha de inicio | Cantidad a realizar | Fecha final | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A   | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS                          |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1   | PRELIMINAR                                                      |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.1 | Replanteo                                                       | oct-23          | 1678.26 M           | oct-23      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3   | MOVIMIENTO DE TIERRA                                            |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.1 | Excavación material compacto c/equipo                           | oct-23          | 1,299.94 M³N        | jun-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.3 | Asiento de arena (Suministro y colocación)                      | oct-23          | 117.48 M³S          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.4 | Suministro de material de mina                                  | oct-23          | 553.89 M³E          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico           | oct-23          | 1,107.77 M³C        | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.6 | Bote material sobrante                                          | oct-23          | 867.55 M³E          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4   | SUMINISTRO DE TUBERÍA                                           |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5   | COLOCACIÓN DE TUBERÍA                                           |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1 | De ø4" PVC (SDR-26) c/J. G.                                     | oct-23          | 1548.18 M           | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.2 | De ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.                                     | oct-23          | 130.08 M            | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6   | PRUEBA HIDROSTÁTICA                                             |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6.1 | De ø4" PVC (SDR-26) c/J. G.                                     | sep-24          | 1548.18 M           | sep-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6.2 | De ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.                                     | sep-24          | 1023.53 M           | sep-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES                    |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8   | CRUCES                                                          |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8.1 | CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø4" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD) |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO            |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10  | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO                     | oct-23          | 1,678.26 M          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11  | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL                                       | oct-23          | 1,678.26 M          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     | NUEVAS PARTIDAS ( N.P. )                                        |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| B   | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS                          |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1   | PRELIMINAR                                                      |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.1 | Replanteo                                                       | jul-24          | 1678.26 M           | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3   | MOVIMIENTO DE TIERRA                                            |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.1 | Excavación material compacto c/equipo                           | jul-24          | 548.87 M³N          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.3 | Asiento de arena (Suministro y colocación)                      | jul-24          | 66.53 M³S           | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.4 | Suministro de material de mina                                  | jul-24          | 83.16 M³E           | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.5 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico           | jul-24          | 563.96 M³C          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.6 | Bote material sobrante                                          | jul-24          | 221.34 M³E          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4   | SUMINISTRO DE TUBERÍA                                           |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5   | COLOCACIÓN DE TUBERÍA                                           |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.2 | De ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.                                     | jul-24          | 1023.53 M           | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6   | PRUEBA HIDROSTÁTICA                                             |                 |                     |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6.2 | De ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.                                     | oct-24          | 1023.53 M           | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10  | SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO                     | jul-24          | 1,520.39 M          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11  | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL                                       | jul-24          | 1,520.39 M          | oct-24      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

  
Preparado por: Ing. Cristian Tavárez Gabino
