



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- REDES DISTRIBUCION EL RODEO

Contrato:

- 036/2021

Contratista:

- MARTINEZ ESPAILLAT CONSTRUCTORES SRL

Periodo de cubicación:

- Del 09 abril 2022 al 15 de septiembre del 2022

I-Descripción General del proyecto:

Por falta de agua potable en las comunidades de Las Tejas El Rodeo, con este proyecto se busca mejorar la calidad del servicio de agua potable de las comunidades antes mencionadas.

La población a impactar es de 1,415 habitantes (Año 2020) -1,943 habitantes (Año 2040)

A continuación, se presenta los principales componentes del proyecto en cuestión:

- Red distribución:** Ø3''PVC (SDR-26) con J.G, con L=4,038.96 m; Ø4''PVC (SDR-26) con J.G, con L=1,456.52 m.
- Acometidas:** 113 unidades rurales con polietileno.

II-Avance actual de la obra.

A la fecha el contratista en el municipio de Galván provincia Bahoruco ha avanzado en el suministro y colocación de tuberías para la red de distribución Ø3''PVC (SDR-26) con J.G y Ø4''PVC (SDR-26) con J.G, con la instalación de acometidas rurales, colocación de piezas especiales y de igual forma ha avanzado con la realización de pruebas Hidrostáticas. La obra tiene 98 % de avance general ejecutado.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS



*** INAPA ***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

III- Informe fotográfico

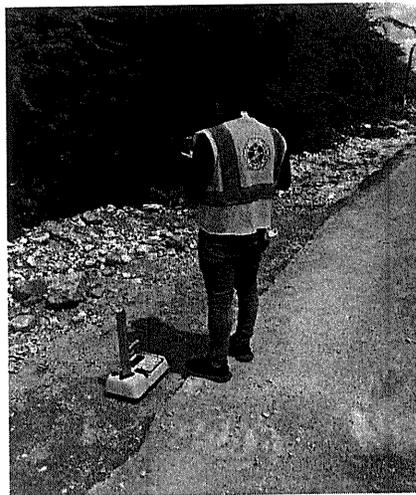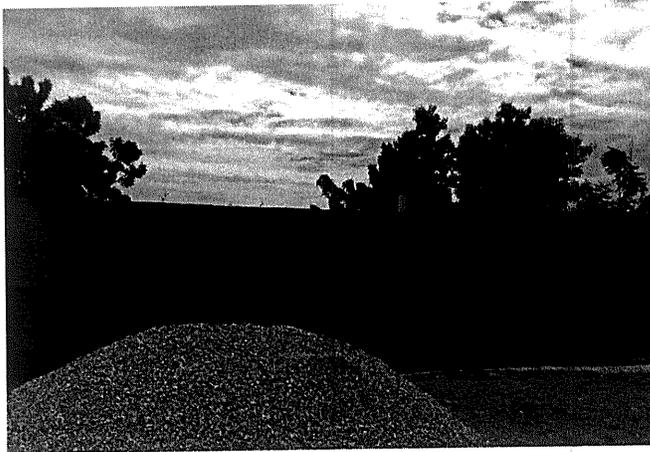

Preparado por:

Amelia Rodríguez

Ing. Amelia Rodríguez

Coordinadora de Proyectos

Dirección de Programas y Proyectos Especiales
