


Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predcesoras
	AMPLIACION DE RED DE ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR	1401 días	lun 14/2/22	jue 6/8/26	
	MAR INICIO	0 días	lun 14/2/22	lun 14/2/22	
	REPLANTEO	1401 días	lun 14/2/22	jue 6/8/26	
	REPLANTEO ETAPA 1	20 días	lun 14/2/22	mar 8/3/22	1
	REPLANTEO ETAPA 2	20 días	mié 9/3/22	jue 31/3/22	4
	REPLANTEO ETAPA 3	20 días	vie 1/4/22	sáb 23/4/22	5
	REPLANTEO ETAPA 4	20 días	vie 10/2/23	sáb 4/3/23	6FC+250 días
	REPLANTEO ETAPA 5	20 días	lun 6/3/23	mar 28/3/23	7
	REPLANTEO ETAPA 6	20 días	mié 29/3/23	jue 20/4/23	8
	MOVIMIENTO DE TIERRA (V=5,272.41)	527 días	mar 15/3/22	sáb 18/11/23	
	Excavación en roca con equipo (Incluye extracción) 30% Etapa 1	25 días	mar 15/3/22	mar 12/4/22	4FC+5 días
	Excavación en roca con equipo (Incluye extracción) 30% Etapa 2	25 días	jue 7/4/22	jue 5/5/22	5FC+5 días
	Excavación en roca con equipo (Incluye extracción) 30% Etapa 3	25 días	sáb 30/4/22	sáb 28/5/22	6FC+5 días
	Excavación en roca con equipo (Incluye extracción) 30% Etapa 4	25 días	lun 6/3/23	lun 3/4/23	7
	Excavación en roca con equipo (Incluye extracción) 30% Etapa 5	25 días	mar 4/4/23	mar 2/5/23	8FC+5 días
	Excavación en roca con equipo (Incluye extracción) 30% Etapa 6	25 días	jue 27/4/23	jue 25/5/23	9FC+5 días


Tarea	Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
División	Tarea crítica resumida	Hito inactivo	solo el comienzo
Hito	Hito resumido	Resumen inactivo	solo fin
Resumen	Progreso resumido	Tarea manual	Fecha límite
Resumen del proyecto	Tareas externas	solo duración	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Hito externo	Informe de resumen manual	Progreso

Página 1


no se a y

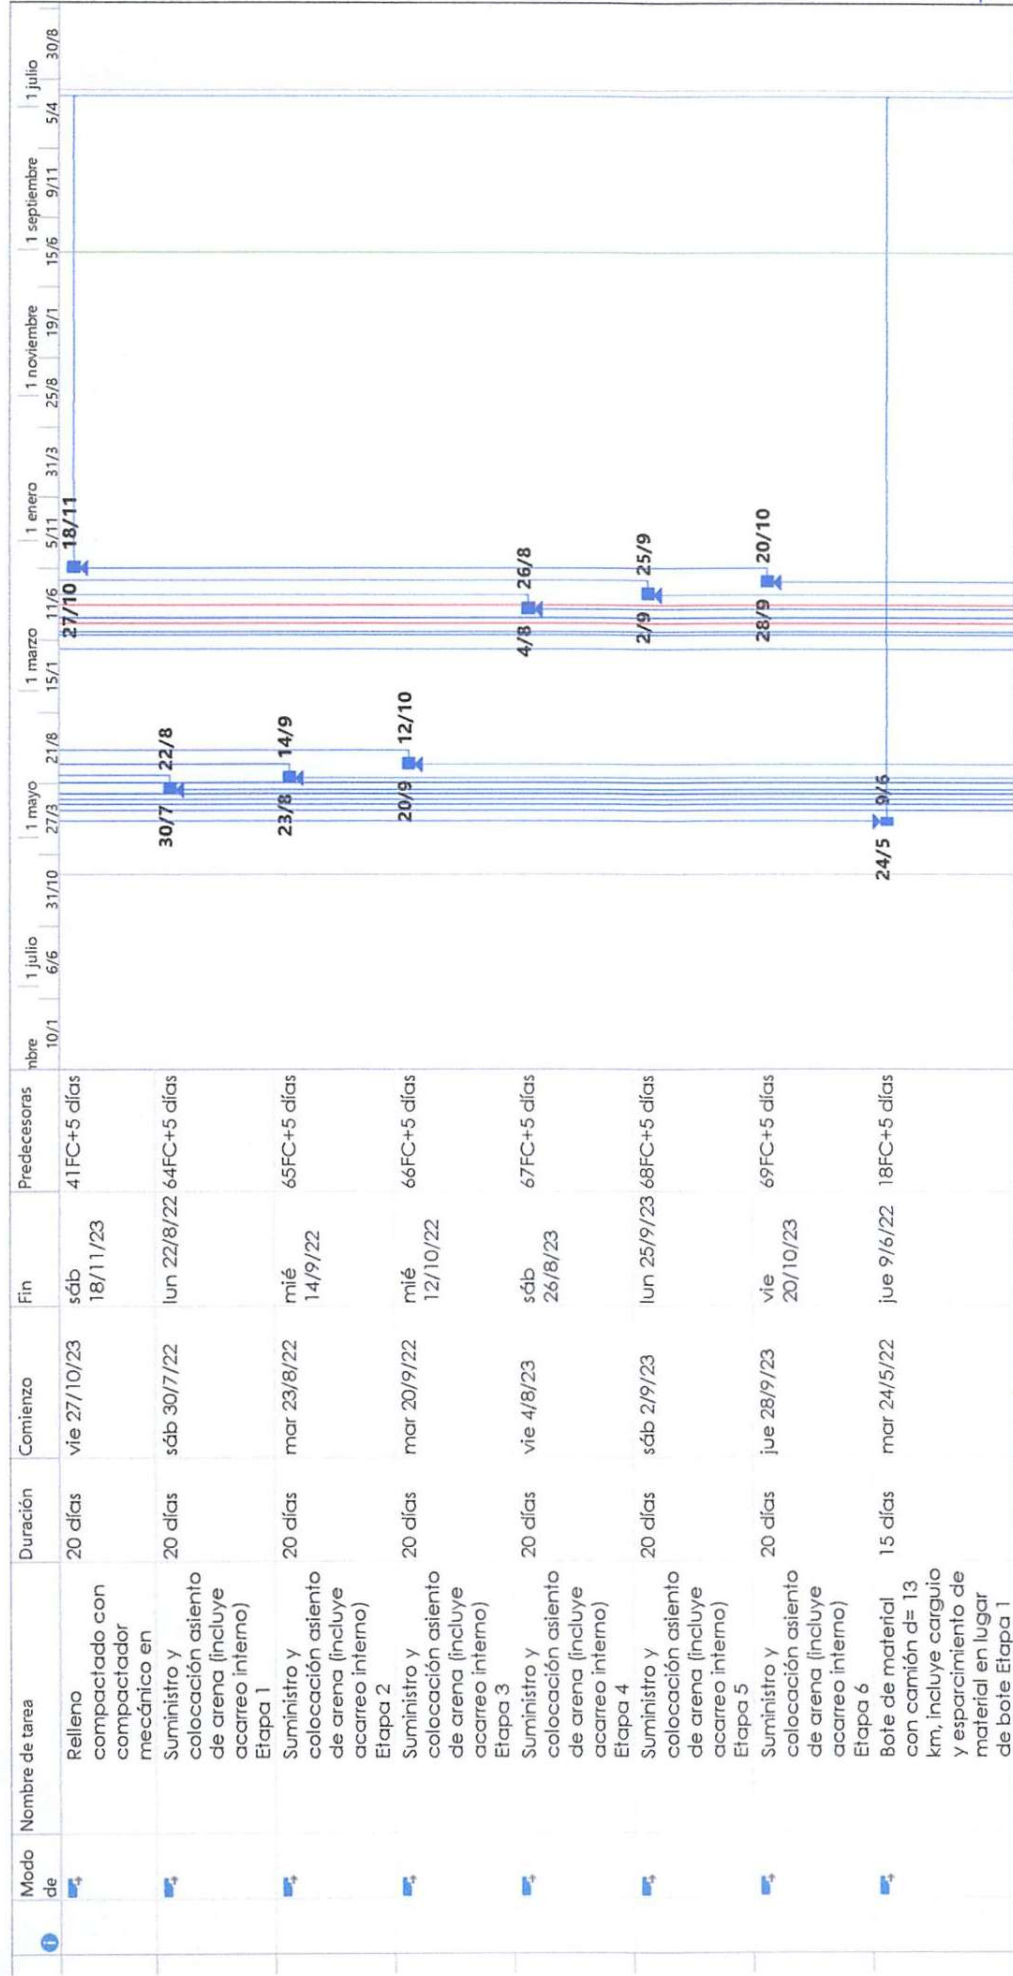

/ecto: AMPLIACION DE RED 1a: jue 28/8/25	Tarea	Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
	División	Tarea crítica resumida	Hito inactivo	solo el comienzo
	Hito	Hito resumido	Resumen inactivo	solo fin
	Resumen	Progreso resumido	Tarea manual	Fecha límite
	Resumen del proyecto	Tareas externas	solo duración	Tarea crítica
	Agrupar por síntesis	Hito externo	Informe de resumen manual	Progreso

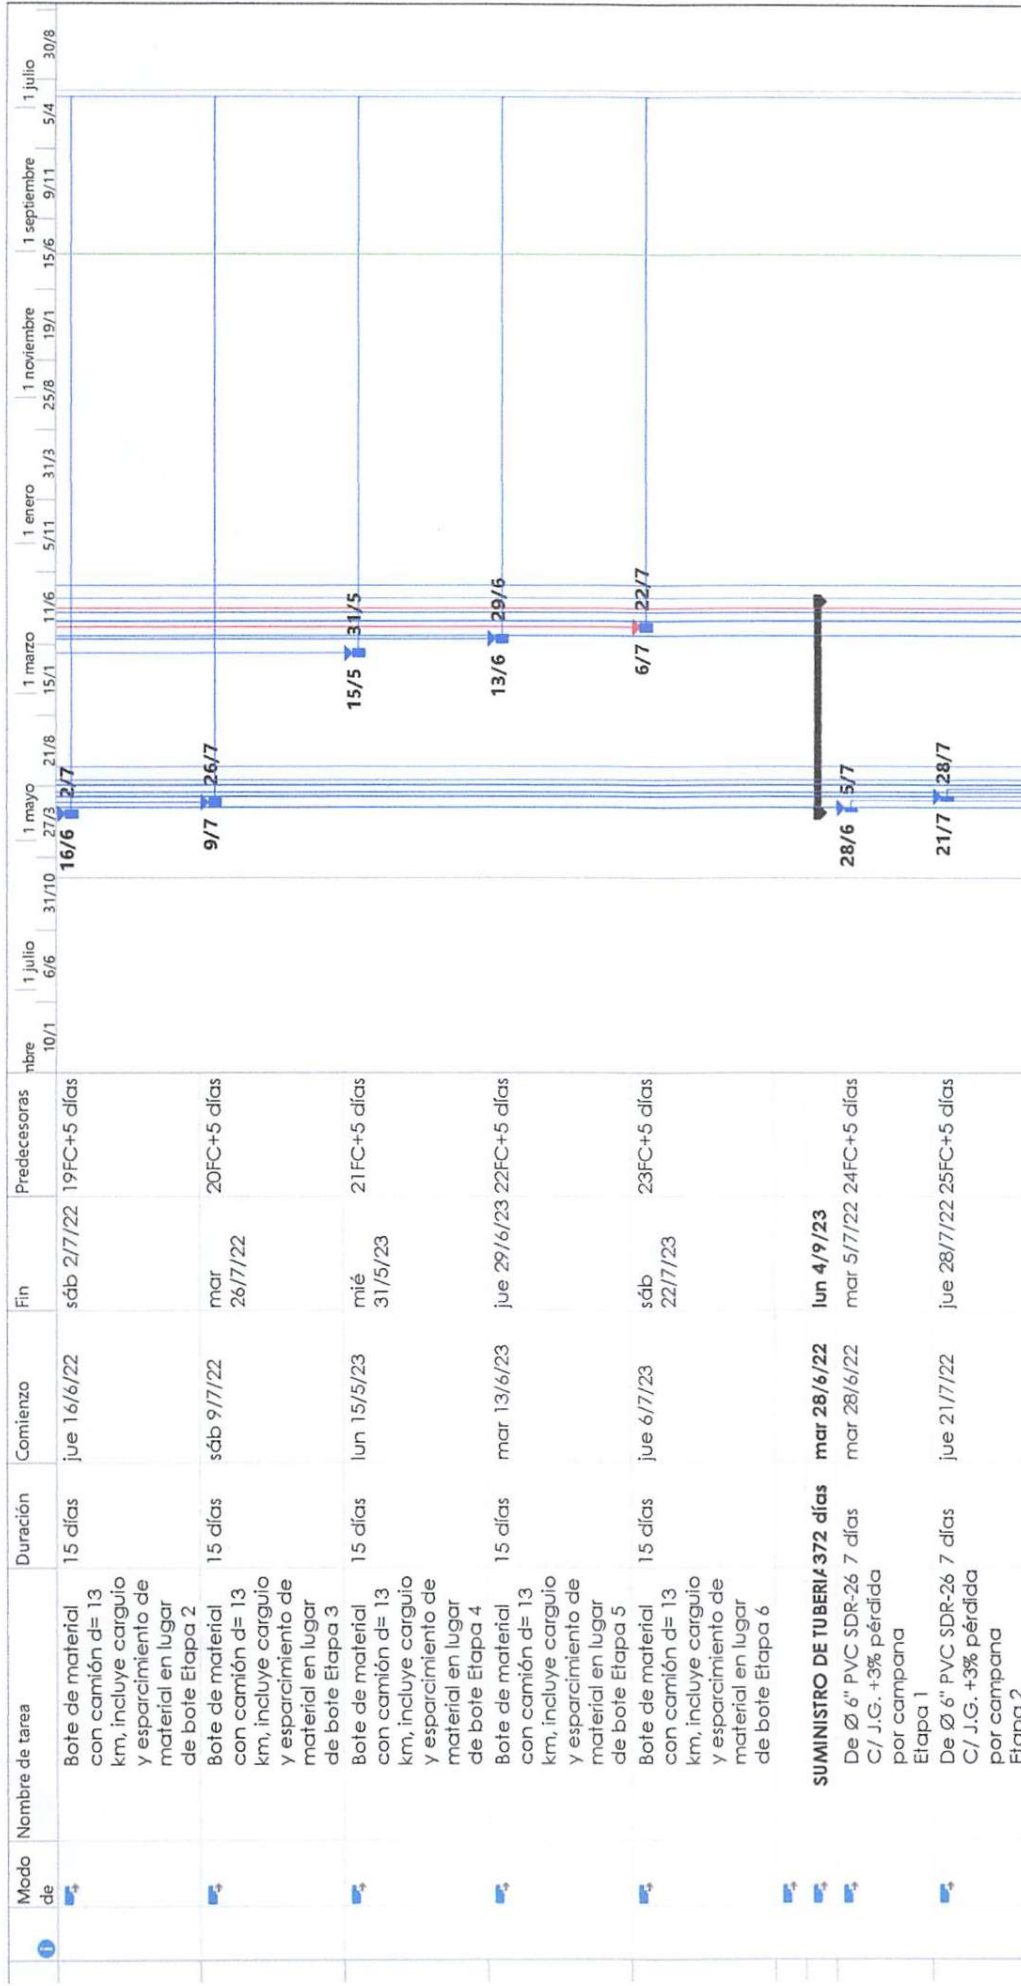
[illegible]

20 de 25

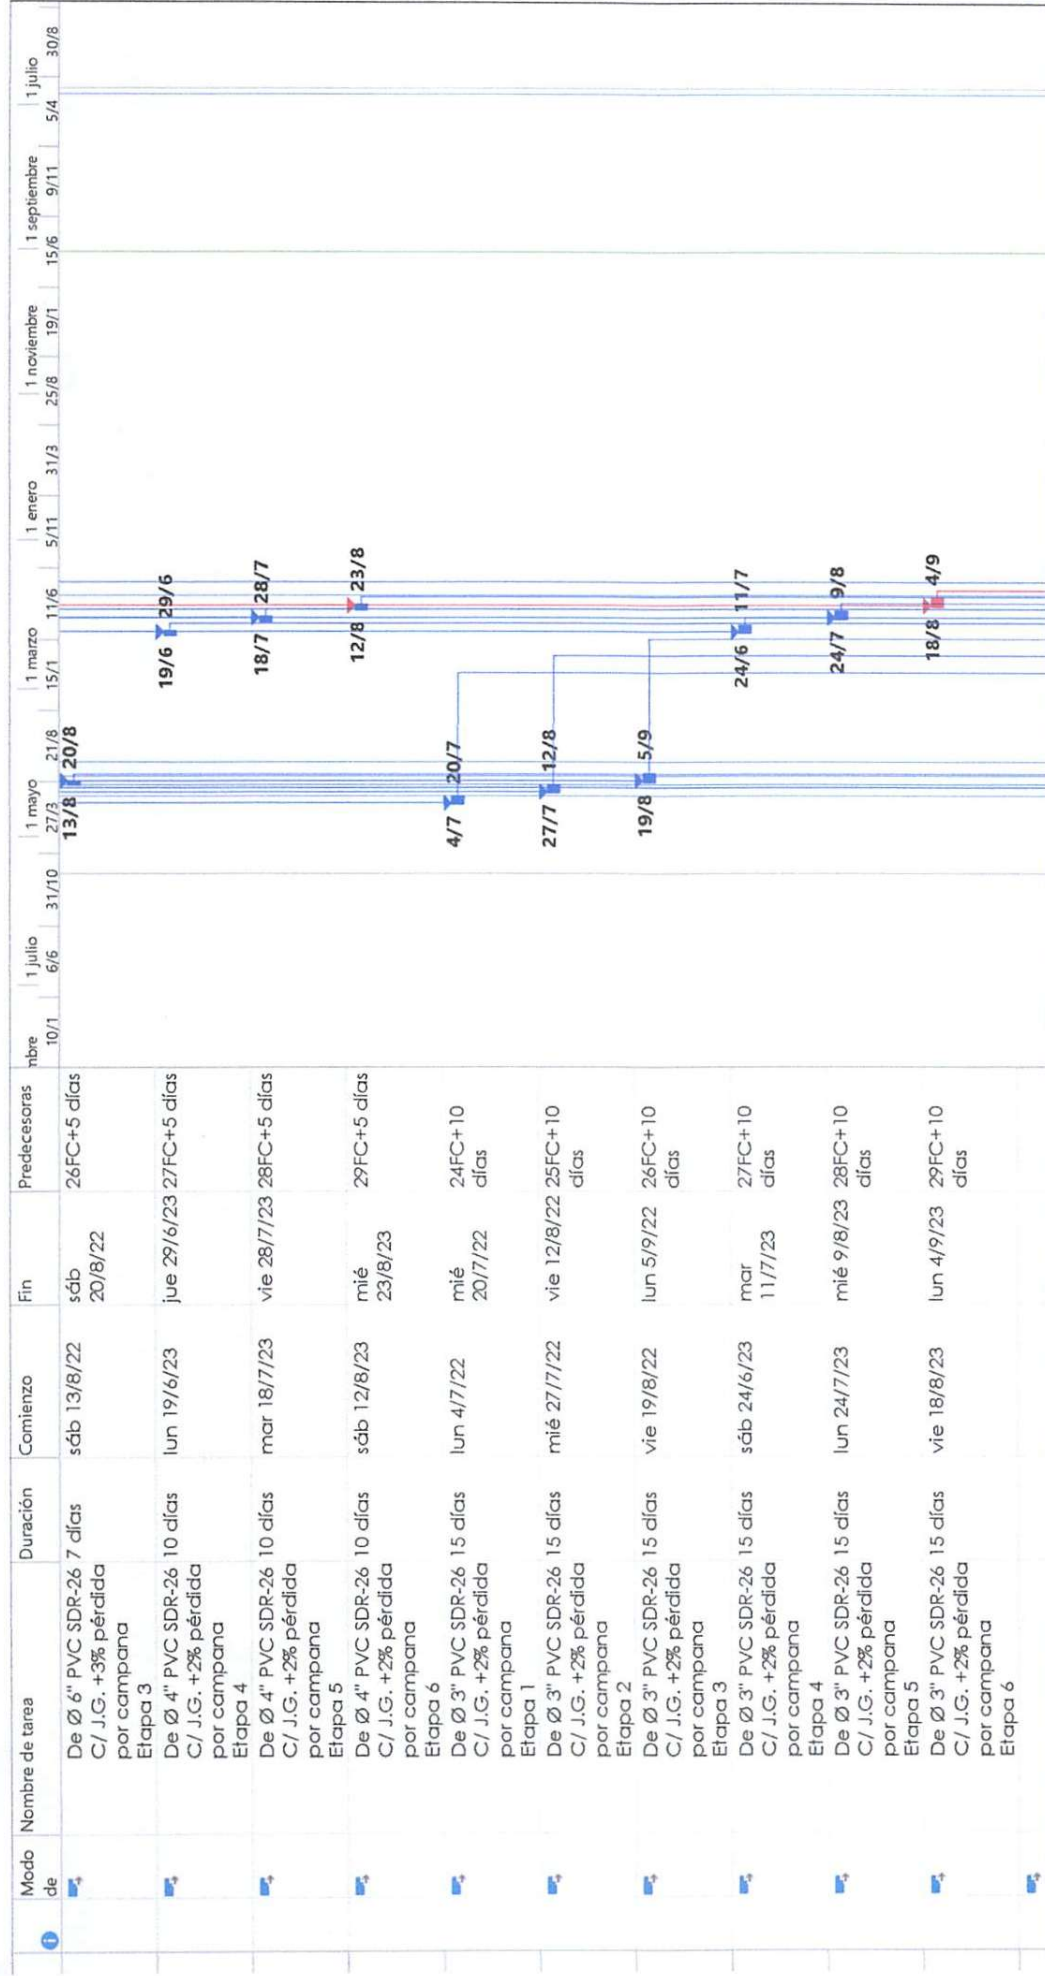

Tarea	Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
	Tarea crítica resumida	Hito inactivo	solo el comienzo
	Hito resumido	Resumen inactivo	solo fin
Resumen	Progreso resumido	Tarea manual	Fecha límite
	Resumen del proyecto	solo duración	Tarea crítica
Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual	Progreso

yecto: AMPLIACION DE RED
na: jue 28/8/25

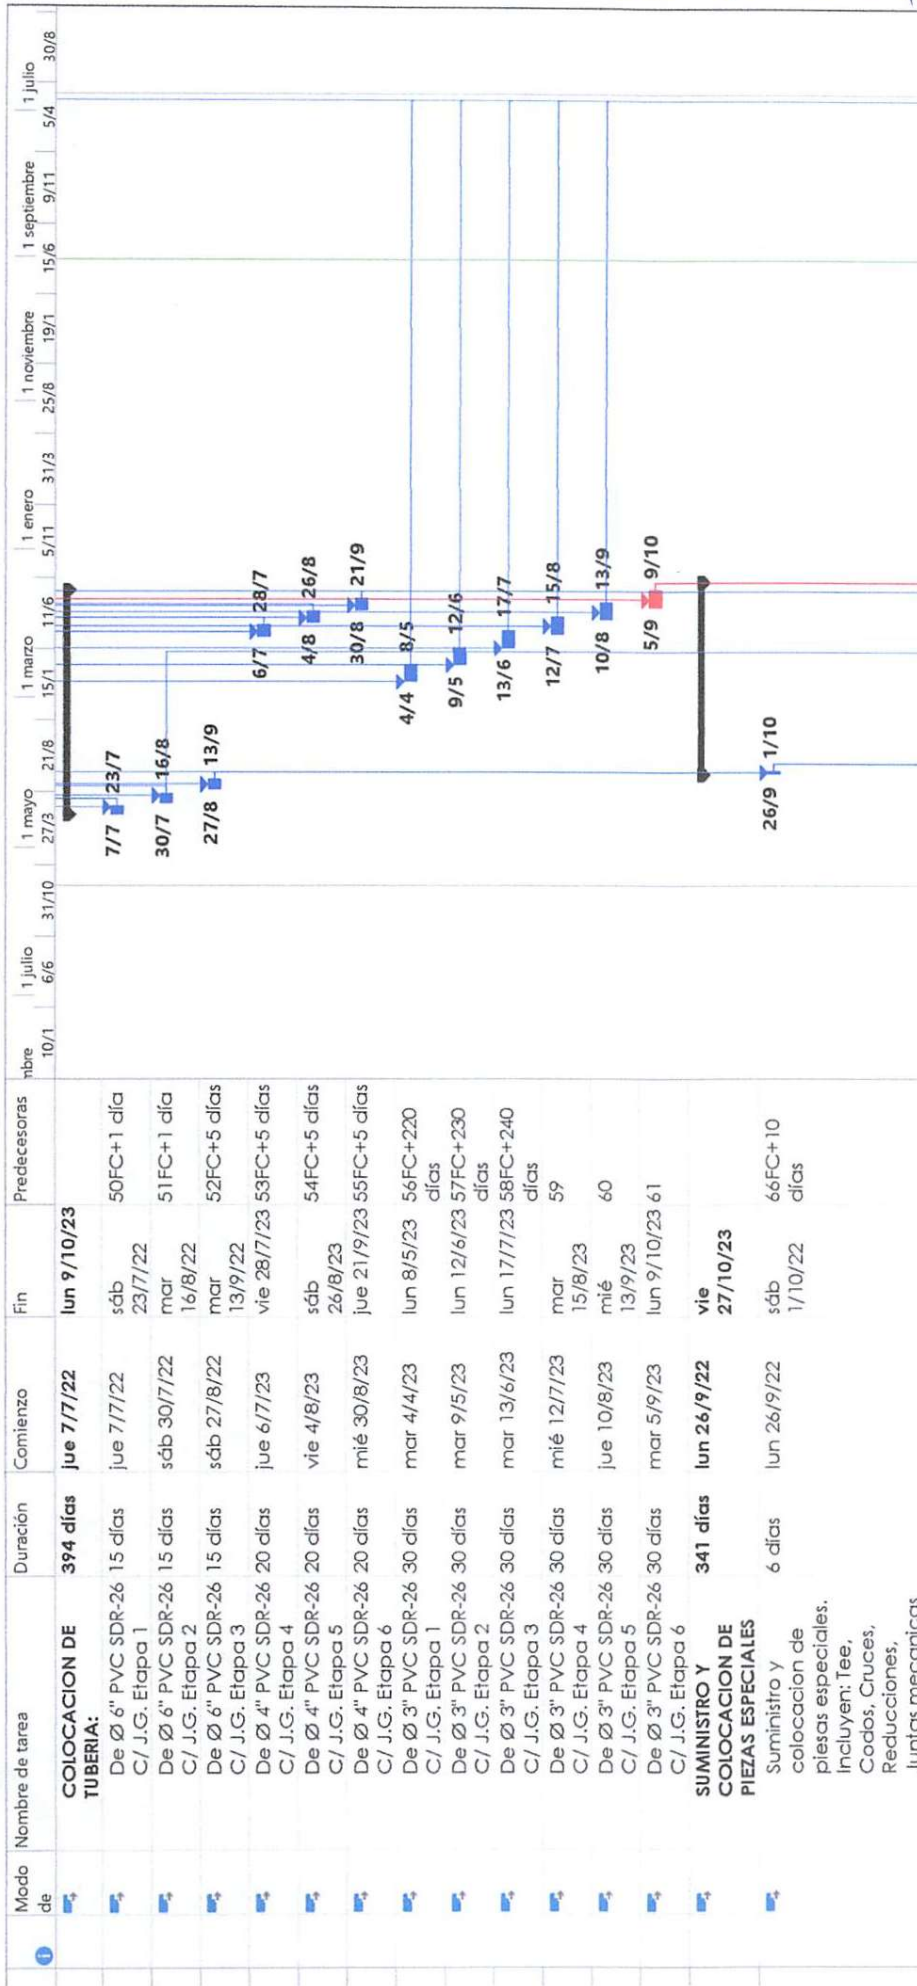

Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva			Resumen manual	
División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo			solo el comienzo	
Hito		Hito resumido		Resumen inactivo			solo fin	
Resumen		Progreso resumido		Tarea manual			Fecha límite	
Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración			Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual			Progreso	

Página 7

22 222 5


Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	10/1	1 julio 6/6	1 mayo 27/3	21/8	15/1	11/6	5/11	1 enero 31/3	15/6	1 septiembre 9/11	19/1	25/8	1 noviembre 5/4	1 julio 30/8
	Suministro y colocación de piezas especiales. Incluyen: Tee, Codos, Cruces, Reducciones, Juntas mecánicas	6 días	mié 4/10/23	mar 10/10/23	69FC+10 días						4/10	10/10							
	Suministro y colocación de piezas especiales. Incluyen: Tee, Codos, Cruces, Reducciones, Juntas mecánicas	6 días	sáb 21/10/23	vie 27/10/23	75FC+10 días						21/10	27/10							
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	342 días	lun 3/10/22	sáb 4/11/23															
	Válvula de compuerta Ø 3" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple platillado, junta Dresser)	2 días	sáb 28/10/23	lun 30/10/23	79							28/10	30/10						
	Válvula de compuerta Ø 4" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple platillado, junta Dresser)	2 días	mié 11/10/23	jue 12/10/23	78							11/10	12/10						

Tarea		Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
División		Tarea crítica resumida	Hito inactivo	Resumen manual
Hito		Hito resumido	Resumen inactivo	Resumen manual
Resumen		Progreso resumido	Tarea manual	Resumen manual
Resumen del proyecto		Tareas externas	Resumen manual	Resumen manual
Agrupar por síntesis		Hito externo	Informe de resumen manual	Resumen manual

de de Ph


Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	1 octubre	1 noviembre	1 diciembre	1 enero	1 febrero	1 marzo	1 abril	1 mayo	1 junio	1 julio	1 agosto	1 septiembre	1 octubre	1 noviembre	1 diciembre	1 enero	1 febrero	1 marzo	1 abril	1 mayo	1 junio	1 julio	1 agosto	1 septiembre	1 octubre	1 noviembre	1 diciembre
	Válvula de compuerta Ø 6" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple platillado, junta Dresser)	2 días	lun 3/10/22	mar 4/10/22	77																											
	Caja telescópica para válvulas (Incluye base y	5 días	mar 31/10/23	sáb 4/11/23	84:82:83																											
	PRUEBA HIDROSTATICA 30 días																															
	Tubería de Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G	30 días	lun 6/11/23	sáb 9/12/23	85																											
	Tubería de Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G	25 días	lun 6/11/23	lun 4/12/23	85																											
	Tubería de Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G	20 días	lun 6/11/23	mar 28/11/23	85																											
	CRUCE DE ALCANTARILLA Ø 6" ACERO L=3.00 M (1 UD), C/PROTECCION ANTICORROSIVA	6 días	lun 5/6/23	sáb 10/6/23																												
	Suministro de tubería de Ø 6"	1 día	mié 7/6/23	mié 7/6/23	97																											
	Codo Ø6"x45 acero SCH-40, con protección anticorrosiva.	1 día	vie 9/6/23	vie 9/6/23	94																											
	Junta mecánica tipo dresser Ø6"	1 día	sáb 10/6/23	sáb 10/6/23	95																											
	Anclajes H.S	2 días	lun 5/6/23	mar 6/6/23	65FC+250 días																											
	Excavación material no clasificado a mano	2 días	mié 7/6/23	jue 8/6/23	97																											
	Relleno compactado @																															

Tarea	División	Hito	Resumen	Resumen del proyecto	Agrupar por síntesis	Tarea resumida	Tarea crítica resumida	Hito resumido	Progreso resumido	Tareas externas	Hito externo	Tarea inactiva	Hito inactivo	Resumen inactivo	Tarea manual	solo duración	Informe de resumen manual	Resumen manual	solo el comienzo	solo fin	Fecha límite	Tarea crítica	Progreso
ecto: AMPLIACION DE RED																							
a: jue 28/8/25																							

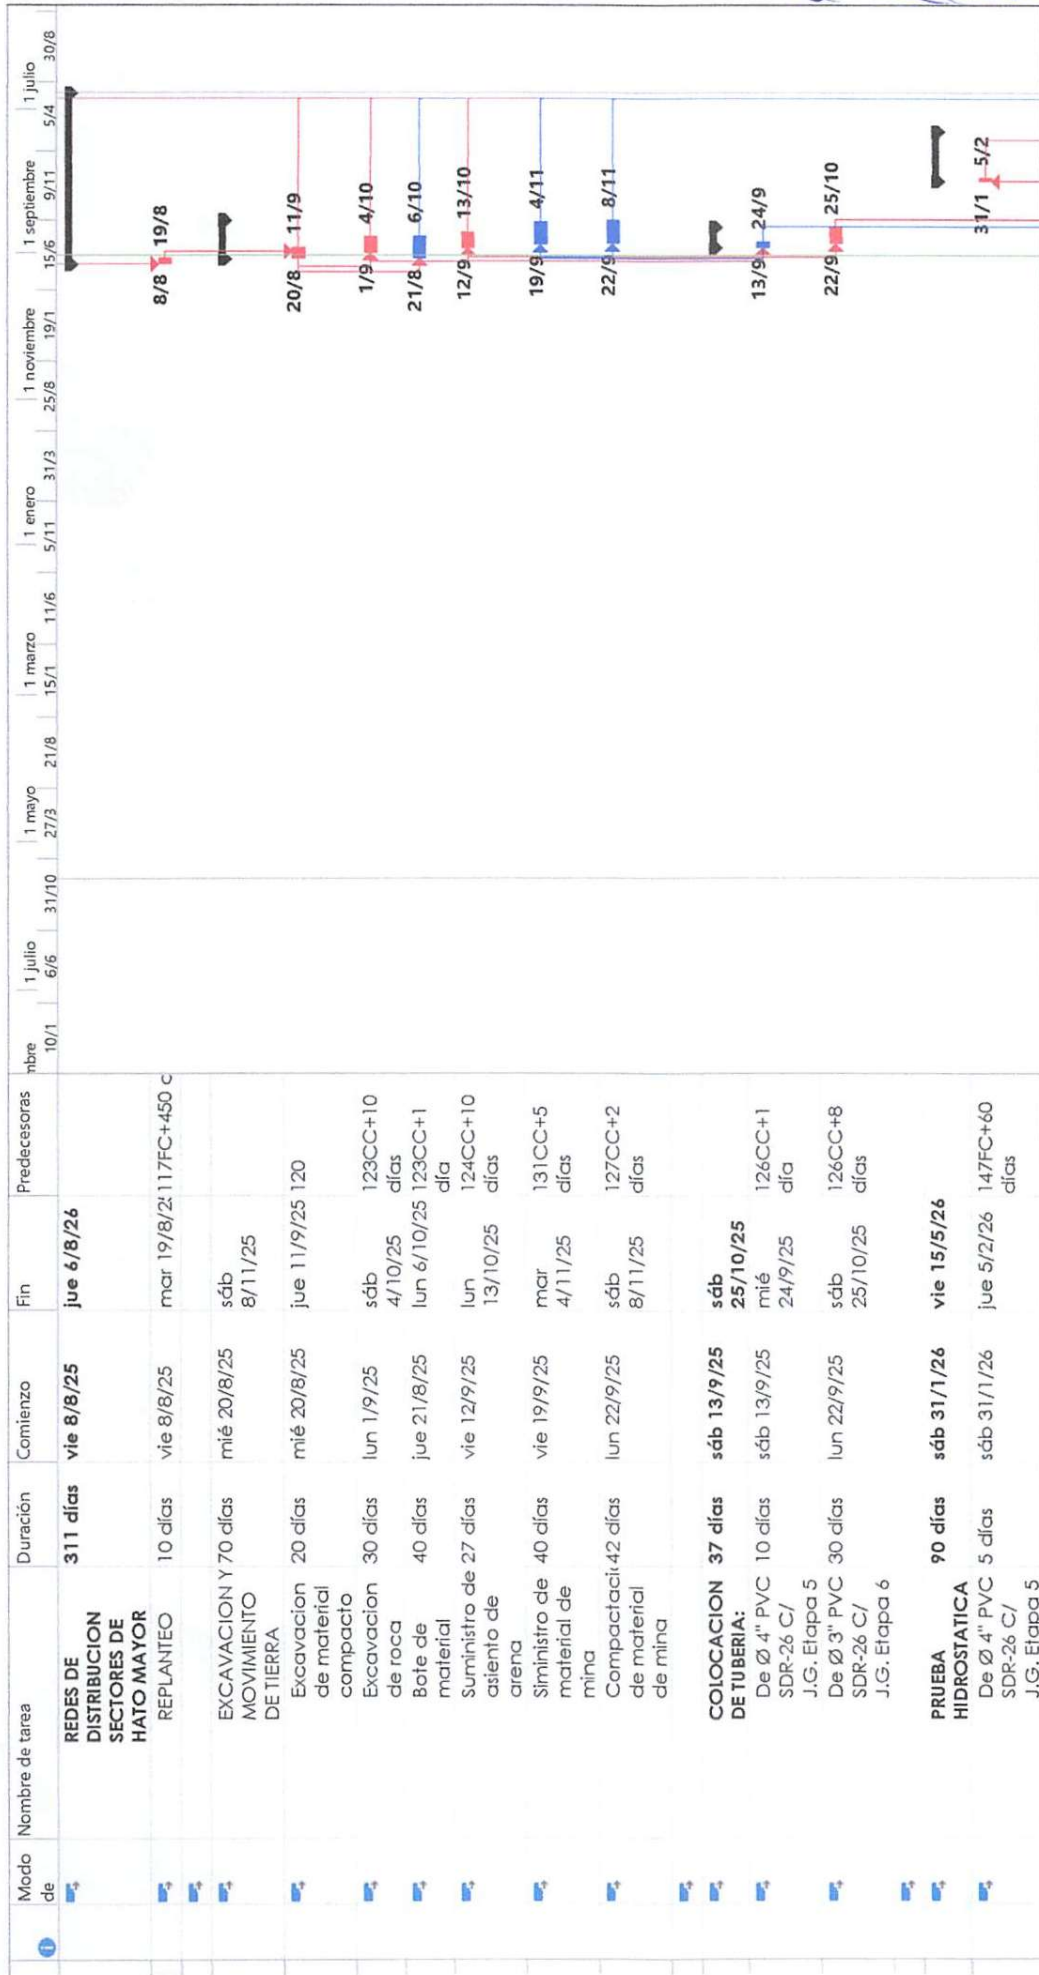

Tarea		Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
División		Tarea crítica resumida	Hito inactivo	Resumen manual
Hito	◆	Hito resumido	Resumen inactivo	Resumen manual
Resumen	◆	Progreso resumido	Tarea manual	Resumen manual
Resumen del proyecto	◆	Tareas externas	Resumen manual	Resumen manual
Agrupar por síntesis	◆	Hito externo	Informe de resumen manual	Resumen manual

2022

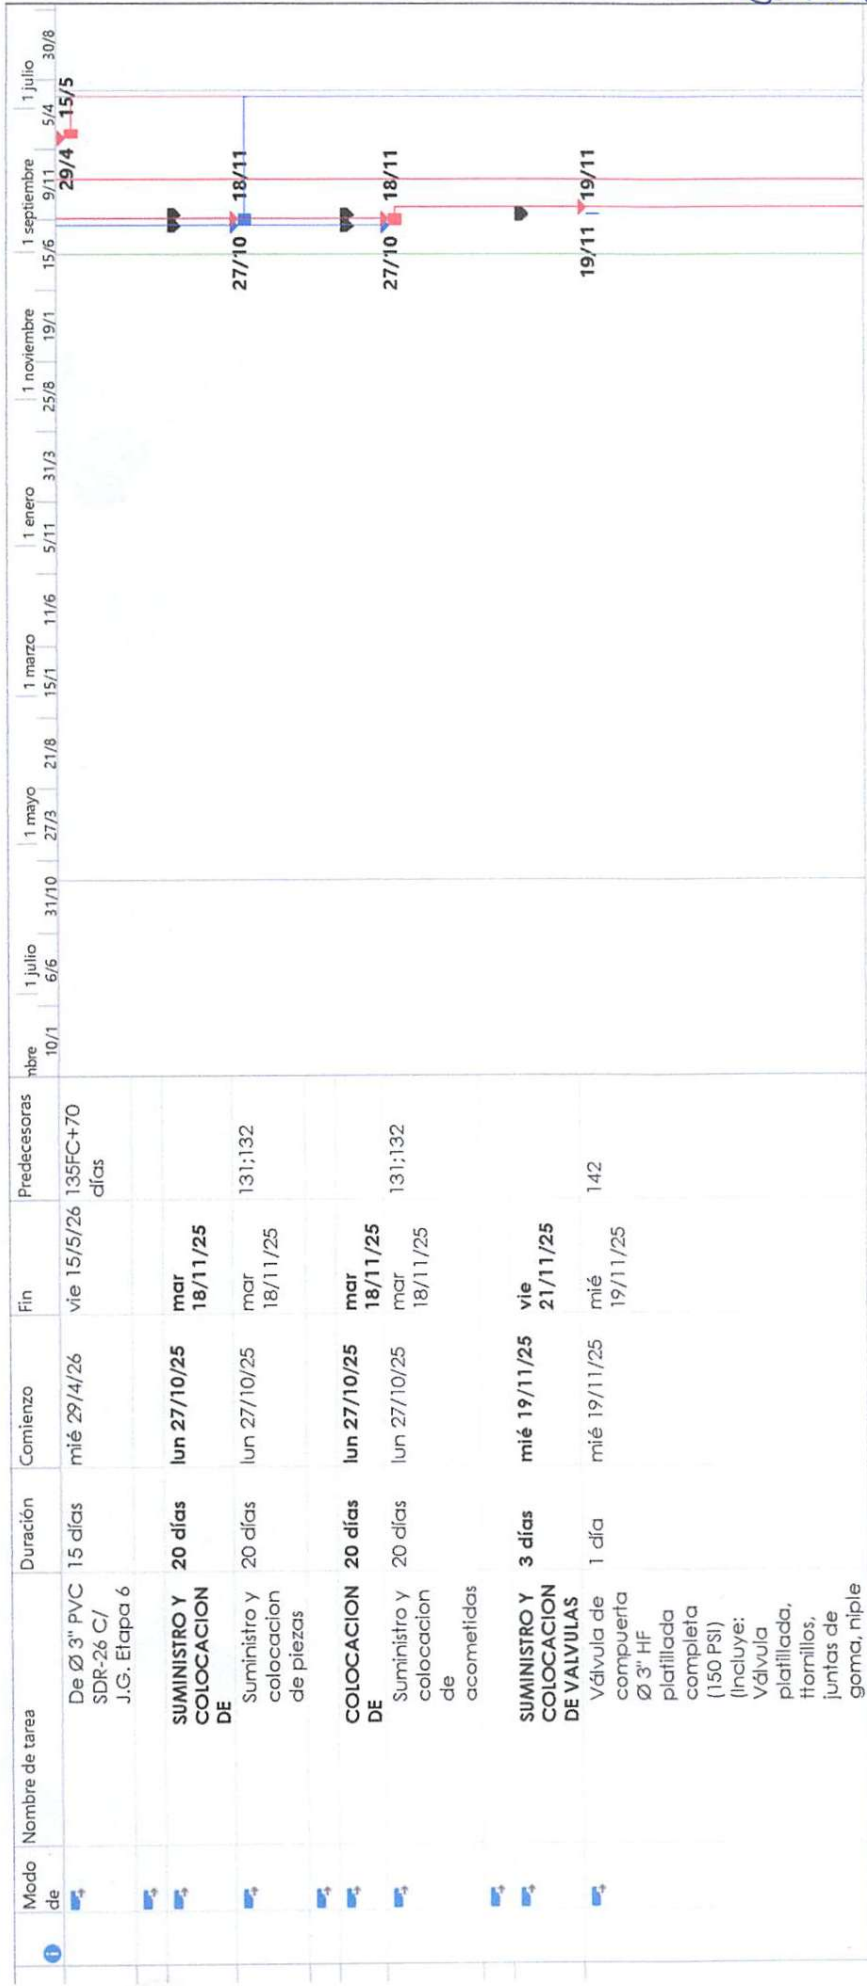

Proyecto: AMPLIACION DE RED
Fecha: 28/8/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	10/1	1 julio 6/6	1 mayo 27/3	21/8	15/1	11/6	5/11	31/3	25/8	19/1	15/6	9/11	1 septiembre 15/6	5/4	1 julio 30/8
1	Válvula de compuerta Ø 4" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25	142													19/11		
	Válvula de compuerta Ø 12" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	148													21/11		
	Construcción 2 días de registro de válvula de Ø 12"	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	142													19/11		
	LIMPIEZA FINAL 10 días	10 días	sáb 25/7/26	jue 6/8/26																
	Limpieza final etapa 4	10 días	sáb 25/7/26	mié 5/8/26	136FC+60 días															
	FIN	0 días	jue 6/8/26	jue 6/8/26	30;31;32;33;34															

Emmanuel

Tarea	Tarea resumida	Tarea inactiva	Resumen manual
División	Tarea crítica resumida	Hito inactivo	solo el comienzo
Hito	Hito resumido	Resumen inactivo	solo fin
Resumen	Progreso resumido	Tarea manual	Fecha límite
Resumen del proyecto	Tareas externas	solo duración	Tarea crítica
Agrupar por síntesis	Hito externo	Informe de resumen manual	Progreso
