



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- **AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERALVILLO-LA PLACETA, PROVINCIA MONTE PLATA**

Contrato:

- **006/2006**

Contratista:

- **COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERÍA (COMPREICA), S.A.S.**

Fecha Período:

- **Del 01 de septiembre del 2025 al 01 de octubre del 2025**

I - Descripción General del proyecto

El proyecto comprende el mejoramiento del abastecimiento de agua potable en las comunidades de Peralvillo, La Placeta, La Majagua arriba, Callejón La Yarata, Caimito, El Naranjo Abajo, Los Manguitos y Los Arroyos. A continuación, se presentan los principales componentes del proyecto:

Electrificación y equipamiento.

- Electrificación y equipamiento de cárcamo de bombeo

Líneas a ejecutar.

- Línea de Impulsión.
- Línea de conducción desde la tubería de 8" hasta depósito regulador de 300m³.
- Línea de conducción desde cámara partidora de caudales hasta depósito regulador existente.
- Línea Matriz dese depósito regulador.

Construcciones varias.

- Construcción de obra de toma y estación de bombeo.
- Construcción de depósito regulador superficial de 700m³



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

II-Avance actual de la obra

A la fecha se ha realizado el suministro de equipos y tuberías, instalación de campamento y colocación de vallas, terminación de primer y segundo nivel de casa de químicos con su pañete interior y exterior, terminación de caseta de operador con pañete exterior e interior, pisos en granito de la caseta de operador, explanada con equipo (retro) para continuación de la verja, continuación de la verja tramo 19 y se vació la losa de fondo del depósito de 700m3 y la losa de techo de la planta.

Se vació el Cárcamo de bombeo y se esta rellenada

La obra tiene un avance financiero de un 87.10%.

III-Fotografías






INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** INAPA ***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

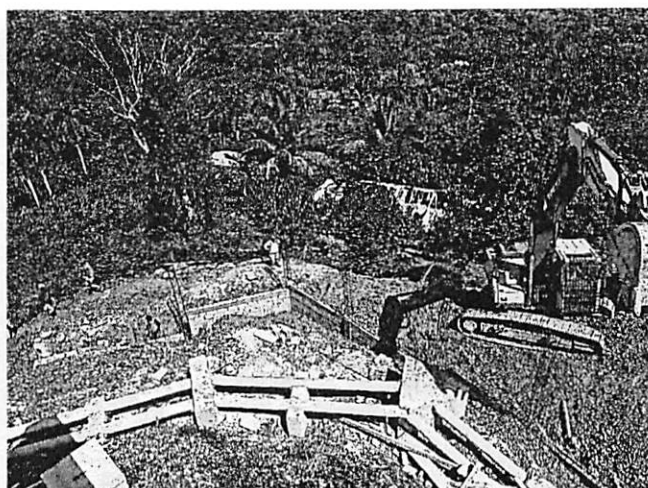

Preparado por:

D/O *Cristian Felix*
Amelia Rodríguez

Coordinador de Proyectos

Dirección de Programas y Proyectos Especiales





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA**

Contrato:

- **006/2006**

Contratista:

- **COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERÍA (COMPREICA), S.A.S.**

Fecha Período:

Desde el 01 de septiembre 2025, hasta el 30 de setiembre 2025

I - Descripción General del proyecto

El proyecto comprende la construcción del Acueducto Múltiple Majagual, ubicado en la provincia de Monte Plata. La obra beneficiara una población de 3,390 habitantes para el año 2036. A continuación, se presentan los principales componentes del proyecto:

Electrificación y equipamiento cárcamo de bombeo Guaraguo

- Cárcamo de agua cruda.
- Cárcamo de agua tratada.

Estación de bombeo en zona tanque de Guaraguo para Acueducto de Majagual (cisterna de 100m³)




- Construcción de estación de bombeo.
- Electrificación y equipamiento a estación de bombeo.
- Electrificación secundaria.
- Suministro e instalación de equipos de bombeo.
- Iluminación periférica



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** INAPA ***

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

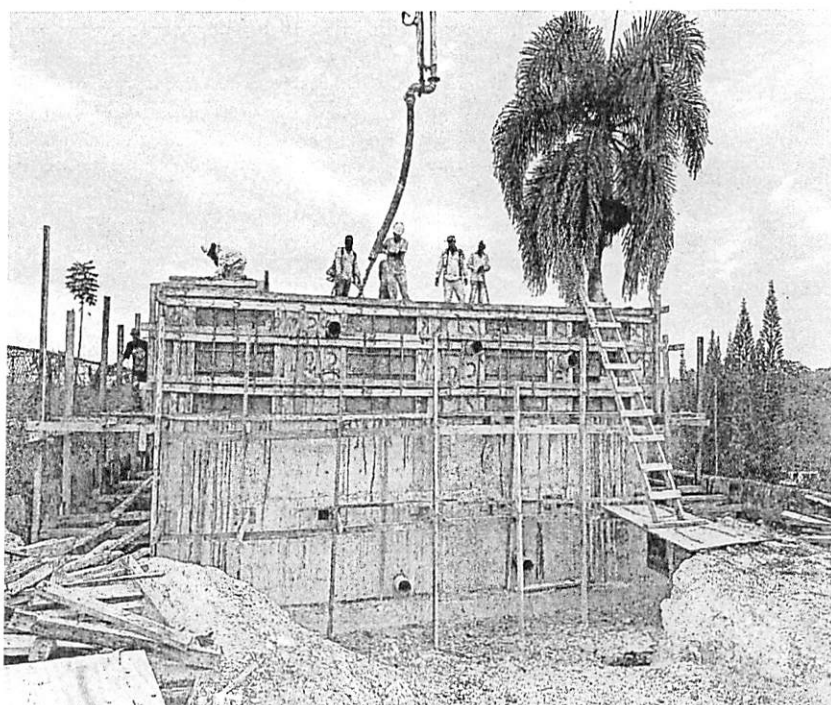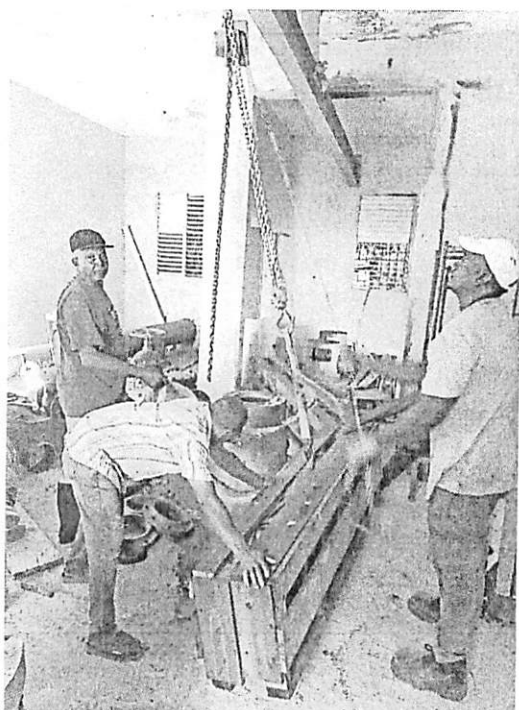

Preparado por:

Amelia Rodríguez
Amelia Rodríguez

Coordinador de proyectos

Dirección de supervisión y fiscalización de obras



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- **CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA**

Contrato:

- **006/2006**

Contratista:

- **COMPRESORES, EQUIPOS E INGENIERÍA (COMPREICA), S.A.S.**

Fecha Período:

Desde el 01 de agosto 2025, hasta el 30 de agosto 2025

I - Descripción General del proyecto

El proyecto comprende la construcción del Acueducto Múltiple Majagual, ubicado en la provincia de Monte Plata. La obra beneficiara una población de 3,390 habitantes para el año 2036. A continuación, se presentan los principales componentes del proyecto:

Electrificación y equipamiento cárcamo de bombeo Guaraguo

- Cárcamo de agua cruda.
- Cárcamo de agua tratada.

Estación de bombeo en zona tanque de Guaraguo para Acueducto de Majagual (cisterna de 100m³)


- Construcción de estación de bombeo.
- Electrificación y equipamiento a estación de bombeo.
- Electrificación secundaria.
- Suministro e instalación de equipos de bombeo.
- Iluminación periférica



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** INAPA ***

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

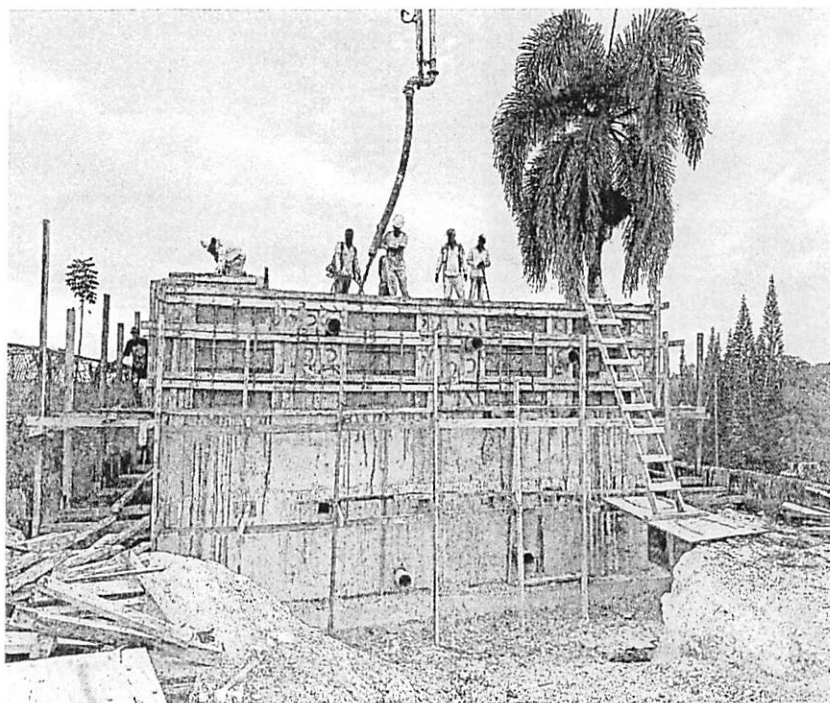

Preparado por:

Amelia Rodríguez
Amelia Rodríguez

Coordinador de proyectos

Dirección de supervisión y fiscalización de obras

