Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0			crono acueducto azua equilibrio economico	53 días	mar 12/9/23	jue 23/11/23	
1			Acueducto de Azua	53 días	mar 12/9/23	jue 23/11/23	
2			PRELIMINARES	10 días	mar 12/9/23	lun 25/9/23	
3			Replanteo Inicial y Control Topográfico. Tramo 1	8 días	jue 14/9/23	lun 25/9/23	
4			Letreros de Obras	1 día	jue 14/9/23	jue 14/9/23	3CC
5			Instalación de Campamento	1 día	jue 14/9/23	vie 15/9/23	4
6			Colocación de Banos moviles	5 días	mar 12/9/23	lun 18/9/23	5FC-4 días
7			Tramo 1	14 días	mar 12/9/23	vie 29/9/23	
8			Excavacion, Corte y Extraccion de Asfalto	3 días	lun 18/9/23	mié 20/9/23	5;3FC-12 días
9			Suministro y Colocación de asiento y relleno	8 días	mar 12/9/23	jue 21/9/23	8FC-7 días
10			Bote de Material Sobrante	6 días	jue 14/9/23	jue 21/9/23	9FC-6 días
11			Suministro y Colocacion de Tuberias	10 días	jue 14/9/23	mié 27/9/23	3CC;9FC-7 días
12			Reparacion de averias, reposicion de servicios y limpieza continua	10 días	lun 18/9/23	vie 29/9/23	8CC;11FF
13			Tramo 2	13 días	lun 18/9/23	mié 4/10/23	7CC+3 días
14			Excavacion, Corte y Extraccion de Asfalto	8 días	lun 18/9/23	mié 27/9/23	5;3FC-12 días
15			Suministro y Colocación de asiento y relleno	8 días	mar 19/9/23	jue 28/9/23	14FC-7 días
16			Bote de Material Sobrante	6 días	jue 21/9/23	jue 28/9/23	15FC-6 días
17			Suministro y Colocacion de Tuberias	10 días	mié 20/9/23	mar 3/10/23	15FC-7 días;3CC
18			cruces de Puentes, Alcantarillas, Canal en	11 días	mié 20/9/23	mié 4/10/23	17CC
19			Reparacion de averias, reposcion de servicios y limpieza continua	8 días	lun 25/9/23	mié 4/10/23	14CC;18FF
20			Tramo 3	12 días	lun 2/10/23	mar 17/10/2	13CC+10 días
21			Excavacion, Corte y Extraccion de Asfalto	8 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23	5;3FC-12 días
22			Suministro y Colocación de asiento y relleno	8 días	mar 3/10/23	jue 12/10/23	21FC-7 días
23			Bote de Material Sobrante	6 días	jue 5/10/23	jue 12/10/23	22FC-6 días
24			Suministro y Colocacion de Tuberias	10 días	mié 4/10/23	mar 17/10/23	22FC-7 días;3CC
25			cruces de Puentes, Alcantarillas, Canal en	10 días	mié 4/10/23	mar 17/10/23	24CC
26			Reparacion de averias, reposcion de servicios y	8 días	vie 6/10/23	mar 17/10/23	21CC;25FF
27			Terminacion de Red y pruebas de presion	41 días	mié 27/9/23	mié 22/11/23	
28			Prueba tramo 1	12 días	mié 27/9/23	jue 12/10/23	7FC-3 días
29			Prueba tramo 2	12 días	lun 16/10/23	mar 31/10/2	13FC-3 días;28FC
30			Prueba tramo 3	10 días	jue 2/11/23	mié 15/11/2	20FC-3 días;29FC
31			suministro y colocacion de carpeta asfaltica	5 días	jue 16/11/23	mié 22/11/23	28;29;30
32			Reparación de Verja Perimetral en Depósitos Reguladores.	3 días	vie 13/10/23	mar 17/10/23	
33			Reparación de Verja Perimetral en Depósitos	3 días	vie 13/10/23	mar 17/10/23	28
34			Limpieza Final del Proyecto	1 día	jue 23/11/23	jue 23/11/23	31;33

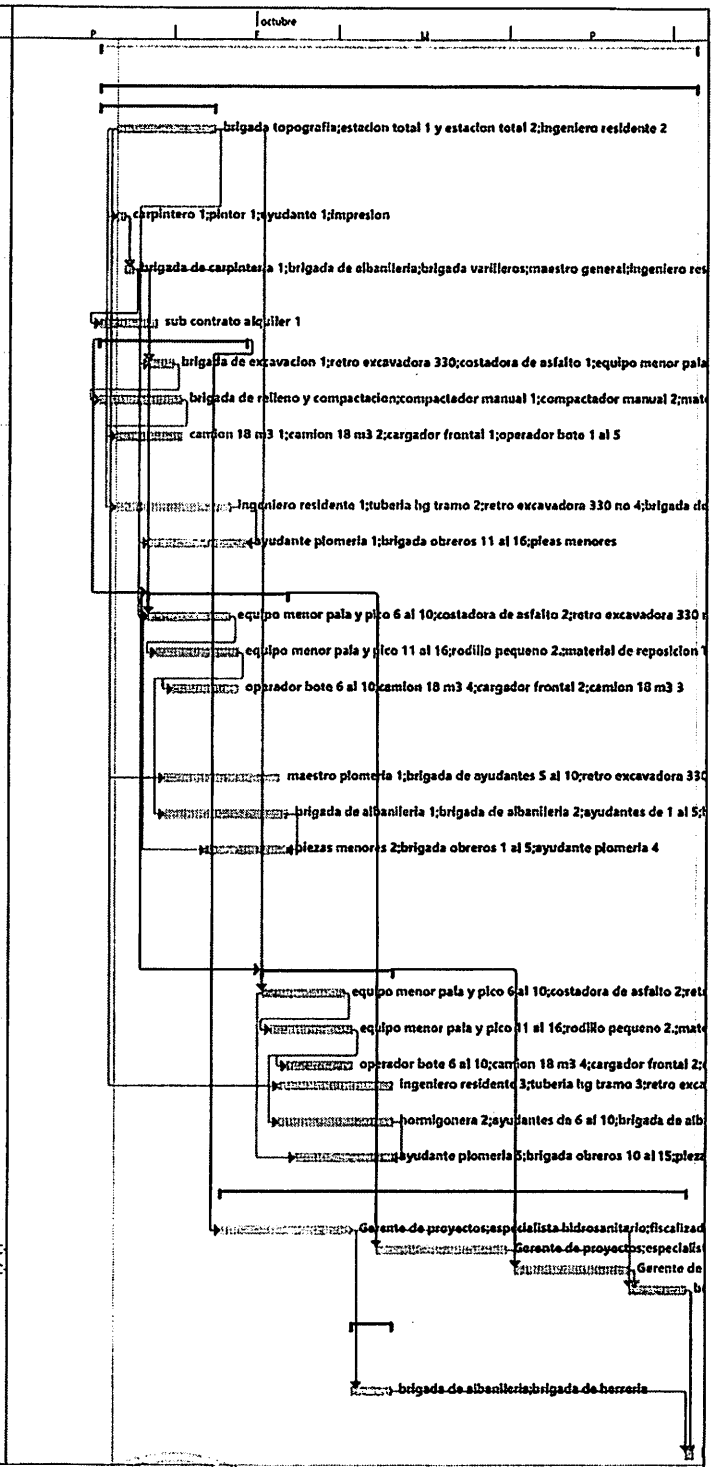

CONSTRUCTORA HARAMILLE SRL
RNC 131-08157-5
Santo Domingo, R.D.

Proyecto: crono acueducto azu
Fecha: jue 14/9/23

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Notas:
1.- Los tiempos podran variar por:
a) Dependiendo los tiempos de asignacion de rutas de las navieras.
b) Por imprevistos entre las navieras y las empresas de transporte.
2.- Los tiempos de entrega en Puerto de Haina
