Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE BAITOA- TAVERA, PROVINCIAS SANTIAGO-LA VEGA**	**500 días**	**lun 2/3/26**	**vie 28/1/28**
2		INICIO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26
3		OBRA DE TOMA DIRECTA EN LAGO DE LA PRESA	150 días	lun 2/3/26	vie 25/9/26
4		LINEA DE IMPULSION DESDE PRESA HASTA ESTACION DE BOMBEO (TOMA DIRECTA-ESTACION DE BOMBEO)	30 días	lun 28/9/26	vie 6/11/26
5		ESTACION DE BOMBEO CAPACIDAD 100 M3 (PROXIMO AL EMBALSE)	180 días	lun 2/3/26	vie 6/11/26
6		LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO HASTA PLANTA POTABILIZADORA	70 días	lun 9/11/26	vie 12/2/27
7		CONVERSION PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA DE 30 LPS A FILTRACION RAPIDA DE 100 LPS	200 días	lun 2/3/26	vie 4/12/26
8		LINEA DE CONDUCCION DESDE PLANTA POTABILIZADORA-ESTACION DE BOMBEO (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA)	10 días	lun 7/12/26	vie 18/12/26
9		ESTACION DE BOMBEO C/CISTERNA DE H.A. 100 M3 (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA)	180 días	lun 21/12/26	vie 27/8/27
10		LINEA DE IMPULSION DESDE ESTACION DE BOMBEO (A CONSTRUIR EN ZONA DE PLANTA)-DEPOSITO DE 600 M3	110 días	lun 30/8/27	vie 28/1/28
11		DEPOSITO REGULADOR CAPACIDAD 600 M3	120 días	lun 16/8/27	vie 28/1/28
12		LINEA MATRIZ PARA BAITOA, LA LIMA Y LOS RANCHOS DE TAVERA	100 días	lun 13/9/27	vie 28/1/28
13		RED DE DISTRIBUCION BAITOA-TAVERA	200 días	lun 26/4/27	vie 28/1/28
14		CAMPAMENTO	500 días	lun 2/3/26	vie 28/1/28
15		FIN DEL PROYECTO	0 días	lun 2/3/26	lun 2/3/26

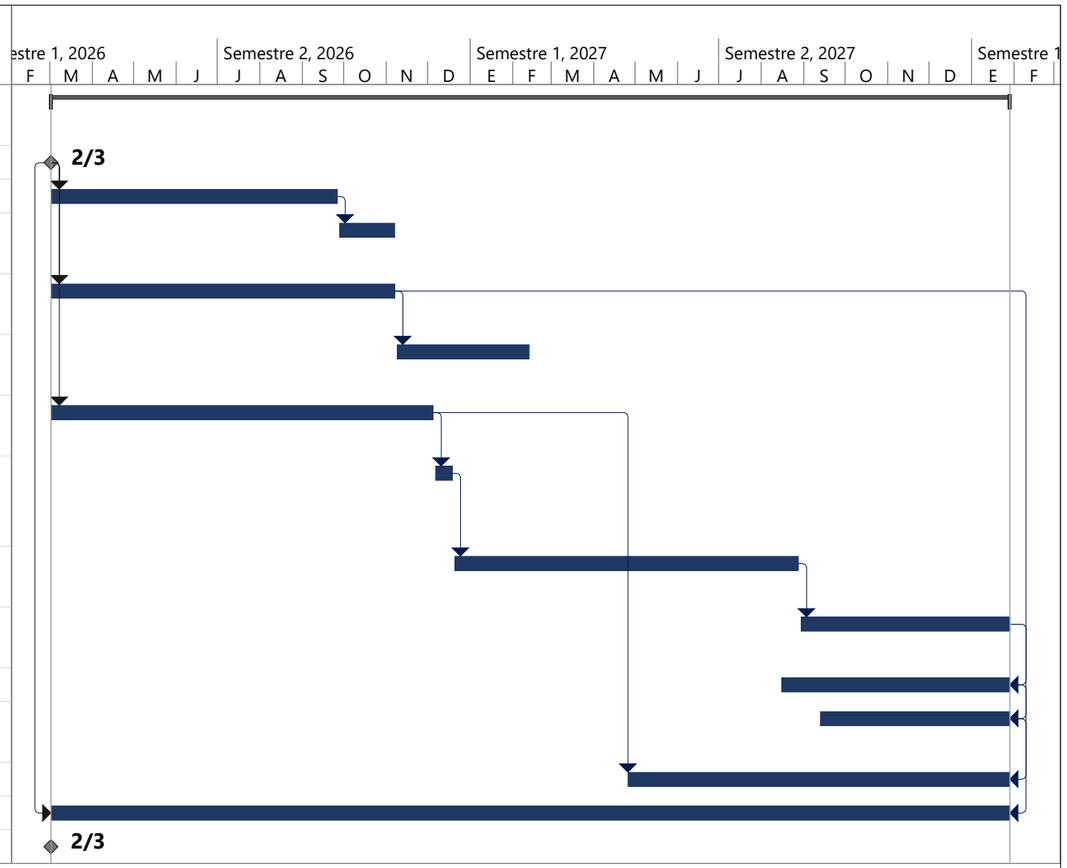

Proyecto: Programacion Const.
Fecha: vie 26/12/25

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
