AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**	**AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO**	**1224 días**	**12/10/22**	**12/12/26**
2	**1.1**	**LOTE III**	**1224 días**	**12/10/22**	**12/12/26**
3	**1.1.1**	**INICIO**	**1224 días**	**12/10/22**	**12/12/26**
4	1.1.1.1	Acta de Inicio de Obra	1 día	12/10/22	12/10/22
5	1.1.1.2	Movilización e instalación	5 días	13/10/22	19/10/22
6	**1.1.1.3**	**A - LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE Ø6" PVC SDR-26 A EMPALMAR DE LA TUBERÍA DE Ø24" HACIA LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA**	**73 días**	**19/10/22**	**18/1/23**
7	**1.1.1.3.1**	**Preliminares**	**3 días**	**19/10/22**	**22/10/22**
8	1.1.1.3.1.1	Replanteo y marcado de corte	3 días	19/10/22	22/10/22
9	**1.1.1.3.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**10 días**	**22/10/22**	**4/11/22**
10	1.1.1.3.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	7 días	22/10/22	1/11/22
11	1.1.1.3.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	2 días	1/11/22	3/11/22
12	1.1.1.3.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	1 día	3/11/22	4/11/22
13	**1.1.1.3.3**	**Movimiento de tierra**	**55 días**	**4/11/22**	**11/1/23**
14	1.1.1.3.3.1	Excavación material compacto	20 días	4/11/22	29/11/22
15	1.1.1.3.3.2	Nivelación en fondo de zanja	20 días	5/11/22	30/11/22
16	1.1.1.3.3.3	Suministro y coloc. Asiento de arena	20 días	7/11/22	1/12/22
17	1.1.1.3.3.4	Relleno compactado	8 días	27/12/22	5/1/23
18	1.1.1.3.3.5	Bote de material con camón (d= 5 km)	5 días	5/1/23	11/1/23
19	**1.1.1.3.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**20 días**	**1/12/22**	**27/12/22**
20	1.1.1.3.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PVC (SDR-26) y accesorios	15 días	1/12/22	20/12/22
21	1.1.1.3.4.2	Prueba hidrostática	2 días	23/12/22	27/12/22
22	**1.1.1.3.5**	**Suministro y colocación de válvulas**	**3 días**	**20/12/22**	**23/12/22**
23	1.1.1.3.5.1	Suministro y colocación de válvulas	3 días	20/12/22	23/12/22
24	**1.1.1.3.6**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**3 días**	**11/1/23**	**16/1/23**
25	1.1.1.3.6.1	Imprimación y colocación de asfalto	3 días	11/1/23	16/1/23
26	1.1.1.3.7	Limpieza Continua y Final	2 días	16/1/23	18/1/23
27	**1.1.1.4**	**B - REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES EL CERRO, SAN MIGUEL, LOS MULTIS, DUARTE, EL CARRIL, MARTÍNEZ Y VILLA NUEVA, EN NAVARRETE**	**258 días**	**27/12/22**	**13/11/23**
28	**1.1.1.4.1**	**Preliminares**	**5 días**	**27/12/22**	**2/1/23**
29	1.1.1.4.1.1	Replanteo y marcado de corte	5 días	27/12/22	2/1/23
30	**1.1.1.4.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**42 días**	**2/1/23**	**23/2/23**
31	1.1.1.4.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	30 días	2/1/23	8/2/23
32	1.1.1.4.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	7 días	8/2/23	16/2/23
33	1.1.1.4.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	5 días	16/2/23	23/2/23
34	**1.1.1.4.3**	**Movimiento de tierra**	**176 días**	**16/2/23**	**23/9/23**
35	1.1.1.4.3.1	Excavación material compacto	50 días	16/2/23	20/4/23
36	1.1.1.4.3.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	50 días	17/2/23	21/4/23

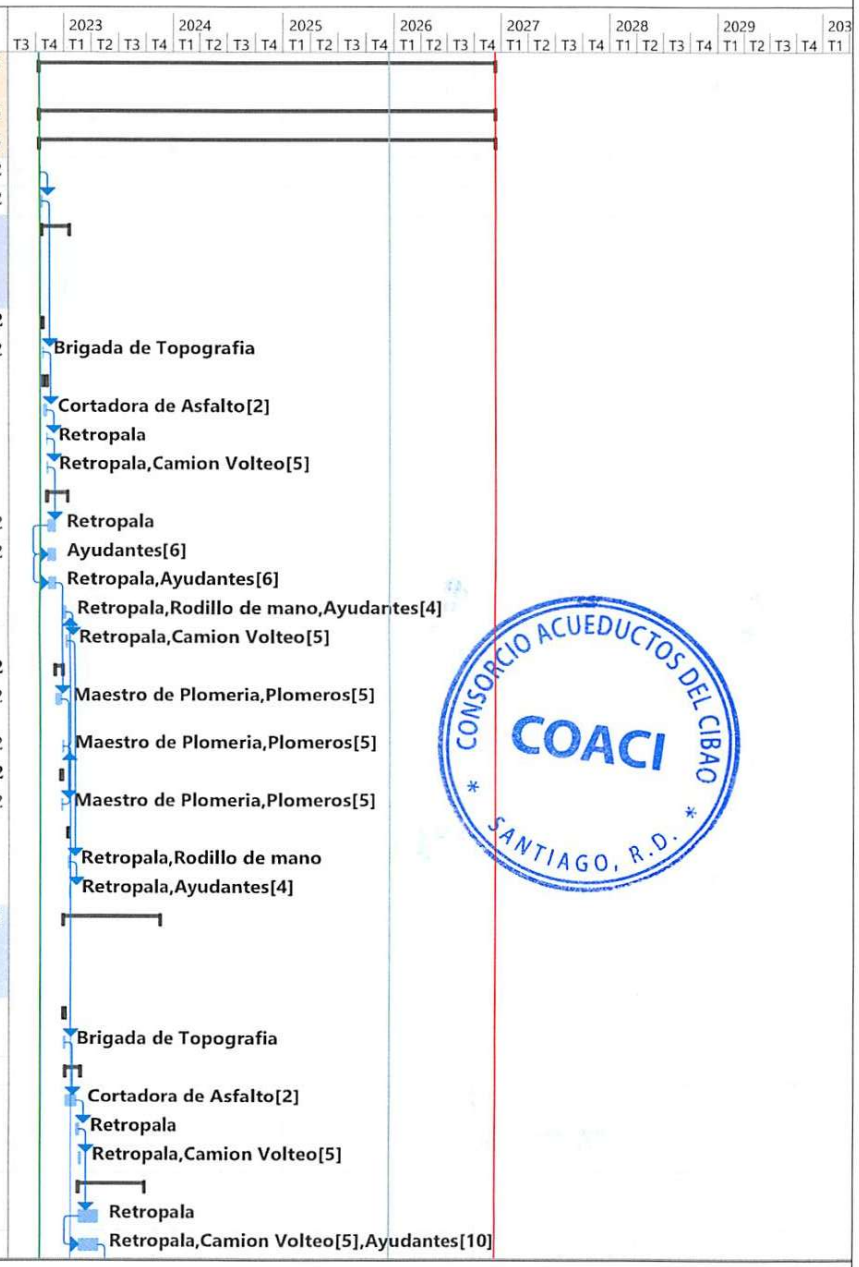

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	1.1.1.4.3.3	Relleno compactado	30 días	17/8/23	23/9/23
38	**1.1.1.4.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**95 días**	**21/4/23**	**17/8/23**
39	1.1.1.4.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PVC (SDR-26) y accesorios	35 días	21/4/23	3/6/23
40	1.1.1.4.4.2	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PVC (SDR-26) y accesorios	20 días	3/6/23	28/6/23
41	1.1.1.4.4.3	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PVC (SDR-26) y accesorios	40 días	28/6/23	17/8/23
42	**1.1.1.4.5**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**30 días**	**23/9/23**	**31/10/23**
43	1.1.1.4.5.1	Imprimación y colocación de asfalto	30 días	23/9/23	31/10/23
44	1.1.1.4.6	Limpieza Continua y Final	10 días	31/10/23	13/11/23
45	**1.1.1.5**	**C - LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE DEPÓSITO REGULADOR 8,000 M³ HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO No.2 (EN COMUNIDAD LA ATRAVESADA)**	**223.25 días**	**27/12/22**	**29/9/23**
46	**1.1.1.5.1**	**Preliminares**	**5 días**	**27/12/22**	**2/1/23**
47	1.1.1.5.1.1	Replanteo	5 días	27/12/22	2/1/23
48	**1.1.1.5.2**	**Movimiento de tierra**	**101 días**	**29/4/23**	**1/9/23**
49	1.1.1.5.2.1	Excavación material compacto	10 días	29/4/23	11/5/23
50	1.1.1.5.2.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	10 días	1/5/23	12/5/23
51	1.1.1.5.2.3	Relleno compactado	15 días	15/8/23	1/9/23
52	**1.1.1.5.3**	**Suministro y colocación de tuberías**	**20 días**	**13/5/23**	**7/6/23**
53	1.1.1.5.3.1	Suministro y colocación de tuberías Ø8" PVC (SDR-26) y accesorios	20 días	13/5/23	7/6/23
54	**1.1.1.5.4**	**Suministro y Colocación de Valvulas**	**7 días**	**7/6/23**	**15/6/23**
55	1.1.1.5.4.1	Suministro y Colocación de Valvulas	7 días	7/6/23	15/6/23
56	1.1.1.5.5	Limpieza Continua y Final	3 días	27/9/23	29/9/23
57	**1.1.1.6**	**D - ESTACIÓN DE BOMBEO No.2 (CÁRCAMO Y CASETA) A CONSTRUIR EN LA ATRAVESADA PARA ABASTECER LAS COMUNIDADES CAÑADA BONITA, EL TÚNEL, LA SIERRA Y GUANÁBANO**	**170 días**	**2/9/23**	**1/4/24**
58	1.1.1.6.1	**CÁRCAMO DE BOMBEO**	**103 días**	**2/9/23**	**9/1/24**
59	**1.1.1.6.1.1**	**Preliminares**	**7 días**	**2/9/23**	**11/9/23**
60	1.1.1.6.1.1.1	Limpieza del área	5 días	2/9/23	8/9/23
61	1.1.1.6.1.1.2	Replanteo	2 días	8/9/23	11/9/23
62	**1.1.1.6.1.2**	**Movimiento de tierra**	**59 días**	**11/9/23**	**23/11/23**
63	1.1.1.6.1.2.1	Excavación material compacto	7 días	11/9/23	20/9/23
64	1.1.1.6.1.2.2	Relleno Compactado	2 días	18/11/23	21/11/23
65	1.1.1.6.1.2.3	Bote de Escombros	2 días	21/11/23	23/11/23
66	**1.1.1.6.1.3**	**Hormigón Armado**	**48 días**	**20/9/23**	**18/11/23**
67	1.1.1.6.1.3.1	Zapatas	10 días	20/9/23	2/10/23
68	1.1.1.6.1.3.2	Losa de Fondo	10 días	17/10/23	30/10/23
69	1.1.1.6.1.3.3	Muros	12 días	2/10/23	17/10/23

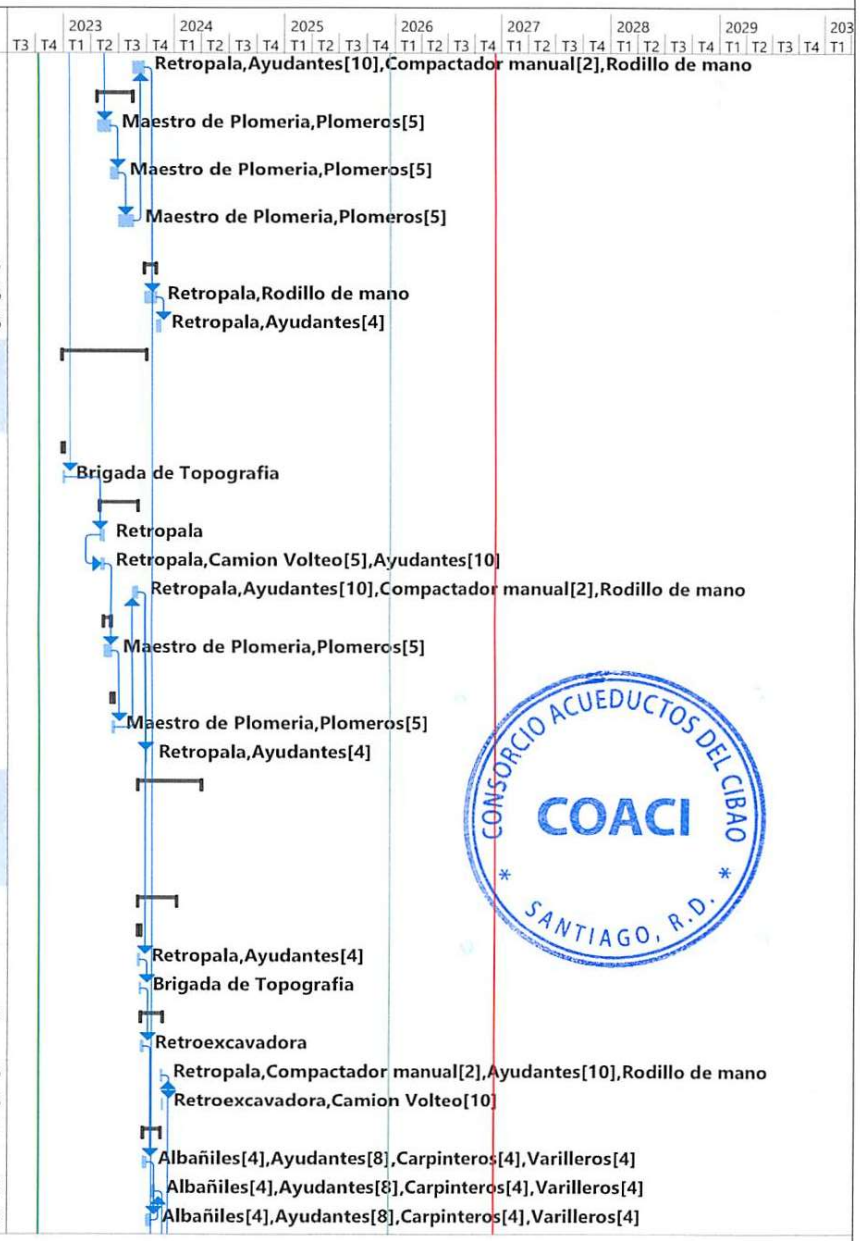

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
70	1.1.1.6.1.3.4	Columnas	6 días	30/10/23	6/11/23
71	1.1.1.6.1.3.5	Vigas y Losas	10 días	6/11/23	18/11/23
72	**1.1.1.6.1.4**	**Terminacion de Superficie**	**34 días**	**27/11/23**	**9/1/24**
73	1.1.1.6.1.4.1	Fino Losa de fondo	5 días	27/11/23	4/12/23
74	1.1.1.6.1.4.2	Pañete interior	7 días	4/12/23	12/12/23
75	1.1.1.6.1.4.3	Fino de techo	4 días	3/1/24	9/1/24
76	**1.1.1.6.2**	**CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTERNA**	**40 días**	**12/12/23**	**31/1/24**
77	1.1.1.6.2.1	Hormigón Armado	10 días	22/12/23	3/1/24
78	1.1.1.6.2.2	Muro de Blocks	8 días	12/12/23	21/12/23
79	1.1.1.6.2.3	Acera	4 días	18/1/24	23/1/24
80	1.1.1.6.2.4	Terminación de Superficie	8 días	9/1/24	18/1/24
81	1.1.1.6.2.5	Verja de Malla Ciclónica	6 días	18/1/24	25/1/24
82	1.1.1.6.2.6	Portaje	2 días	25/1/24	29/1/24
83	1.1.1.6.2.7	Limpieza	2 días	29/1/24	31/1/24
84	1.1.1.6.3	ELECTRIFICACIÓN ESTACION DE BOMB	10 días	31/1/24	12/2/24
85	**1.1.1.6.4**	**GARITA DE VIGILANTE**	**39 días**	**13/2/24**	**1/4/24**
86	1.1.1.6.4.1	Replanteo	1 día	13/2/24	13/2/24
87	1.1.1.6.4.2	Movimiento de Tierra	1 día	14/2/24	14/2/24
88	**1.1.1.6.4.3**	**Hormigón Armado**	**14 días**	**15/2/24**	**4/3/24**
89	1.1.1.6.4.3.1	Zapata de muro	3 días	15/2/24	19/2/24
90	1.1.1.6.4.3.2	Viga de amarre BNP	2 días	20/2/24	22/2/24
91	1.1.1.6.4.3.3	Dintel	2 días	26/2/24	28/2/24
92	1.1.1.6.4.3.4	Columnas	2 días	23/2/24	26/2/24
93	1.1.1.6.4.3.5	Losa y Viga de techo	3 días	28/2/24	4/3/24
94	**1.1.1.6.4.4**	**Muro de Bloques**	**4 días**	**19/2/24**	**23/2/24**
95	1.1.1.6.4.4.1	Muros BNP	1 día	19/2/24	20/2/24
96	1.1.1.6.4.4.2	Muros SNP	1 día	22/2/24	23/2/24
97	**1.1.1.6.4.5**	**Terminación de Superficie**	**17 días**	**4/3/24**	**25/3/24**
98	1.1.1.6.4.5.1	Fraguache	1 día	8/3/24	9/3/24
99	1.1.1.6.4.5.2	Pañete interior	1 día	11/3/24	12/3/24
100	1.1.1.6.4.5.3	Pañete exterior	1 día	9/3/24	11/3/24
101	1.1.1.6.4.5.4	Fino de techo	2 días	5/3/24	7/3/24
102	1.1.1.6.4.5.5	Antepecho	1 día	4/3/24	5/3/24
103	1.1.1.6.4.5.6	Zabaleta en techo	1 día	7/3/24	8/3/24
104	1.1.1.6.4.5.7	Impermeabilizante	2 días	21/3/24	25/3/24
105	1.1.1.6.4.5.8	Cerámica en baño	2 días	14/3/24	16/3/24
106	1.1.1.6.4.5.9	Pintura	2 días	19/3/24	21/3/24
107	**1.1.1.6.4.6**	**Pisos**	**2 días**	**12/3/24**	**14/3/24**
108	1.1.1.6.4.6.1	Pisos de hormigón	2 días	12/3/24	14/3/24
109	**1.1.1.6.4.7**	**Acera**	**2 días**	**16/3/24**	**19/3/24**
110	1.1.1.6.4.7.1	Acera perimetral	2 días	16/3/24	19/3/24

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
111	**1.1.1.6.4.8**	**Puertas y Ventanas**	**2 días**	**21/3/24**	**25/3/24**
112	1.1.1.6.4.8.1	Suministro e instalación de puertas, ventanas y protectores	2 días	21/3/24	25/3/24
113	**1.1.1.6.4.9**	**Instalaciones Sanitarias**	**10 días**	**19/3/24**	**1/4/24**
114	1.1.1.6.4.9.1	Instalación de aparatos sanitarios	1 día	21/3/24	22/3/24
115	1.1.1.6.4.9.2	Cámaras de inspección	3 días	19/3/24	22/3/24
116	1.1.1.6.4.9.3	Séptico	5 días	22/3/24	29/3/24
117	1.1.1.6.4.9.4	Pozo filtrante	2 días	29/3/24	1/4/24
118	**1.1.1.6.4.10**	**Instalaciones Eléctricas**	**8 días**	**4/3/24**	**13/3/24**
119	1.1.1.6.4.10.1	Salidas Electricas	2 días	4/3/24	6/3/24
120	1.1.1.6.4.10.2	Instalación Panel	1 día	12/3/24	13/3/24
121	1.1.1.6.4.11	Limpieza	2 días	21/3/24	25/3/24
122	**1.1.1.7**	**E - LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO SCH 40 DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO No. 2 (EN LA ATRAVESADA) HASTA DEPÓSITO DE 150 M3 (DE CAÑADA BONITA ABAJO) Y DERIVACIÓN Ø6" ACERO SCH 40 HASTA DEPÓSITO REGULADOR DE 65 M3 DEL**	**143 días**	**23/9/23**	**20/3/24**
123	**1.1.1.7.1**	**Preliminares**	**4 días**	**23/9/23**	**28/9/23**
124	1.1.1.7.1.1	Replanteo y marcado de corte	4 días	23/9/23	28/9/23
125	**1.1.1.7.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**40 días**	**28/9/23**	**17/11/23**
126	1.1.1.7.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	20 días	28/9/23	24/10/23
127	1.1.1.7.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	10 días	24/10/23	4/11/23
128	1.1.1.7.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	10 días	6/11/23	17/11/23
129	**1.1.1.7.3**	**Movimiento de tierra**	**82 días**	**17/11/23**	**27/2/24**
130	1.1.1.7.3.1	Excavación material compacto	30 días	17/11/23	25/12/23
131	1.1.1.7.3.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	30 días	18/11/23	26/12/23
132	1.1.1.7.3.3	Relleno compactado	10 días	15/2/24	27/2/24
133	**1.1.1.7.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**70 días**	**20/11/23**	**15/2/24**
134	1.1.1.7.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø8" Acero SCH-40 y accesorios	50 días	20/11/23	22/1/24
135	1.1.1.7.4.2	Suministro y colocación de tuberías Ø6" Acero SCH-40 y accesorios	20 días	22/1/24	15/2/24
136	**1.1.1.7.5**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**10 días**	**28/2/24**	**11/3/24**
137	1.1.1.7.5.1	Imprimación y colocación de asfalto	10 días	28/2/24	11/3/24
138	1.1.1.7.6	Limpieza Continua y Final	7 días	11/3/24	20/3/24
139	**1.1.1.8**	**F - DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE 65 M³ EN HORMIGÓN ARMADO PARA ABASTECIMIENTO COMUNIDAD EL GUANÁBANO**	**63 días**	**28/2/24**	**16/5/24**
140	**1.1.1.8.1**	**Preliminares**	**4 días**	**28/2/24**	**4/3/24**
141	1.1.1.8.1.1	Limpieza del área	2 días	28/2/24	29/2/24
142	1.1.1.8.1.2	Replanteo	2 días	1/3/24	4/3/24
143	**1.1.1.8.2**	**Movimiento de tierra**	**40 días**	**4/3/24**	**22/4/24**

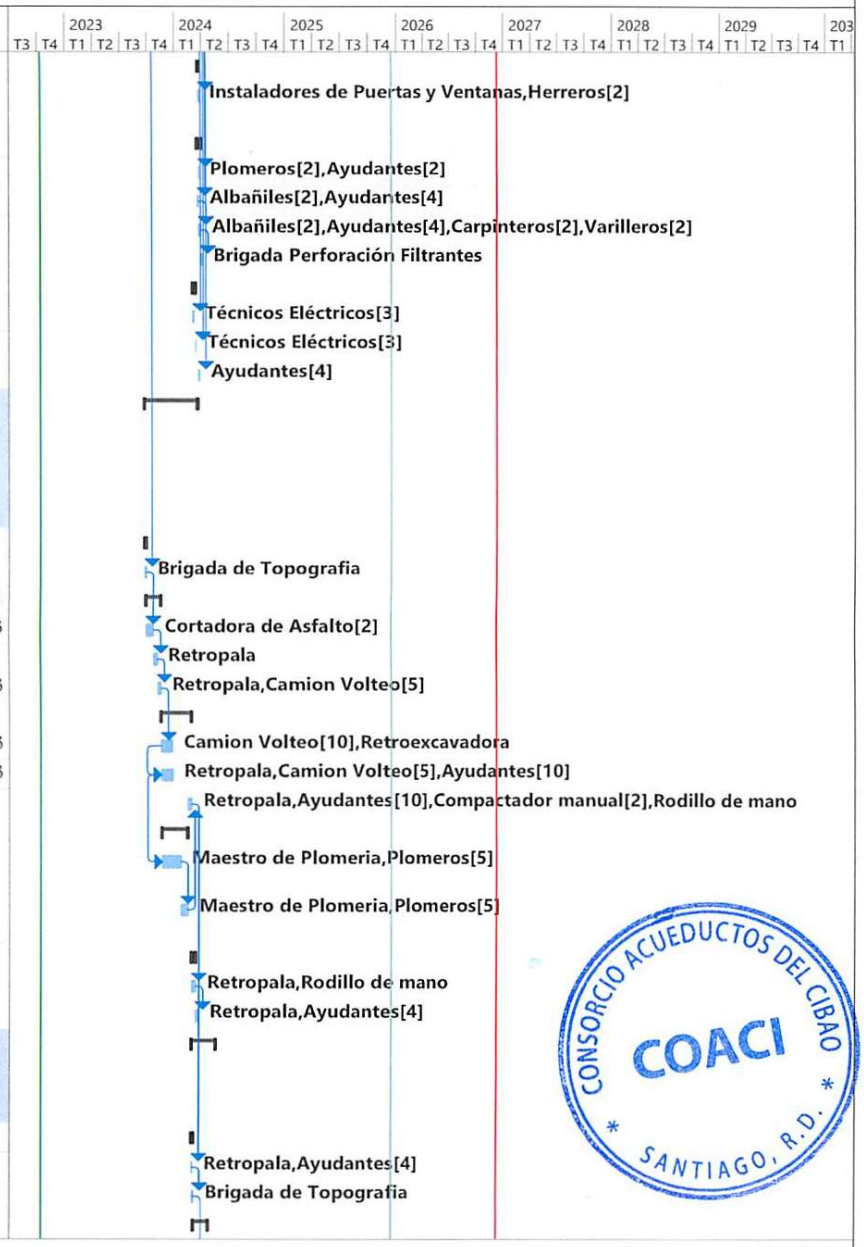

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
144	1.1.1.8.2.1	Excavación material compacto	2 días	4/3/24	6/3/24
145	1.1.1.8.2.2	Relleno Compactado	4 días	12/4/24	17/4/24
146	1.1.1.8.2.3	Bote de Escombros	4 días	17/4/24	22/4/24
147	**1.1.1.8.3**	**Hormigón Armado**	**30 días**	**6/3/24**	**12/4/24**
148	1.1.1.8.3.1	Zapatas	6 días	6/3/24	13/3/24
149	1.1.1.8.3.2	Losa de Fondo	6 días	21/3/24	28/3/24
150	1.1.1.8.3.3	Muros	6 días	13/3/24	21/3/24
151	1.1.1.8.3.4	Columnas	6 días	28/3/24	4/4/24
152	1.1.1.8.3.5	Vigas y Losas	6 días	4/4/24	12/4/24
153	**1.1.1.8.4**	**Terminacion de Superficie**	**18 días**	**22/4/24**	**14/5/24**
154	1.1.1.8.4.1	Fino Losa de fondo	4 días	22/4/24	25/4/24
155	1.1.1.8.4.2	Pañete interior	6 días	26/4/24	3/5/24
156	1.1.1.8.4.3	Fino de techo	4 días	3/5/24	8/5/24
157	1.1.1.8.4.4	Pintura	4 días	8/5/24	14/5/24
158	1.1.1.8.5	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrada, Salida, Rebose y Desague	10 días	21/3/24	2/4/24
159	1.1.1.8.6	Acera perimetral	2 días	2/4/24	4/4/24
160	**1.1.1.8.7**	**Verja en Bloques de 6"**	**33 días**	**4/4/24**	**16/5/24**
161	1.1.1.8.7.1	Replanteo	1 día	4/4/24	5/4/24
162	**1.1.1.8.7.2**	**Movimiento de tierra**	**27 días**	**5/4/24**	**9/5/24**
163	1.1.1.8.7.2.1	Excavación material compacto	5 días	5/4/24	12/4/24
164	1.1.1.8.7.2.2	Relleno de reposición	2 días	4/5/24	7/5/24
165	1.1.1.8.7.2.3	Bote de material	2 días	7/5/24	9/5/24
166	**1.1.1.8.7.3**	**Hormigón Armado**	**18 días**	**12/4/24**	**4/5/24**
167	1.1.1.8.7.3.1	Zapatas	5 días	12/4/24	18/4/24
168	1.1.1.8.7.3.2	Viga de Amarre SNP	5 días	29/4/24	4/5/24
169	**1.1.1.8.7.4**	**Muros**	**8 días**	**18/4/24**	**29/4/24**
170	1.1.1.8.7.4.1	Blocks 8" BNP	3 días	18/4/24	22/4/24
171	1.1.1.8.7.4.2	Blocks 6" SNP	5 días	23/4/24	29/4/24
172	**1.1.1.8.7.5**	**Terminación de Superficie**	**5 días**	**4/5/24**	**10/5/24**
173	1.1.1.8.7.5.1	Fraguache	2 días	4/5/24	7/5/24
174	1.1.1.8.7.5.2	Pañete en vigas y columnas	3 días	7/5/24	10/5/24
175	1.1.1.8.7.6	Pintura	4 días	10/5/24	16/5/24
176	**1.1.1.9**	**G - RED DE DISTRIBUCIÓN DE GUANÁBANO ABAJO**	**76 días**	**17/4/24**	**20/7/24**
177	**1.1.1.9.1**	**Preliminares**	**4 días**	**17/4/24**	**22/4/24**
178	1.1.1.9.1.1	Replanteo y marcado de corte	4 días	17/4/24	22/4/24
179	**1.1.1.9.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**13 días**	**23/4/24**	**8/5/24**
180	1.1.1.9.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	6 días	23/4/24	30/4/24
181	1.1.1.9.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	5 días	30/4/24	6/5/24
182	1.1.1.9.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	2 días	6/5/24	8/5/24
183	**1.1.1.9.3**	**Movimiento de tierra**	**52 días**	**8/5/24**	**12/7/24**

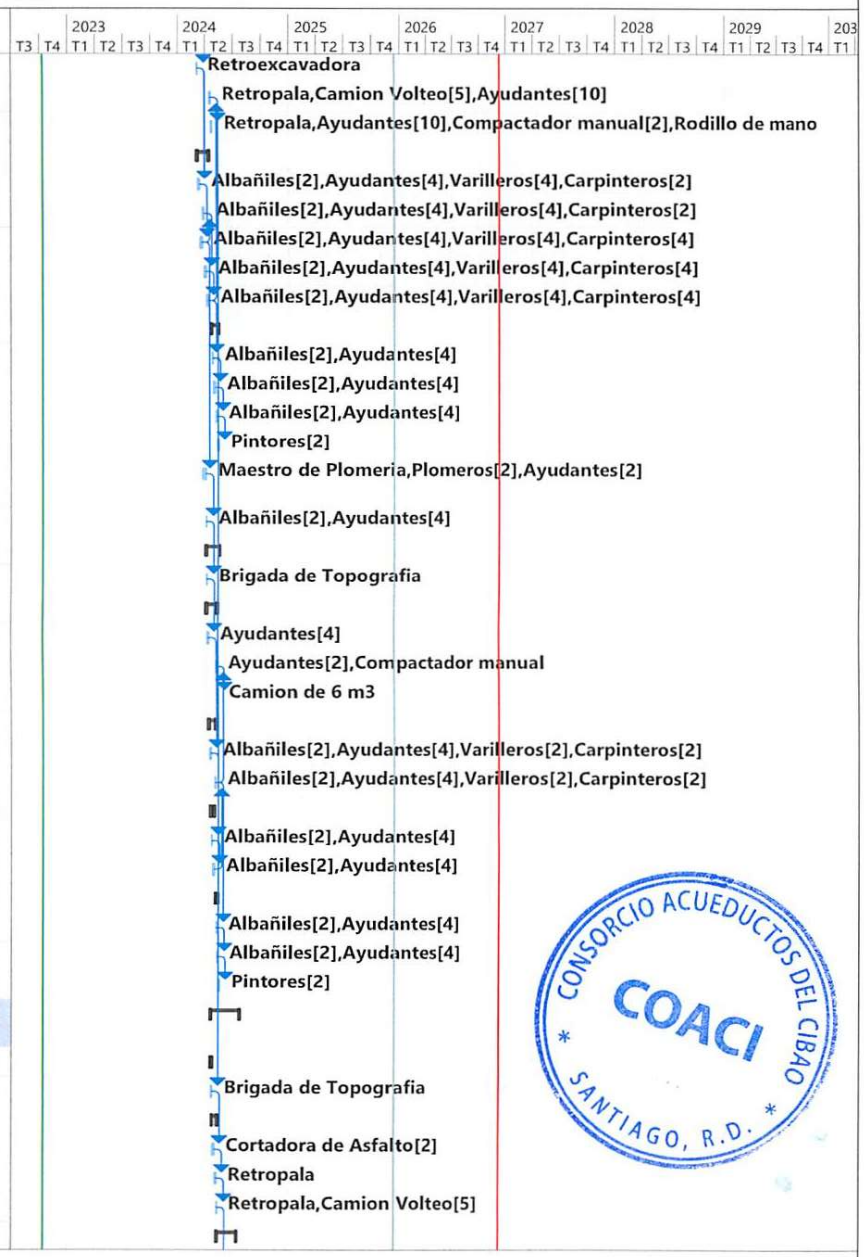

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
184	1.1.1.9.3.1	Excavación material compacto	20 días	8/5/24	3/6/24
185	1.1.1.9.3.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	20 días	9/5/24	4/6/24
186	1.1.1.9.3.3	Relleno compactado	14 días	25/6/24	12/7/24
187	**1.1.1.9.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**36 días**	**10/5/24**	**25/6/24**
188	1.1.1.9.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PVC SDR-26 y accesorios	16 días	10/5/24	30/5/24
189	1.1.1.9.4.2	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PVC SDR-26 y accesorios	20 días	30/5/24	25/6/24
190	**1.1.1.9.5**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**5 días**	**12/7/24**	**18/7/24**
191	1.1.1.9.5.1	Imprimación y colocación de asfalto	5 días	12/7/24	18/7/24
192	1.1.1.9.6	Limpieza Continua y Final	2 días	18/7/24	20/7/24
193	**1.1.1.10**	**H - DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL DE 150 M³ (CAÑADA BONITA ABAJO)**	**62 días**	**12/7/24**	**27/9/24**
194	**1.1.1.10.1**	**Preliminares**	**4 días**	**12/7/24**	**17/7/24**
195	1.1.1.10.1.1	Limpieza del área	2 días	12/7/24	15/7/24
196	1.1.1.10.1.2	Replanteo	2 días	15/7/24	17/7/24
197	**1.1.1.10.2**	**Movimiento de tierra**	**36 días**	**17/7/24**	**30/8/24**
198	1.1.1.10.2.1	Excavación material compacto	1 día	17/7/24	18/7/24
199	1.1.1.10.2.2	Relleno Compactado	2 días	26/8/24	28/8/24
200	1.1.1.10.2.3	Bote de Escombros	2 días	28/8/24	30/8/24
201	**1.1.1.10.3**	**Hormigón Armado**	**31 días**	**18/7/24**	**26/8/24**
202	1.1.1.10.3.1	Zapatas	6 días	18/7/24	25/7/24
203	1.1.1.10.3.2	Losa de Fondo	6 días	3/8/24	10/8/24
204	1.1.1.10.3.3	Muros	7 días	25/7/24	3/8/24
205	1.1.1.10.3.4	Columnas	6 días	12/8/24	19/8/24
206	1.1.1.10.3.5	Vigas y Losas	6 días	19/8/24	26/8/24
207	**1.1.1.10.4**	**Terminacion de Superficie**	**18 días**	**4/9/24**	**26/9/24**
208	1.1.1.10.4.1	Fino Losa de fondo	4 días	4/9/24	9/9/24
209	1.1.1.10.4.2	Pañete interior	6 días	9/9/24	16/9/24
210	1.1.1.10.4.3	Fino de techo	4 días	16/9/24	20/9/24
211	1.1.1.10.4.4	Pintura	4 días	20/9/24	26/9/24
212	1.1.1.10.5	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrada, Salida, Rebose y Desague	10 días	3/8/24	15/8/24
213	1.1.1.10.6	Acera perimetral	2 días	16/8/24	19/8/24
214	**1.1.1.10.7**	**Verja en Bloques de 6"**	**32 días**	**19/8/24**	**27/9/24**
215	1.1.1.10.7.1	Replanteo	1 día	19/8/24	20/8/24
216	**1.1.1.10.7.2**	**Movimiento de tierra**	**27 días**	**20/8/24**	**23/9/24**
217	1.1.1.10.7.2.1	Excavación material compacto	5 días	20/8/24	26/8/24
218	1.1.1.10.7.2.2	Relleno de reposición	2 días	17/9/24	19/9/24
219	1.1.1.10.7.2.3	Bote de material	2 días	19/9/24	23/9/24
220	**1.1.1.10.7.3**	**Hormigón Armado**	**18 días**	**26/8/24**	**17/9/24**
221	1.1.1.10.7.3.1	Zapatas	5 días	26/8/24	2/9/24

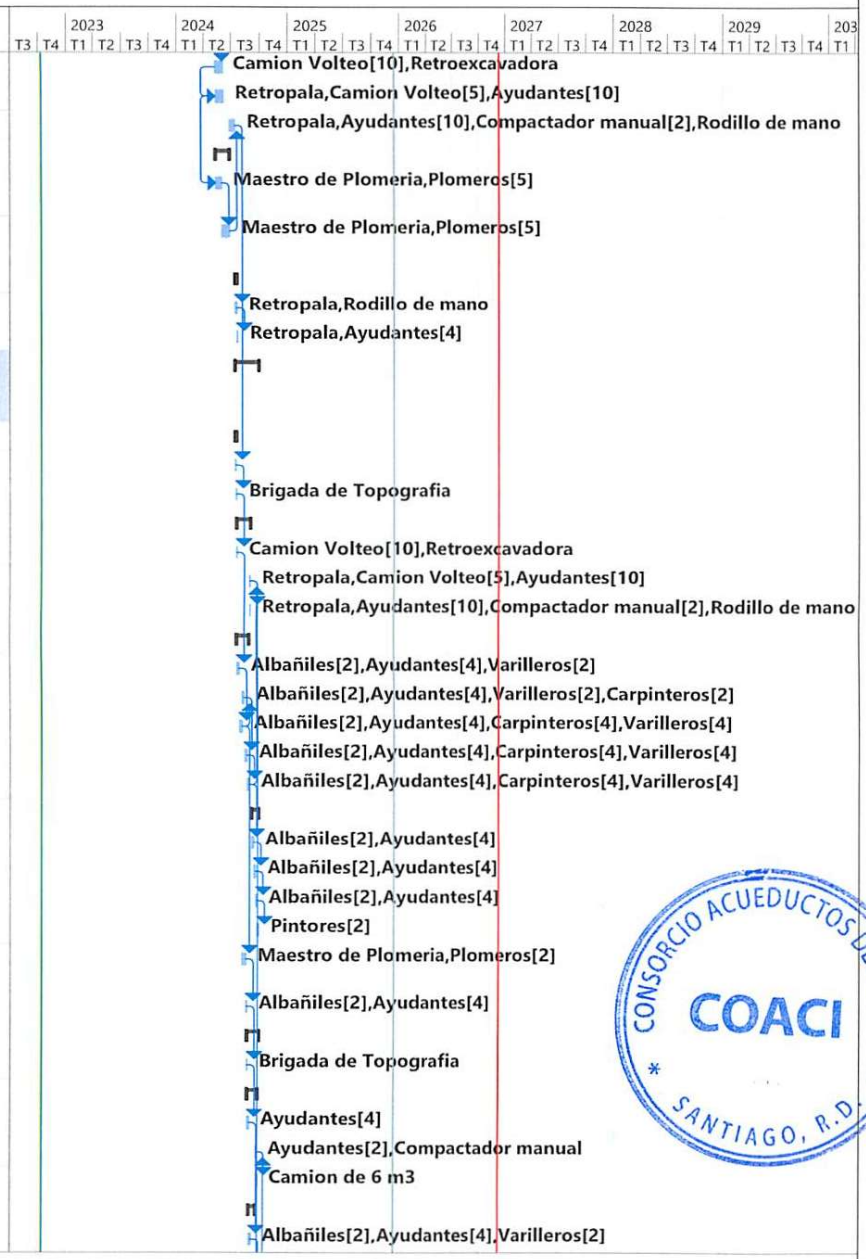

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
222	1.1.1.10.7.3.2	Viga de Amarre SNP	5 días	11/9/24	17/9/24
223	**1.1.1.10.7.4**	**Muros**	**8 días**	**2/9/24**	**11/9/24**
224	1.1.1.10.7.4.1	Blocks 8" BNP	3 días	2/9/24	5/9/24
225	1.1.1.10.7.4.2	Blocks 6" SNP	5 días	5/9/24	11/9/24
226	**1.1.1.10.7.5**	**Terminación de Superficie**	**5 días**	**17/9/24**	**24/9/24**
227	1.1.1.10.7.5.1	Fraguache	2 días	17/9/24	19/9/24
228	1.1.1.10.7.5.2	Pañete en vigas y columnas	3 días	19/9/24	24/9/24
229	1.1.1.10.7.6	Pintura	3 días	24/9/24	27/9/24
230	**1.1.1.11**	**I - RED DE DISTRIBUCIÓN DE CAÑADA BONITA ZONA BAJA**	**371 días**	**28/8/24**	**3/12/25**
231	**1.1.1.11.1**	**Preliminares**	**10 días**	**28/8/24**	**10/9/24**
232	1.1.1.11.1.1	Replanteo y marcado de corte	10 días	28/8/24	10/9/24
233	**1.1.1.11.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**80 días**	**10/9/24**	**18/12/24**
234	1.1.1.11.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	60 días	10/9/24	23/11/24
235	1.1.1.11.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	12 días	23/11/24	9/12/24
236	1.1.1.11.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	8 días	9/12/24	18/12/24
237	**1.1.1.11.3**	**Movimiento de tierra**	**255 días**	**9/12/24**	**22/10/25**
238	1.1.1.11.3.1	Excavación material compacto	80 días	9/12/24	18/3/25
239	1.1.1.11.3.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	80 días	10/12/24	19/3/25
240	1.1.1.11.3.3	Relleno compactado	60 días	8/8/25	22/10/25
241	**1.1.1.11.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**114 días**	**19/3/25**	**8/8/25**
242	1.1.1.11.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PVC (SDR-26) y accesorios	40 días	19/3/25	8/5/25
243	1.1.1.11.4.2	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PVC (SDR-26) y accesorios	24 días	8/5/25	6/6/25
244	1.1.1.11.4.3	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PVC (SDR-26) y accesorios	50 días	6/6/25	8/8/25
245	**1.1.1.11.5**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**24 días**	**22/10/25**	**20/11/25**
246	1.1.1.11.5.1	Imprimación y colocación de asfalto	24 días	22/10/25	20/11/25
247	1.1.1.11.6	Limpieza Continua y Final	10 días	20/11/25	3/12/25
248	**1.1.1.12**	**J - ESTACIÓN DE RELEVO EN DEPÓSITO 150 M3 (EQUIPAMIENTO DE BOOSTER EN CAÑADA BONITA)**	**52 días**	**22/10/25**	**25/12/25**
249	1.1.1.12.1	Electrificación Primaria y Secuntadia	40 días	22/10/25	10/12/25
250	1.1.1.12.2	Suministro e instalación de bombas y accesorios	12 días	10/12/25	25/12/25
251	**1.1.1.13**	**K - LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTACIÓN DE RELEVO EN DEPÓSITO 150 M3 DE CAÑADA BONITA ABAJO HASTA DEPÓSITO DE 100 M3 UBICADO EN COMUNIDAD LA SIERRA**	**150 días**	**22/10/25**	**27/4/26**
252	**1.1.1.13.1**	**Preliminares**	**4 días**	**22/10/25**	**27/10/25**
253	1.1.1.13.1.1	Replanteo y marcado de corte	4 días	22/10/25	27/10/25
254	**1.1.1.13.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**26 días**	**27/10/25**	**28/11/25**
255	1.1.1.13.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	12 días	27/10/25	11/11/25

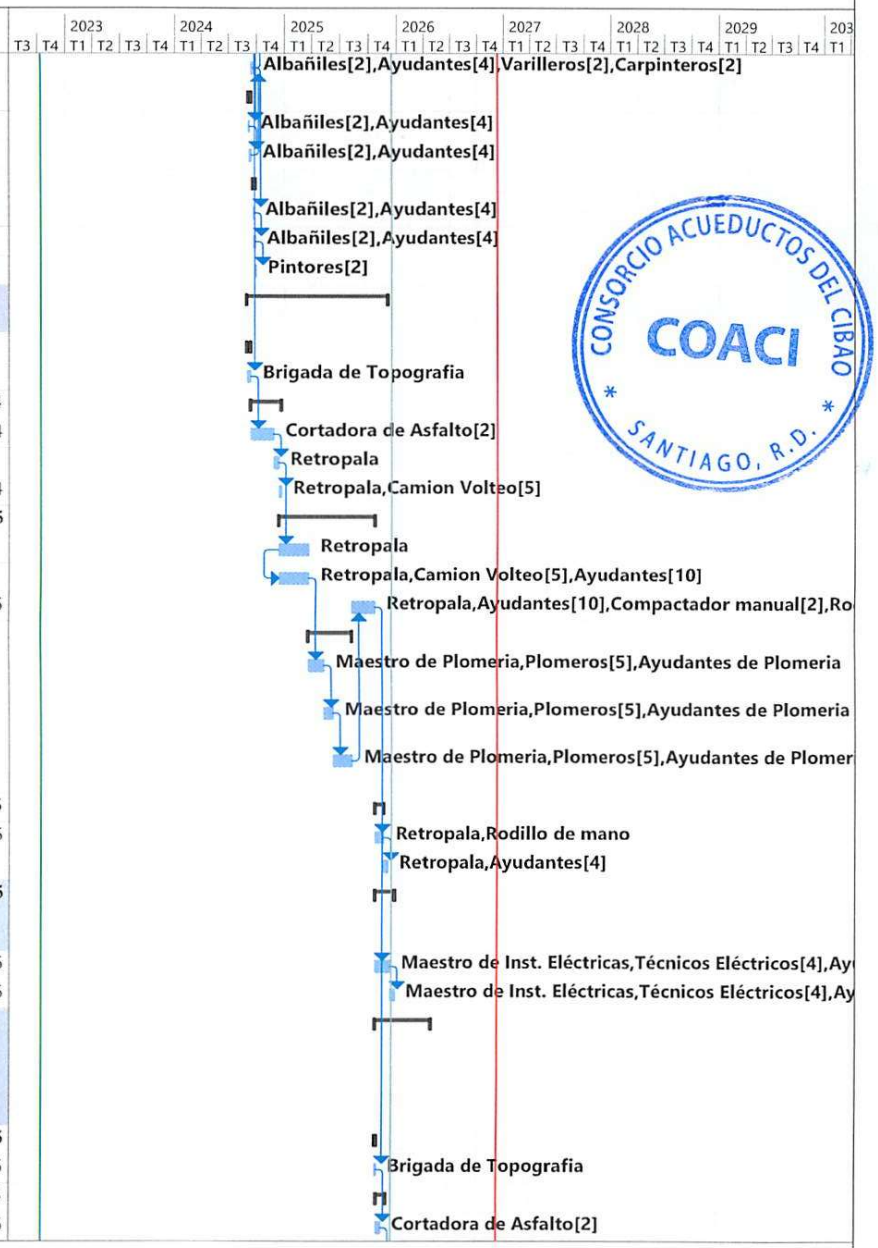

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO COACI SANTIAGO, R.D.

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
256	1.1.1.13.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	10 días	11/11/25	24/11/25
257	1.1.1.13.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	4 días	24/11/25	28/11/25
258	**1.1.1.13.3**	**Movimiento de tierra**	**102 días**	**28/11/25**	**3/4/26**
259	1.1.1.13.3.1	Excavación material compacto	50 días	28/11/25	29/1/26
260	1.1.1.13.3.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	50 días	29/11/25	30/1/26
261	1.1.1.13.3.3	Relleno compactado	30 días	26/2/26	3/4/26
262	**1.1.1.13.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**70 días**	**1/12/25**	**25/2/26**
263	1.1.1.13.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø6" Acero SCH-40 y accesorios	40 días	1/12/25	20/1/26
264	1.1.1.13.4.2	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PVC SDR-21 y accesorios	30 días	20/1/26	25/2/26
265	**1.1.1.13.5**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**10 días**	**3/4/26**	**16/4/26**
266	1.1.1.13.5.1	Imprimación y colocación de asfalto	10 días	3/4/26	16/4/26
267	1.1.1.13.6	Limpieza Continua y Final	8 días	16/4/26	27/4/26
268	**1.1.1.14**	**L - DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL DE 100 M³ PARA ABASTECER LAS COMUNIDADES CAÑADA BONITA ARRIBA, LA SIERRA Y EL TÚNEL**	**94 días**	**3/4/26**	**30/7/26**
269	**1.1.1.14.1**	**Preliminares**	**8 días**	**3/4/26**	**14/4/26**
270	1.1.1.14.1.1	Limpieza del área	4 días	3/4/26	9/4/26
271	1.1.1.14.1.2	Replanteo	4 días	9/4/26	14/4/26
272	**1.1.1.14.2**	**Movimiento de tierra**	**56 días**	**14/4/26**	**23/6/26**
273	1.1.1.14.2.1	Excavación material compacto	2 días	14/4/26	16/4/26
274	1.1.1.14.2.2	Relleno Compactado	4 días	12/6/26	17/6/26
275	1.1.1.14.2.3	Bote de Escombros	4 días	18/6/26	23/6/26
276	**1.1.1.14.3**	**Hormigón Armado**	**46 días**	**16/4/26**	**12/6/26**
277	1.1.1.14.3.1	Zapatas	8 días	16/4/26	27/4/26
278	1.1.1.14.3.2	Losa de Fondo	6 días	14/5/26	21/5/26
279	1.1.1.14.3.3	Muros	14 días	27/4/26	14/5/26
280	1.1.1.14.3.4	Columnas	8 días	21/5/26	1/6/26
281	1.1.1.14.3.5	Vigas y Losas	10 días	1/6/26	12/6/26
282	**1.1.1.14.4**	**Terminacion de Superficie**	**20 días**	**22/6/26**	**16/7/26**
283	1.1.1.14.4.1	Fino Losa de fondo	4 días	22/6/26	26/6/26
284	1.1.1.14.4.2	Pañete interior	8 días	26/6/26	7/7/26
285	1.1.1.14.4.3	Fino de techo	4 días	7/7/26	11/7/26
286	1.1.1.14.4.4	Pintura	4 días	11/7/26	16/7/26
287	1.1.1.14.5	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrada, Salida, Rebose y Desague	12 días	14/5/26	28/5/26
288	1.1.1.14.6	Acera perimetral	4 días	28/5/26	3/6/26
289	**1.1.1.14.7**	**Verja en Bloques de 6"**	**46 días**	**3/6/26**	**30/7/26**
290	1.1.1.14.7.1	Replanteo	2 días	3/6/26	5/6/26
291	**1.1.1.14.7.2**	**Movimiento de tierra**	**36 días**	**5/6/26**	**20/7/26**
292	1.1.1.14.7.2.1	Excavación material compacto	10 días	5/6/26	17/6/26

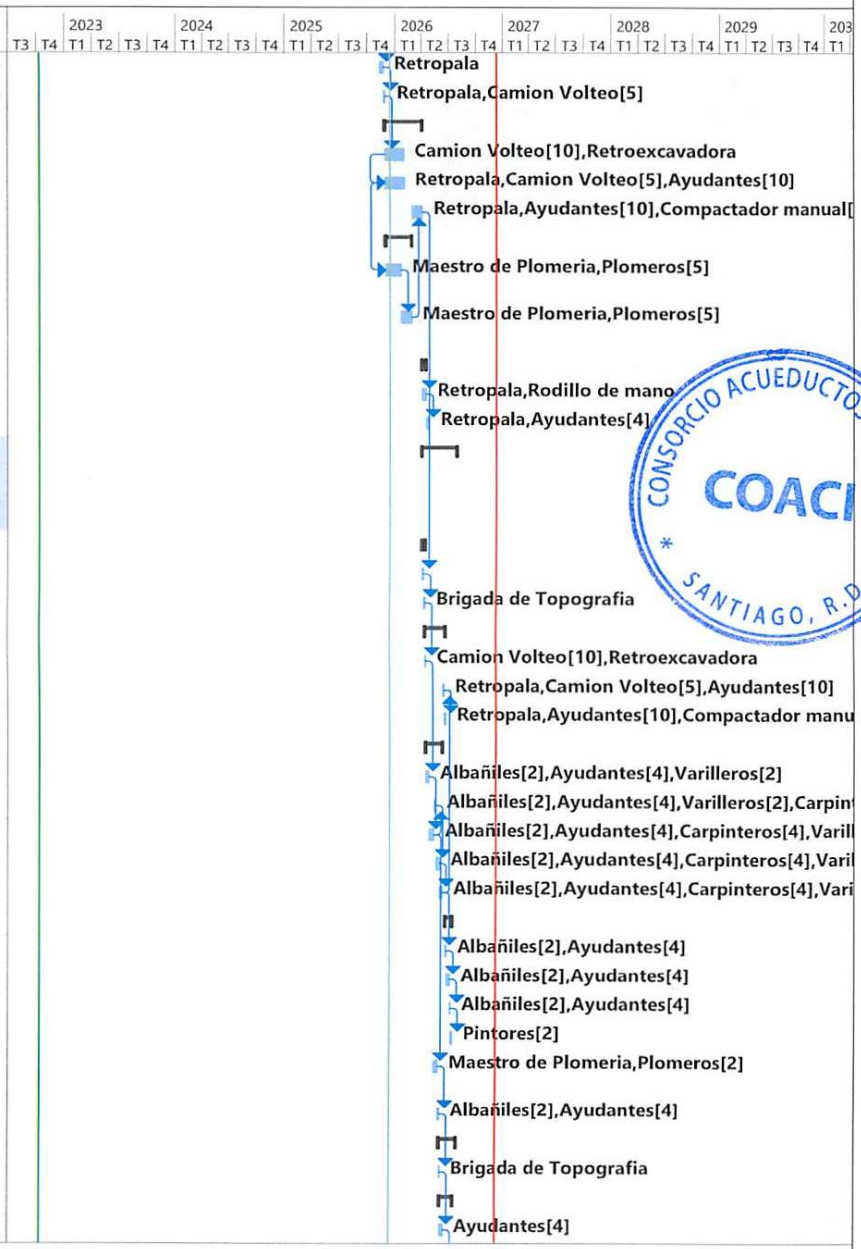

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO * SANTIAGO, R.D. * COACI

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
293	1.1.1.14.7.2.2	Relleno de reposición	2 días	15/7/26	17/7/26
294	1.1.1.14.7.2.3	Bote de material	2 días	17/7/26	20/7/26
295	**1.1.1.14.7.3**	**Hormigón Armado**	**22 días**	**18/6/26**	**15/7/26**
296	1.1.1.14.7.3.1	Zapatas	6 días	18/6/26	25/6/26
297	1.1.1.14.7.3.2	Viga de Amarre SNP	6 días	8/7/26	15/7/26
298	**1.1.1.14.7.4**	**Muros**	**10 días**	**25/6/26**	**8/7/26**
299	1.1.1.14.7.4.1	Blocks 8" BNP	2 días	25/6/26	27/6/26
300	1.1.1.14.7.4.2	Blocks 6" SNP	8 días	27/6/26	8/7/26
301	**1.1.1.14.7.5**	**Terminación de Superficie**	**8 días**	**15/7/26**	**24/7/26**
302	1.1.1.14.7.5.1	Fraguache	2 días	15/7/26	17/7/26
303	1.1.1.14.7.5.2	Pañete en vigas y columnas	6 días	17/7/26	24/7/26
304	1.1.1.14.7.6	Pintura	4 días	24/7/26	30/7/26
305	**1.1.1.15**	**M - RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA SIERRA - CAÑADA BONITA ZONA ALTA - TUNEL**	**119 días**	**17/7/26**	**12/12/26**
306	**1.1.1.15.1**	**Preliminares**	**6 días**	**17/7/26**	**24/7/26**
307	1.1.1.15.1.1	Replanteo y marcado de corte	6 días	17/7/26	24/7/26
308	**1.1.1.15.2**	**Corte y Extracción de Asfalto**	**36 días**	**24/7/26**	**8/9/26**
309	1.1.1.15.2.1	Corte de asfalto e=2" (ambos lados)	18 días	24/7/26	17/8/26
310	1.1.1.15.2.2	Extracción de asfalto c/equipo e=2"	14 días	17/8/26	3/9/26
311	1.1.1.15.2.3	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	4 días	3/9/26	8/9/26
312	**1.1.1.15.3**	**Movimiento de tierra**	**71 días**	**3/9/26**	**30/11/26**
313	1.1.1.15.3.1	Excavación material compacto	20 días	3/9/26	28/9/26
314	1.1.1.15.3.2	Suministro y coloc. Asiento de arena	20 días	4/9/26	29/9/26
315	1.1.1.15.3.3	Relleno compactado	10 días	18/11/26	30/11/26
316	**1.1.1.15.4**	**Suministro y colocación de tuberías**	**40 días**	**29/9/26**	**18/11/26**
317	1.1.1.15.4.1	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PVC (SDR-26) y accesorios	10 días	29/9/26	12/10/26
318	1.1.1.15.4.2	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PVC (SDR-26) y accesorios	14 días	12/10/26	29/10/26
319	1.1.1.15.4.3	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PVC (SDR-26) y accesorios	16 días	29/10/26	18/11/26
320	**1.1.1.15.5**	**Reposición de Carpeta Asfáltica**	**7 días**	**1/12/26**	**9/12/26**
321	1.1.1.15.5.1	Imprimación y colocación de asfalto	7 días	1/12/26	9/12/26
322	1.1.1.15.6	Limpieza Continua y Final	3 días	9/12/26	12/12/26

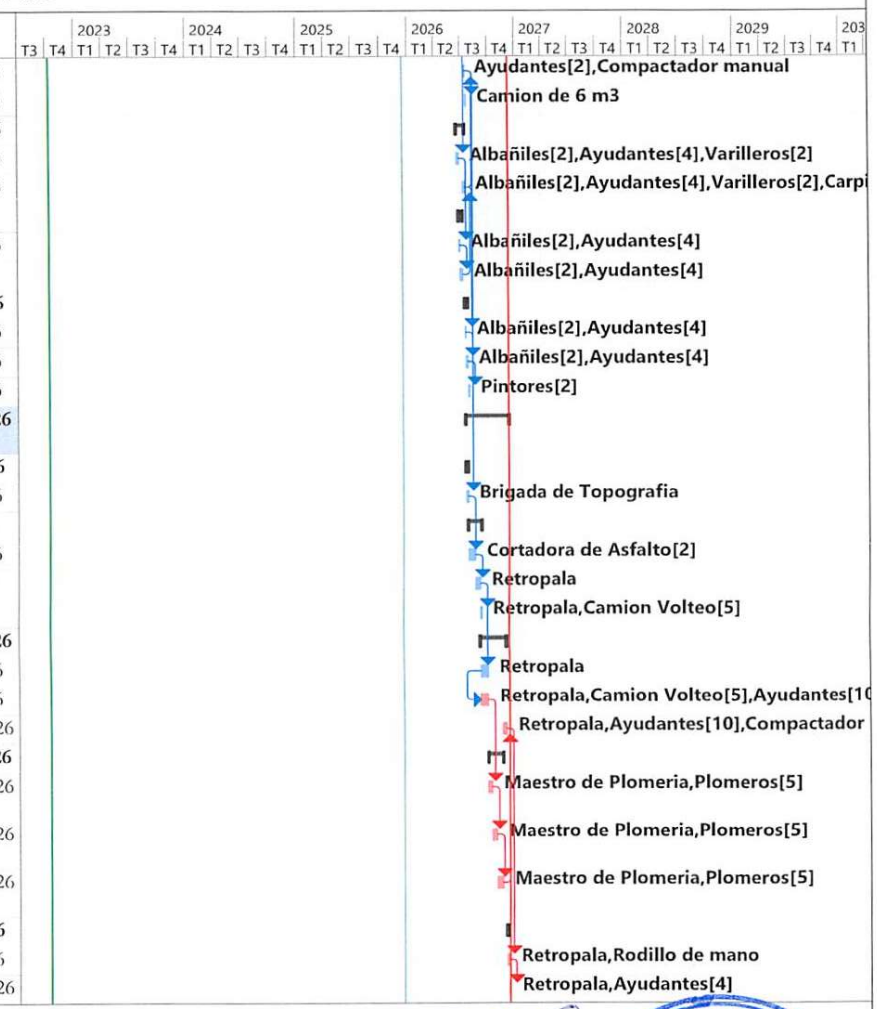

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO
COACI
SANTIAGO, R.D.
