


<p>Proyecto: Línea conducción 12</p> <p>Fecha: lun 5/10/20</p>	<p>Tarea: [Bar] Tarea inactiva</p> <p>División: [Dotted] Hito inactivo</p> <p>Hito: [Diamond] Resumen inactivo</p> <p>Resumen: [Bar] Tarea manual</p> <p>Resumen del proyecto: [Bar] solo duración</p>	<p>Informe de resumen manual: [Bar] Hito externo</p> <p>Resumen manual: [Bar] Fecha limite</p> <p>solo el comienzo: [Bar] Tareas criticas</p> <p>solo fin: [Bar] División critica</p> <p>Tareas externas: [Bar] Progreso</p>	<p>Progreso manual: [Bar]</p>
--	--	--	-------------------------------

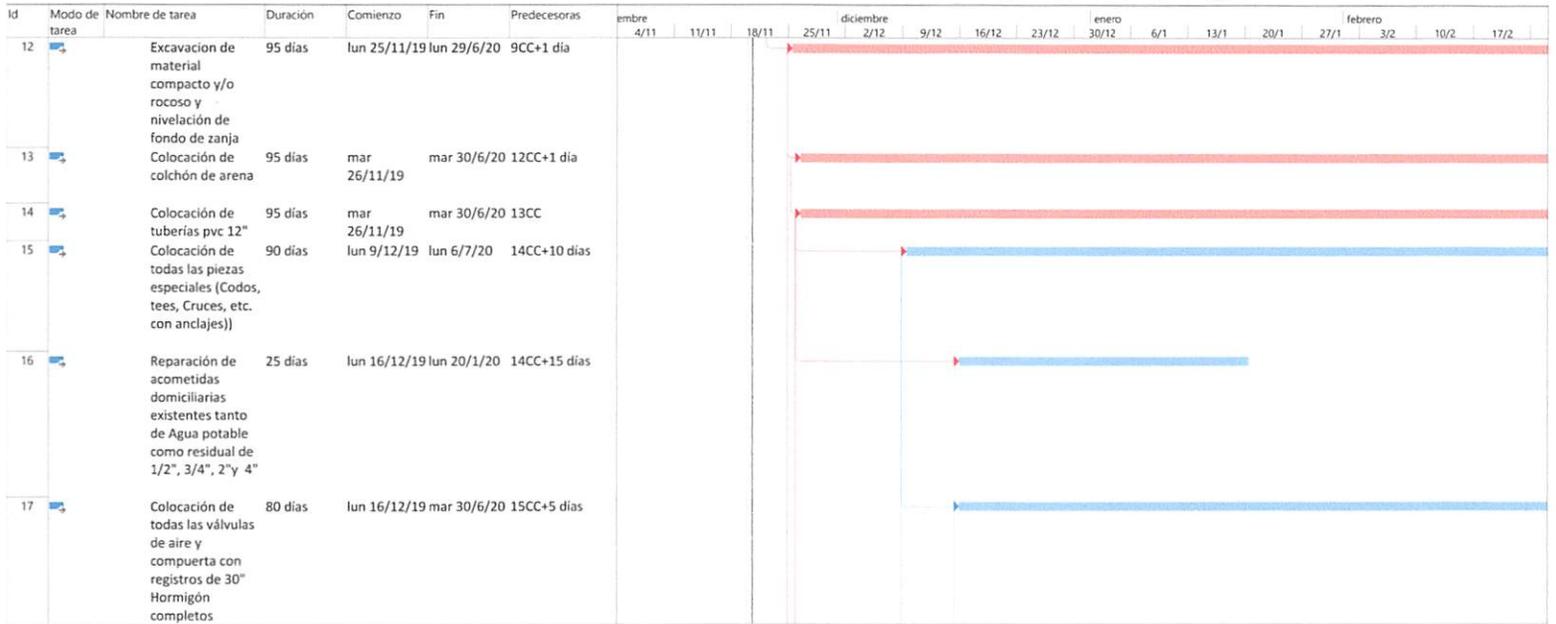

Proyecto: Línea conducción 12
 Fecha: lun 5/10/20


Tarea		Tarea inactiva		Tareas externas		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart											
							4/11	11/11	18/11	25/11	diciembre		enero		febrero			
48		Colocación de acometida (Escuela Juan Ramón Díaz); colocación completa de acometida incluidas todas las piezas de HG, tuberías P.E y aditamentos, mas las estructuras de sopoprtre de H.S y/o pedestales, llave de chorro de bronce, etc.	4 días	vie 20/12/19	jue 26/12/19	42	[Gantt bar for task 48 from 20/12 to 26/12]											
49		Cruces	135 días	vie 22/11/19	sáb 15/8/20		[Gantt bar for task 49 from 22/11 to 15/8/20]											
50		Contrucción completa de Cruce de puente en tubería de acero 4" (6 m) incluye anclajes de H.A, JD, protección anticorrosiva, etc.	10 días	vie 22/11/19	mié 4/12/19	34CC+2 días	[Gantt bar for task 50 from 22/11 to 4/12/19]											
51		Contrucción completa de Cruce de puente en tubería de acero 4" (32.40 m) incluye anclajes de H.A, JD, protección anticorrosiva, etc.	12 días	lun 25/11/19	mar 10/12/19	50CC+2 días	[Gantt bar for task 51 from 25/11 to 10/12/19]											


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea: [Barra azul] Tarea inactiva División: [Barra punteada] Hito inactivo Hito: [Barra con diamante] Resumen inactivo Resumen: [Barra con flecha] Tarea manual Resumen del proyecto: [Barra con flecha] solo duración	Informe de resumen manual: [Barra azul] Hito externo Resumen manual: [Barra con flecha] Fecha limite solo el comienzo: [Barra azul] Tareas criticas solo fin: [Barra azul] División critica Tareas externas: [Barra azul] Progreso	Progreso manual: [Barra azul]
---	---	--	-------------------------------




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

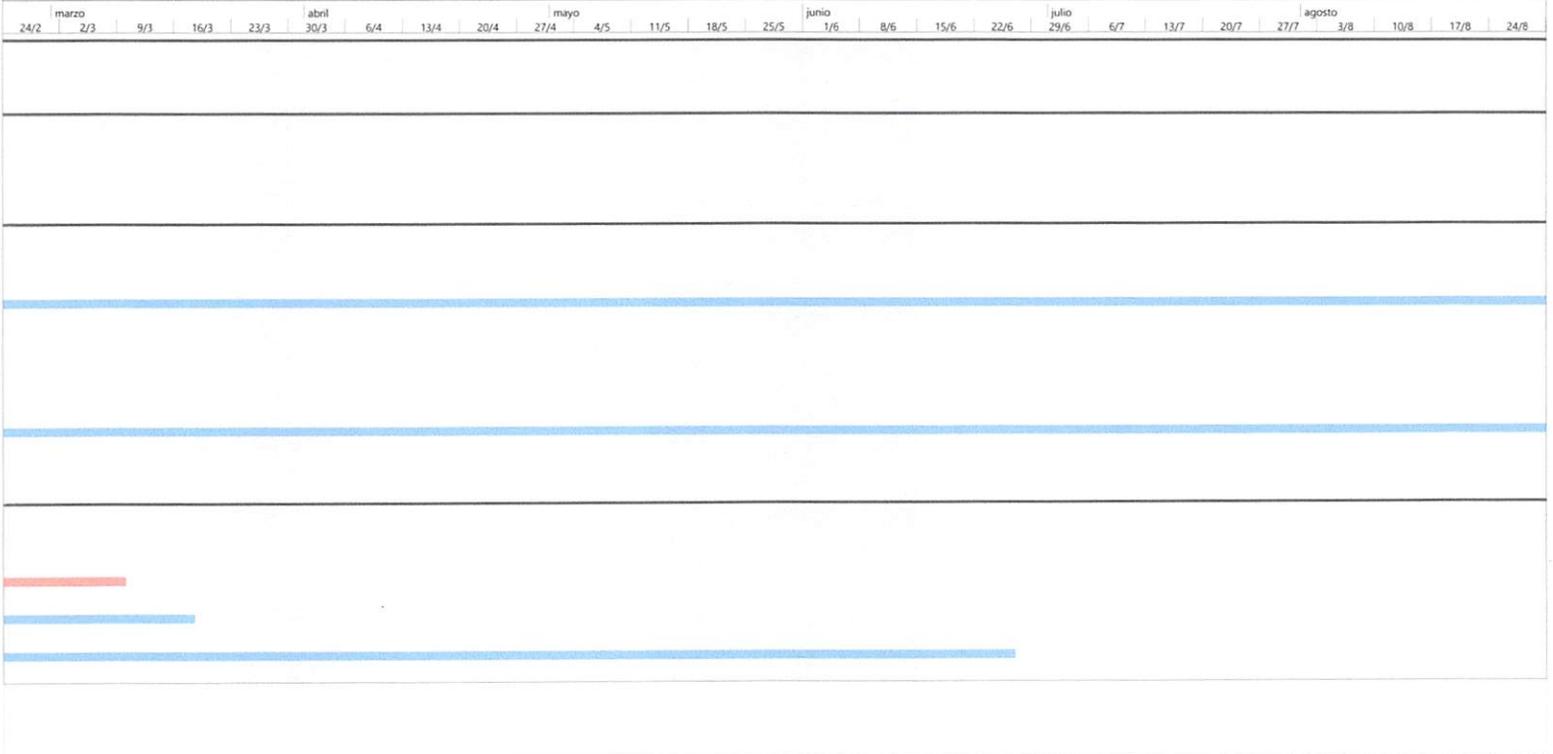

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

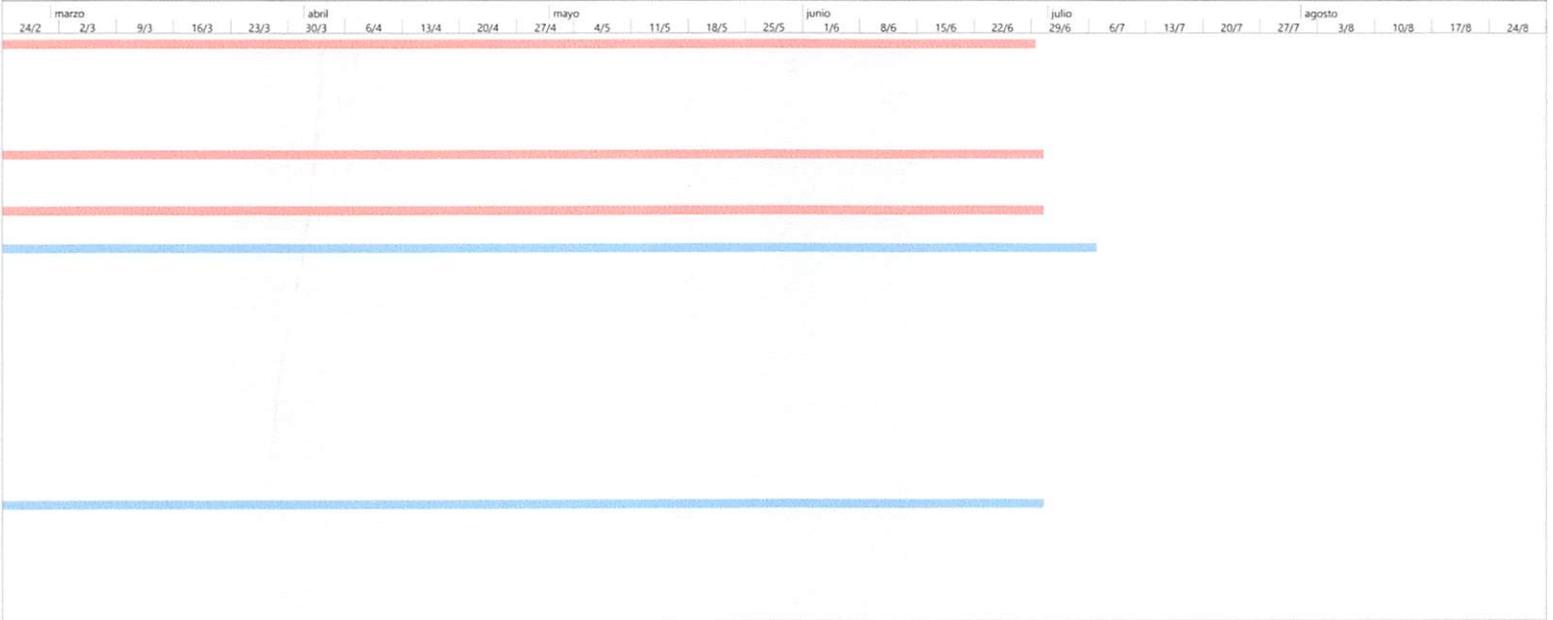


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

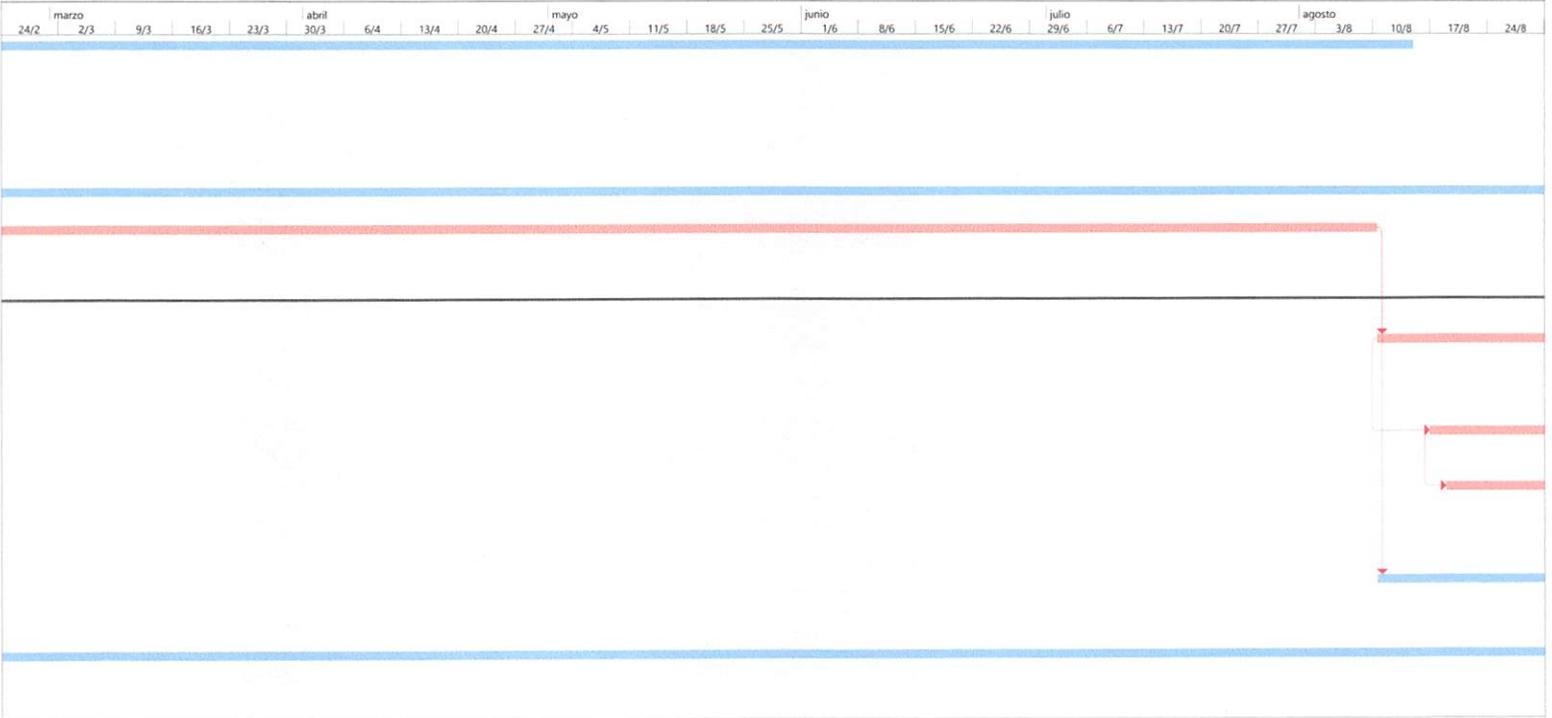


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

marzo 24/2 2/3 9/3 16/3 23/3 abril 30/3 6/4 13/4 20/4 mayo 27/4 4/5 11/5 18/5 25/5 junio 1/6 8/6 15/6 22/6 julio 29/6 6/7 13/7 20/7 27/7 agosto 3/8 10/8 17/8 24/8




Proyecto: Linea conduccion 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			

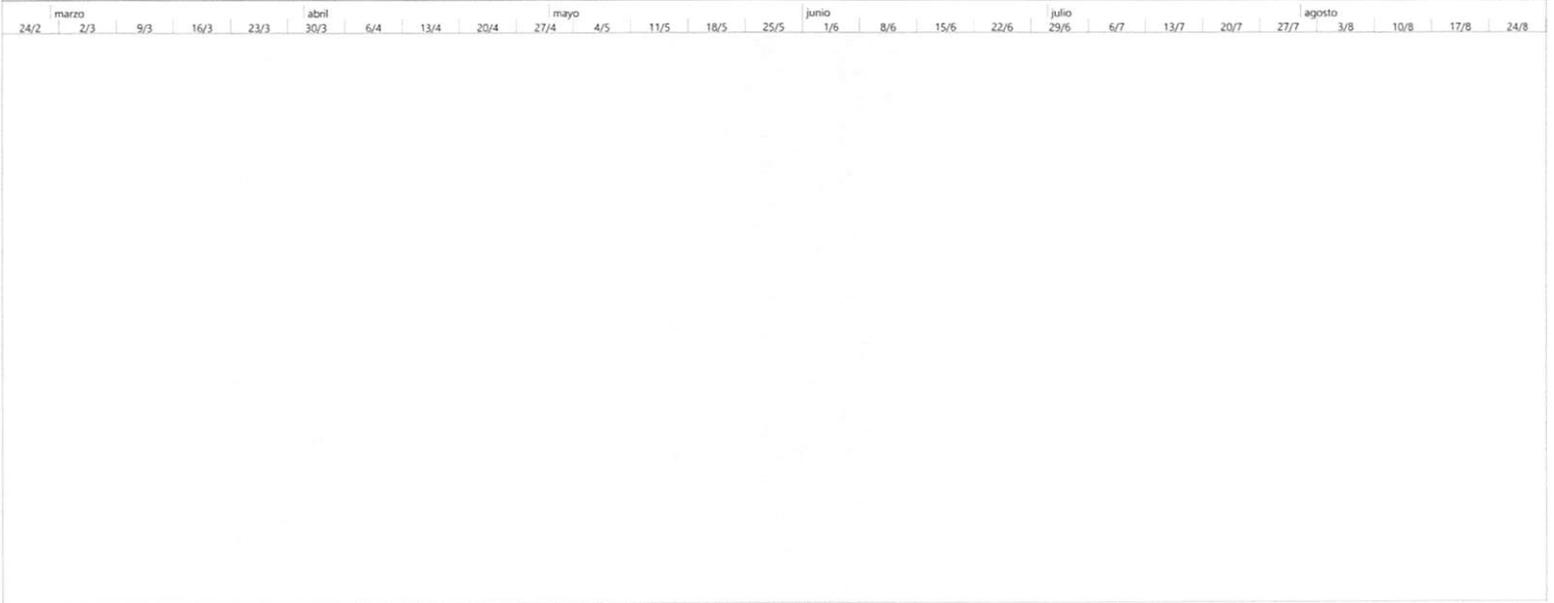


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

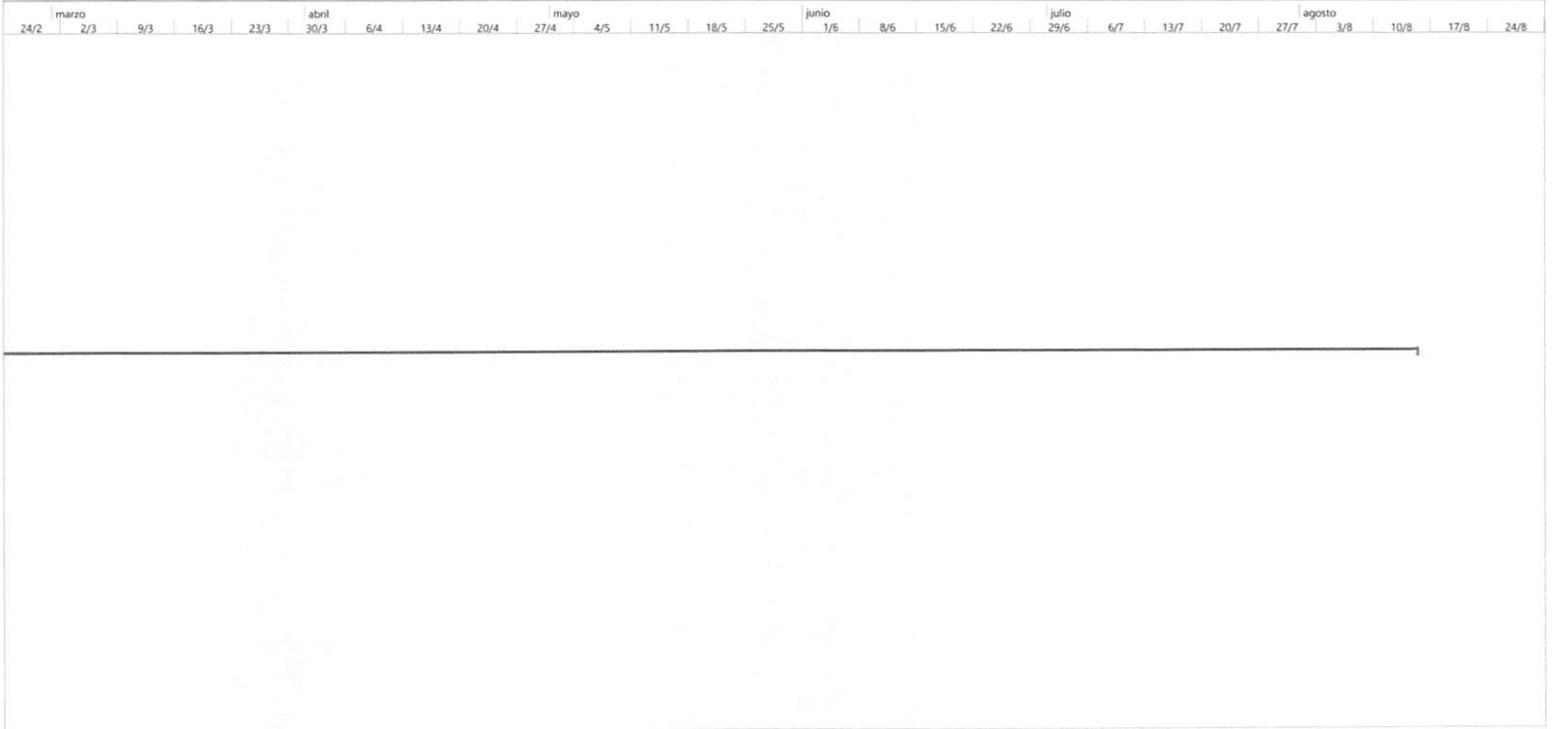


Proyecto: Linea conduccion 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			

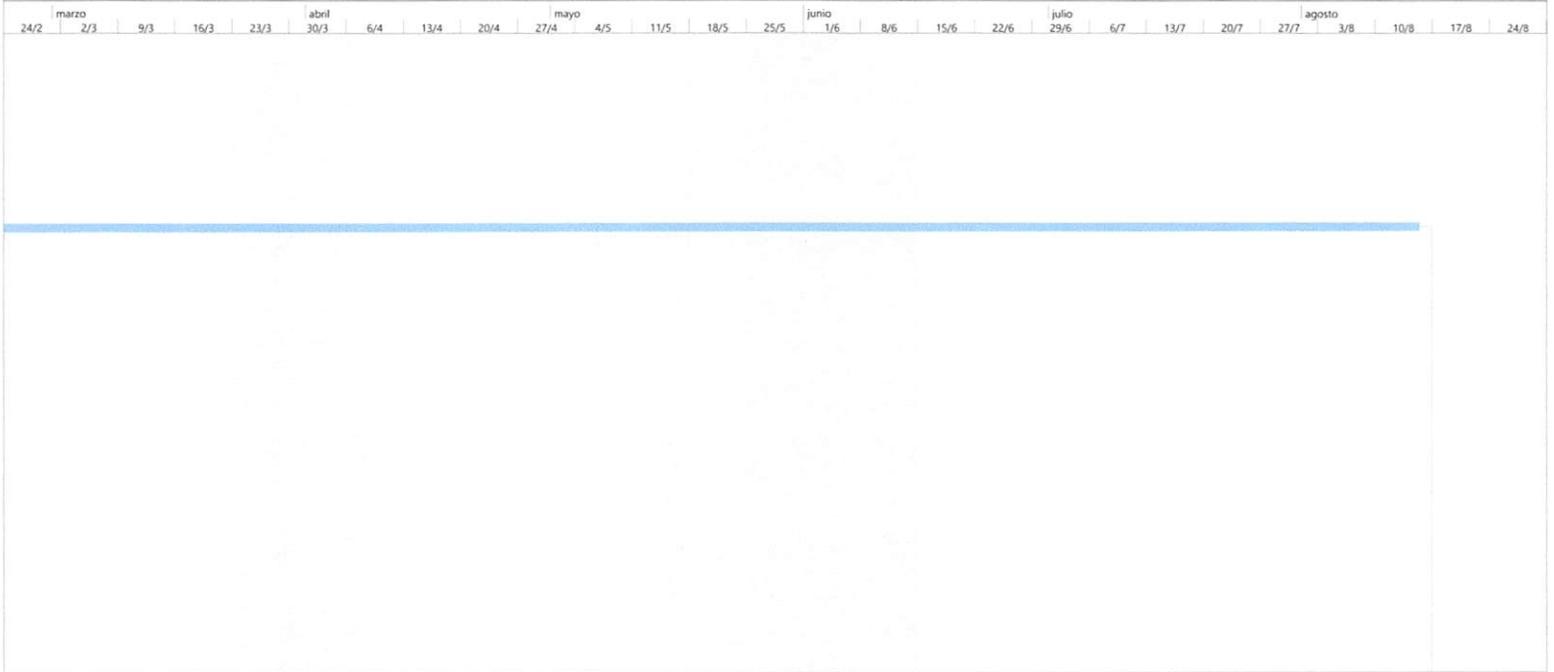

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual solo duración Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Progreso manual Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso
---	---	--

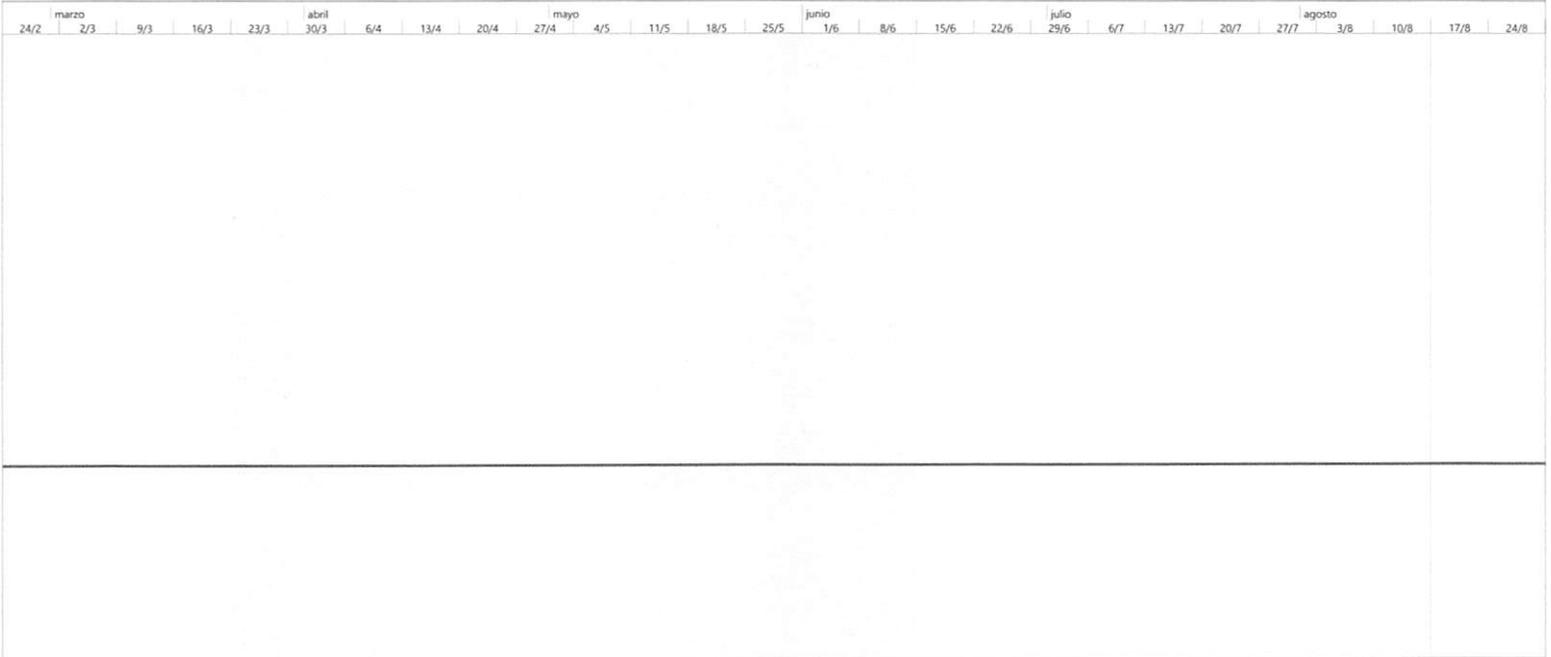


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

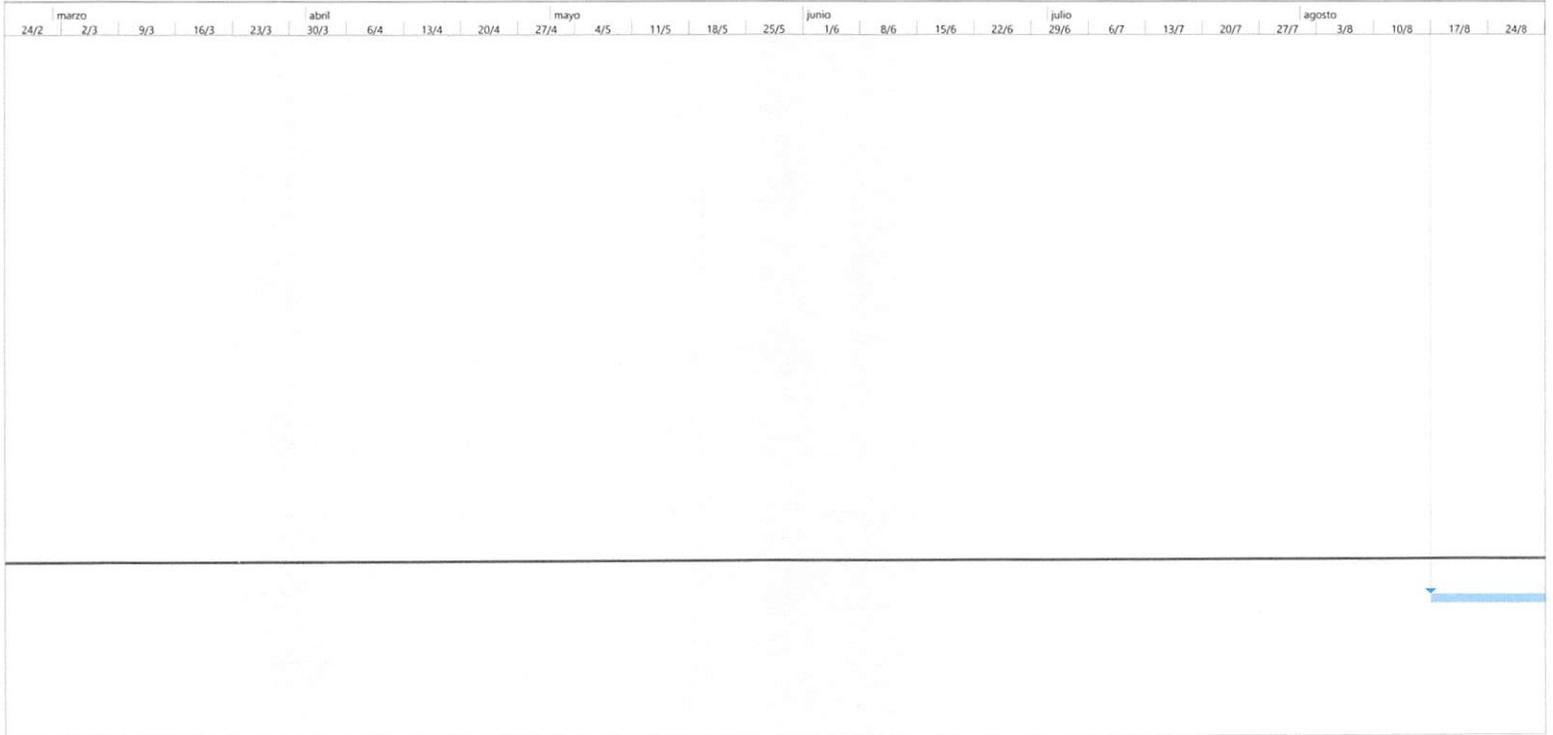

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

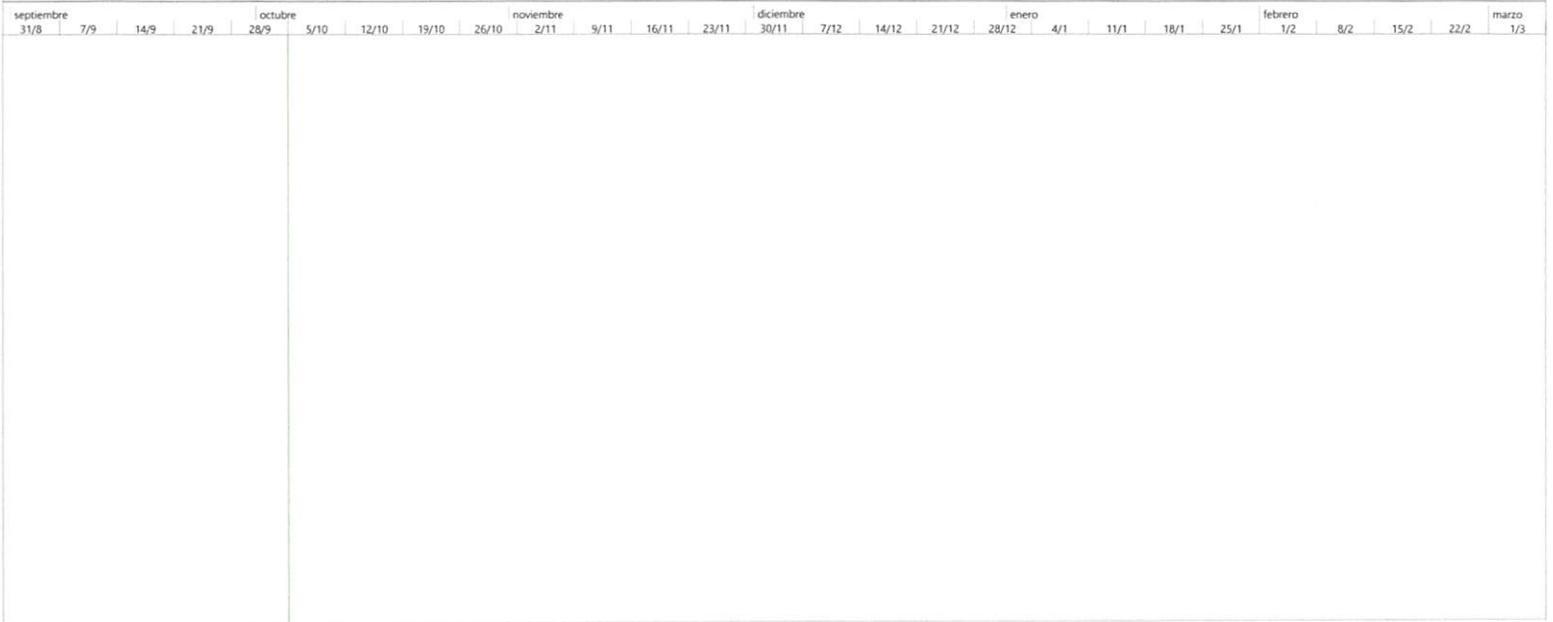


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------


septiembre				octubre				noviembre				diciembre				enero				febrero			marzo			
31/8	7/9	14/9	21/9	28/9	5/10	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11	16/11	23/11	30/11	7/12	14/12	21/12	28/12	4/1	11/1	18/1	25/1	1/2	8/2	15/2	22/2	1/3




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

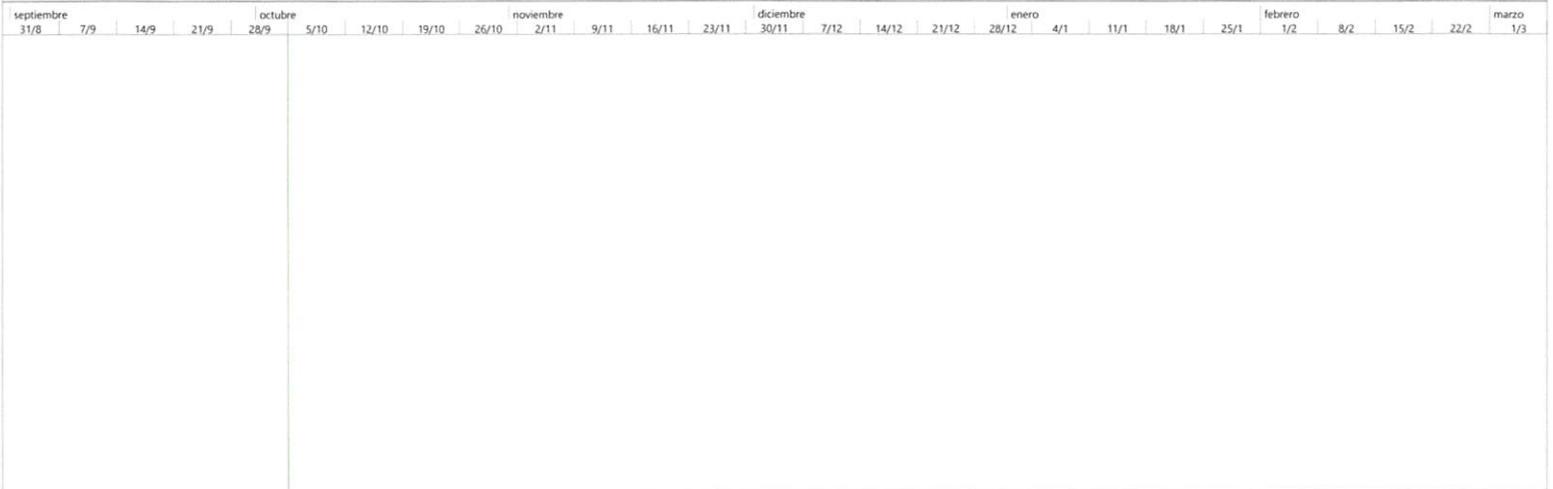


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

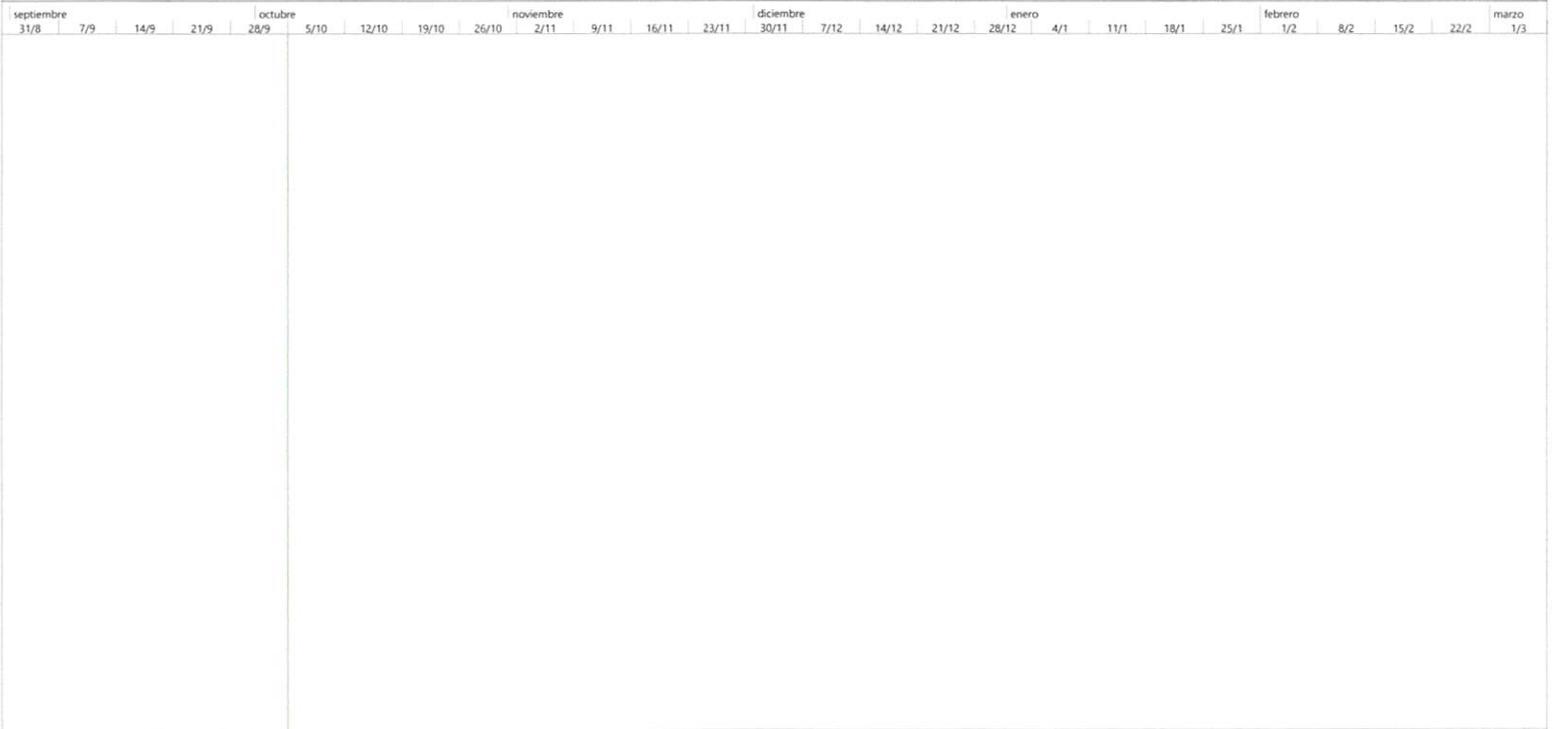

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

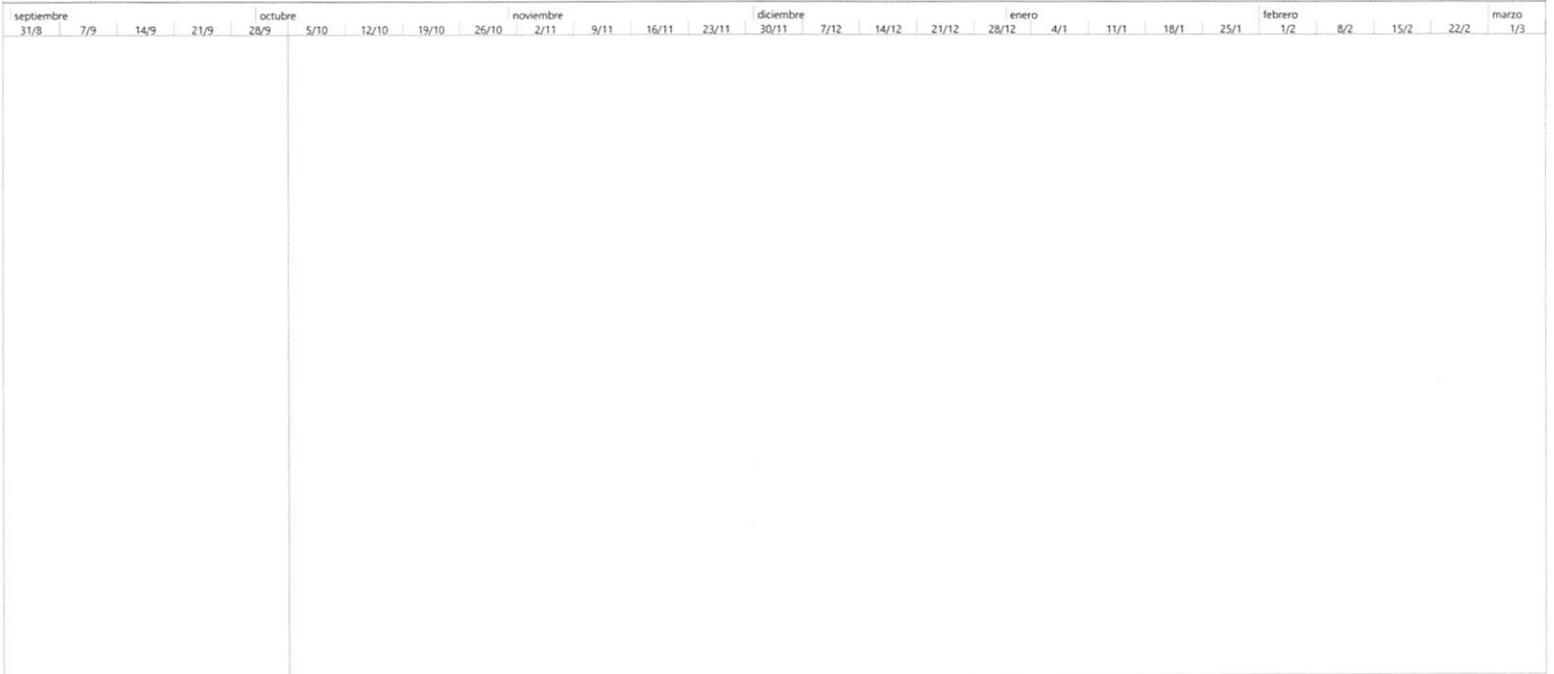


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

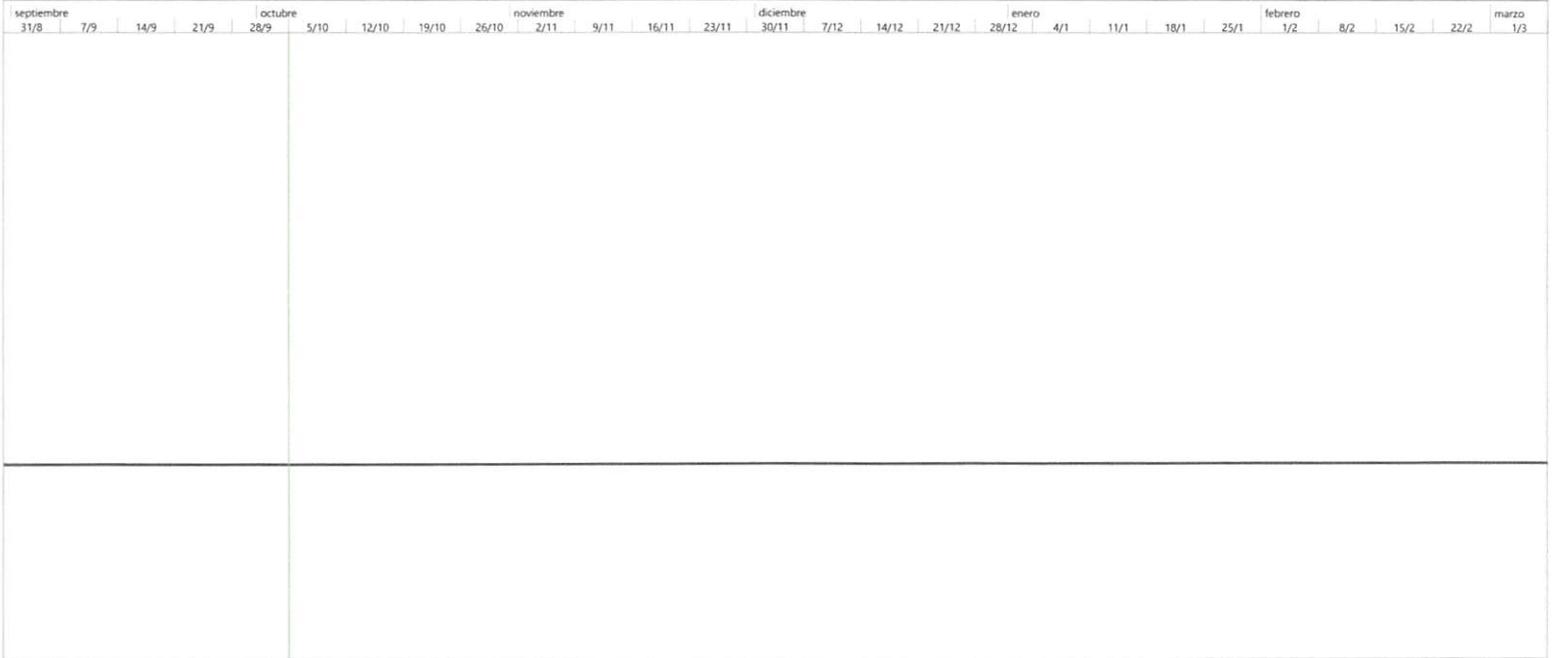


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------

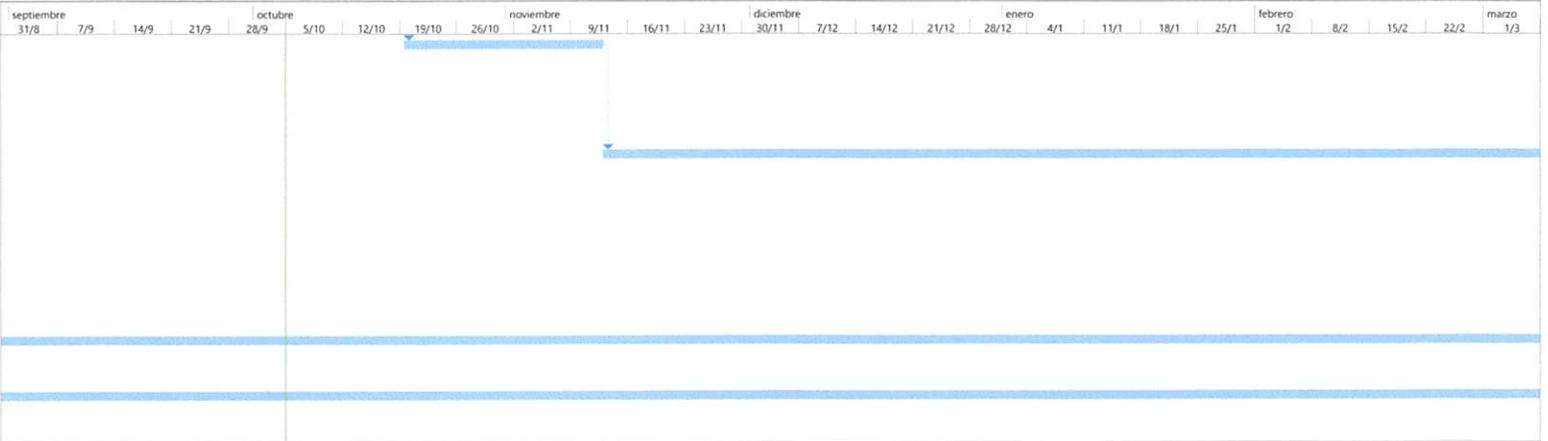


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------

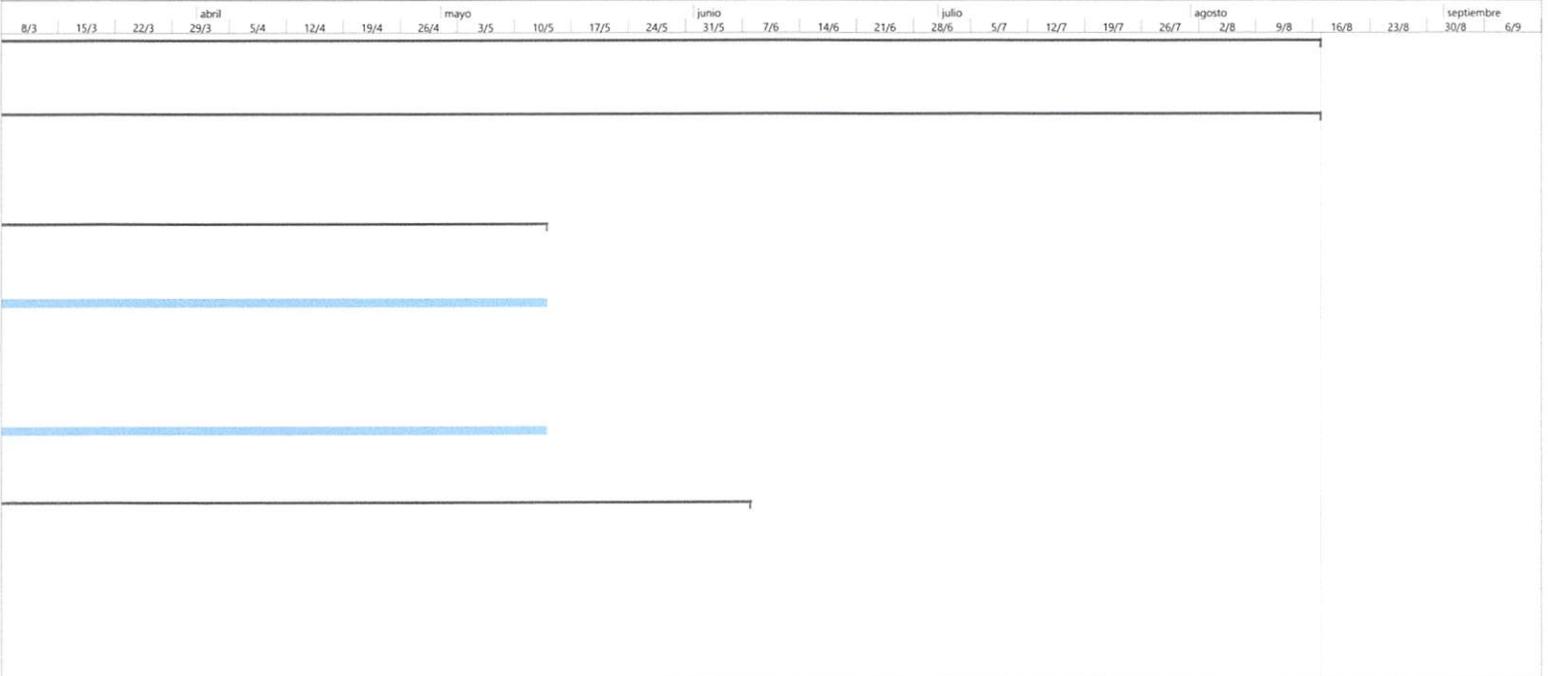


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------

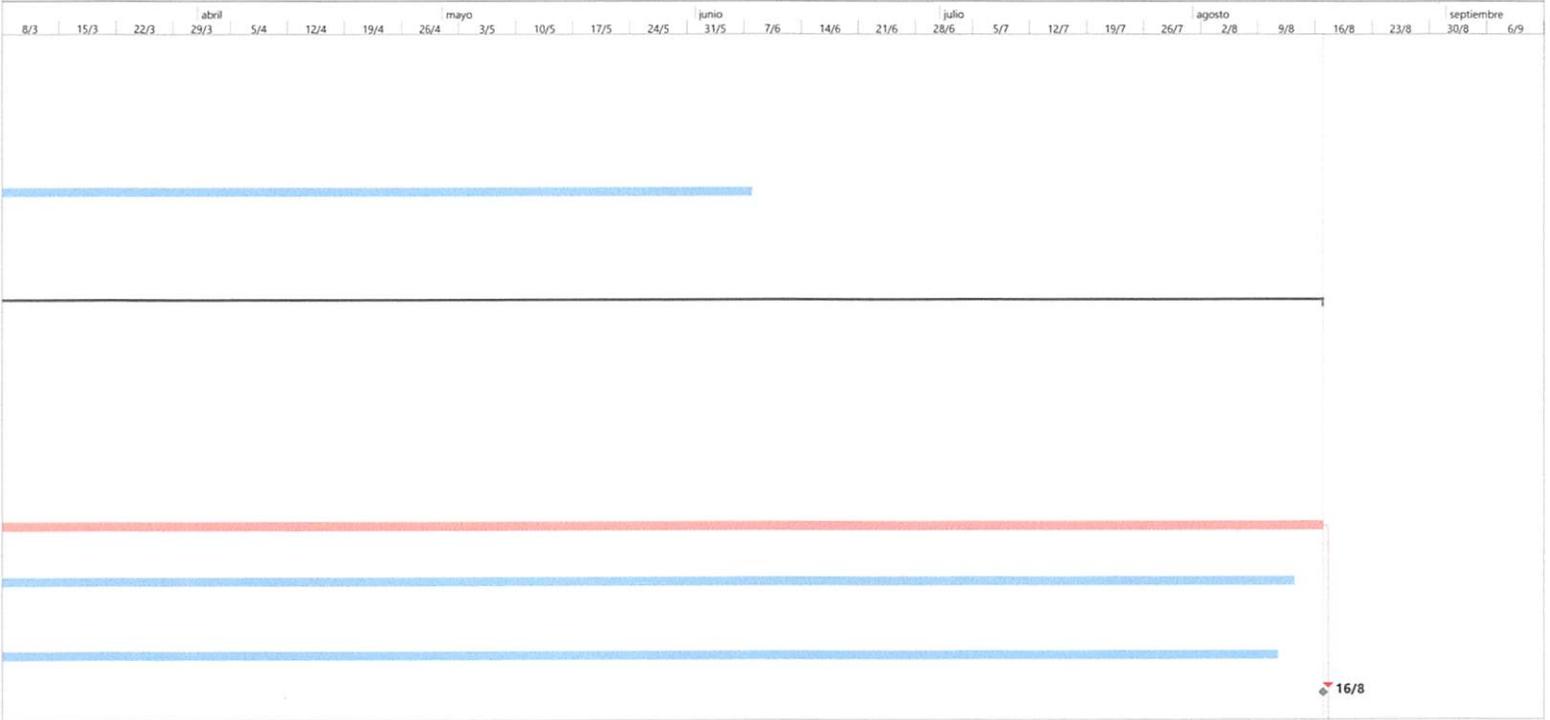

Proyecto: Linea conduccion 12	Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
Fecha: lun 5/10/20	División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
	Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	División crítica	Progreso
	Resumen	Tarea manual	solo fin	Tareas externas	
	Resumen del proyecto	solo duración			

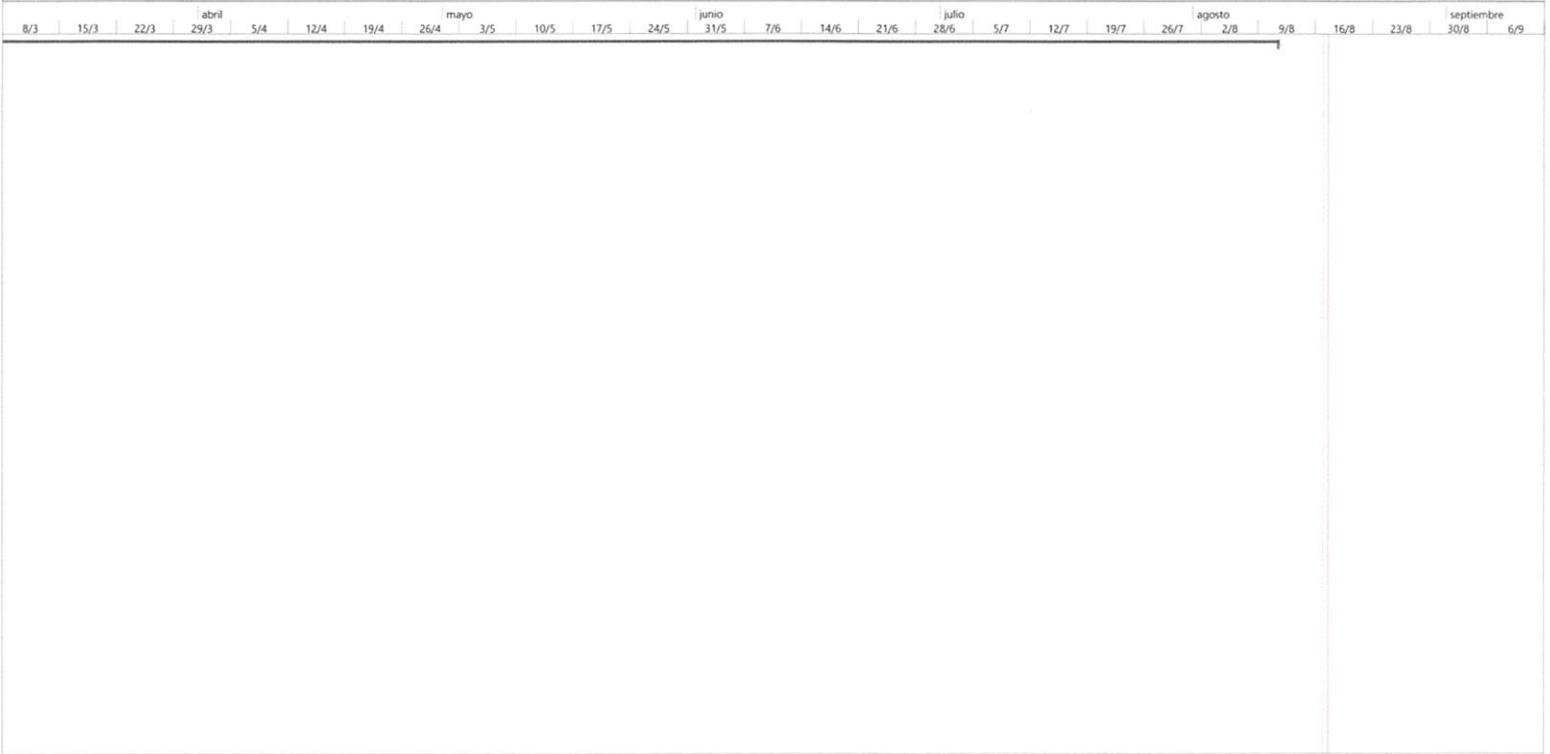

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

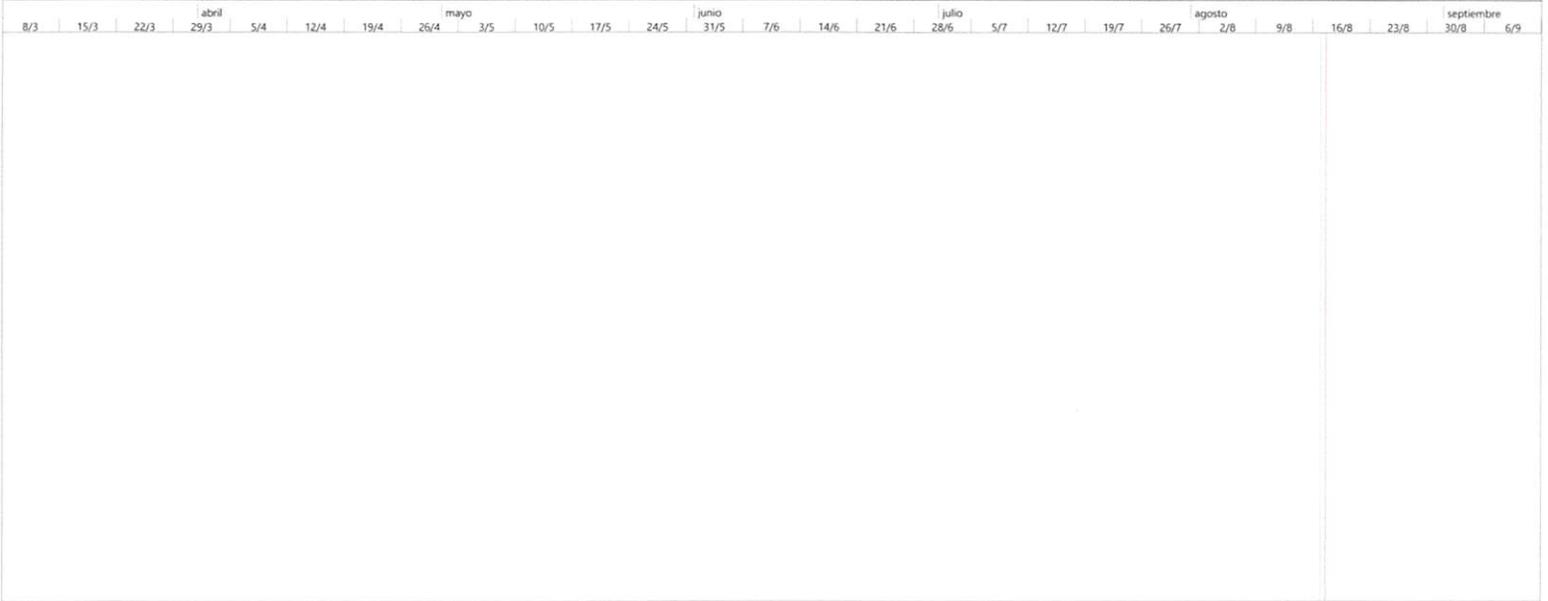

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Linea conduccion 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica		
	Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Progreso		




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Proyecto: Línea conducción 12
Fecha: lun 5/10/20

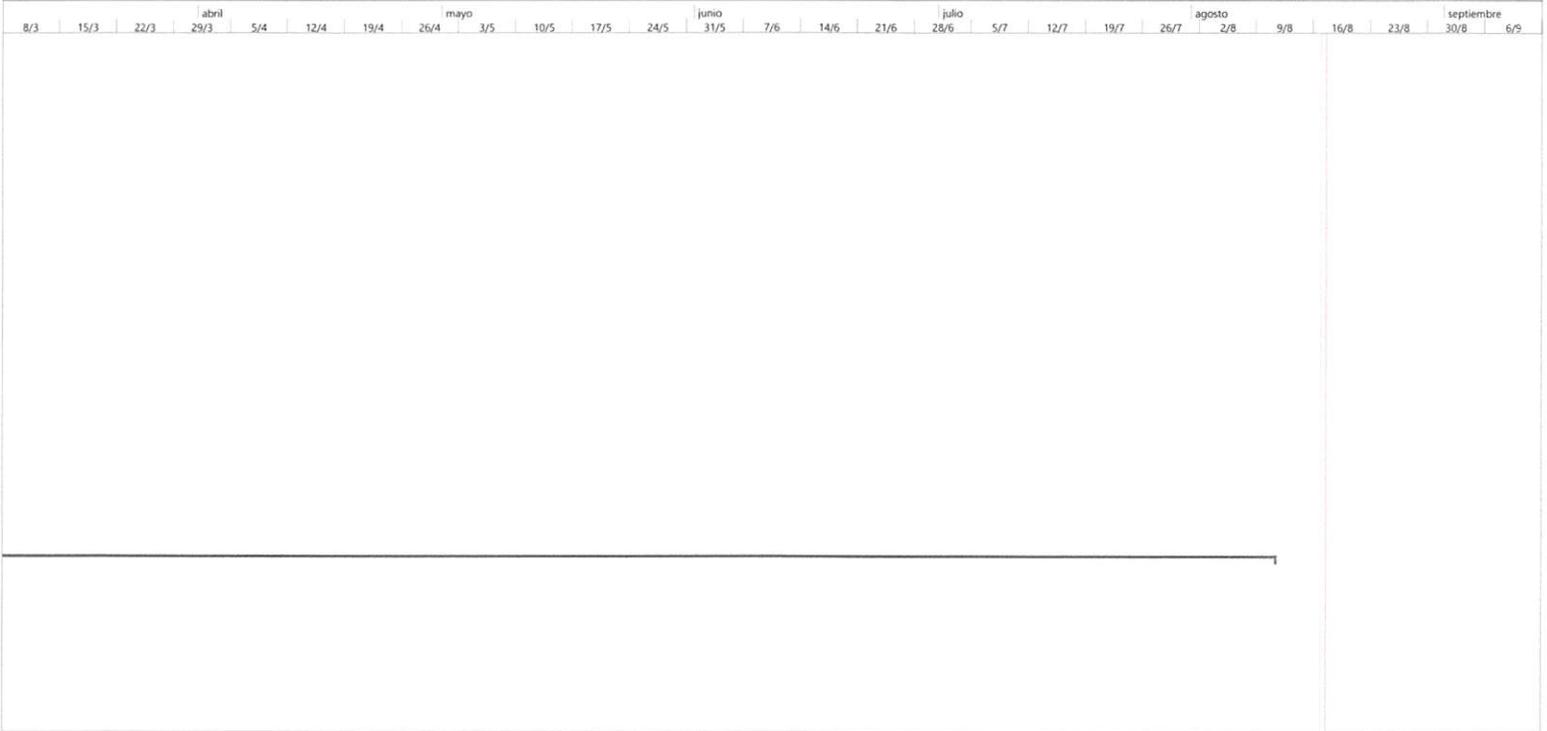

Proyecto: Linea conduccion 12	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
Fecha: lun 5/10/20	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			

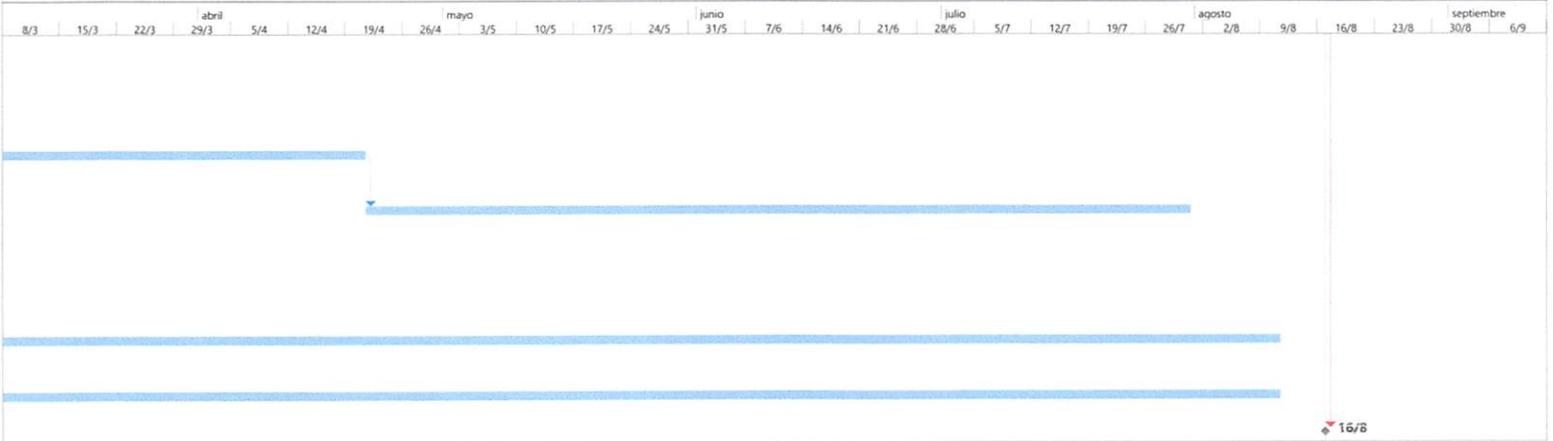

Proyecto: Línea conducción 12	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
Fecha: lun 5/10/20	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			
