



<p>Proyecto: Línea conducción 12</p> <p>Fecha: lun 5/10/20</p>	<p>Tarea </p> <p>División </p> <p>Hito </p> <p>Resumen </p> <p>Resumen del proyecto </p>	<p>Tarea inactiva </p> <p>Hito inactivo </p> <p>Resumen inactivo </p> <p>Tarea manual </p> <p>solo duración </p>	<p>Informe de resumen manual </p> <p>Resumen manual </p> <p>solo el comienzo </p> <p>solo fin </p> <p>Tareas externas </p>	<p>Hito externo </p> <p>Fecha límite </p> <p>Tareas críticas </p> <p>División crítica </p> <p>Progreso </p>	<p>Progreso manual </p>
--	--	--	--	---	-------------------------

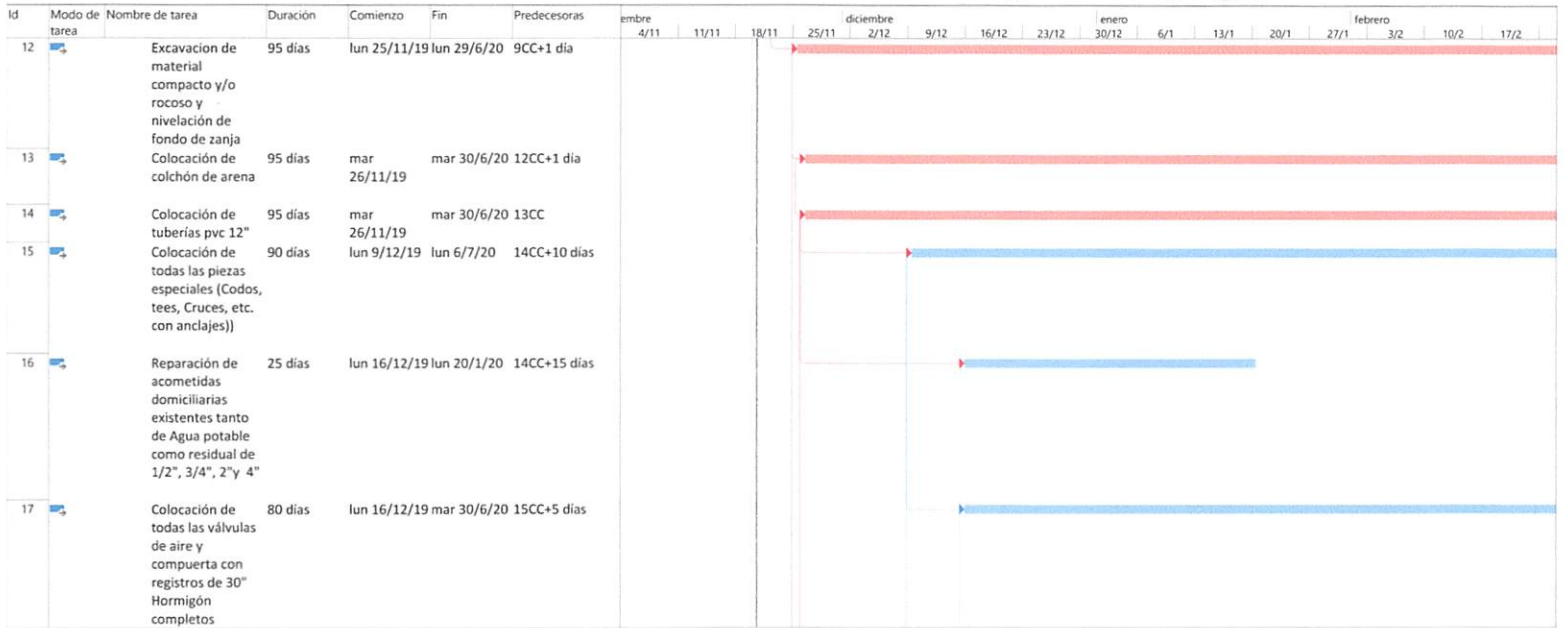

Proyecto: Línea conducción 12
 Fecha: lun 5/10/20


Tarea		Tarea inactiva		Tareas externas		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha limite			
Hito		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual		solo el comienzo		División critica			
Resumen del proyecto		solo duración		solo fin		Progreso			

Ampliación Red de Distribución Línea de Conducción Zona Norte Hato Mayor. Provincia Hato Mayor.

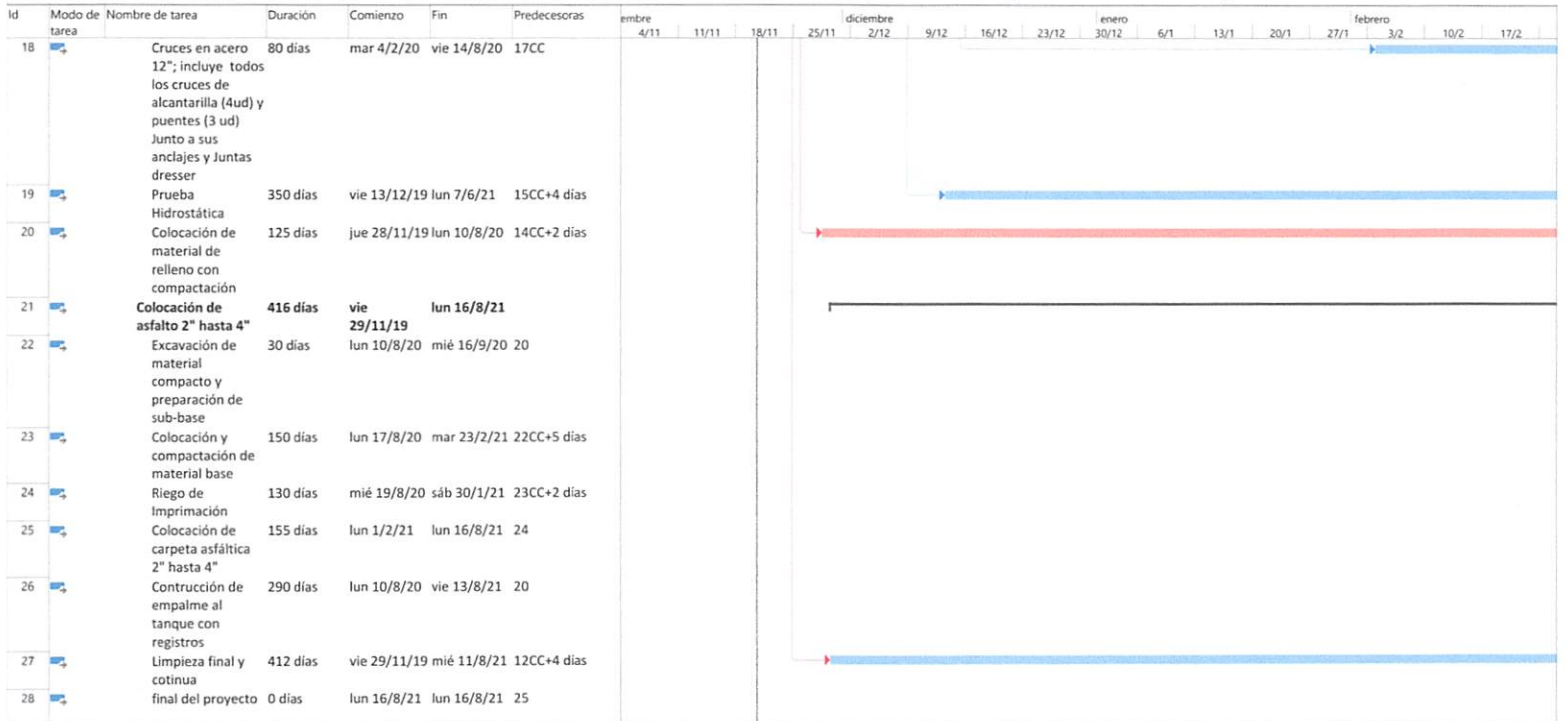


Proyecto: Línea conduccion 12
Fecha: lun 5/10/20

Tarea	[Barra azul]	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	[Barra azul con línea]	Hito externo	[Círculo]	Progreso manual	[Barra azul]
División	[Línea punteada]	Hito inactivo	Resumen manual	[Barra azul con línea]	Fecha limite	[Línea verde]		
Hito	[Diamante]	Resumen inactivo	solo el comienzo	[Línea azul]	Tareas criticas	[Barra roja]		
Resumen	[Barra azul con línea]	Tarea manual	solo fin	[Línea azul]	División critica	[Línea punteada]		
Resumen del proyecto	[Barra azul con línea]	solo duracion	Tareas externas	[Barra gris]	Progreso	[Barra azul]		

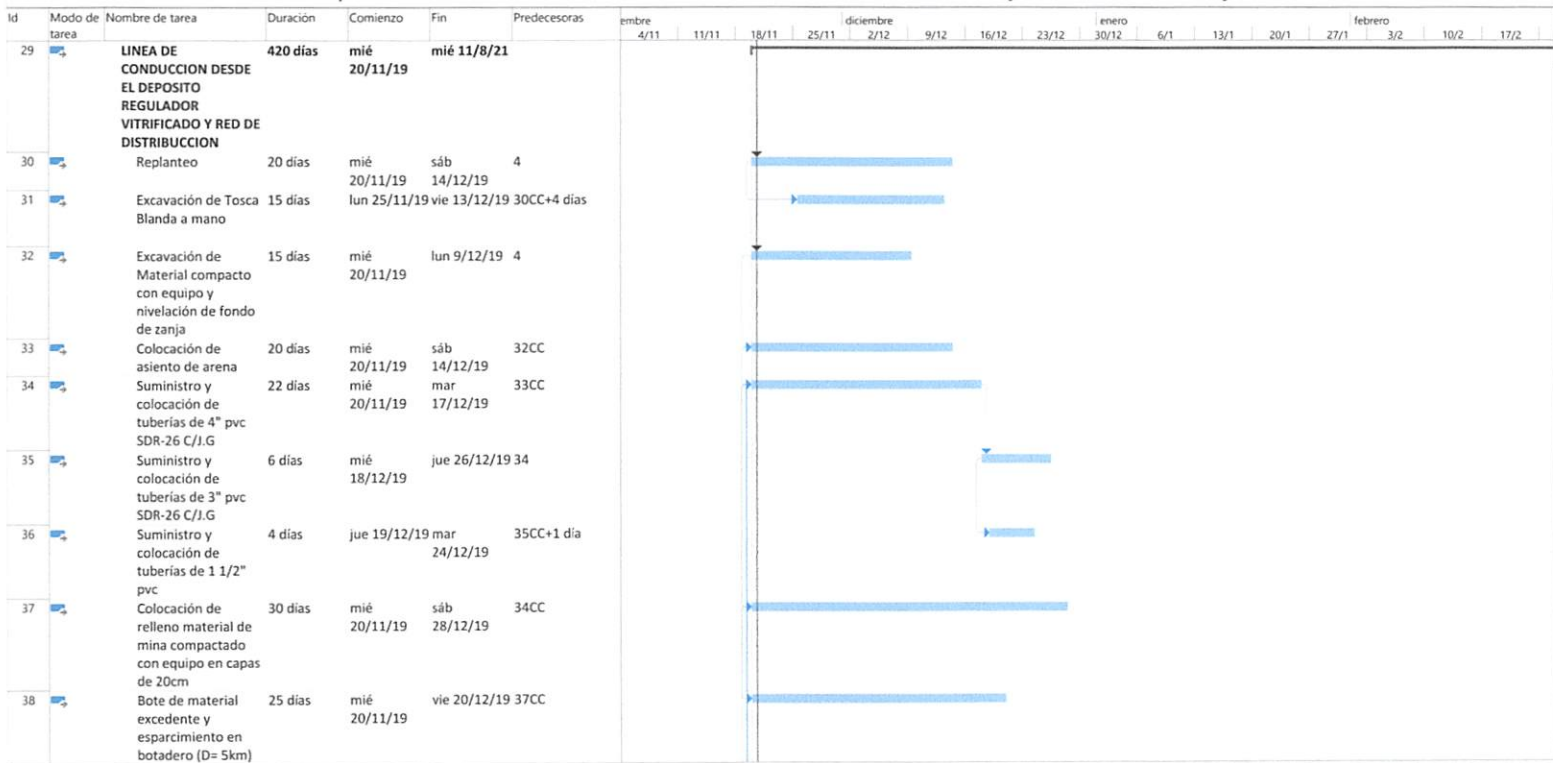

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea	[Barra]	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	[Barra]	Hito externo	[Barra]	Progreso manual	[Barra]
	División	[Punto]	Hito inactivo	Resumen manual	[Barra]	Fecha límite	[Barra]		
	Hito	[Punto]	Resumen inactivo	solo el comienzo	[Barra]	Tareas críticas	[Barra]		
	Resumen	[Barra]	Tarea manual	solo fin	[Barra]	División crítica	[Barra]		
	Resumen del proyecto	[Barra]	solo duración	Tareas externas	[Barra]	Progreso	[Barra]		

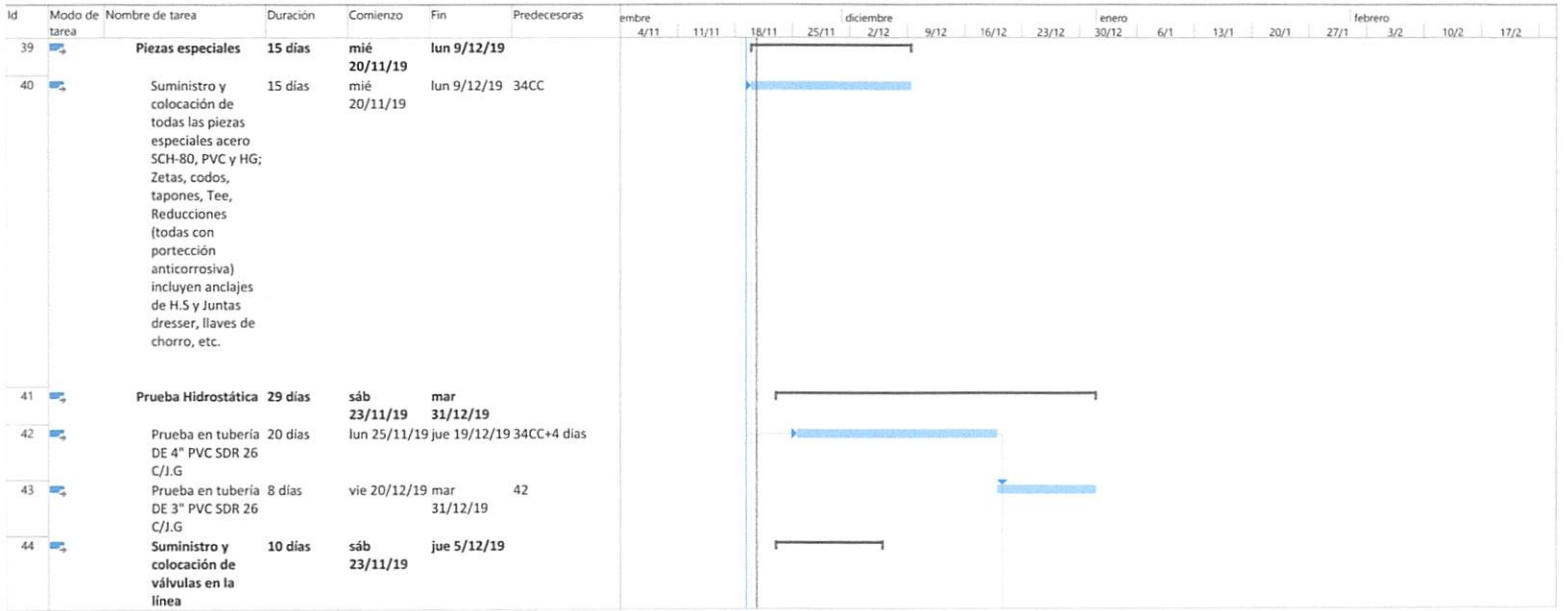

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Fecha																
							4/11	11/11	18/11	25/11	diciembre	2/12	9/12	16/12	23/12	30/12	enero	6/1	13/1	20/1	27/1	febrero	3/2
45		Válvula de compuerta 3" H.F 150 PSI (Completa; con todos los tornillos, nipples, JG, JD, base de H.S, etc)	4 días	sáb 23/11/19	jue 28/11/19	34CC+3 días																	
46		Válvula de compuerta 4" H.F 150 PSI (Completa; con todos los tornillos, nipples, JG, JD, base de H.S, etc)	5 días	jue 28/11/19	mié 4/12/19	45																	
47		Sumistro y colocación de caja telescópica (incluye bases superficial de H.S)	6 días	jue 28/11/19	jue 5/12/19	46CC																	

Proyecto: Línea conducción 12	Tarea	■	Tarea inactiva	■	Informe de resumen manual	■	Hito externo	○	Progreso manual	■
Fecha: lun 5/10/20	División	Hito inactivo	■	Resumen manual	■	Fecha límite	○		
	Hito	◆	Resumen inactivo	■	solo el comienzo	[Tareas críticas	■		
	Resumen	■	Tarea manual	■	solo fin]	División crítica		
	Resumen del proyecto	■	solo duración	■	Tareas externas	■	Progreso	■		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart															
							enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero	enero				
48		Colocación de acometida (Escuela Juan Ramón Díaz); colocación completa de acometida incluidas todas las piezas de HG, tuberías P.E y aditamentos, mas las estructuras de sopoprtre de H.S y/o pedestales, llave de chorro de bronce, etc.	4 días	vie 20/12/19	jue 26/12/19	42	4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	23/12	30/12	6/1	13/1	20/1	27/1	3/2	10/2	17/2
49		Cruces	135 días	vie 22/11/19	sáb 15/8/20																	
50		Contrucción completa de Cruce de puente en tubería de acero 4" (6 m) incluye anclajes de H.A, JD, protección anticorrosiva, etc.	10 días	vie 22/11/19	mié 4/12/19	34CC+2 días																
51		Contrucción completa de Cruce de puente en tubería de acero 4" (32.40 m) incluye anclajes de H.A, JD, protección anticorrosiva, etc.	12 días	lun 25/11/19	mar 10/12/19	50CC+2 días																

Proyecto: Línea conducción 12
 Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			

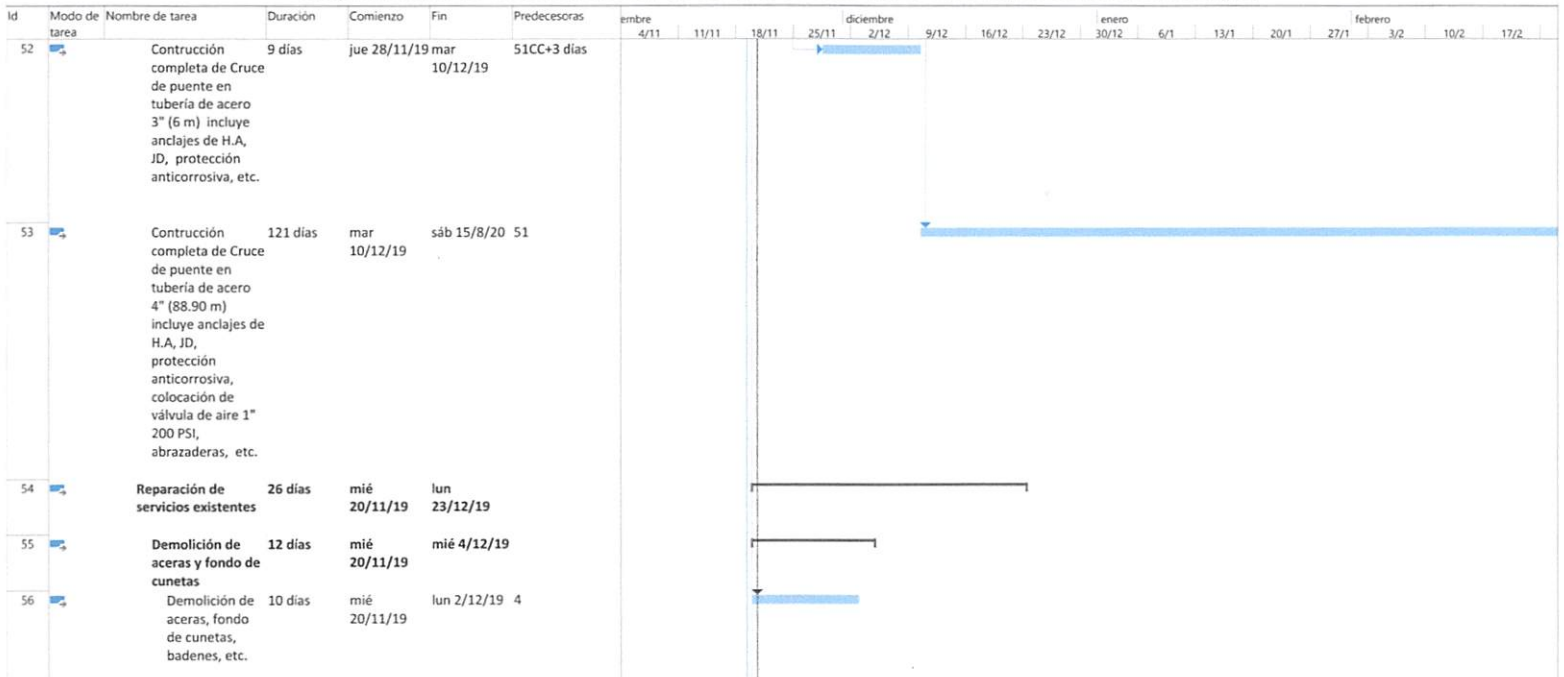


Proyecto: Línea conducción 12
Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas criticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica			
Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

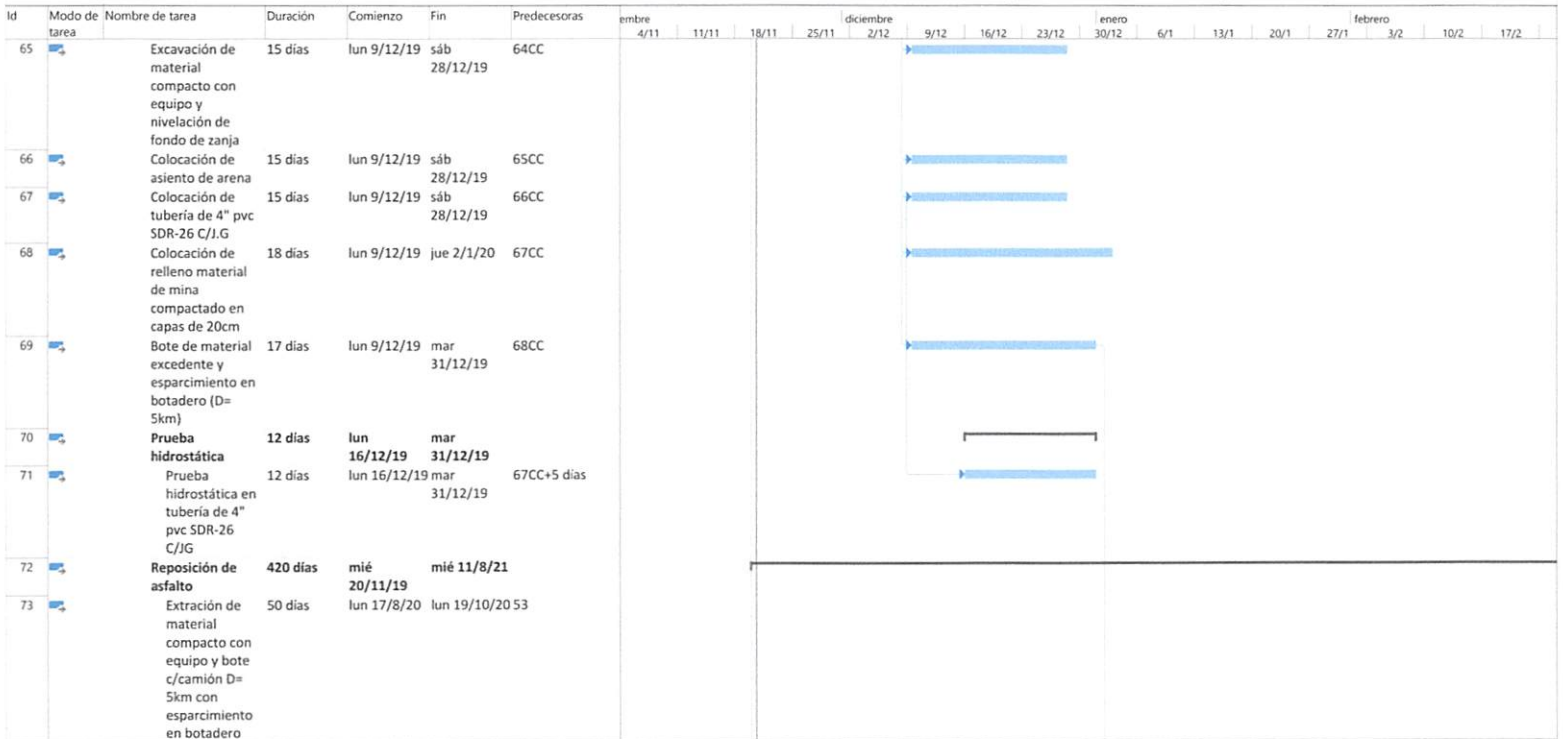


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Gantt Chart Timeline											
							4/11	11/11	18/11	25/11	2/12	9/12	16/12	23/12	30/12	6/1	13/1	20/1
74		Relleno y compactado con compactador mecánico capas 20cm	20 días	lun 19/10/20	vie 12/11/20	73												
75		Imprimación y riego de adherencia	125 días	vie 13/11/20	mié 21/4/21	74												
76		Reposición/coloc: de carpeta asfáltica 2"	80 días	mié 21/4/21	sáb 31/7/21	75												
77		Suministro de tubería de 8" pvc SDR-26 mas J.D de 8"	4 días	jue 2/1/20	mié 8/1/20	69												
78		Control de tráfico, señalización/seg	420 días	mié 20/11/19	mié 11/8/21	4												
79		Limpieza final y continua	420 días	mié 20/11/19	mié 11/8/21	4												
80		Final del proyecto	0 días	lun 16/8/21	lun 16/8/21	25												


Proyecto: Linea conduccion 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

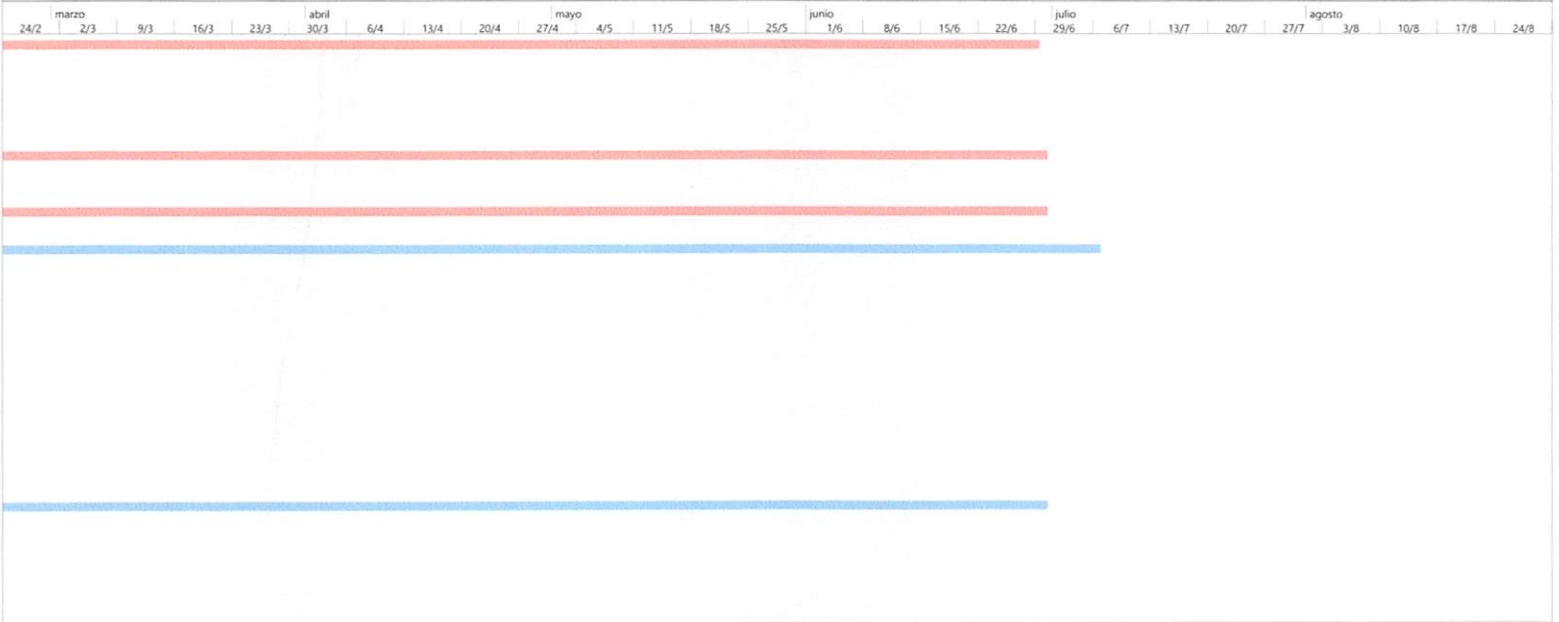


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

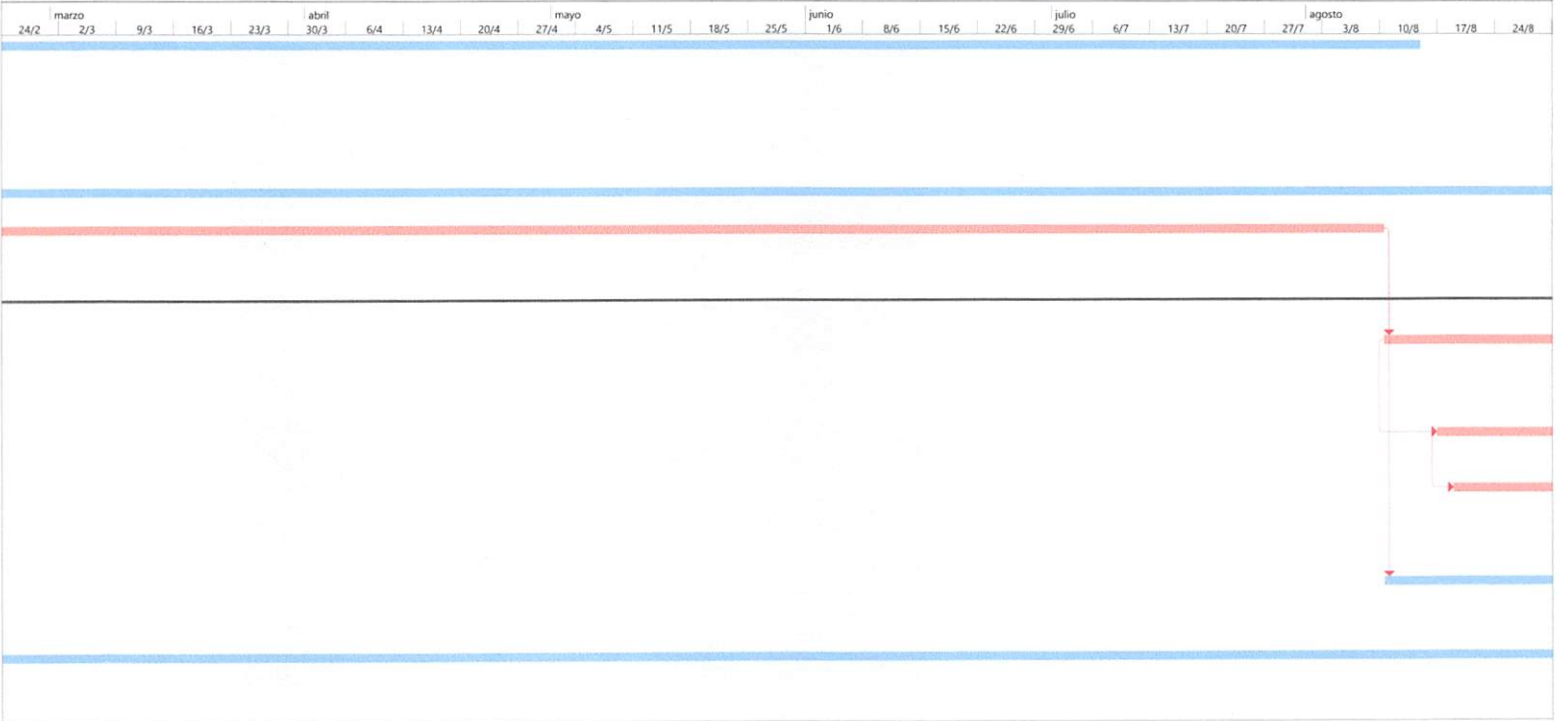

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------


marzo 24/2 2/3 9/3 16/3 23/3 abril 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 mayo 4/5 11/5 18/5 25/5 junio 1/6 8/6 15/6 22/6 julio 29/6 6/7 13/7 20/7 27/7 agosto 3/8 10/8 17/8 24/8

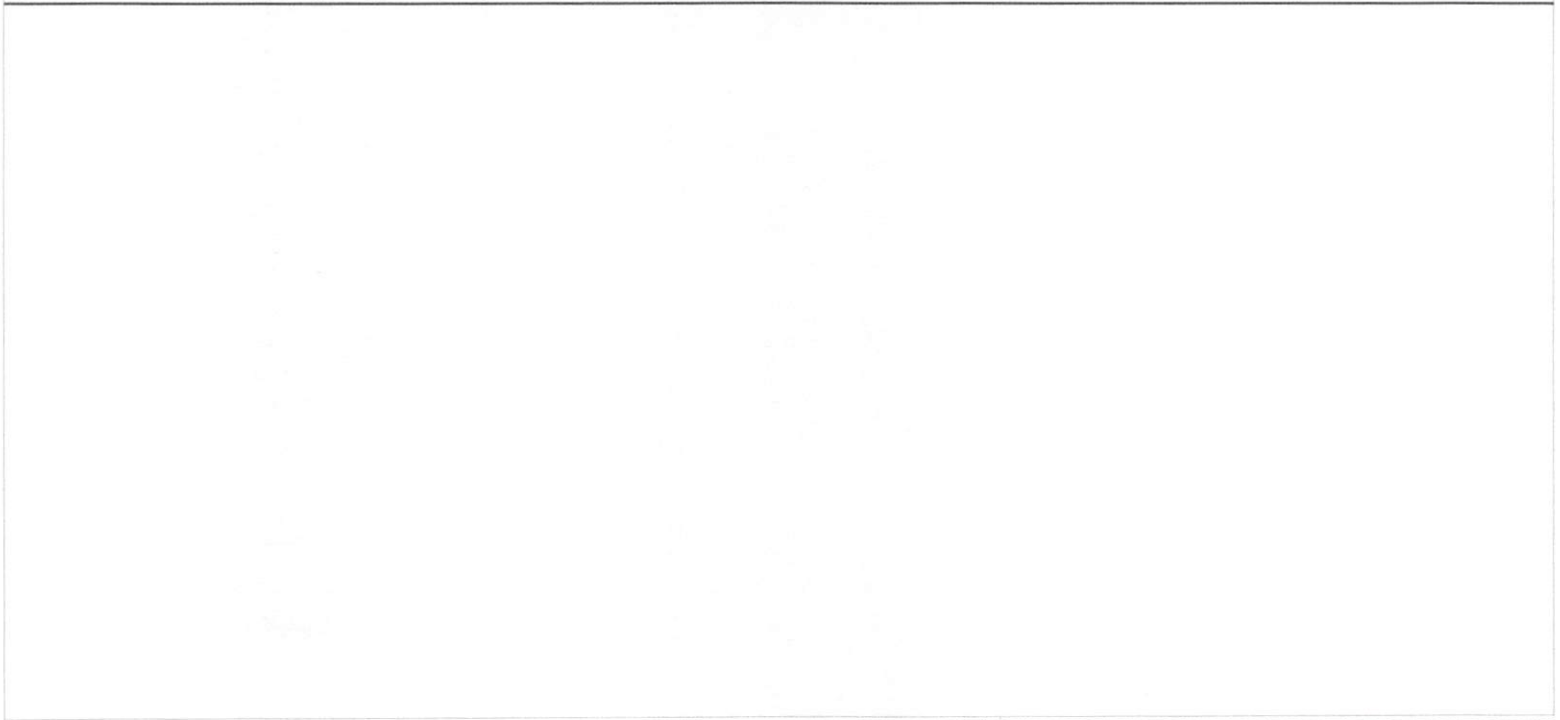


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

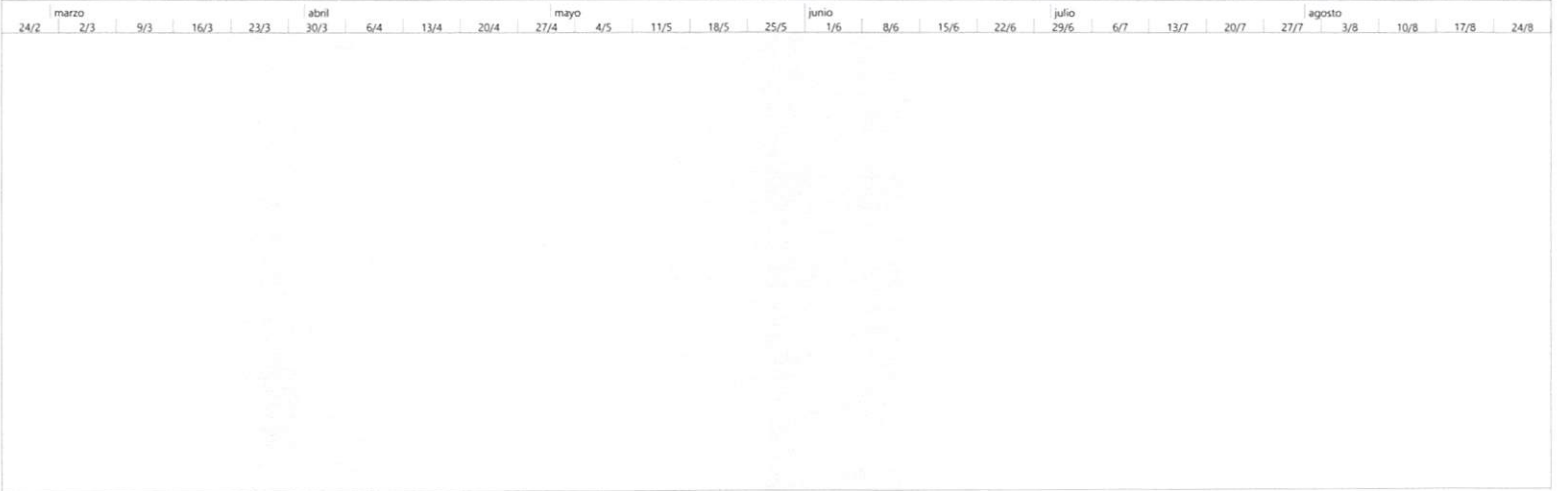


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

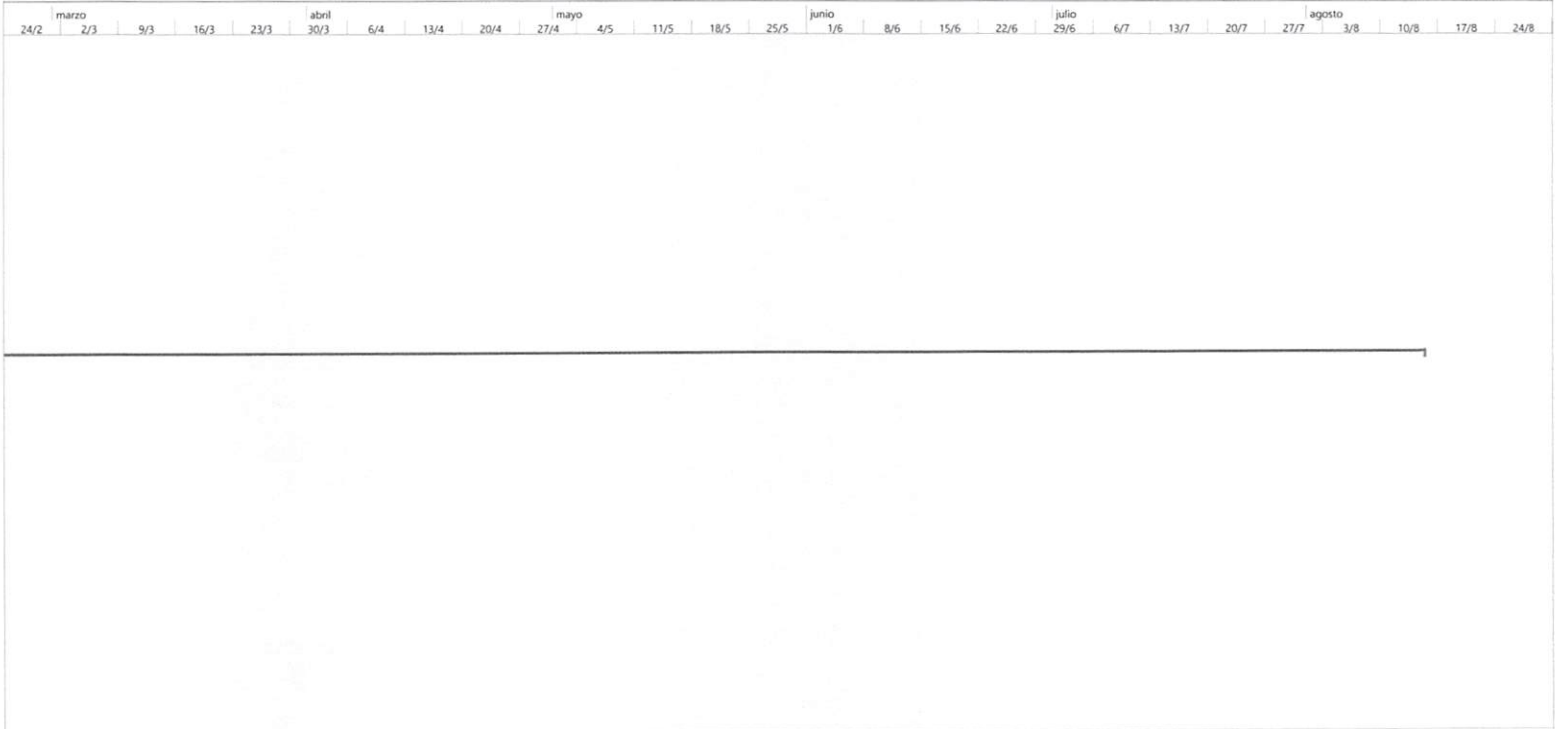


Proyecto: Linea conduccion 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			

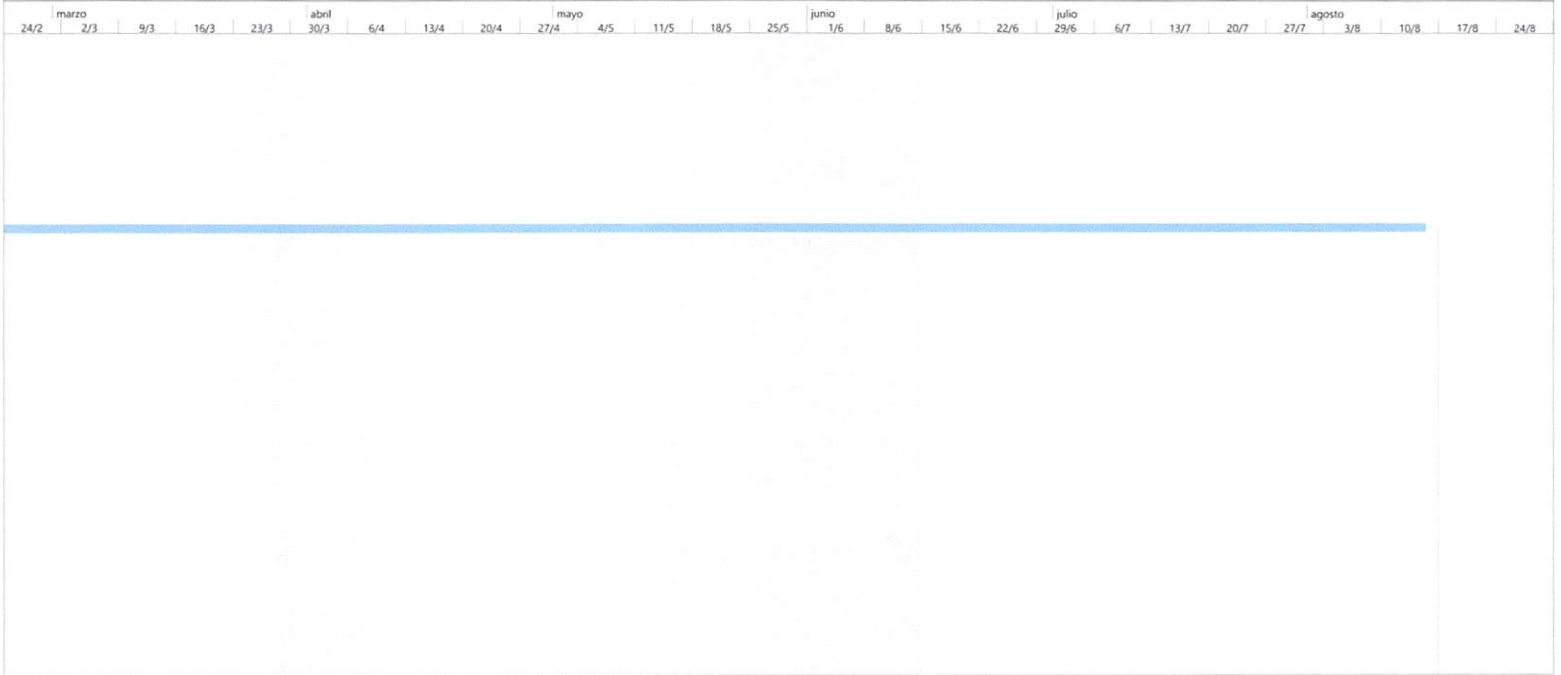

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual solo duración Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	---	---	-----------------

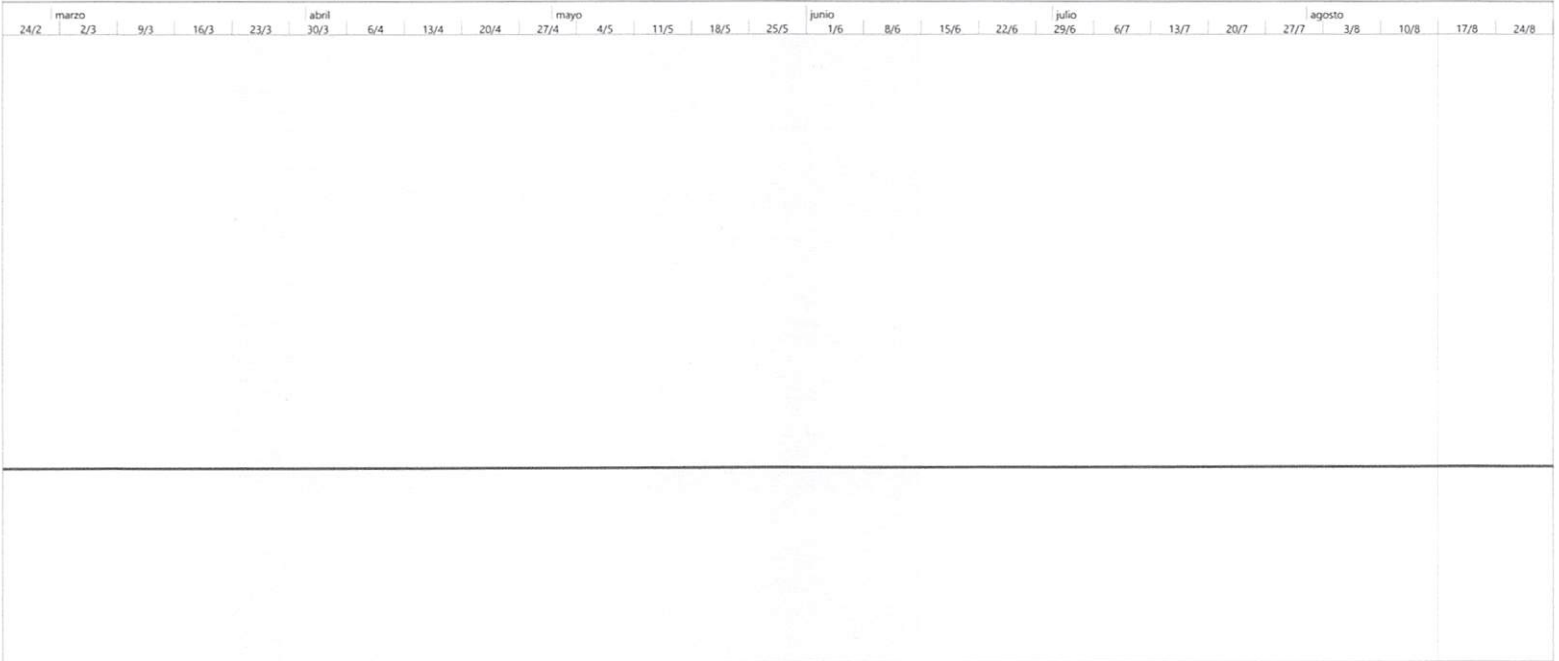

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

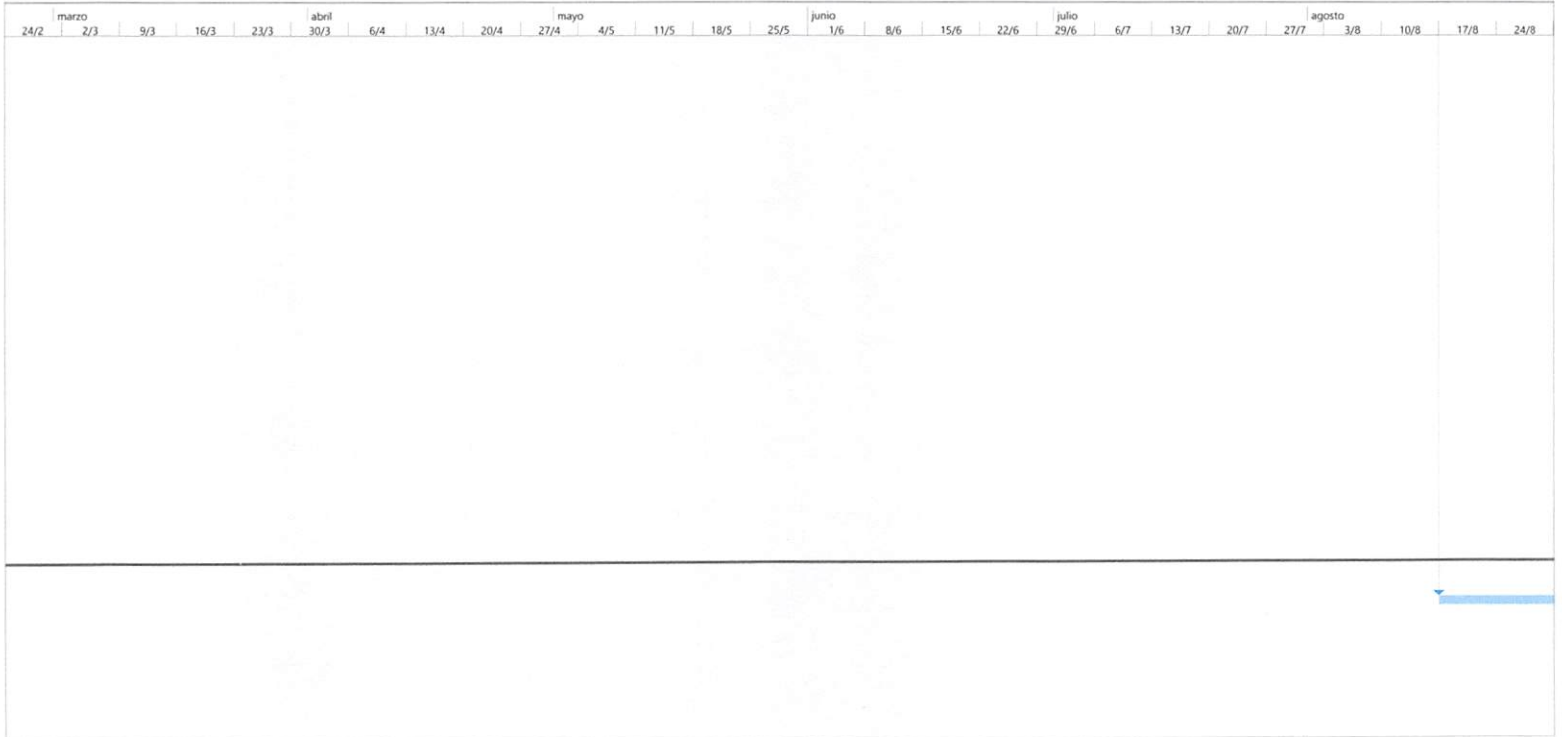


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica		
	Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Progreso		



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------


septiembre				octubre				noviembre				diciembre				enero				febrero			marzo			
31/8	7/9	14/9	21/9	28/9	5/10	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11	16/11	23/11	30/11	7/12	14/12	21/12	28/12	4/1	11/1	18/1	25/1	1/2	8/2	15/2	22/2	1/3

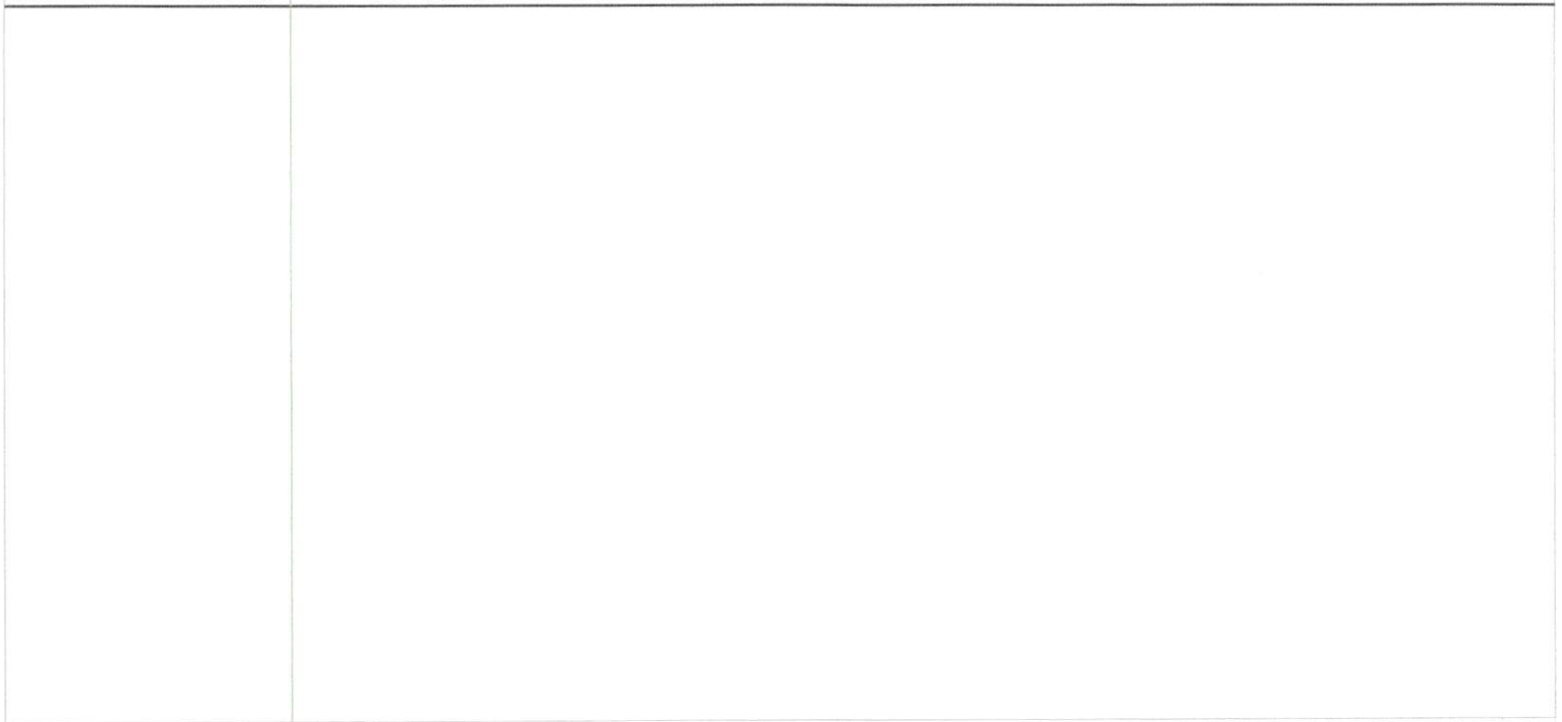

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

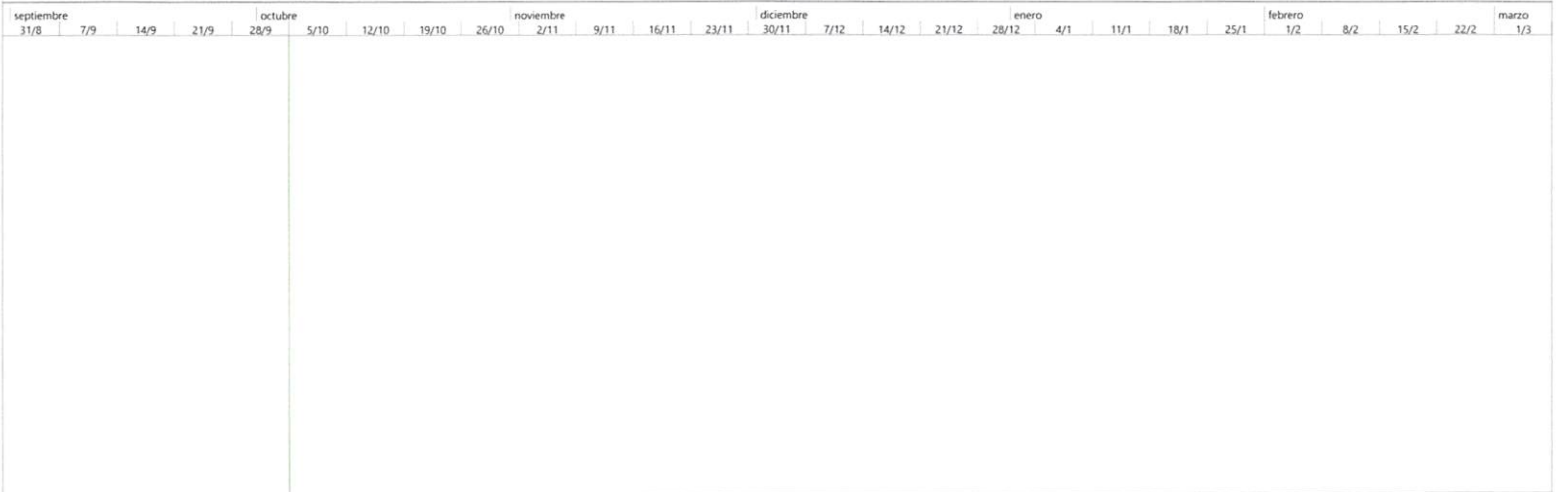

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

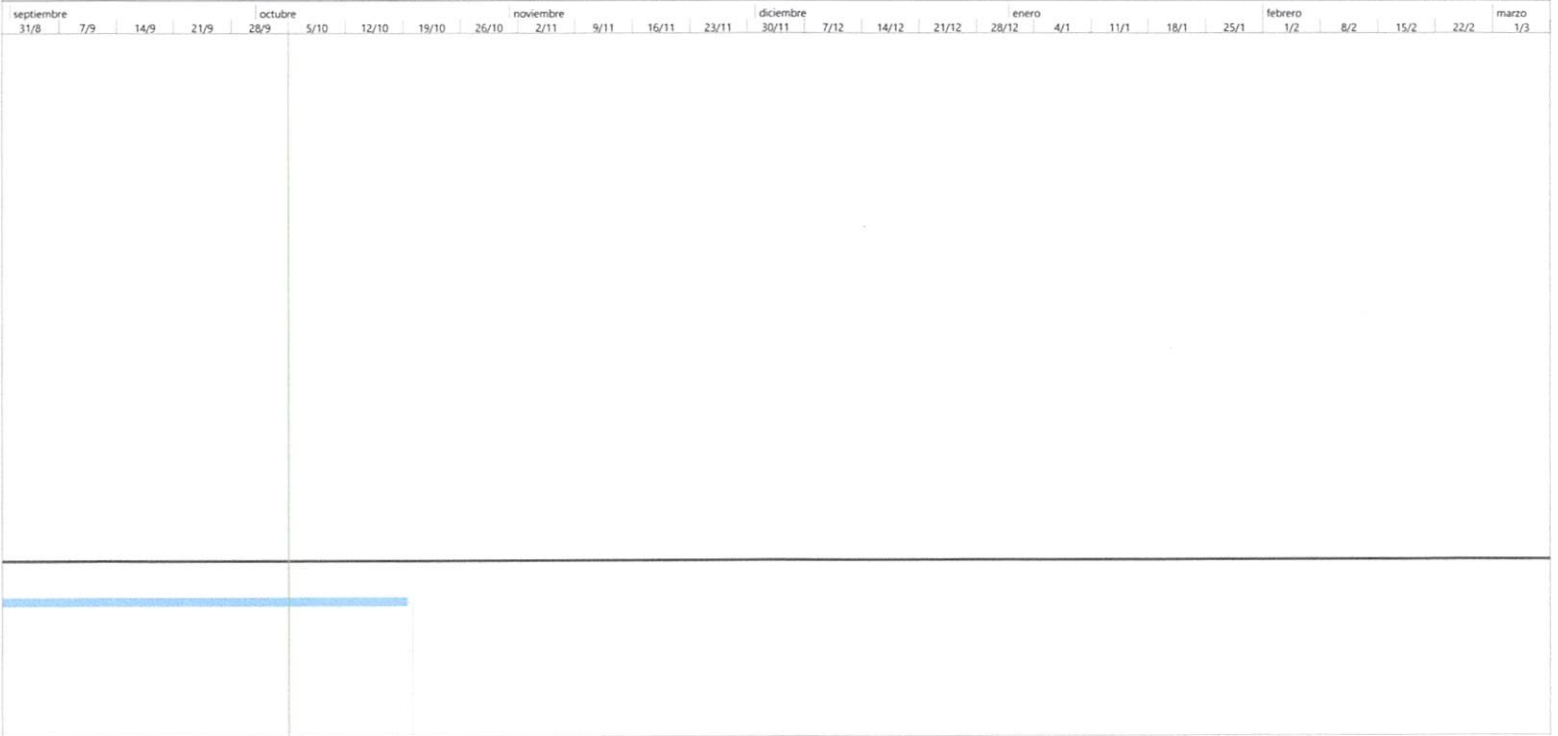

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

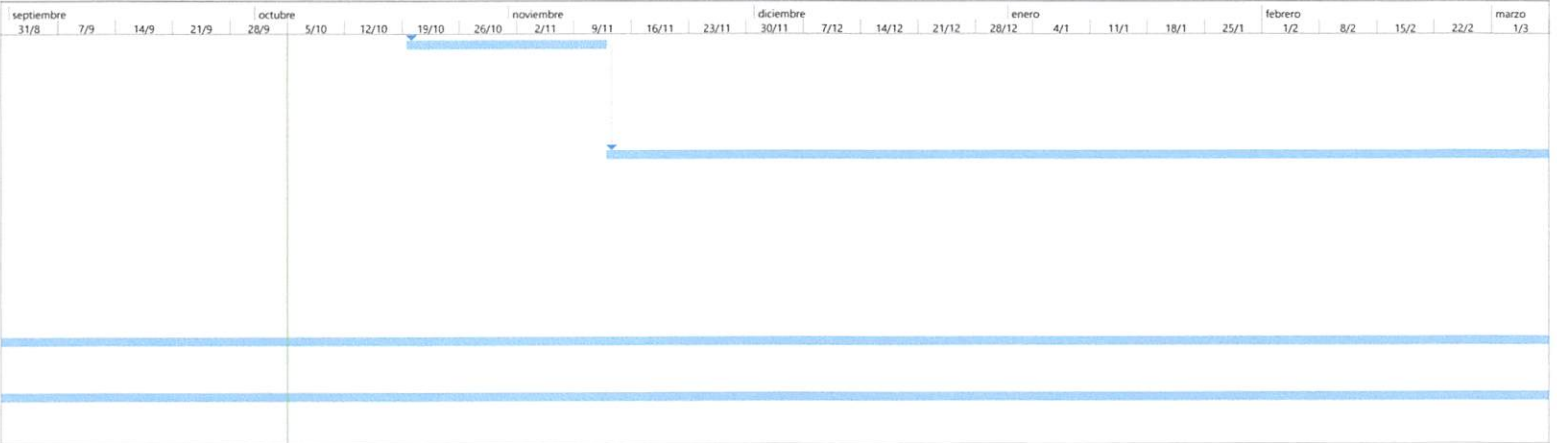


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------

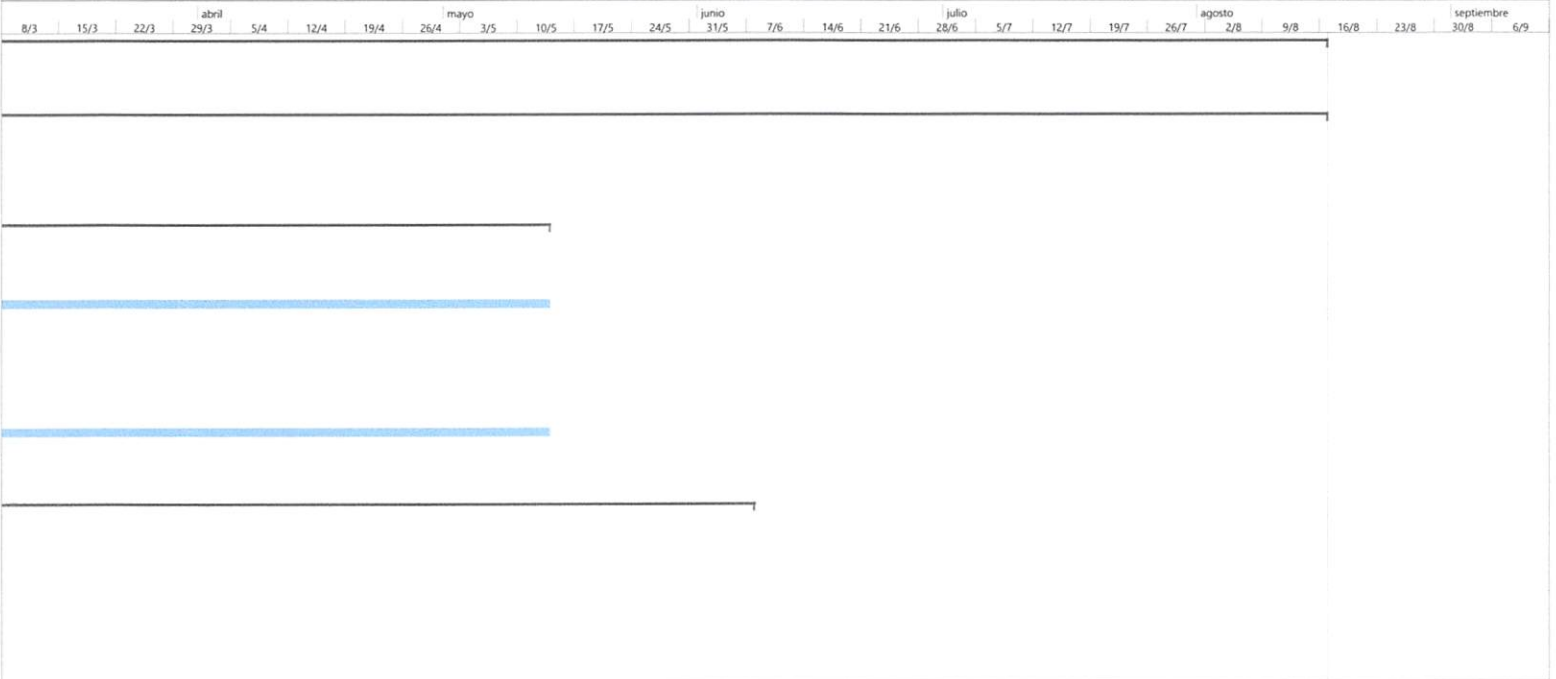


Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------

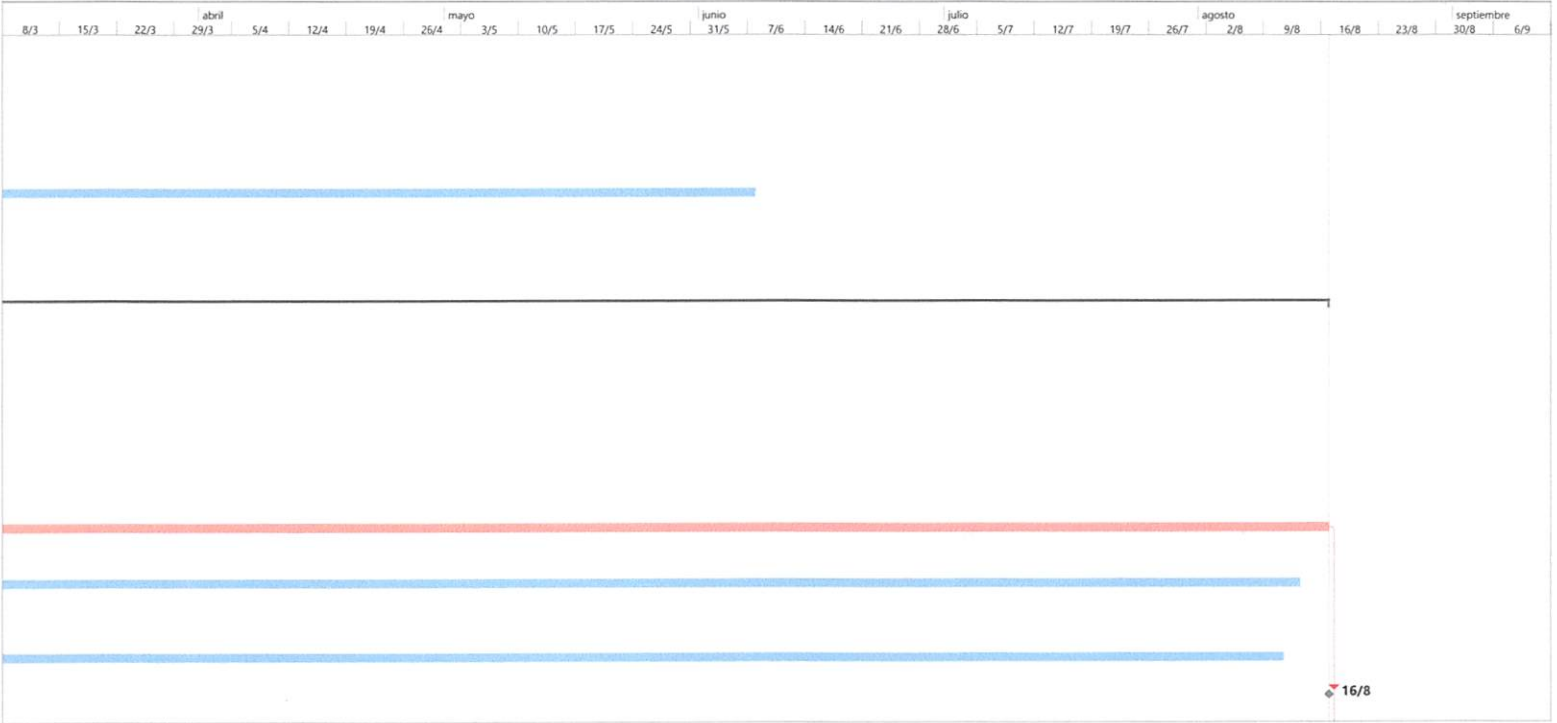

Proyecto: Linea conduccion 12	Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
Fecha: lun 5/10/20	División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Tareas críticas
	Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	División crítica	Progreso
	Resumen	Tarea manual	solo fin	Tareas externas	
	Resumen del proyecto	solo duración			

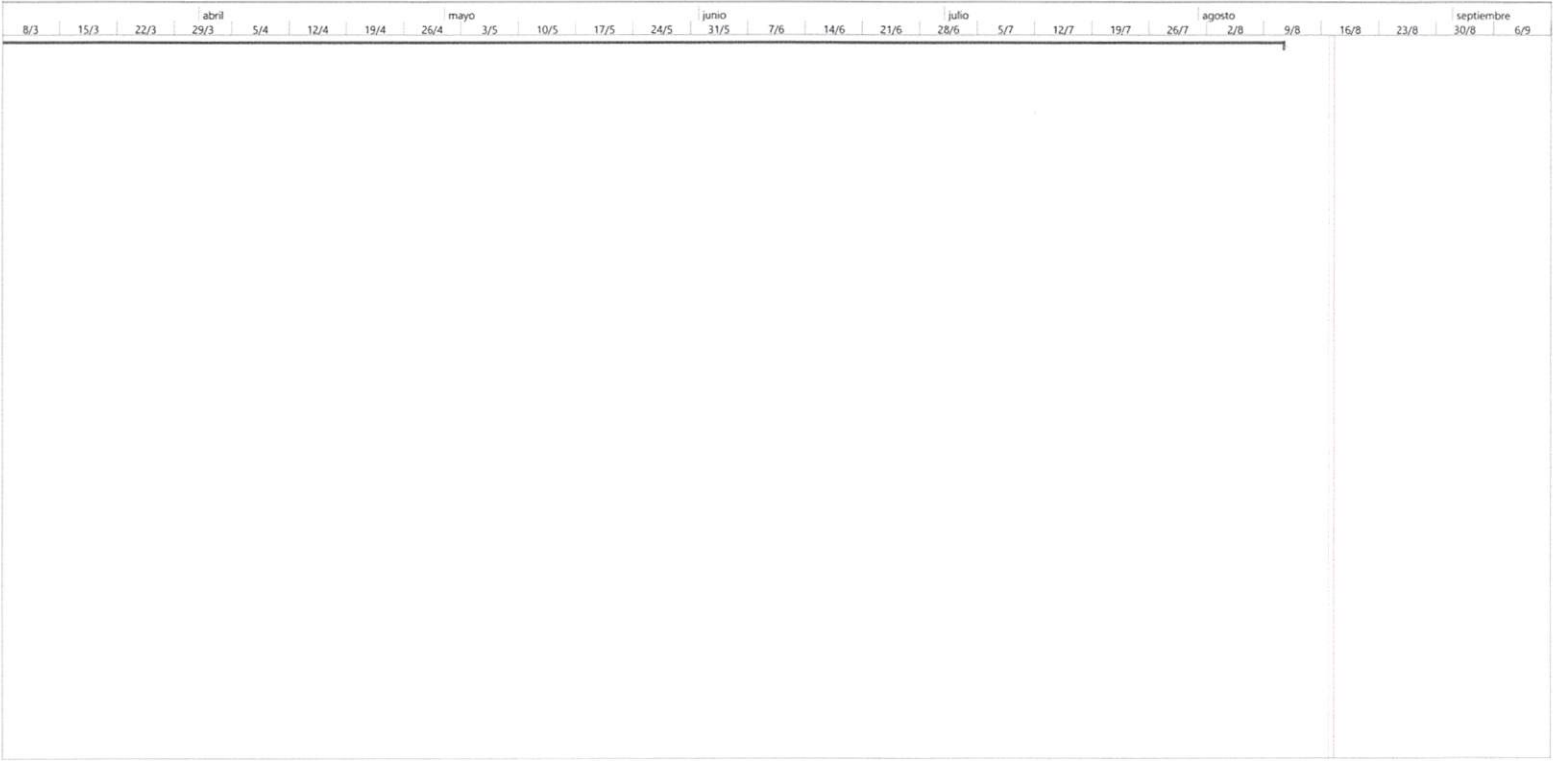

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			


Proyecto: Línea conducción 12
Fecha: lun 5/10/20



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			

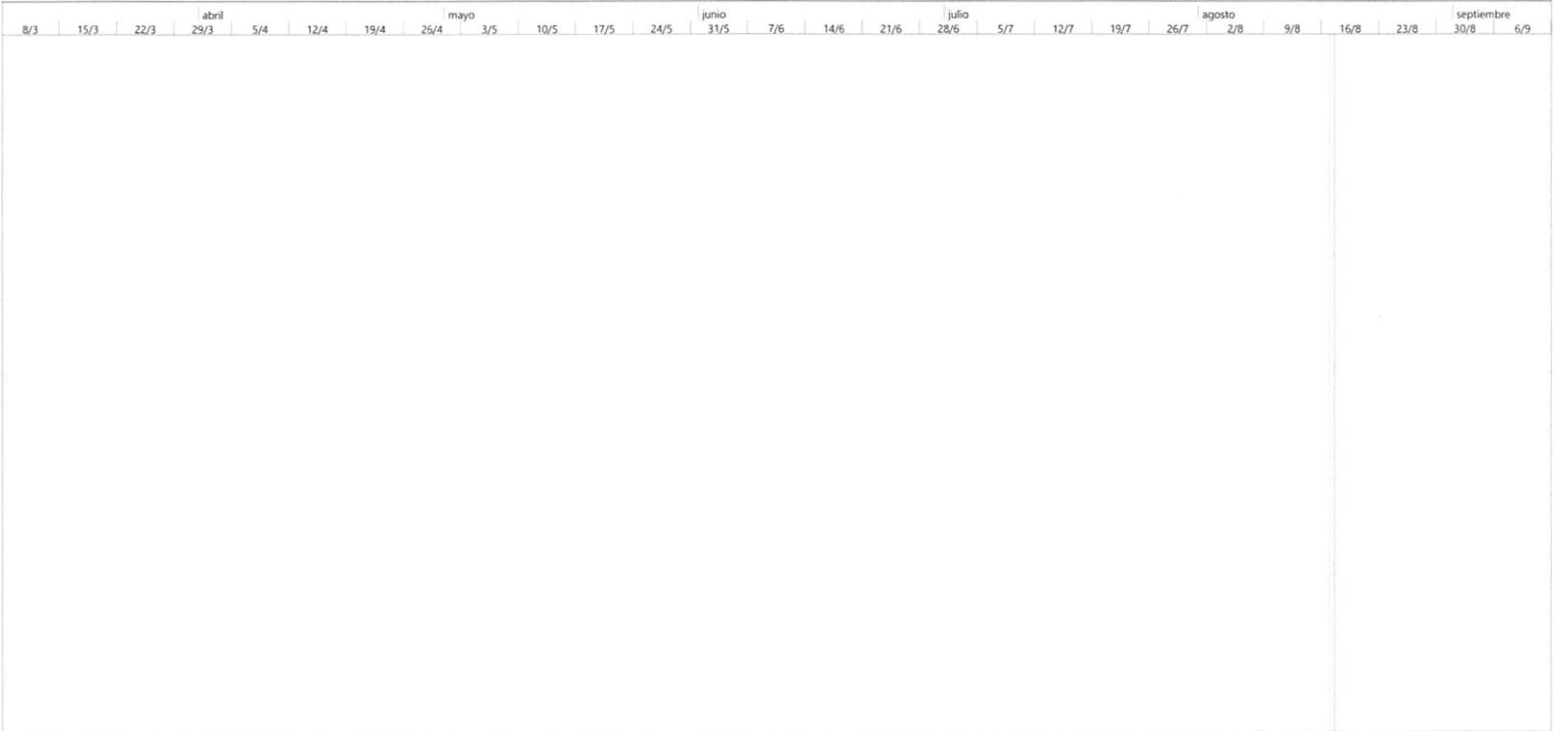


Proyecto: Linea conduccion 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			




Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Progreso			



Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------

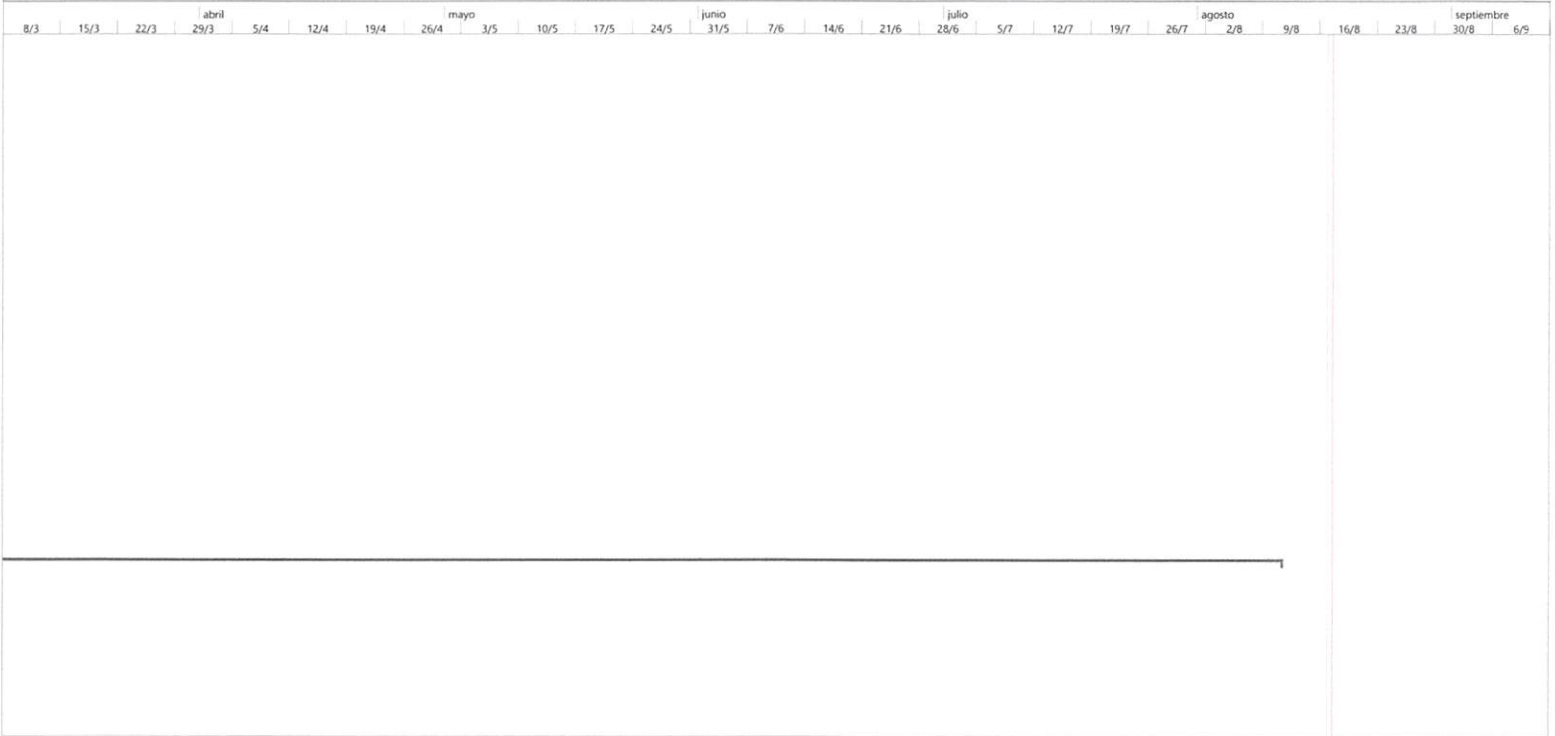

Proyecto: Linea conduccion 12	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
Fecha: lun 5/10/20	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite			
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas			
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica			
	Resumen del proyecto		solo duracion	Tareas externas		Progreso			

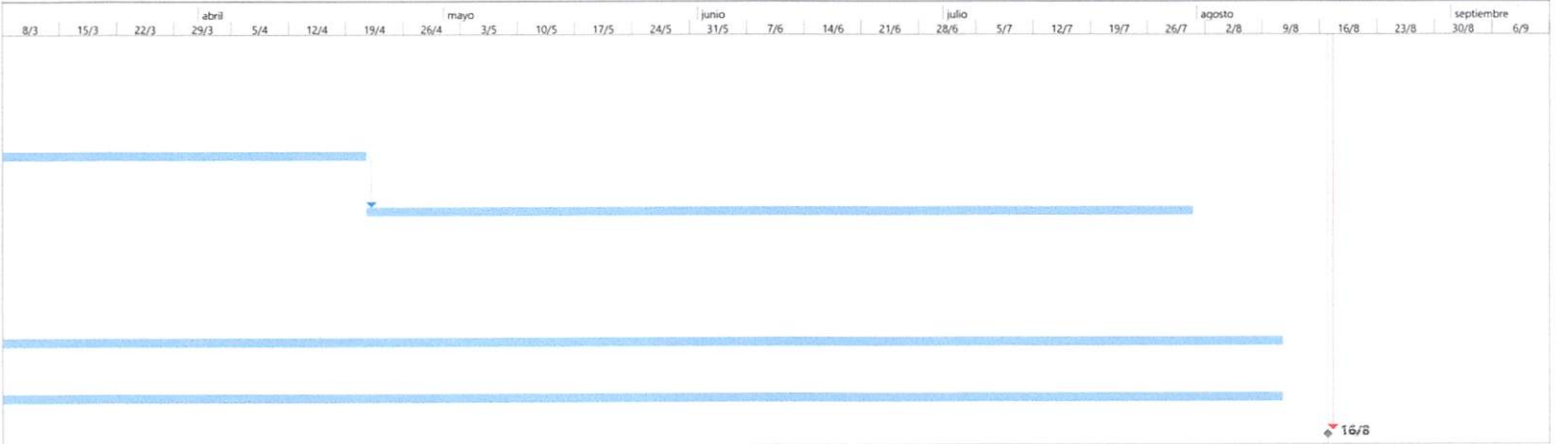

Proyecto: Línea conducción 12 Fecha: lun 5/10/20	Tarea Tarea inactiva División Hito inactivo Hito Resumen inactivo Resumen Tarea manual Resumen del proyecto solo duración	Informe de resumen manual Hito externo Resumen manual Fecha límite solo el comienzo Tareas críticas solo fin División crítica Tareas externas Progreso	Progreso manual
---	--	---	-----------------
