


Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2, 2026												Semestre 1, 2027					Semestre 2, 2027					Semestre 1, 2028				
							S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M						
1		AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	390 días	lun 5/10/26	vie 31/3/28																												
2		INICIO	0 días	lun 5/10/26	lun 5/10/26																												
3		PLANTA POTABILIZADORA DE 200 LPS DE CAPACIDAD	220 días	lun 5/10/26	vie 6/8/27	2																											
4		LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø20 HIERRO DUCTIL (C-25), DESDE PLANTA POTABILIZADORA HASTA DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. 5,000 M3, (A CONSTRUIR) Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø8 PVC (SDR-26) DESDE PLANTA POTABILIZADORA HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO (A CONSTRUIR)	80 días	lun 9/8/27	vie 26/11/27	3;7																											
5		ESTACIÓN DE BOMBEO DE 500 M³	180 días	lun 5/10/26	vie 11/6/27	2																											
6		LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8 ACERO (SCH-40) , DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO HASTA DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL H.A. CAPACIDAD DE 500 M3 (A CONSTRUIR)	60 días	lun 20/9/27	vie 10/12/27	5;8FF																											
7		DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL CIRCULAR, CAP. 5,000 M³	220 días	lun 5/10/26	vie 6/8/27	2																											
8		DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 500 M3	90 días	lun 9/8/27	vie 10/12/27	3;4FF																											
9		LÍNEA MATRÍZ Ø20 HIERRO DÚCTIL (C-25) DESDE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE H.A. 5,000 M3 (A CONSTRUIR) Y LÍNEA MATRÍZ DE Ø8 PVC (SDR-26) c/J.G. DESDE DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL DE H.A. 500 M3 (CONSTRUIR)	80 días	lun 13/12/27	vie 31/3/28	8;7																											
10		REDES DE DISTRIBUCIÓN	370 días	lun 5/10/26	vie 3/3/28	2																											
11		CAMPAMENTO	390 días	lun 5/10/26	vie 31/3/28	9FF;10FF																											
12		FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 31/3/28	vie 31/3/28	9FF;10FF																											

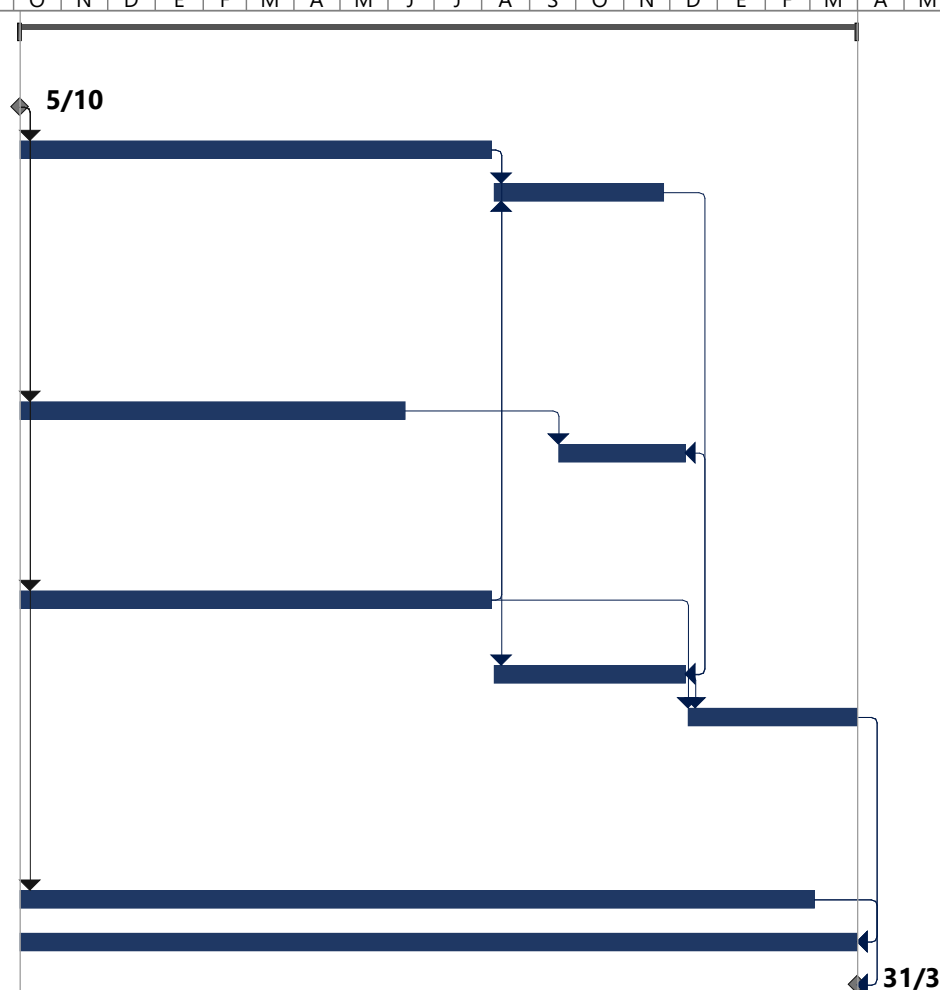

Proyecto: Programacion Const. Fecha: vie 8/5/26	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
