CRONOGRAMA

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERALVILLO - LA PLACETA

EQUIPOS & COMPRESORES
INGENIERIA COMPRESORES S.A.S

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Ampliación Acueducto Múltiple Peralvillo - La Placeta**	**14.75 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 9/12/22**
2		**Obra de toma y estación bombeo**	**6.15 mss**	**lun 25/10/21**	**mié 13/4/22**
3		Camino de acceso 253.40m (A=5.40m)	1 ms	lun 25/10/21	vie 19/11/21
4		Terminación obra de toma	1.5 mss	lun 8/11/21	vie 17/12/21
5		Aducción obra toma/Est. De bombeo 95.40m. Ext. Línea 12"/NL 20" SCH-40	2 mss	lun 22/11/21	vie 14/1/22
6		Cárcamo y caseta de bombeo	3 mss	jue 25/11/21	mié 16/2/22
7		**Electrificación y equipamiento cárcamo de bombeo**	**5 mss**	**jue 25/11/21**	**mié 13/4/22**
8		**Elect. Primaria**	**3.5 mss**	**lun 27/12/21**	**vie 1/4/22**
9		Pedido	2 mss	lun 27/12/21	vie 18/2/22
10		Instalación	1.5 mss	lun 21/2/22	vie 1/4/22
11		**Elect. Secundaria**	**3.5 mss**	**lun 27/12/21**	**vie 1/4/22**
12		Pedido	2 mss	lun 27/12/21	vie 18/2/22
13		Instalación	1.5 mss	lun 21/2/22	vie 1/4/22
14		**Suministro e instalación elect. Bombas de 100HP c/u Inc. Piezas (560 GPM vs. 507 pies TDH)**	**5 mss**	**jue 25/11/21**	**mié 13/4/22**
15		Pedido	3 mss	jue 25/11/21	mié 16/2/22
16		Instalación	2 mss	jue 17/2/22	mié 13/4/22
17		**Línea de impulsión (791 m) 12" acero negro SCH-30**	**8 mss**	**jue 25/11/21**	**mié 6/7/22**
18		Movimiento de Tierras	4.5 mss	lun 27/12/21	vie 29/4/22
19		**Colocación 12" AN SCH-40**	**4 mss**	**jue 25/11/21**	**mié 16/3/22**
20		Pedido	3 mss	jue 25/11/21	mié 16/2/22
21		Instalación	1 ms	jue 17/2/22	mié 16/3/22
22		**Colocación 12" PVC SDR-21 (2,283.8m) desde est. Bombeo/p. potabilizadora (70 L/S)**	**6 mss**	**jue 25/11/21**	**mié 11/5/22**
23		Pedido	3 mss	jue 25/11/21	mié 16/2/22
24		Instalación	3 mss	jue 17/2/22	mié 11/5/22
25		Cruces y miscelaneos	2 mss	jue 12/5/22	mié 6/7/22
26		**Planta Potabilizadora (70 L/S)**	**14.75 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 9/12/22**
27		Rehabilitación camino de acceso (T.I) 251m (A=4.00m)	1.5 mss	lun 25/10/21	vie 3/12/21
28		Limpieza unidades existentes	0.5 mss	lun 6/12/21	vie 17/12/21
29		**Válvulas 12" HF (2.1) + varios**	**2.5 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 31/12/21**
30		Pedido	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21
31		Instalación	0.5 mss	lun 20/12/21	vie 31/12/21
32		**Vertedero cimacio y compuerta**	**3 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 14/1/22**
33		Pedido	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21
34		Instalación	1 ms	lun 20/12/21	vie 14/1/22
35		**Floculadores (T. varios) con placas de polipropileno**	**7 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 6/5/22**
36		Pedido	3 mss	lun 25/10/21	vie 14/1/22
37		Instalación	4 mss	lun 17/1/22	vie 6/5/22
38		**Sedimentadores Módulos lamenares decanter 80**	**8 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 3/6/22**
39		Pedido	3 mss	lun 25/10/21	vie 14/1/22
40		Instalación	5 mss	lun 17/1/22	vie 3/6/22
41		Canaletas (Desagües/Floculadores) Canales de distribución/Ent. Sed.	6 mss	mar 25/1/22	lun 11/7/22
42		Sedimentadores (Trab. Varios)	6 mss	lun 25/4/22	vie 7/10/22
43		**Filtro rápidos**	**11 mss**	**lun 27/12/21**	**vie 28/10/22**
44		Pedido	3 mss	lun 27/12/21	vie 18/3/22
45		Instalación	8 mss	lun 21/3/22	vie 28/10/22
46		Trab. Miscelaneos (P. Potabilizadora)	6 mss	lun 27/6/22	vie 9/12/22
47		**Casa de químicos/varios/casa de operadores**	**8 mss**	**lun 25/4/22**	**vie 2/12/22**
48		Pedido	3 mss	lun 25/4/22	vie 15/7/22
49		Instalación	5 mss	lun 18/7/22	vie 2/12/22
50		Verja	2 mss	jue 25/8/22	mié 19/10/22
51		**Línea de conducción 8" PVC/6"PVC SDR-26. Línea 8"/Depósito regulador 300m³**	**2.5 mss**	**jue 25/11/21**	**mié 2/2/22**
52		Pedido	1 ms	jue 25/11/21	mié 22/12/21
53		Instalación	1.5 mss	jue 23/12/21	mié 2/2/22
54		**Línea conducción cámara rep. De caudales/hasta dep. reg. Exist. 8"**	**5 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 11/3/22**
55		Pedido	2 mss	lun 25/10/21	vie 17/12/21
56		Instalación	3 mss	lun 20/12/21	vie 11/3/22
57		**Depósito regulador 700m³ stand-pipe (superficial) H.A.**	**13 mss**	**lun 25/10/21**	**vie 21/10/22**
58		Preparación	1 ms	lun 25/10/21	vie 19/11/21
59		Instalación	10 mss	lun 22/11/21	vie 26/8/22
60		Conexiones y pruebas	2 mss	lun 29/8/22	vie 21/10/22
61		**Línea matriz (depósito-red) 8" PVC SDR-26 (inc. Rompedora de presión)**	**5 mss**	**vie 25/2/22**	**jue 14/7/22**
62		Pedido	2 mss	vie 25/2/22	jue 21/4/22
63		Instalación	3 mss	vie 22/4/22	jue 14/7/22
64		**Redes de distribución**	**9.45 mss**	**lun 25/10/21**	**jue 14/7/22**
65		Los Botados	4 mss	lun 25/10/21	vie 11/2/22
66		Comunidad Camarón	3 mss	vie 25/2/22	jue 19/5/22
67		Los Solares	4 mss	vie 25/3/22	jue 14/7/22
68		Asfaltado en general	4 mss	lun 25/7/22	vie 11/11/22

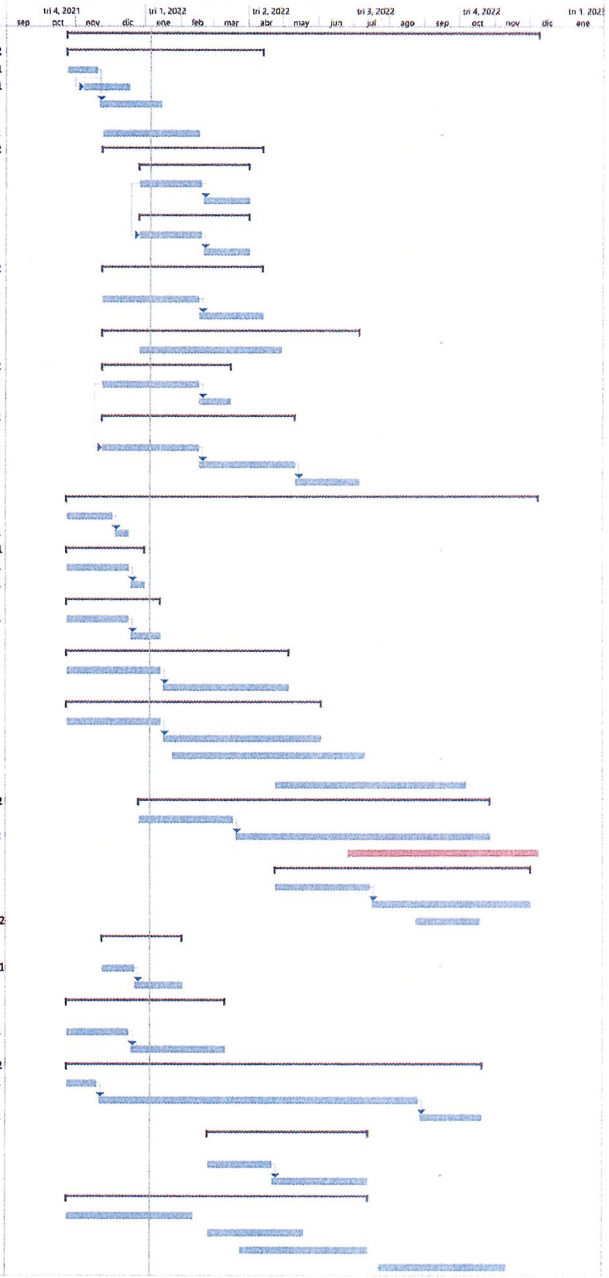

Proyecto: Peralvillo Bacha.mpp
Fecha: jue 6/1/22

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

EQUIPOS & COMPRESORES INGENIERIA, S.A.S.
